126 - VARCES
SEO

IM2S
Votre solution Hydraulique
1bis Avenue François Adam
94100 SAINT MAUR DES FOSSES

N°	Mo	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs
1		**Projet SEO VARCES**	**37 jrs**	**Mar 28/04/26**	**Mer 24/06/26**	
2		**Installation de chantier**	**2 jrs**	**Mar 28/04/26**	**Mer 29/04/26**	
3		Installation de la base vie	1 jr	Mar 28/04/26	Mar 28/04/26	
4		Mise en place des barrières HERAS et protections du chantier	1 jr	Mer 29/04/26	Mer 29/04/26	3
5		**Démolition**	**8 jrs**	**Jeu 30/04/26**	**Mer 13/05/26**	
6		Mise en sécurité électrique de la station	1 jr	Jeu 30/04/26	Jeu 30/04/26	4
7		Nettoyage / Dégazage des cuves et tuyauteries existantes (Mise en sécurité de la station)	2 jrs	Jeu 30/04/26	Lun 04/05/26	4
8		Dépose de l'ensemble du matériel sur piste VL et PL (distributeurs, tête d'affiche, etc.)	2 jrs	Mar 05/05/26	Mer 06/05/26	7
9		Dépose de l'ensemble des réseaux (assainissement, électricité, télécom)	2 jrs	Jeu 07/05/26	Lun 11/05/26	8
10		Démolition partielle des îlots	2 jrs	Mar 12/05/26	Mer 13/05/26	9
11		**Terrassement**	**7 jrs**	**Lun 18/05/26**	**Mer 27/05/26**	
12		Terrassement Cuve	3 jrs	Lun 18/05/26	Mer 20/05/26	10
13		Réalisation des tranchées pour tuyauteries, fourreaux et assainissement	3 jrs	Ven 22/05/26	Mer 27/05/26	17
14		**Réservoir**	**5 jrs**	**Jeu 21/05/26**	**Jeu 28/05/26**	
15		Mise en place des réservoirs	1 jr	Jeu 21/05/26	Jeu 21/05/26	12
16		Réalisation du radier béton	1 jr	Jeu 21/05/26	Jeu 21/05/26	12
17		Remblaiement jusqu'au trou d'homme en sable Ph Neutre	1 jr	Jeu 21/05/26	Jeu 21/05/26	12
18		Mise en place des équipements des plateaux de trous d'homme	2 jrs	Ven 22/05/26	Mar 26/05/26	17
19		Mise en place des cheminées de trous d'homme	2 jrs	Mer 27/05/26	Jeu 28/05/26	18
20		**Réseaux**	**5 jrs**	**Jeu 28/05/26**	**Mer 03/06/26**	
21		Réalisation de l'assainissement (canalisation, SHY, regards, etc.)	2 jrs	Jeu 28/05/26	Ven 29/05/26	13
22		Mise en place des fourreaux électrique et AEP	3 jrs	Lun 01/06/26	Mer 03/06/26	21
23		Mise en place de la tuyauteries (cuve, distributeurs, évent)	4 jrs	Ven 29/05/26	Mer 03/06/26	19
24		**Distribution et local technique**	**10 jrs**	**Jeu 04/06/26**	**Mer 17/06/26**	
25		Pose chaises des distributeur et remontées de tuyauteries	2 jrs	Jeu 04/06/26	Ven 05/06/26	22
26		Réfection des îlots	3 jrs	Lun 08/06/26	Mer 10/06/26	25
27		Réalisation du dépotage et soutirage et remontée de tuyauteries	2 jrs	Lun 08/06/26	Mar 09/06/26	25
28		Réalisation massif event et remontée de tuyauteries	2 jrs	Mer 10/06/26	Jeu 11/06/26	27
29		Réalisation de la dalle béton au-dessus du réservoir	3 jrs	Ven 12/06/26	Mar 16/06/26	28
30		Pose des appareils de distribution et du bulk AdBlue	4 jrs	Ven 12/06/26	Mer 17/06/26	28
31		**Auvent**	**3 jrs**	**Jeu 18/06/26**	**Lun 22/06/26**	
32		Mise en place éclairage	2 jrs	Jeu 18/06/26	Ven 19/06/26	30
33		Mis en place de la signalétique SEO	1 jr	Lun 22/06/26	Lun 22/06/26	32
34		**Travaux voirie**	**1 jr**	**Mar 23/06/26**	**Mar 23/06/26**	
35		Mise en place de la signalisation horizontale et verticale	1 jr	Mar 23/06/26	Mar 23/06/26	33
36		**Tests et essais**	**4 jrs**	**Jeu 18/06/26**	**Mar 23/06/26**	
37		Tests et essais de bon fonctionnement des tuyauteries	2 jrs	Jeu 18/06/26	Ven 19/06/26	30
38		Tests et essais de bon fonctionnement électrique	2 jrs	Lun 22/06/26	Mar 23/06/26	32
39		**Préparation à la réception du chantier**	**1 jr**	**Mer 24/06/26**	**Mer 24/06/26**	
40		Retrait des clôtures de chantier	1 jr	Mer 24/06/26	Mer 24/06/26	38
41		Nettoyage général	1 jr	Mer 24/06/26	Mer 24/06/26	38

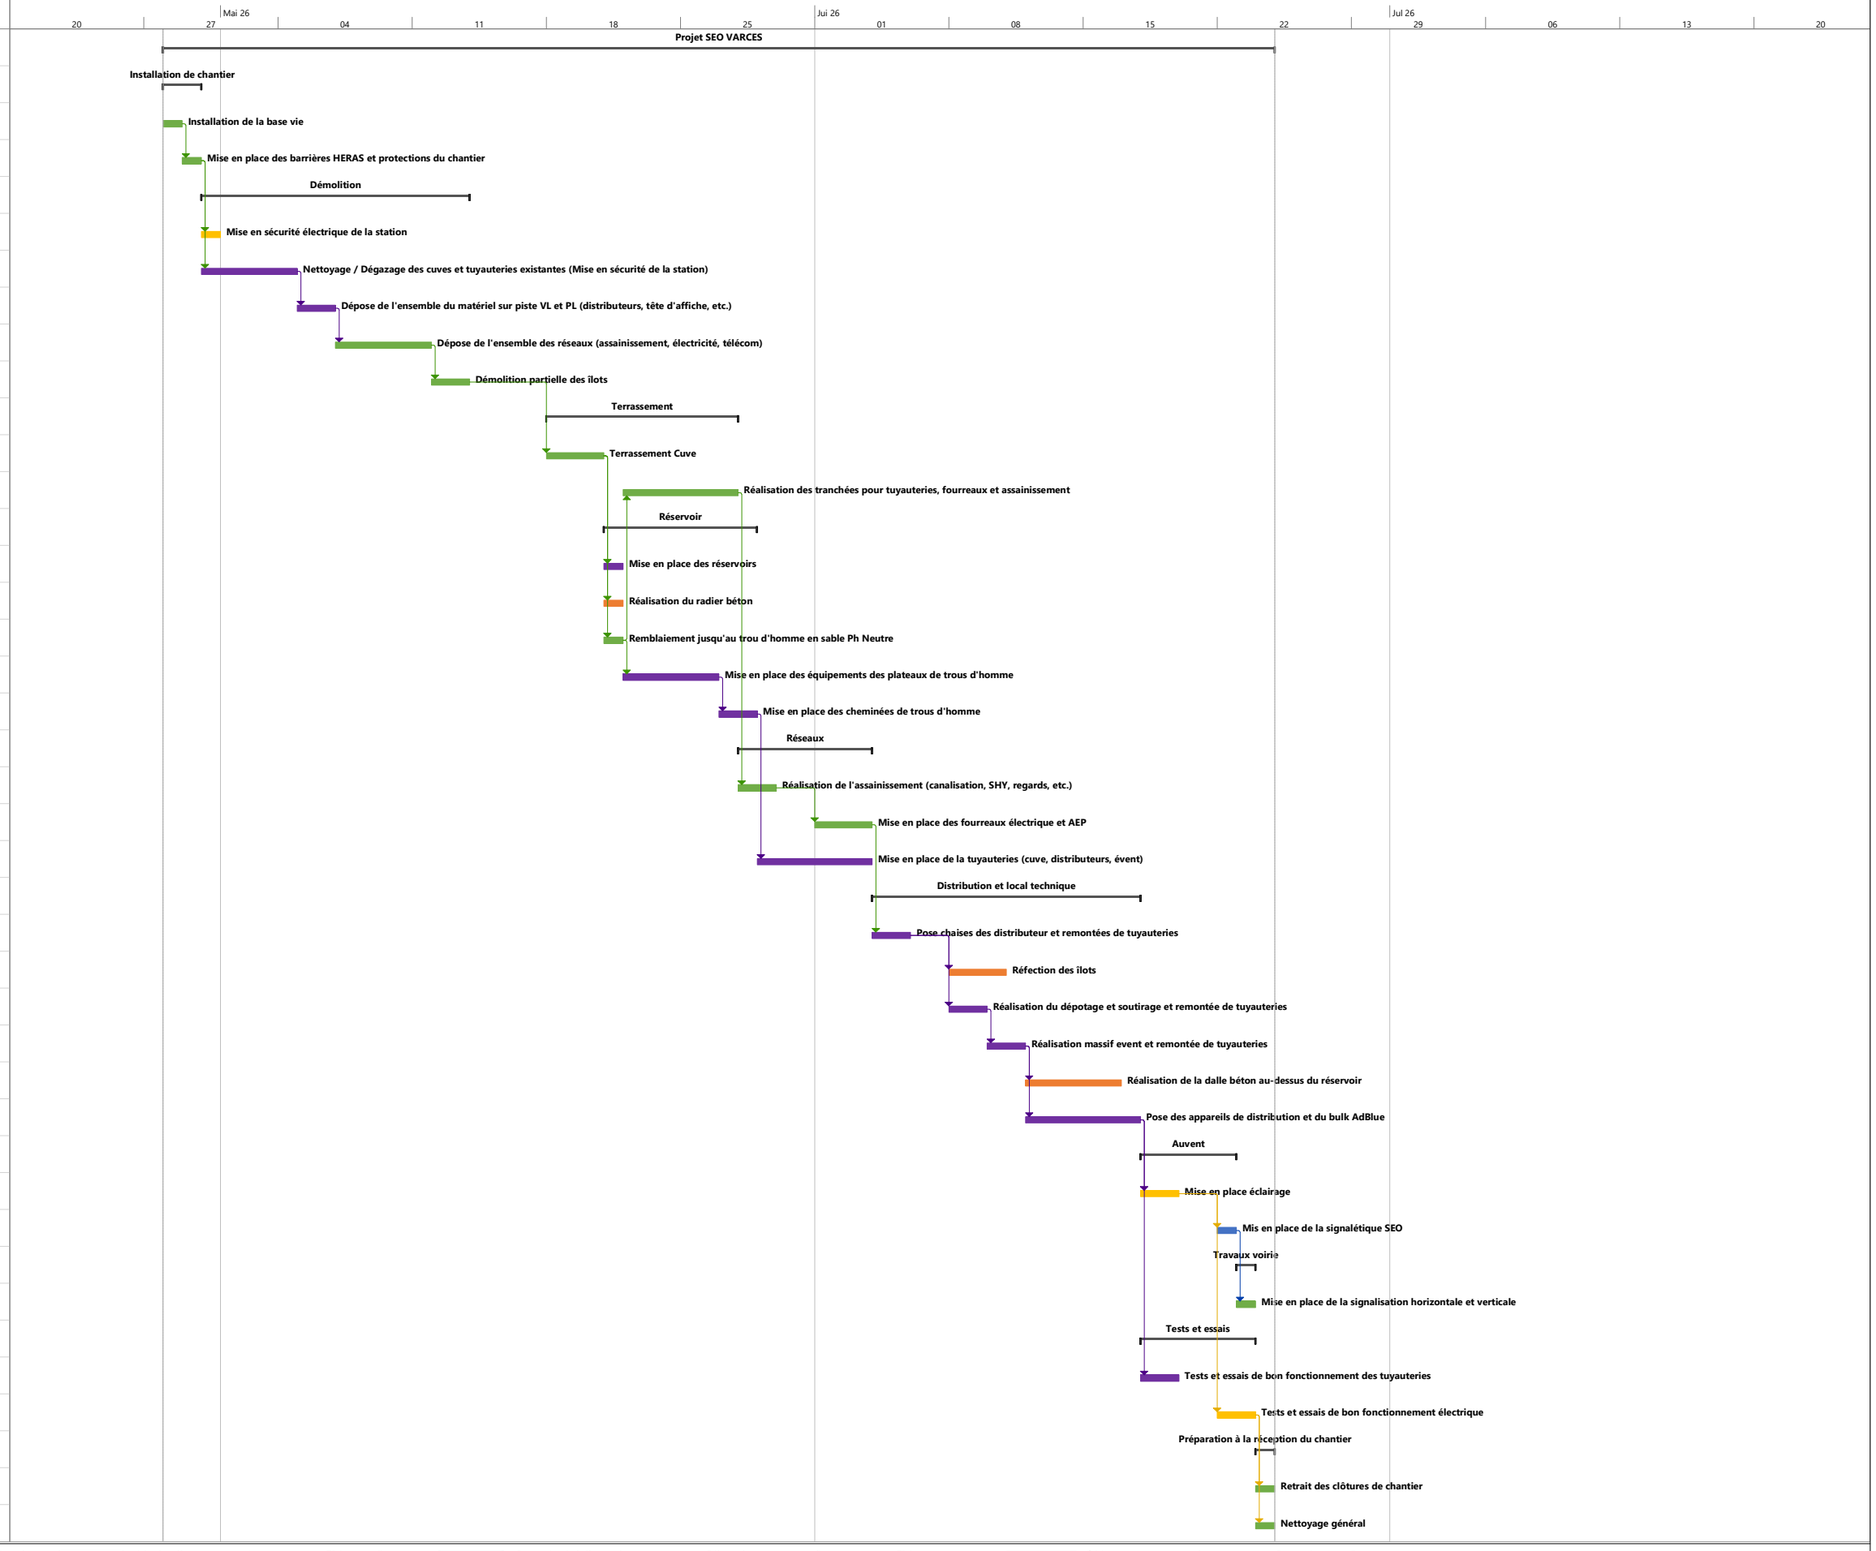

Projet : MsProject - Base
Date : Jeu 30/10/25

Tâche · Fractionnement · Jalon · Récapitulative · Récapitulatif du projet · Tâche inactive · Jalon inactif · Récapitulatif inactif · Tâche manuelle · Durée uniquement · Report récapitulatif manuel · Récapitulatif manuel · Début uniquement · Fin uniquement · Tâches externes · Jalons externes · Échéance · Avancement · Progression manuelle
