MOE. ERIC TAVEAU CONSEPTIONS _ GROUPE BETCE

REAMENAGEMENT DU PARVIS DE LA CAF 31 au 24 RUE RIQUET A TOULOUSE //
PLANING TRAVAUX DCE V01 OCTOBRE 2025

CAF DE LA HAUTE-GARONNE

	Nom	Durée	Début	Noms des ressources
1	**PREPARATION CHANTIER**	**55 j?**	**02/03/2026 0…**	
2	Etudes exécution structure gros oeuvre et charpente	10 j		LOT 01; LOT 02
3	Etudes exécution Etanchéité , serrurerie et elec	25 j	02/03/2026 0…	LOT 03; LOT 04; LOT 05
4	Autorisation de voirie	1 j?	02/03/2026 0…	LOT 01
5	Plan préfa mur béton et échantillons + valid.	15 j	16/03/2026 0…	LOT 01
6	Préfabrication Modules mur béton	30 j	06/04/2026 0…	LOT 01
7	Plan atelier charpente métallique	5 j	16/03/2026 0…	LOT 02
8	Préfabrication charpente en atelier	20 j	23/03/2026 0…	LOT 02
9	Préfabrication serrurerie en atelier	30 j	06/04/2026 0…	LOT 04
10	**INTERVENTION SUR SITE (fermeture ACCUEIL)**	**62 j**	**27/04/2026 0…**	
11	Installations chantier (cloture et base vie sur rue)	4 j	27/04/2026 0…	LOT 01
12	Dépose serrurerie (cloture, portails, main courante et bardage sas)	2 j	04/05/2026 0…	LOT 04
13	Démolitions gros oeuvre (pagode, cloture et carrelage)	3 j	06/05/2026 0…	LOT 01
14	Micropieux compris amenée et repli matériel	2 j	12/05/2026 0…	LOT 01
15	Modifications réseaux entrerré	2 j	14/05/2026 0…	LOT 01
16	Coffrage longrine et ferraillage	2 j	18/05/2026 0…	LOT 01
17	Livraison, mise en oeuvre et clavetage des modules béton préfa	1 j	20/05/2026 0…	LOT 01
18	Remblai parvis	2 j	21/05/2026 0…	LOT 01
19	Dallage béton et caniveau bas de rampe et réseaux enterrés électricité et EP	2 j	25/05/2026 0…	LOT 01; LOT 05
20	Maçonneries à créer et reprise insert base écran	3 j	27/05/2026 0…	LOT 01; LOT 04
21	Mise en oeuvre charpente métallique	2 j	01/06/2026 0…	LOT 02
22	Pose bac support étanchéité costières et isolant	2 j	03/06/2026 0…	LOT 03
23	Etanchéité et relevés et crochets ancrage	2 j	05/06/2026 0…	LOT 03
24	Essai mise en eau	1 j	09/06/2026 0…	LOT 03
25	Réseau électrique en plafond	1 j	09/06/2026 0…	LOT 05
26	Végétalisation toiture	2 j	10/06/2026 0…	LOT 03
27	Habillages acrotères et rives auvent	3 j	12/06/2026 0…	LOT 03
28	Pose des ventelles en tête mur	1 j	17/06/2026 0…	LOT 03
29	Enduit sur murets et mur et chaperons, assise béton	3 j	17/06/2026 0…	LOT 01
30	Terre végétale jardinière, cables tendus et pose barreaudages	3 j	22/06/2026 0…	LOT 01; LOT 04
31	Bardage sas et faux plafond auvent	5 j	22/06/2026 0…	LOT 04
32	Remplacement portes automatiques sas	1 j	29/06/2026 0…	LOT 04
33	Pose portail entrée et ensemble serrurerie sortie	4 j	30/06/2026 0…	LOT 04
34	Eclairages, caméras et mains courantes	2 j	06/07/2026 0…	LOT 04; LOT 05
35	Signalétique sur rue et sous auvent	1 j	06/07/2026 0…	LOT 04; CAF 31
36	Résine sol et signalisation accessibilité	5 j	07/07/2026 0…	LOT 01
37	Pose matériel Ecran et file d'attente	1 j	15/07/2026 0…	LOT 04; LOT 05; CAF 31
38	Repliement installations chantier OPR et nettoyage	8 j	15/07/2026 0…	LOT 01; LOT 04
39	Reception et mise à disposition.	1 j	27/07/2026 0…	CAF 31

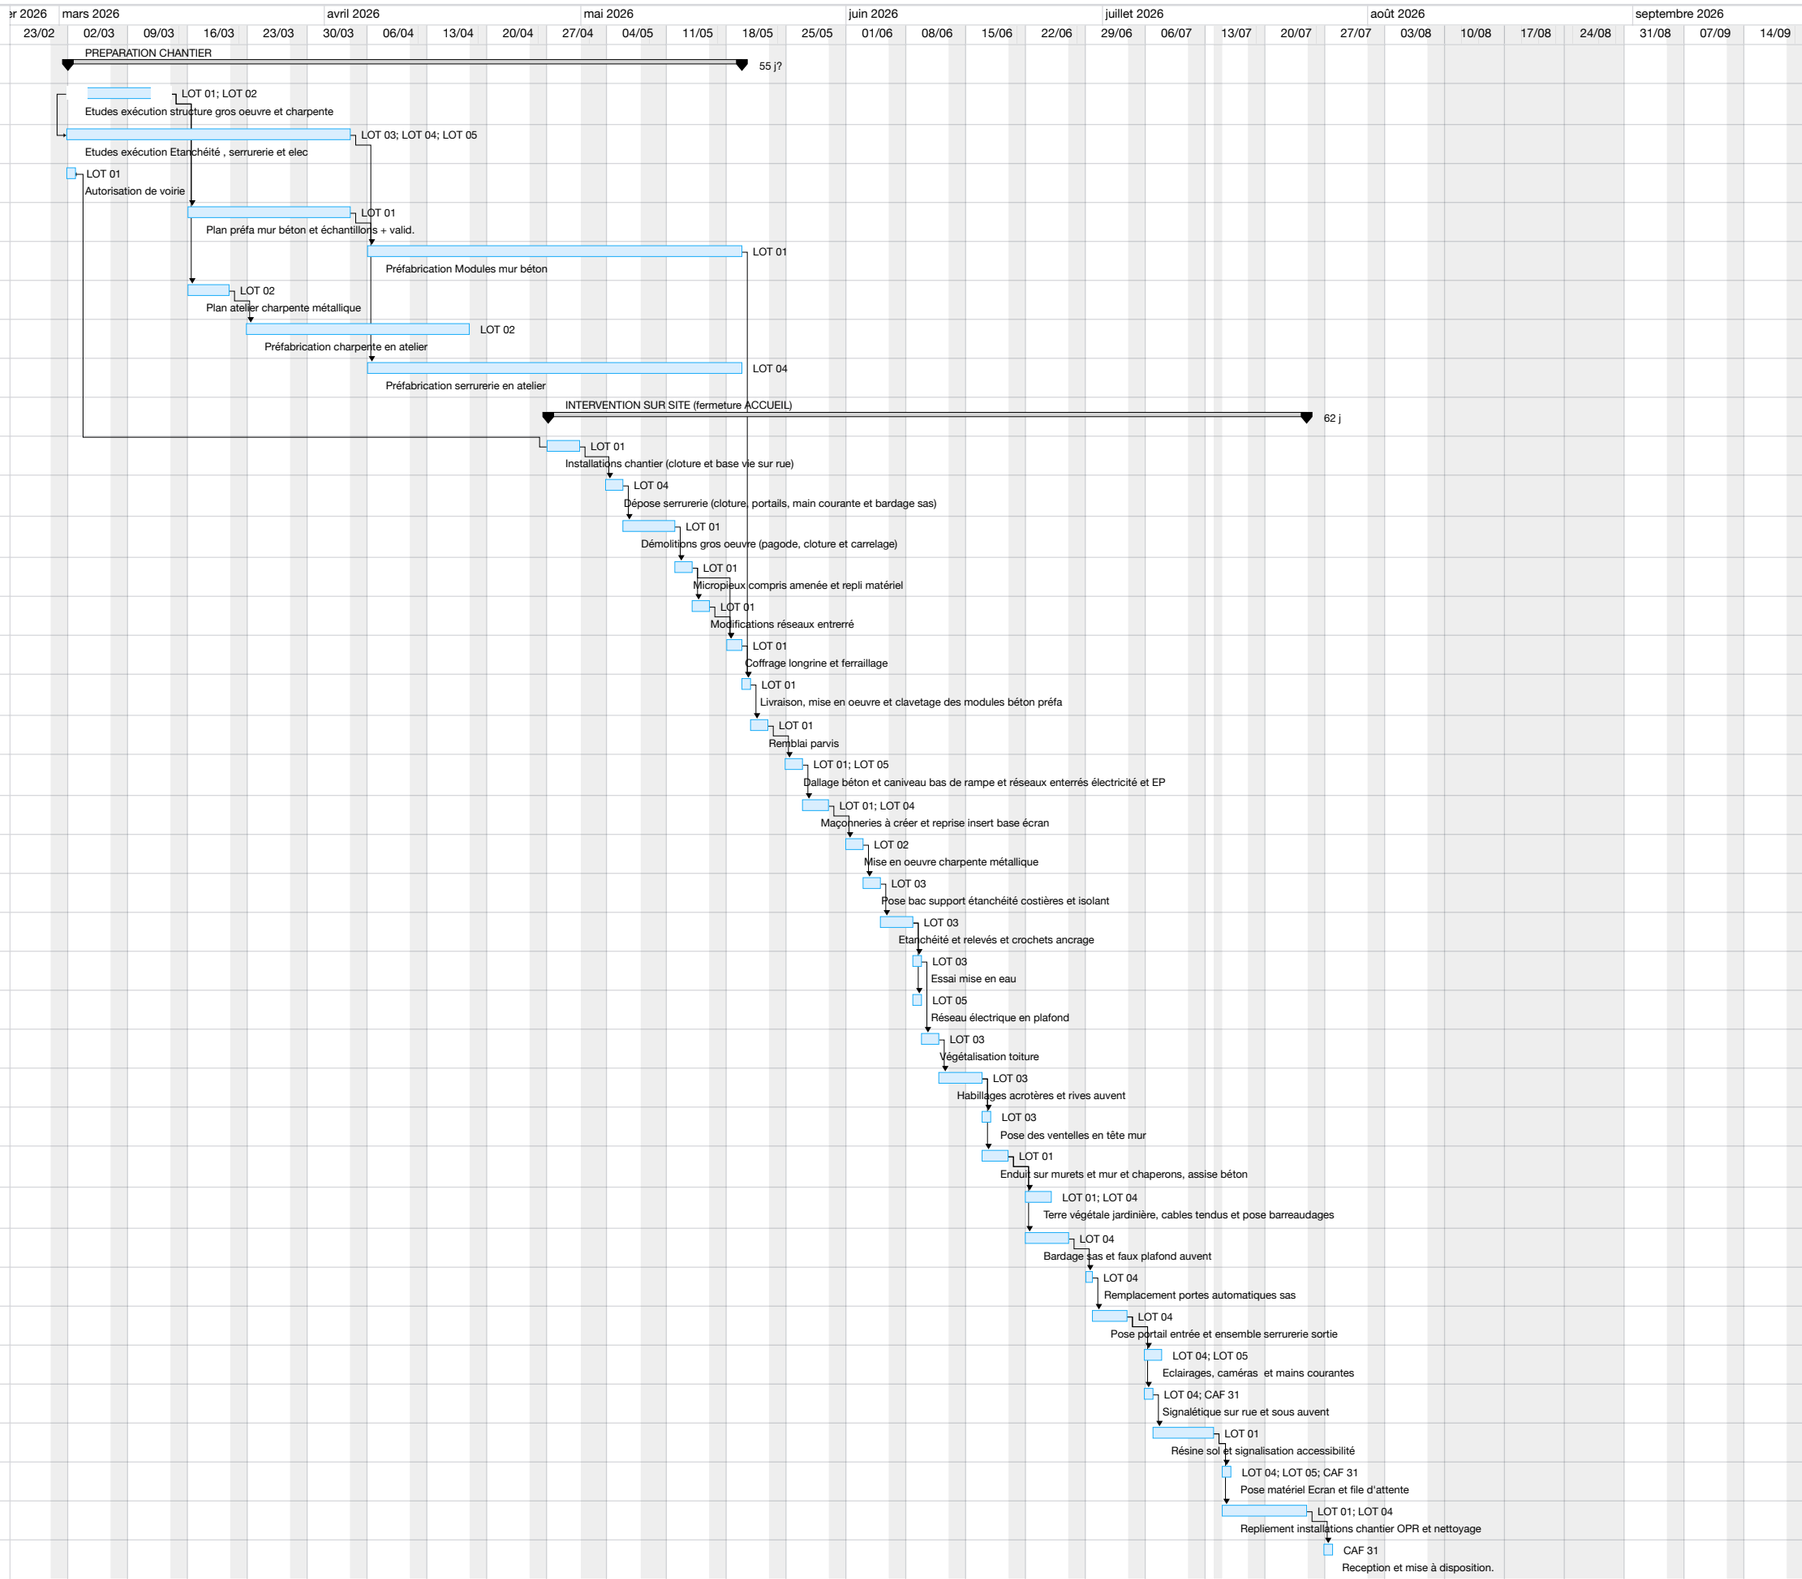

auteur : ERIC TAVEAU CONCEPTIONS architecte dplg et OPC
