2277-MAISON D'ARRET DE CARCASSONNE-ARMURERIE- CALENDRIER DE TRAVAUX PRO-DCE
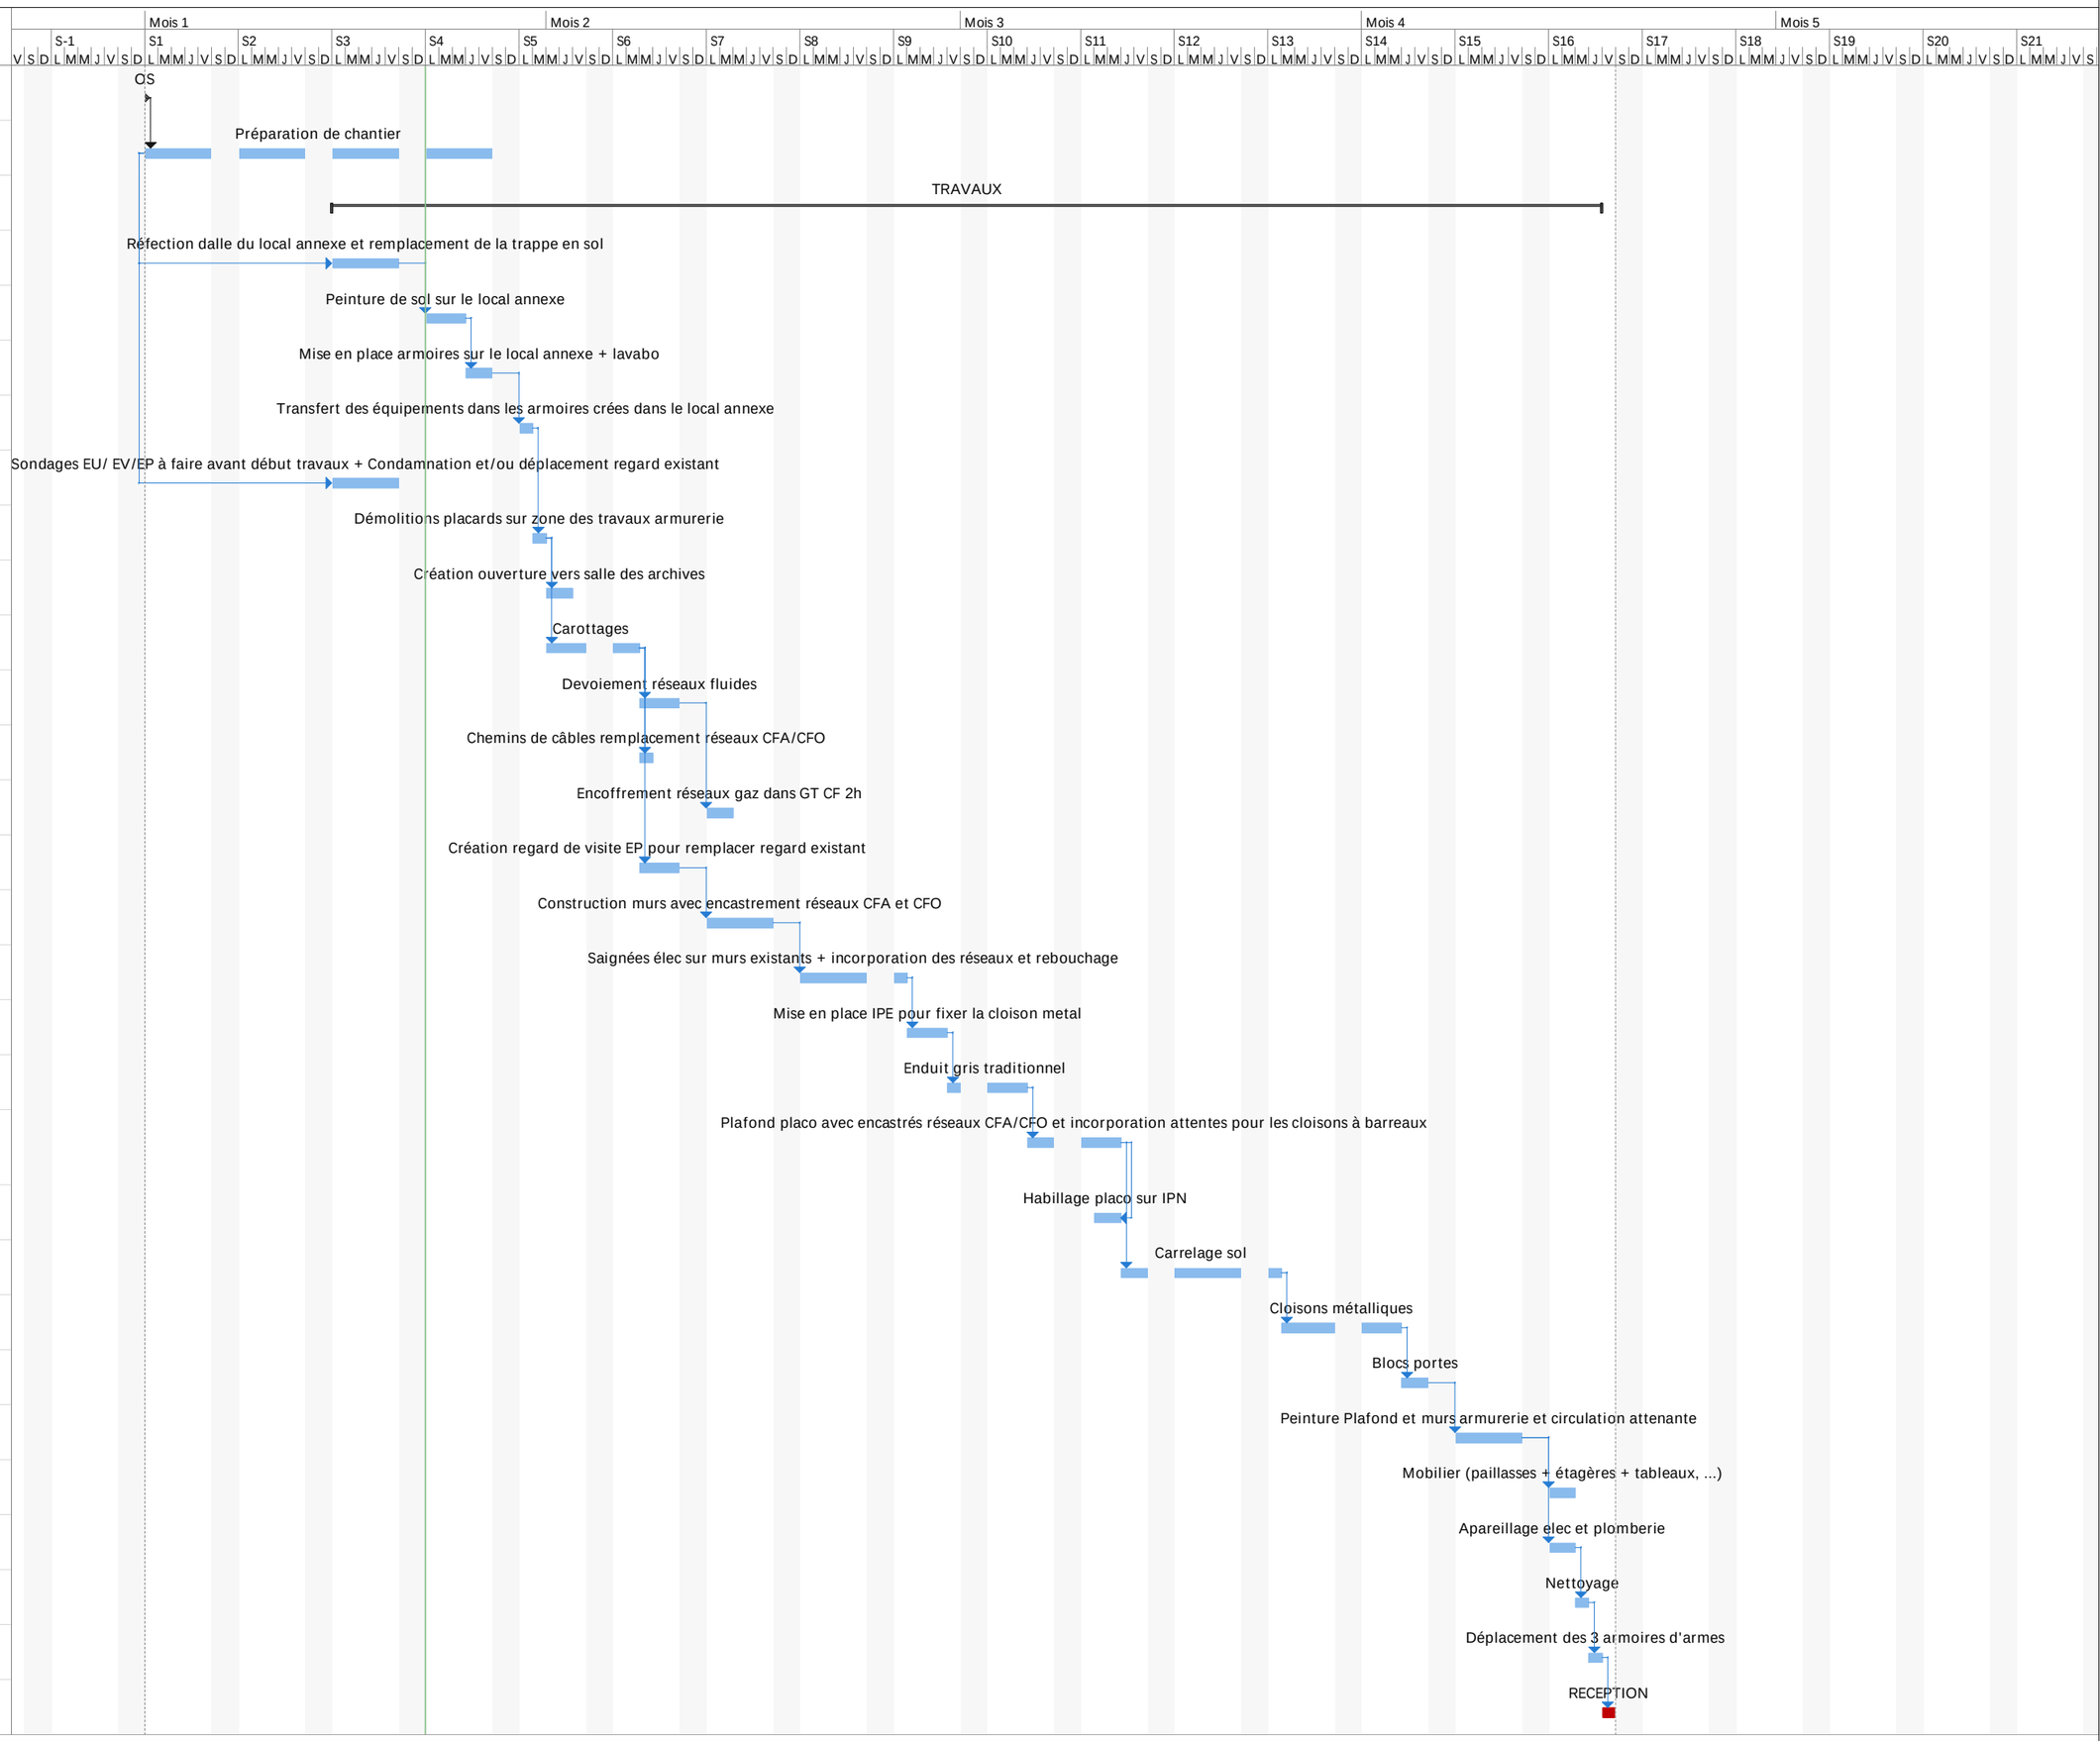
N°	Nom de la tâche	Durée
1	OS	0 jour
2	Préparation de chantier	1 mois
3	TRAVAUX	69 jours
4	Réfection dalle du local annexe et remplacement de la trappe en sol	5 jours
5	Peinture de sol sur le local annexe	3 jours
6	Mise en place armoires sur le local annexe + lavabo	2 jours
7	Transfert des équipements dans les armoires crées dans le local annexe	1 jour
8	Sondages EU/ EV/EP à faire avant début travaux + Condamnation et/ou déplacement regard existant	5 jours
9	Démolitions placards sur zone des travaux armurerie	1 jour
10	Création ouverture vers salle des archives	2 jours
11	Carottages	5 jours
12	Devoiement réseaux fluides	3 jours
13	Chemins de câbles remplacement réseaux CFA/CFO	1 jour
14	Encoffrement réseaux gaz dans GT CF 2h	2 jours
15	Création regard de visite EP pour remplacer regard existant	3 jours
16	Construction murs avec encastrement réseaux CFA et CFO	5 jours
17	Saignées élec sur murs existants + incorporation des réseaux et rebouchage	6 jours
18	Mise en place IPE pour fixer la cloison metal	3 jours
19	Enduit gris traditionnel	4 jours
20	Plafond placo avec encastrés réseaux CFA/CFO et incorporation attentes pour les cloisons à barreaux	5 jours
21	Habillage placo sur IPN	2 jours
22	Carrelage sol	8 jours
23	Cloisons métalliques	7 jours
24	Blocs portes	2 jours
25	Peinture Plafond et murs armurerie et circulation attenante	5 jours
26	Mobilier (paillasses + étagères + tableaux, ...)	2 jours
27	Apareillage elec et plomberie	2 jours
28	Nettoyage	1 jour
29	Déplacement des 3 armoires d'armes	1 jour
30	RECEPTION	1 jour
