MOA : DAC 974
MOE : NEO
OPC : KEOPS

"CENTRE DE CONSERVATION ET D'ETUDE"
PLANNING DCE (durée de 16 mois)
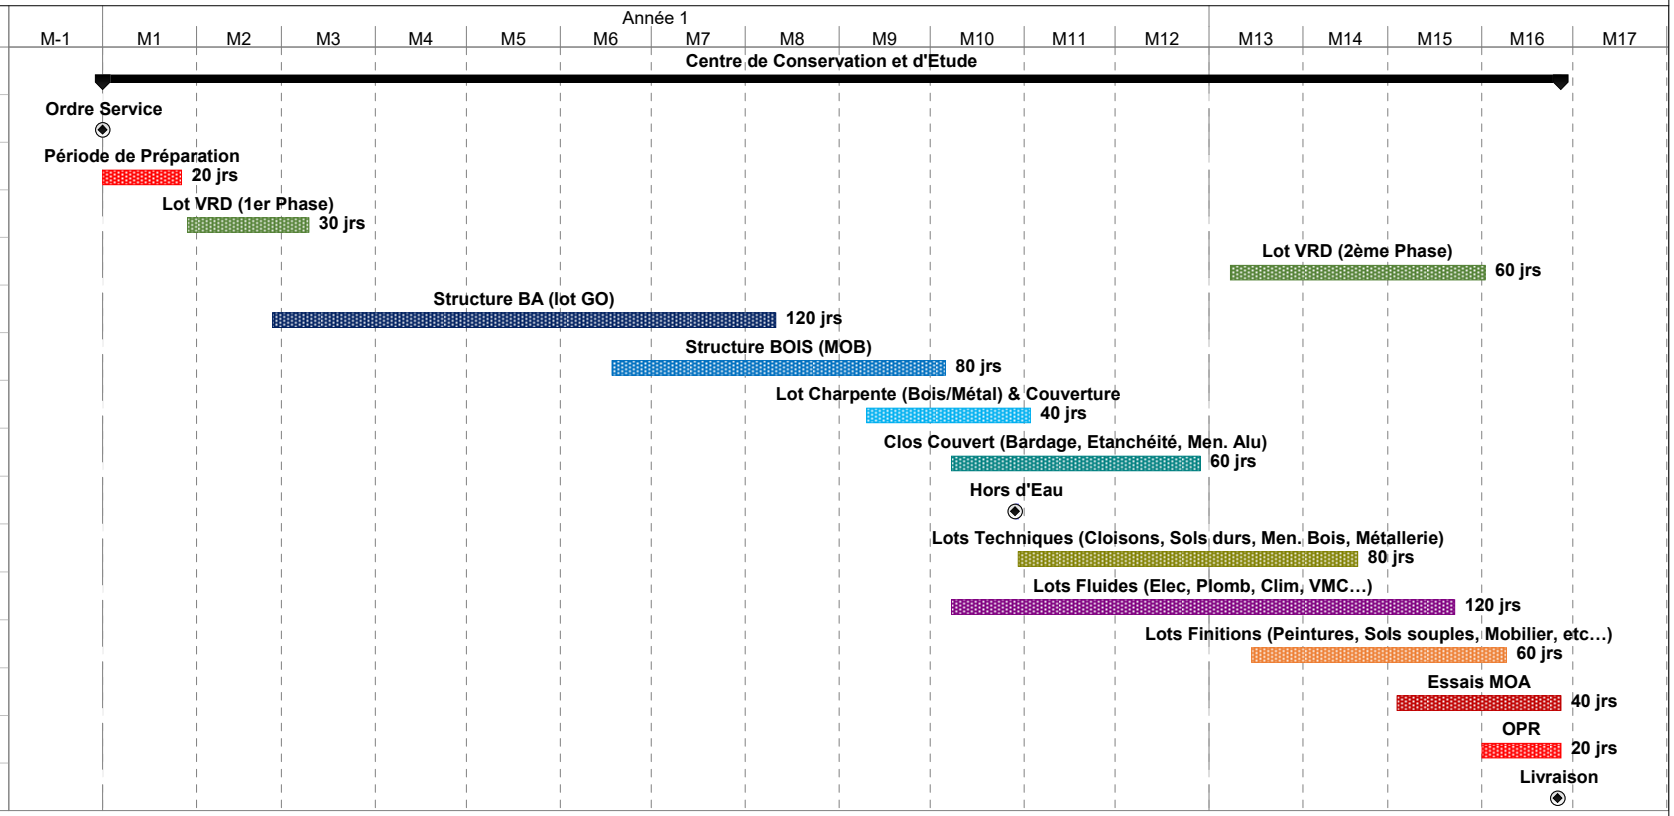
N°	Nom de la tâche	Durée
1	**Centre de Conservation et d'Etude**	**345 jrs**
2	Ordre Service	1 jr
3	Période de Préparation	20 jrs
4	Lot VRD (1er Phase)	30 jrs
5	Lot VRD (2ème Phase)	60 jrs
6	Structure BA (lot GO)	120 jrs
7	Structure BOIS (MOB)	80 jrs
8	Lot Charpente (Bois/Métal) & Couverture	40 jrs
9	Clos Couvert (Bardage, Etanchéité, Men. Alu)	60 jrs
10	**Hors d'Eau**	1 jr
11	Lots Techniques (Cloisons, Sols durs, Men. Bois, Métallerie)	80 jrs
12	Lots Fluides (Elec, Plomb, Clim, VMC…)	120 jrs
13	Lots Finitions (Peintures, Sols souples, Mobilier, etc…)	60 jrs
14	**Essais MOA**	40 jrs
15	**OPR**	20 jrs
16	**Livraison**	1 jr
