DGAC BATIMENT 484 - PLANNING PREVISIONNEL PHASE DCE
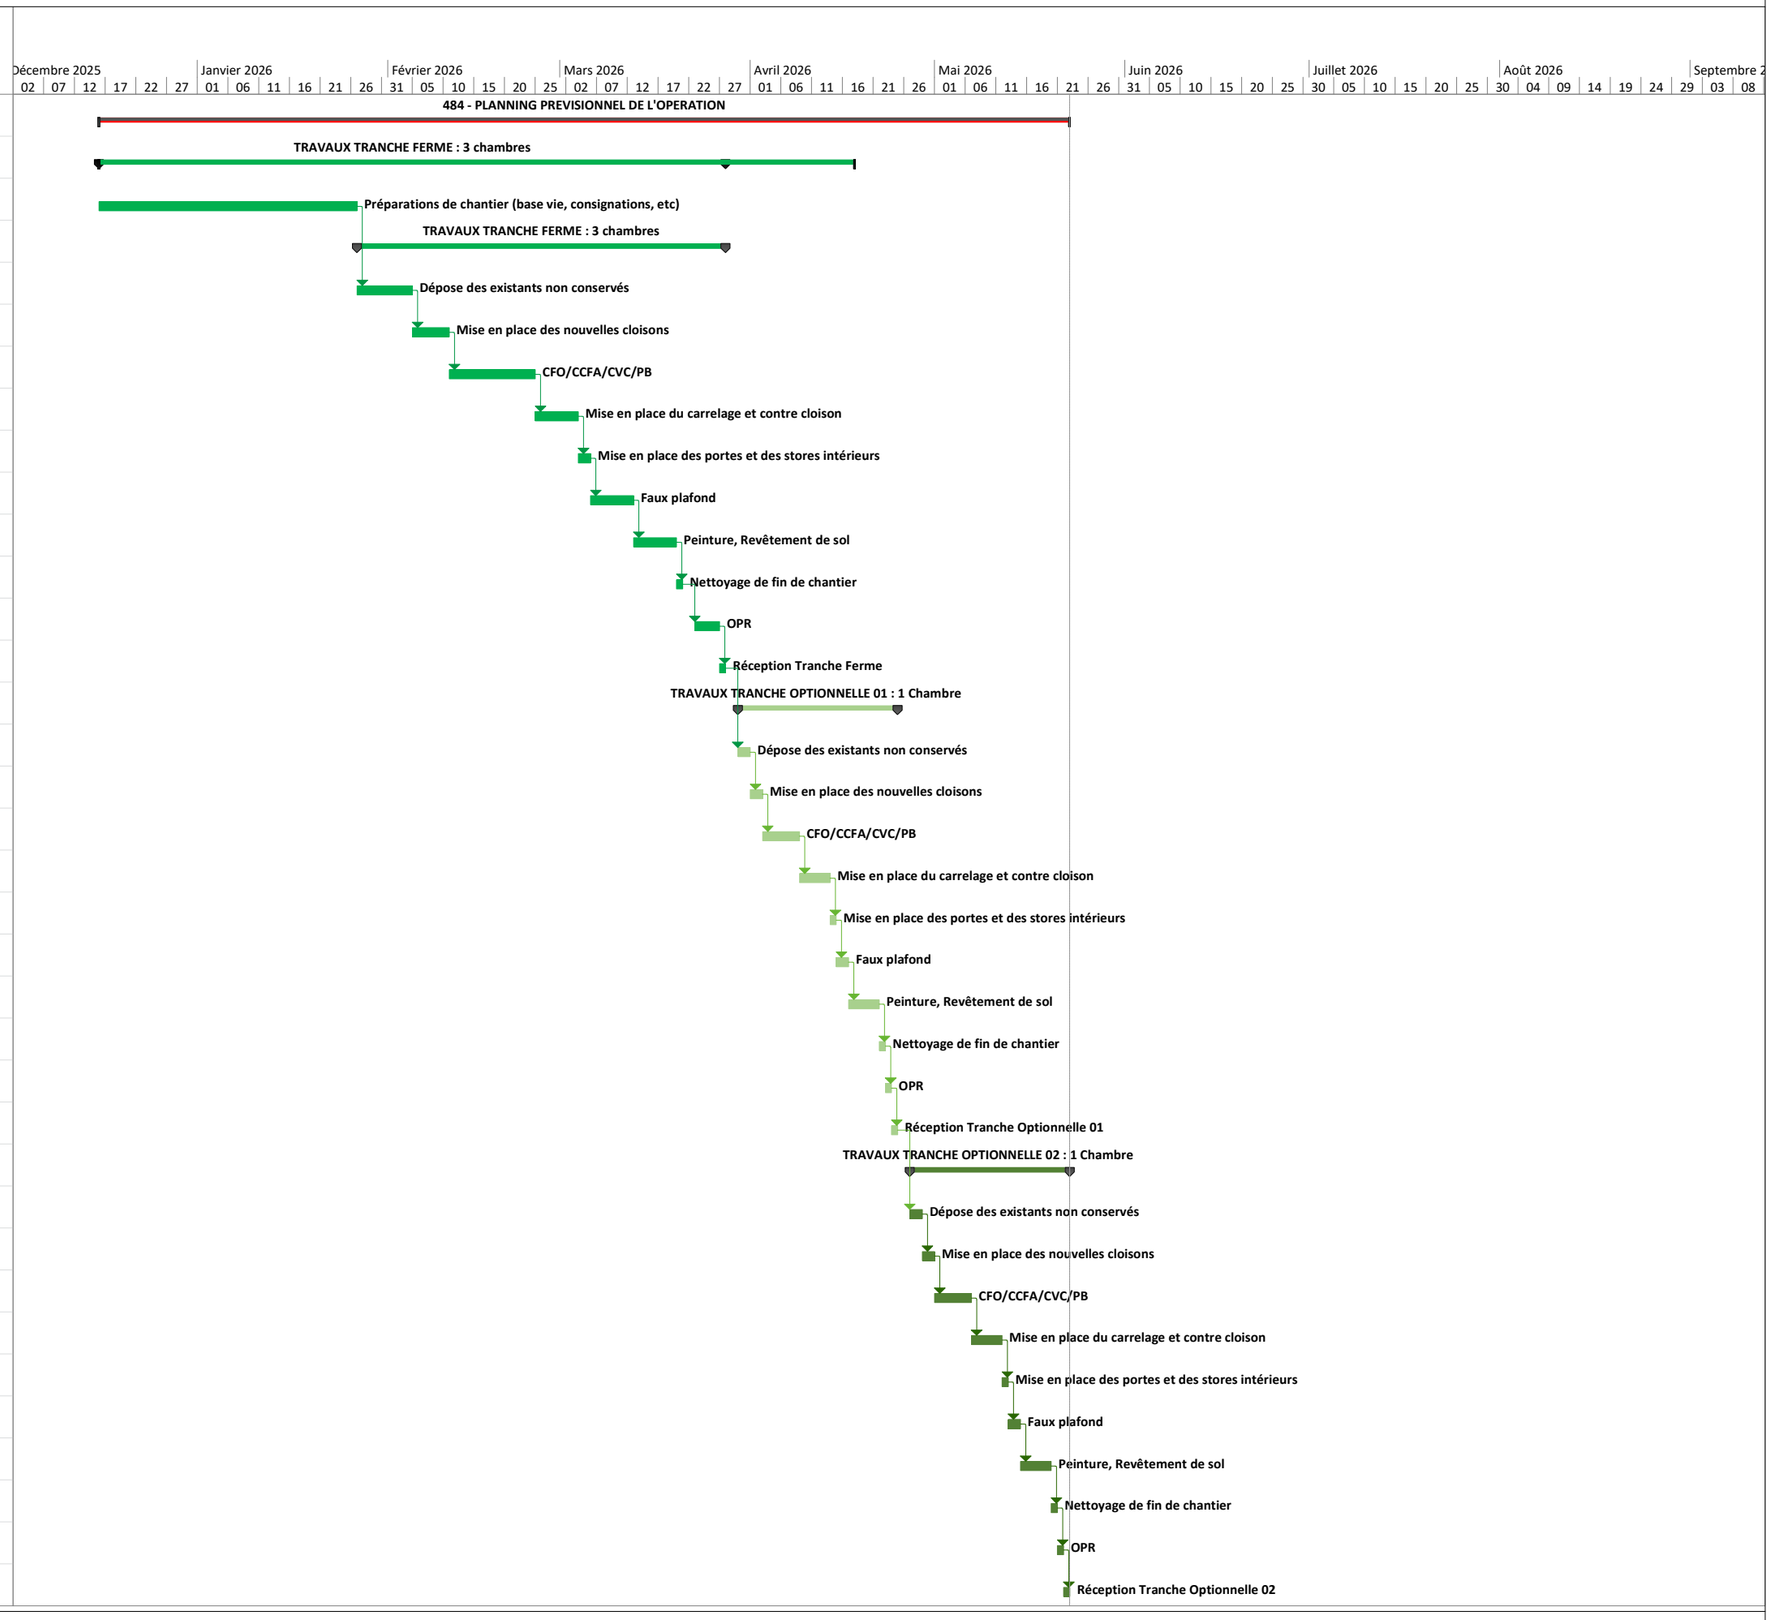
N°	Pr	Début	Fin	Durée	Nom de la tâche
1		**Mar 16/12/25**	**Ven 22/05/26**	**114 jrs**	**484 - PLANNING PREVISIONNEL DE L'OPERATION**
2		**Mar 16/12/25**	**Ven 17/04/26**	**89 jrs**	**TRAVAUX TRANCHE FERME : 3 chambres**
3		Mar 16/12/25	Lun 26/01/26	30 jrs	Préparations de chantier (base vie, consignations, etc)
4		**Mar 27/01/26**	**Ven 27/03/26**	**44 jrs**	**TRAVAUX TRANCHE FERME : 3 chambres**
5	3	Mar 27/01/26	Mer 04/02/26	7 jrs	Dépose des existants non conservés
6	5	Jeu 05/02/26	Mar 10/02/26	4 jrs	Mise en place des nouvelles cloisons
7	6	Mer 11/02/26	Mar 24/02/26	10 jrs	CFO/CCFA/CVC/PB
8	7	Mer 25/02/26	Mar 03/03/26	5 jrs	Mise en place du carrelage et contre cloison
9	8	Mer 04/03/26	Jeu 05/03/26	2 jrs	Mise en place des portes et des stores intérieurs
10	9	Ven 06/03/26	Jeu 12/03/26	5 jrs	Faux plafond
11	10	Ven 13/03/26	Jeu 19/03/26	5 jrs	Peinture, Revêtement de sol
12	11	Ven 20/03/26	Ven 20/03/26	1 jr	Nettoyage de fin de chantier
13	12	Lun 23/03/26	Jeu 26/03/26	4 jrs	OPR
14	13	Ven 27/03/26	Ven 27/03/26	1 jr	Réception Tranche Ferme
15		**Lun 30/03/26**	**Ven 24/04/26**	**20 jrs**	**TRAVAUX TRANCHE OPTIONNELLE 01 : 1 Chambre**
16	14	Lun 30/03/26	Mar 31/03/26	2 jrs	Dépose des existants non conservés
17	16	Mer 01/04/26	Jeu 02/04/26	2 jrs	Mise en place des nouvelles cloisons
18	17	Ven 03/04/26	Mer 08/04/26	4 jrs	CFO/CCFA/CVC/PB
19	18	Jeu 09/04/26	Lun 13/04/26	3 jrs	Mise en place du carrelage et contre cloison
20	19	Mar 14/04/26	Mar 14/04/26	1 jr	Mise en place des portes et des stores intérieurs
21	20	Mer 15/04/26	Jeu 16/04/26	2 jrs	Faux plafond
22	21	Ven 17/04/26	Mar 21/04/26	3 jrs	Peinture, Revêtement de sol
23	22	Mer 22/04/26	Mer 22/04/26	1 jr	Nettoyage de fin de chantier
24	23	Jeu 23/04/26	Jeu 23/04/26	1 jr	OPR
25	24	Ven 24/04/26	Ven 24/04/26	1 jr	Réception Tranche Optionnelle 01
26		**Lun 27/04/26**	**Ven 22/05/26**	**20 jrs**	**TRAVAUX TRANCHE OPTIONNELLE 02 : 1 Chambre**
27	25	Lun 27/04/26	Mar 28/04/26	2 jrs	Dépose des existants non conservés
28	27	Mer 29/04/26	Jeu 30/04/26	2 jrs	Mise en place des nouvelles cloisons
29	28	Ven 01/05/26	Mer 06/05/26	4 jrs	CFO/CCFA/CVC/PB
30	29	Jeu 07/05/26	Lun 11/05/26	3 jrs	Mise en place du carrelage et contre cloison
31	30	Mar 12/05/26	Mar 12/05/26	1 jr	Mise en place des portes et des stores intérieurs
32	31	Mer 13/05/26	Jeu 14/05/26	2 jrs	Faux plafond
33	32	Ven 15/05/26	Mar 19/05/26	3 jrs	Peinture, Revêtement de sol
34	33	Mer 20/05/26	Mer 20/05/26	1 jr	Nettoyage de fin de chantier
35	34	Jeu 21/05/26	Jeu 21/05/26	1 jr	OPR
36	35	Ven 22/05/26	Ven 22/05/26	1 jr	Réception Tranche Optionnelle 02
