Planning travaux - INSERM Rénovation P3

N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1		**INSERM P3**	**180 jours**	**06/10/25**	**12/06/26**
2		Consultation entreprises	25 jours	06/10/25	07/11/25
3		Analyse d'offres	15 jours	10/11/25	28/11/25
4		Marchés	5 jours	01/12/25	05/12/25
5		Etudes d'exécution	35 jours	08/12/25	23/01/26
6		Approvisionement	45 jours	19/01/26	20/03/26
7		Local technique	40 jours	16/03/26	08/05/26
8		Dépose et évacuation	10 jours	23/03/26	03/04/26
9		Cloisonnement	10 jours	06/04/26	17/04/26
10		Modifications aéraulique	10 jours	13/04/26	24/04/26
11		Modifications électrique	10 jours	13/04/26	24/04/26
12		Plafond	5 jours	27/04/26	01/05/26
13		Sol	5 jours	04/05/26	08/05/26
14		Essais et équilibrage	10 jours	11/05/26	22/05/26
15		OPR	5 jours	11/05/26	15/05/26
16		Réception	5 jours	25/05/26	29/05/26
17		Levées de réserves	10 jours	25/05/26	05/06/26
18		Mise à gris / Mise à blanc	5 jours	01/06/26	05/06/26
19		Qualifications	5 jours	08/06/26	12/06/26

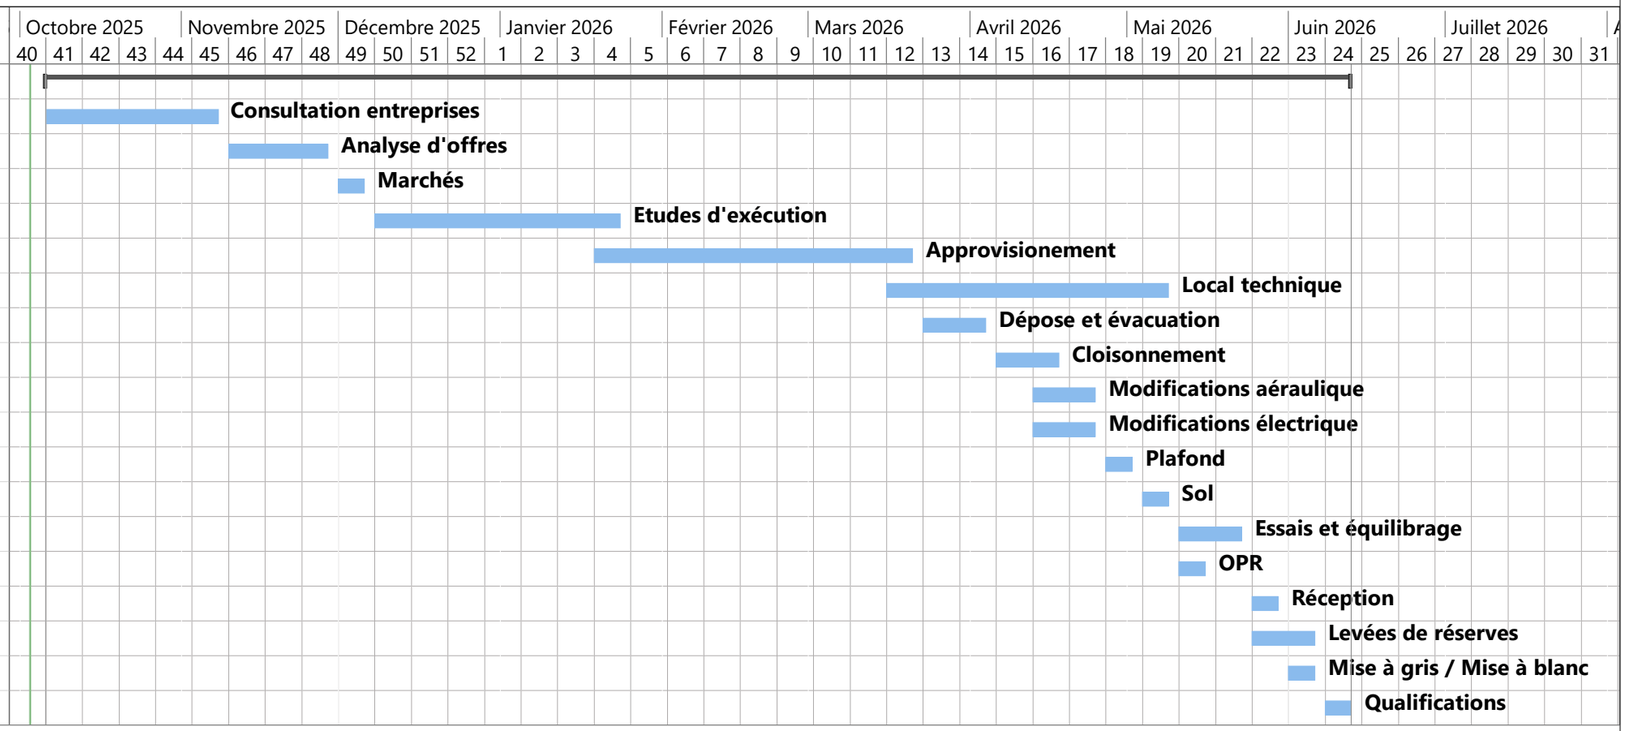

Projet : 485 - Planning rénovation L3
Date : 03/10/25

Tâche	Tâche inactive	Report récapitulatif manuel	Jalons externes
Fractionnement	Jalon inactif	Récapitulatif manuel	Échéance
Jalon	Récapitulatif inactif	Début uniquement	Avancement
Récapitulative	Tâche manuelle	Fin uniquement	Progression manuelle
Récapitulatif du projet	Durée uniquement	Tâches externes	
