PLANNING GENERAL ETUDES ET TRAVAUX - OREST
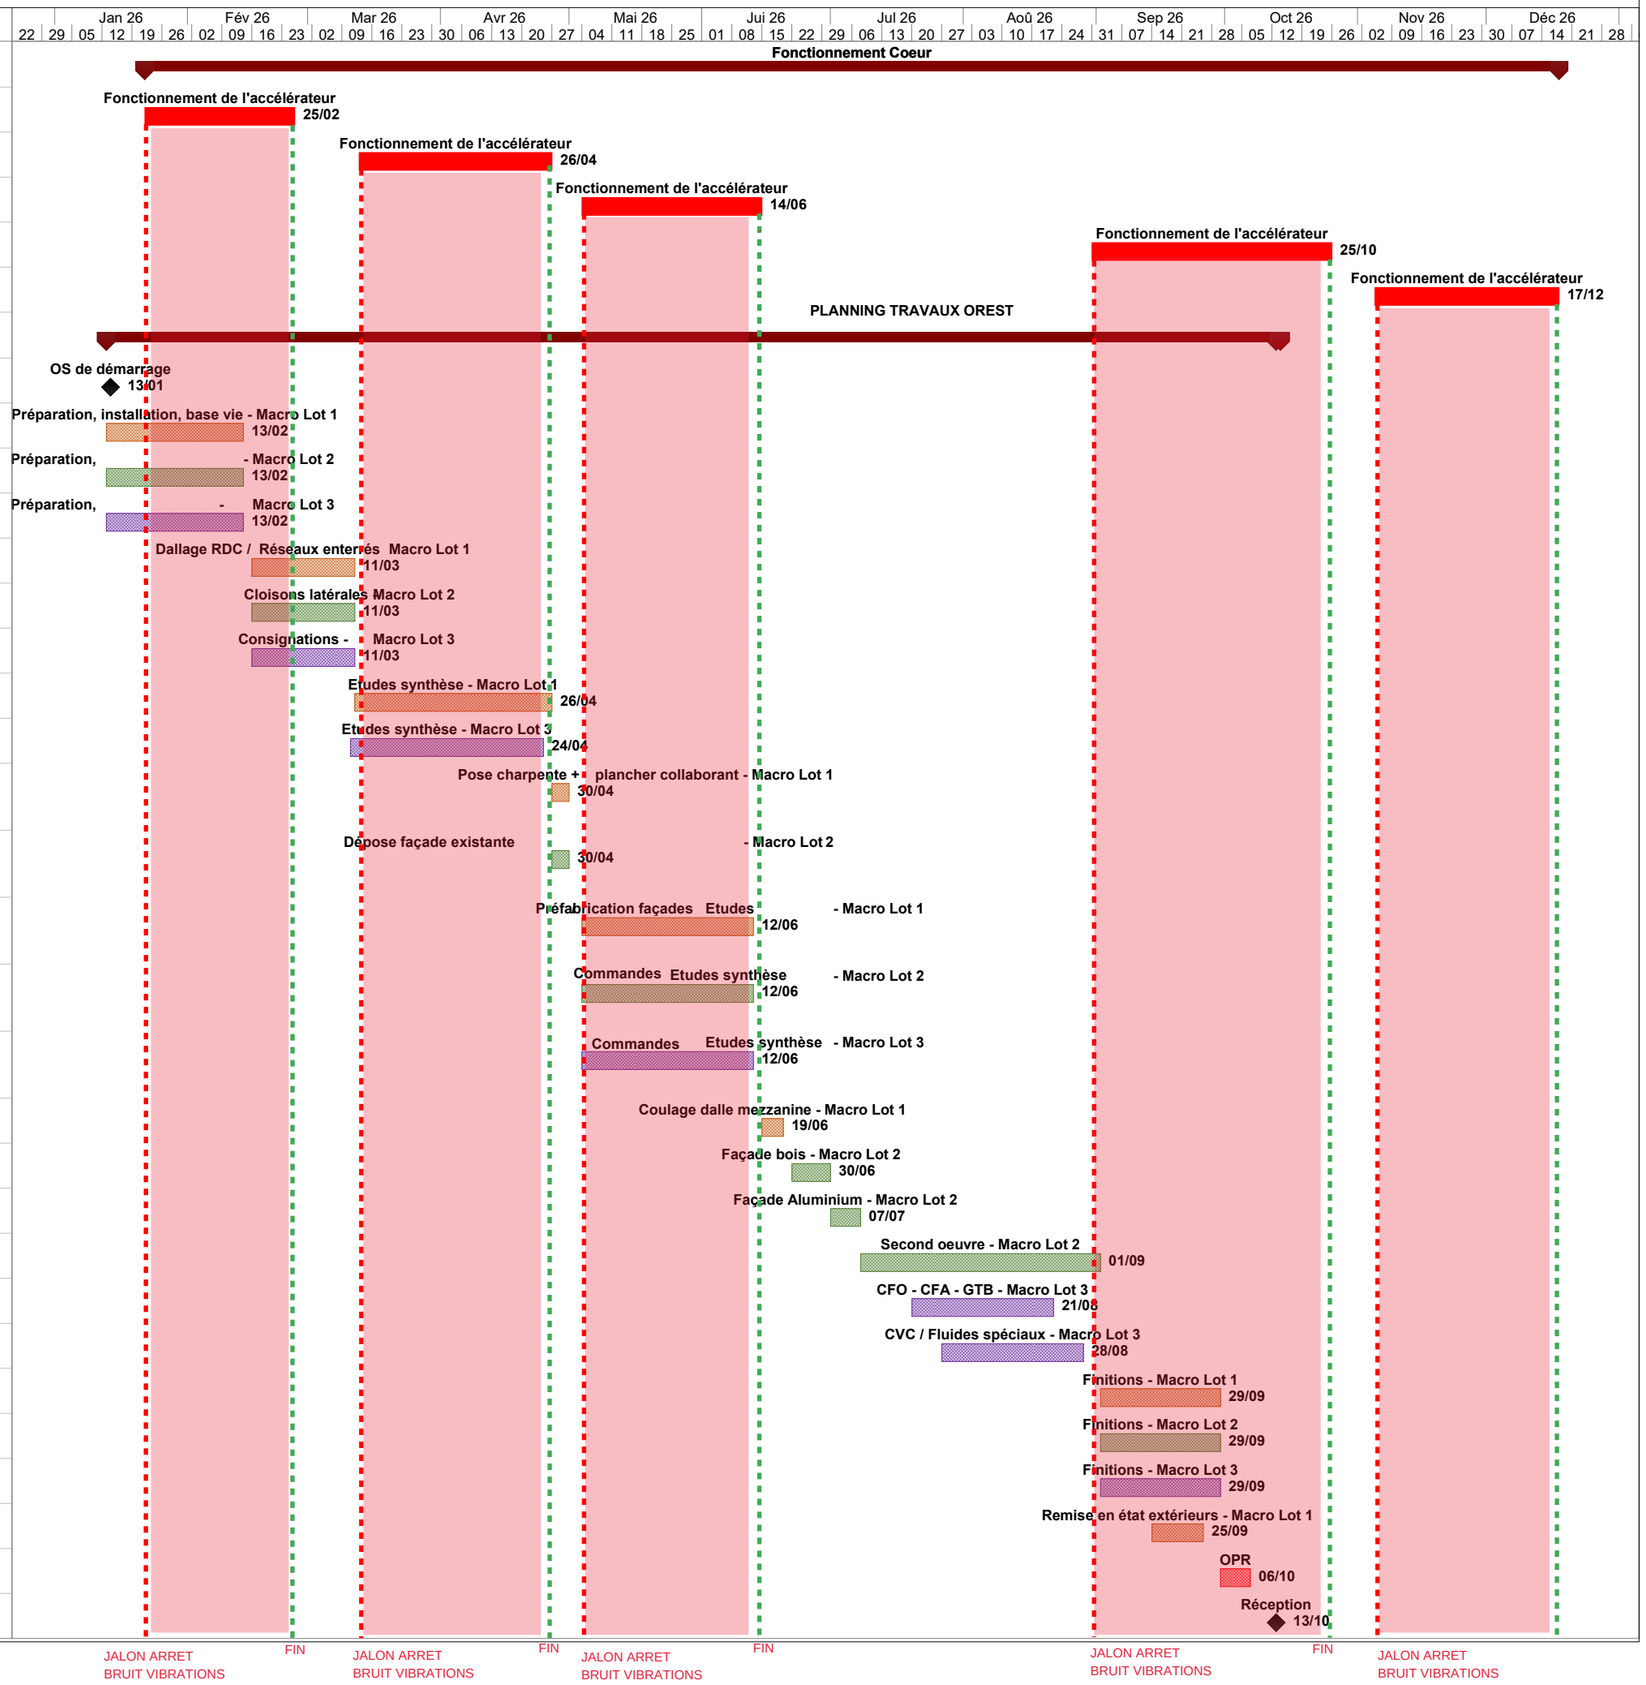
N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	**Fonctionnement Coeur**	**10,71 m**	**Jeu 22/01/26**	**Jeu 17/12/26**
2	Fonctionnement de l'accélérateur	5 sem.	Jeu 22/01/26	Mer 25/02/26
3	Fonctionnement de l'accélérateur	6,4 sem.	Ven 13/03/26	Dim 26/04/26
4	Fonctionnement de l'accélérateur	6,2 sem.	Lun 04/05/26	Dim 14/06/26
5	Fonctionnement de l'accélérateur	8,2 sem.	Lun 31/08/26	Dim 25/10/26
6	Fonctionnement de l'accélérateur	6,2 sem.	Jeu 05/11/26	Jeu 17/12/26
7	**Planning travaux OREST**	**8,89 m**	**Mar 13/01/26**	**Mar 13/10/26**
8	OS de démarrage	0 m	Mar 13/01/26	Mar 13/01/26
9	Préparation, installation, base vie - Macro Lot 1	4,8 sem.	Mar 13/01/26	Ven 13/02/26
10	Préparation - Macro Lot 2	4,8 sem.	Mar 13/01/26	Ven 13/02/26
11	Préparation - Macro Lot 3	4,8 sem.	Mar 13/01/26	Ven 13/02/26
12	Dallage RDC / Cloisons latéral - Macro Lot 1	3,8 sem.	Lun 16/02/26	Mer 11/03/26
13	Cloisons latérales - Macro Lot 2	3,8 sem.	Lun 16/02/26	Mer 11/03/26
14	Consignations Macro Lot 3	3,8 sem.	Lun 16/02/26	Mer 11/03/26
15	Etudes synthèse - Macro Lot 1	6,6 sem.	Jeu 12/03/26	Dim 26/04/26
16	Etudes synthèse - Macro Lot 3	6,6 sem.	Mer 11/03/26	Ven 24/04/26
17	Pose charpente + plancher collaborant - Macro Lot 1	0,8 sem.	Lun 27/04/26	Jeu 30/04/26
18	Dépose façade existante c - Macro Lot 2	0,8 sem.	Lun 27/04/26	Jeu 30/04/26
19	Préfabrication façades enterrés / Etudes - Macro Lot 1	6 sem.	Lun 04/05/26	Ven 12/06/26
20	Commandes/ Etudes synthèse - Macro Lot 2	6 sem.	Lun 04/05/26	Ven 12/06/26
21	Commandes Etudes synthèse - Macro Lot 3	6 sem.	Lun 04/05/26	Ven 12/06/26
22	Coulage dalle mezzanine - Macro Lot 1	1 sem.	Lun 15/06/26	Ven 19/06/26
23	Façade bois - Macro Lot 2	1,4 sem.	Lun 22/06/26	Mar 30/06/26
24	Façade Aluminium - Macro Lot 2	1 sem.	Mer 01/07/26	Mar 07/07/26
25	Second oeuvre - Macro Lot 2	8 sem.	Mer 08/07/26	Mar 01/09/26
26	CFO - CFA - GTB - Macro Lot 3	5 sem.	Lun 20/07/26	Ven 21/08/26
27	CVC / Fluides spéciaux - Macro Lot 3	5 sem.	Lun 27/07/26	Ven 28/08/26
28	Finitions - Macro Lot 1	4 sem.	Mer 02/09/26	Mar 29/09/26
29	Finitions - Macro Lot 2	4 sem.	Mer 02/09/26	Mar 29/09/26
30	Finitions - Macro Lot 3	4 sem.	Mer 02/09/26	Mar 29/09/26
31	Remise en état extérieurs - Macro Lot 1	2 sem.	Lun 14/09/26	Ven 25/09/26
32	OPR	1 sem.	Mer 30/09/26	Mar 06/10/26
33	Réception	0 sem.	Mar 13/10/26	Mar 13/10/26
