LUNEVILLE - (54300)

RESTRUCTURATION DE LA PHARMACIE A USAGE INTERIEUR (PUI)

24/07/2025

PLANNING PREVISIONNEL
PHASE PRO

ETICO
Economie - Technicité - Ingénierie - Coordination

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1				
2	**RESUME**	**239 jrs**	**Ven 31/10/25**	**Mer 04/11/26**
3	Etudes	47 jrs	Ven 31/10/25	Lun 19/01/26
4	Notification entreprises	0 jr	Lun 19/01/26	Lun 19/01/26
5	Période de préparation	30 jrs	Mar 20/01/26	Lun 02/03/26
6	Travaux - Phase 1	95 jrs	Mar 03/03/26	Lun 13/07/26
7	OPR et réserves	8 jrs	Mar 14/07/26	Jeu 23/07/26
8	Réception	0 jr	Mer 22/07/26	Mer 22/07/26
9	Travaux - Phase 2	60 jrs	Jeu 23/07/26	Mer 04/11/26
10				
11	**ETUDES (1)**	**47 jrs**	**Ven 31/10/25**	**Lun 19/01/26**
12	Mise en ligne Appel d'Offres	2 jrs	Ven 31/10/25	Lun 03/11/25
13	Consultation entreprises	20 jrs	Mar 04/11/25	Lun 01/12/25
14	Analyse des offres	10 jrs	Mar 02/12/25	Lun 15/12/25
15	Attribution et mises au point	15 jrs	Mar 16/12/25	Lun 19/01/26
16				
17	**TRAVAUX - PHASE 1 - PUI LOCAUX STERILES**	**125 jrs**	**Lun 19/01/26**	**Lun 13/07/26**
18	Notifications entreprises	0 jr	Lun 19/01/26	Lun 19/01/26
19	Période de préparation	30 jrs	Mar 20/01/26	Lun 02/03/26
20	Préparation du terrain et base vie	10 jrs	Mar 03/02/26	Mar 17/02/26
21				
22	**LOT 03 - DEMOLITIONS - GROS-OEUVRE - VRD**	**45 jrs**	**Mar 17/02/26**	**Lun 20/04/26**
23	Démolition / Purges R+1	10 jrs	Mar 17/02/26	Lun 02/03/26
24	Infrastructure - Assainissement	20 jrs	Mar 03/03/26	Lun 30/03/26
25	Superstructure	15 jrs	Mar 31/03/26	Lun 20/04/26
26	Divers (bouchages/ouvertures)	10 jrs	Mar 07/04/26	Lun 20/04/26
27				
28	**CLOS-COUVERT**	**35 jrs**	**Mar 31/03/26**	**Lun 18/05/26**
29	LOT 05 - CHARPENTE - COUVERTURE - ETANCHEITE	20 jrs	Mar 31/03/26	Lun 27/04/26
30	LOT 12 - METALLERIE - SERRURERIE	20 jrs	Mar 07/04/26	Lun 04/05/26
31	LOT 06 - MENUISERIES EXTERIEURES	10 jrs	Mar 05/05/26	Lun 18/05/26
32				
33	**SECOND OEUVRE**	**40 jrs**	**Mar 19/05/26**	**Lun 13/07/26**
34	LOT 17 - PLATRERIE - DOUBLAGE - CLOISONNEMENT - PLAFONDS	20 jrs	Mar 19/05/26	Lun 15/06/26
35	LOT 14 - MENUISERIES INTERIEURES - PAILLASSES	10 jrs	Mar 09/06/26	Lun 22/06/26
36	LOT15 - REVETEMENTS DE SOLS ET PROTECTIONS MURALES	10 jrs	Mar 16/06/26	Lun 29/06/26
37	LOT 16 - PEINTURES - NETTOYAGE	10 jrs	Mar 23/06/26	Lun 06/07/26
38	LOT 01 - ENVELOPPE SALLES BLANCHES	15 jrs	Mar 16/06/26	Lun 06/07/26
39	LOT 02 - GUICHETS ETANCHES	5 jrs	Mar 07/07/26	Lun 13/07/26
40				
41	**LOTS TECHNIQUES**	**105 jrs**	**Mar 17/02/26**	**Lun 13/07/26**
42	LOT 07 - GENIE CLIMATIQUE	105 jrs	Mar 17/02/26	Lun 13/07/26
43	LOT 08 - PLOMBERIE - SANITAIRES	105 jrs	Mar 17/02/26	Lun 13/07/26
44	LOT 10 - ELECTRICITE	105 jrs	Mar 17/02/26	Lun 13/07/26
45				
46	Essais et mise en service	5 jrs	Mar 14/07/26	Lun 20/07/26
47	OPR	1 jr	Mar 14/07/26	Mar 14/07/26
48	Levée de réserve	5 jrs	Mer 15/07/26	Mar 21/07/26
49	Réception	1 jr	Mer 22/07/26	Mer 22/07/26
50				
51	**TRAVAUX - PHASE 2 - PUI LOCAUX NON STERILES (2)**	60 jrs	Jeu 23/07/26	Mer 04/11/26

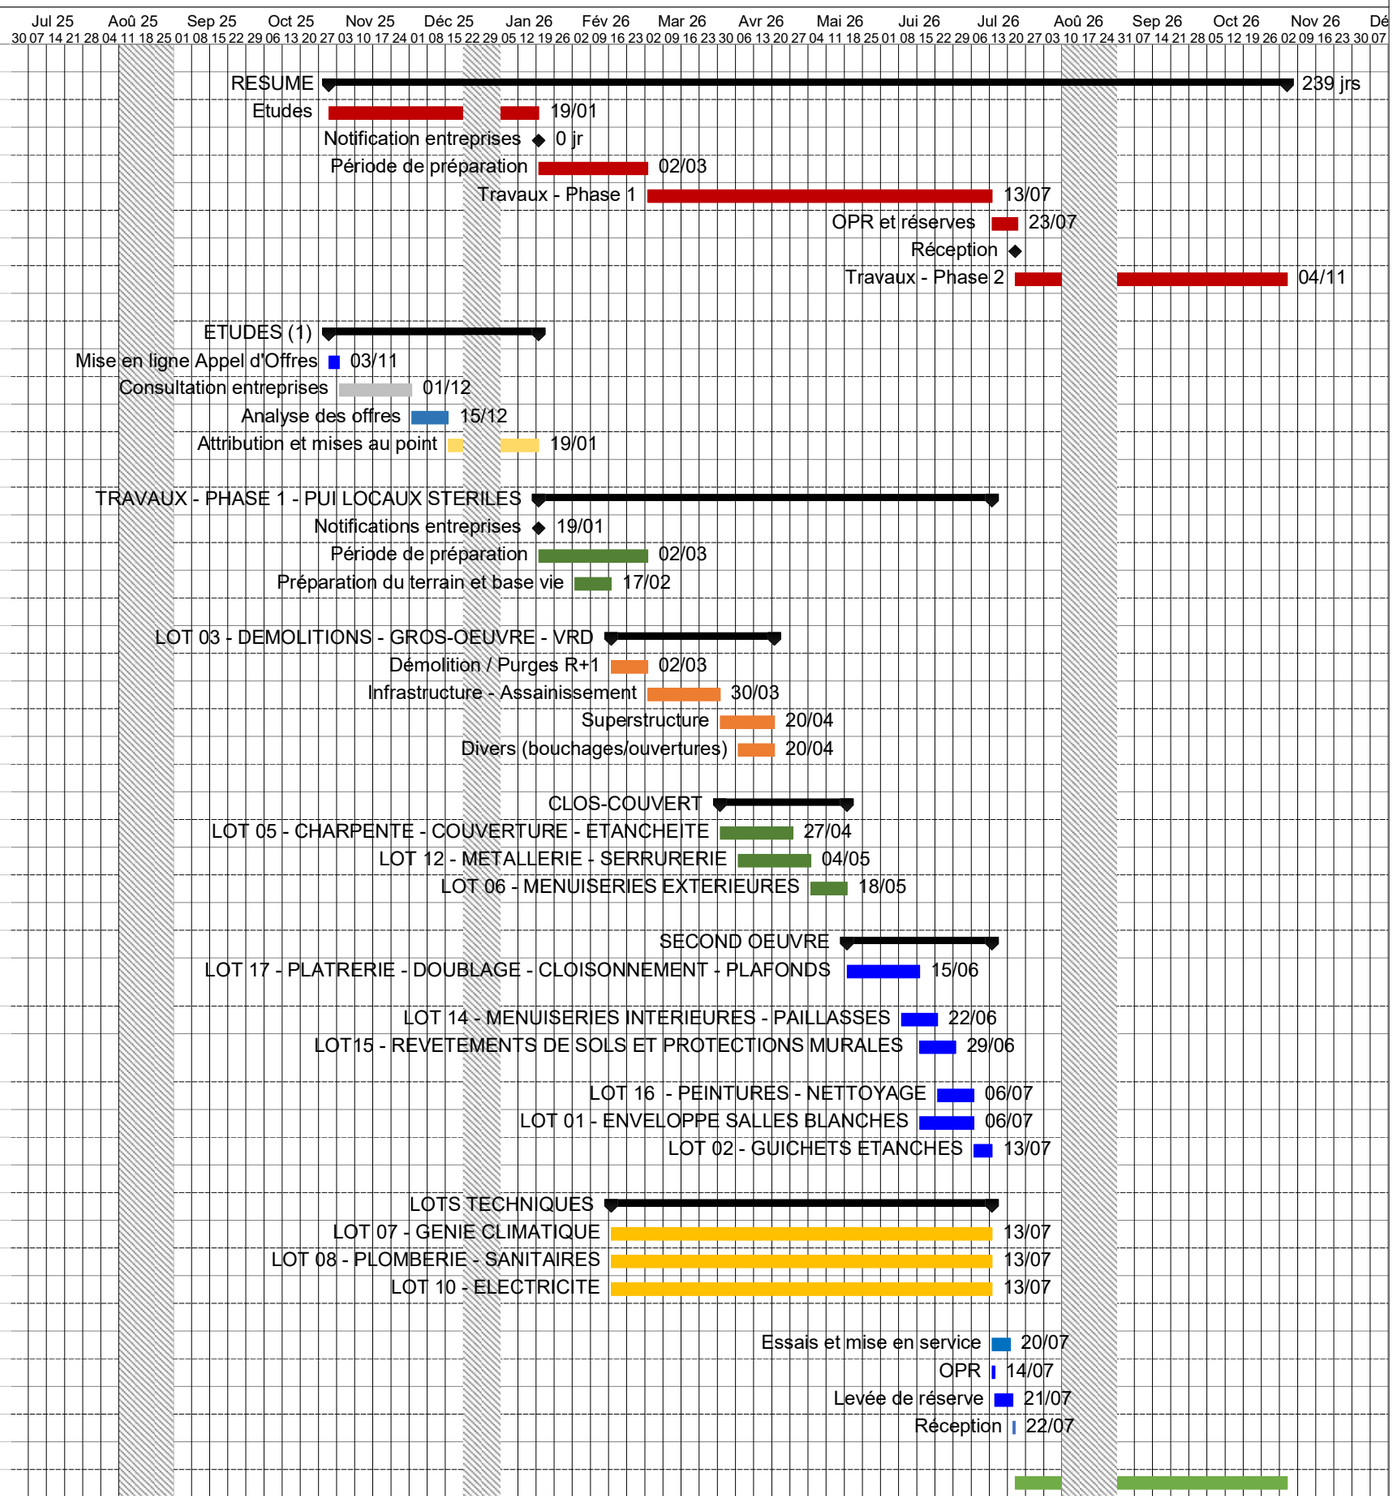

(1) -Les durées des tâches d'études ont été définies en fonction de la date de début des travaux, posée à titre d'hypothèse.
(2) - Hors marché - A la charge du MOA

Ce planning prend en compte les congés d'été, d'hiver 2025 ainsi que ceux de l'été 2026.
