Planning GLOBAL D'OPERATION - CHUM St eloi nouveau bâtiiment de cancero
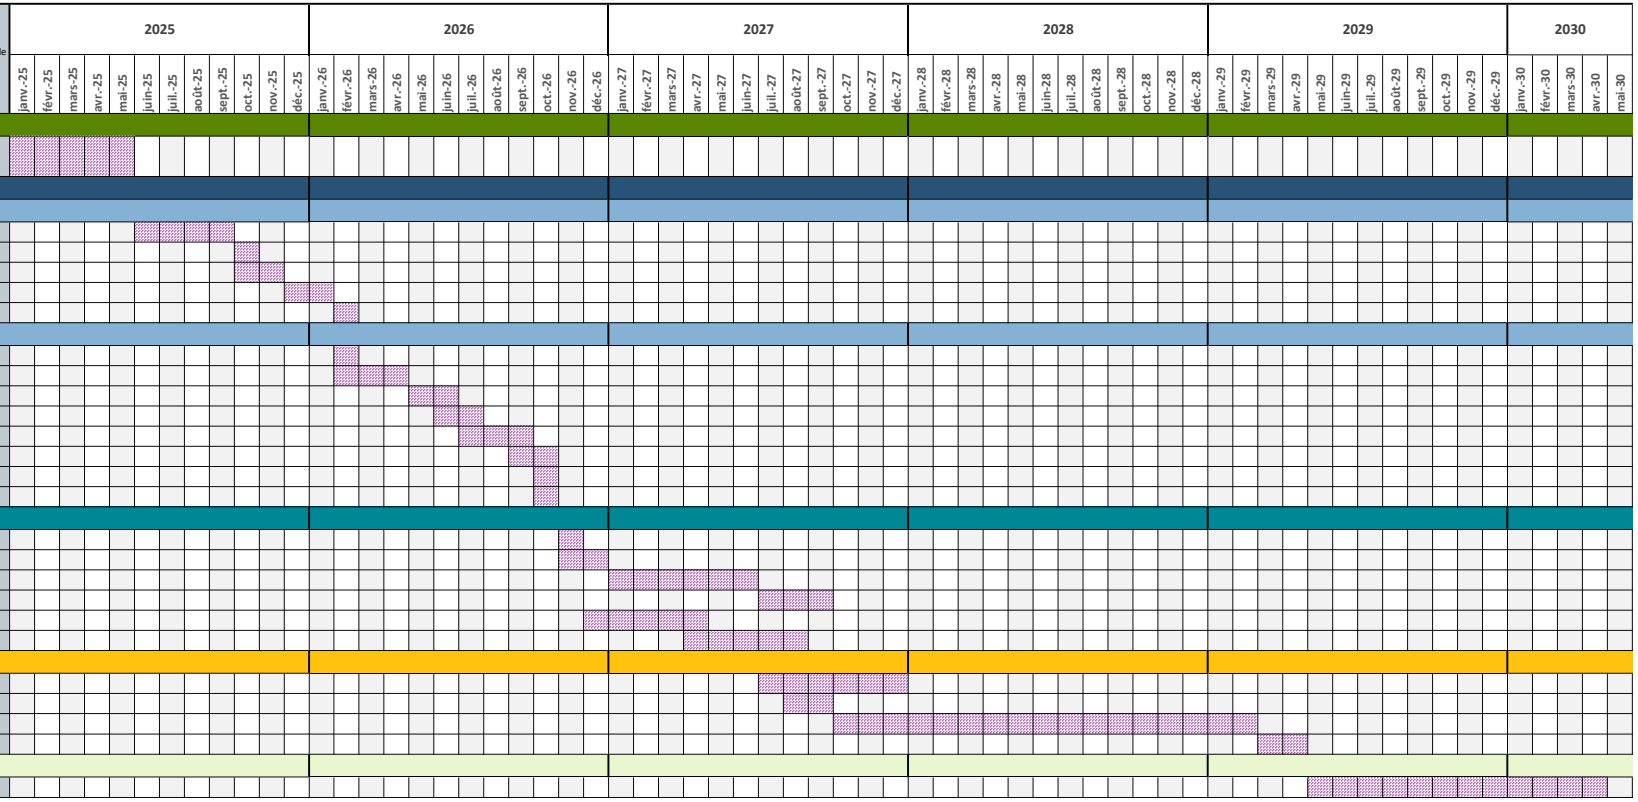
	Début	Nombre de mois
PROGRAMMATION		
Phase de programmation (compris relectures et validations)	janv.-25	5
PASSATION MGS		
Candidatures		
Elaboration du DCE	juin-25	4
Publication DCE Candidatures	sept.-25	
Elaboration des candidatures groupements	sept.-25	2
Analyse des candidatures	nov.-25	2
Jury candidatures	janv.-26	
Offres		
Publication DCE Offres	janv.-26	
Elaboration des offres initiales	janv.-26	3
Analyse des offres initiales	mai-26	2
Auditions et Négociations	mai-26	2
Elaboration des offres finales	juil.-26	3
Analyse des offres finales	août-26	2
Jury offres	sept.-26	
Mise au point marché	sept.-26	1
ETUDES DE CONCEPTION		
APS (consolidation de l'offre) + DIAG (dont validations)	oct.-26	1
AVP1 : Autorisations administratives (dont validations)	oct.-26	2
Instruction PC	déc.-26	6
Recours des tiers	juin-27	3
AVP2 : APD (dont validations)	nov.-26	5
PRO (dont validations)	mars-27	5
TRAVAUX		
EXE (dont analyses et mises au point)	juin-27	6
Travaux préalable - Installations chantiers - constats	juil.-27	2
Travaux - Construction neuve (17 mois de chantier)	sept.-27	17
OPR - levée des réserves	févr.-29	2
GPA		
GPA	avr.-29	12
