PLANNING MEDECINE NUCLEAIRE : PHASE 2b

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	OPR	1 jour	Ven 26/06/26	Ven 26/06/26
2	LEVEE DE RESERVES	1 semaine	Lun 29/06/26	Ven 03/07/26
3	NETTOYAGE 2 : APRES RECEPTION - Lot peinture	1 semaine	Lun 06/07/26	Ven 10/07/26
4	**LOT 02 - DÉSAMIANTAGE - DÉPLOMBAGE**	**15 jours**	**Lun 26/01/26**	**Ven 13/02/26**
5	Désamiantage	3 semaines	Lun 26/01/26	Ven 13/02/26
6	**LOT 01 - GROS OEUVRE - DEMOLITION - FLOCAGE**	**58 jours**	**Lun 16/02/26**	**Mer 06/05/26**
7	Travaux de curage - purge	1 semaine	Lun 16/02/26	Ven 20/02/26
8	Renforts structurels	1 semaine	Lun 23/02/26	Ven 27/02/26
9	Travaux de dépose des menuiseries extérieures + bouchement des ouvertures	2 semaines	Lun 02/03/26	Ven 13/03/26
10	Réalisation du Flocage	2 jours	Lun 16/03/26	Mar 17/03/26
11	Elévations pour chassis fixes de la coursive	1 semaine	Lun 16/03/26	Ven 20/03/26
12	Rehausse pour socle ventilation extérieure	1 semaine	Lun 16/03/26	Ven 20/03/26
13	Création d'ouverture par sciage	2 jours	Lun 23/03/26	Mar 24/03/26
14	Percements des planchers B.A et renforcements structurels par chevêtres métalliques - Création de gaines béton	3 jours	Mer 25/03/26	Ven 27/03/26
15	Campagne de calfeutrementattente au sol	2 jours	Lun 30/03/26	Mar 31/03/26
16	Obturation des anciennes réservations en élévation béton ou maçonné	3 jours	Lun 30/03/26	Mer 01/04/26
17	Création de fondation SS2 + Séchage	10 jours	Jeu 02/04/26	Mer 15/04/26
18	Travaux de renforcement des ossatures existantes	1 semaine	Jeu 16/04/26	Mer 22/04/26
19	Création d'un poteau + séchage pour ajout de charge	10 jours	Jeu 23/04/26	Mer 06/05/26
20	**LOT 03 - CHARPENTE - OSSATURE METALLIQUE - BARDAGE**	**25 jours**	**Lun 23/03/26**	**Ven 24/04/26**
21	Travaux de charpente et ossature métalliques	1 semaine	Lun 23/03/26	Ven 27/03/26
22	Travaux de couverture	1 semaine	Lun 30/03/26	Ven 03/04/26
23	Travaux de bardage	1 semaine	Lun 20/04/26	Ven 24/04/26
24	**LOT 04 - ETANCHEITE**	**40 jours**	**Lun 16/02/26**	**Ven 10/04/26**
25	Purge du complexe d'étanchéité	1 semaine	Lun 16/02/26	Ven 20/02/26
26	Pose d'un nouveau complexe d'étanchéité	1 semaine	Lun 06/04/26	Ven 10/04/26
27	**LOT 05 - MENUISERIES EXTERIEURES**	**5 jours**	**Lun 13/04/26**	**Ven 17/04/26**
28	Chassis vitrés - Vantail soufflet	1 semaine	Lun 13/04/26	Ven 17/04/26
29	Ensembles menuisés	2 jours	Lun 13/04/26	Mar 14/04/26
30	**LOT 06 - PLATRERIE - FAUX PLAFONDS - PANNEAUX INDUSTRIELS**	**95 jours**	**Lun 16/02/26**	**Ven 26/06/26**
31	**PRESTATIONS DE PLATRERIE**	**70 jours**	**Lun 16/02/26**	**Ven 22/05/26**
32	Cloisons provisoires - Cantonnement de phase	2 jours	Lun 16/02/26	Mar 17/02/26
33	Doublages parois existantes	1 semaine	Lun 20/04/26	Ven 24/04/26
34	Cloisons courantes séparatives + Renforts	1 semaine	Lun 27/04/26	Ven 01/05/26
35	Retombées - soffites - jouées en plâtre	1 semaine	Lun 04/05/26	Ven 08/05/26
36	Gaines techniques et coffres	1 semaine	Lun 04/05/26	Ven 08/05/26
37	Prestations complémentaires	2 semaines	Lun 11/05/26	Ven 22/05/26
38	**PRESTATIONS DE FAUX PLAFONDS**	**20 jours**	**Lun 01/06/26**	**Ven 26/06/26**
39	Faux plafond mixte	1 semaine	Lun 01/06/26	Ven 05/06/26
40	Plafonds suspendus dalles	1 semaine	Lun 08/06/26	Ven 12/06/26
41	Blanchiement des faux-plafonds	1 semaine	Lun 15/06/26	Ven 19/06/26
42	Plafond plombés Box TEP	1 semaine	Lun 22/06/26	Ven 26/06/26
43	**LOT 07 - MENUISERIES INTERIEURES**	**35 jours**	**Lun 04/05/26**	**Ven 19/06/26**
44	Révision de porte existante	1 semaine	Lun 04/05/26	Ven 08/05/26
45	Bloc porte intérieur courant	2 jours	Lun 04/05/26	Mar 05/05/26
46	Porte à galandage	3 jours	Lun 04/05/26	Mer 06/05/26
47	Porte de gaine technique	2 jours	Jeu 07/05/26	Ven 08/05/26
48	Chassis vitrés	3 jours	Lun 11/05/26	Mer 13/05/26
49	Placard	1 jour	Lun 15/06/26	Lun 15/06/26
50	Protections murales + Mains courantes	2 jours	Mar 16/06/26	Mer 17/06/26
51	Agencement	2 jours	Jeu 18/06/26	Ven 19/06/26
52	Prestations complémentaires	30 jours	Jeu 07/05/26	Mer 17/06/26
53	**LOT 08 - PORTES AUTOMATIQUES**	**3 jours**	**Lun 22/06/26**	**Mar 24/06/26**
54	Blocs portes coulissants	3 jours	Lun 22/06/26	Mar 24/06/26
55	**LOT 09 - PEINTURE**	**39 jours**	**Lun 04/05/26**	**Jeu 25/06/26**
56	Préparation des supports neufs et existants	2 semaines	Lun 04/05/26	Ven 15/05/26
57	Peinture	2 semaines	Lun 18/05/26	Ven 29/05/26
58	Peinture sur différents supports	1 semaine	Lun 01/06/26	Ven 05/06/26
59	Accessoires	1 semaine	Lun 01/06/26	Ven 05/06/26
60	Retouches peintures	3 jours	Lun 22/06/26	Mer 24/06/26
61	Nettoyage 1 : Avant OPR	1 jour	Jeu 25/06/26	Jeu 25/06/26
62	**LOT 10 - SOL PVC - MURS PVC**	**35 jours**	**Lun 04/05/26**	**Ven 19/06/26**
63	Préparation des supports	2 jours	Lun 04/05/26	Mar 05/05/26
64	Revêtement de sol PVC	2 semaines	Lun 01/06/26	Ven 12/06/26
65	Protection murale PVC - Ht 1,40m	1 semaine	Lun 15/06/26	Ven 19/06/26
66	Prestations complémentaires	14,86 jours	Lun 01/06/26	Ven 19/06/26
67	**LOT 11 - ELECTRICITE - SSI**	**95 jours**	**Lun 16/02/26**	**Ven 26/06/26**
68	Neutralisation des réseaux	1 jour	Lun 16/02/26	Lun 16/02/26
69	Implantation - Passage des réseaux	30 jours	Lun 20/04/26	Ven 29/05/26
70	Appareillage - Mise en service	1 semaine	Lun 22/06/26	Ven 26/06/26
71	**LOT 12 - CVC - PLOMBERIE**	**95 jours**	**Lun 16/02/26**	**Ven 26/06/26**
72	Neutralisation des réseaux	1 jour	Lun 16/02/26	Lun 16/02/26
73	Modification / surélévation gaines pour la purge étanchéité	5 jours	Lun 30/03/26	Ven 03/04/26
74	Implantation - Passage des réseaux	30 jours	Lun 20/04/26	Ven 29/05/26
75	Appareillage - Mise en service	1 semaine	Lun 22/06/26	Ven 26/06/26
76	**LOT 13 - FLUIDES MEDICAUX**	**50 jours**	**Lun 20/04/26**	**Ven 26/06/26**
77	Implantation - Passage des réseaux	30 jours	Lun 20/04/26	Ven 29/05/26
78	Appareillage - Mise en service	1 semaine	Lun 22/06/26	Ven 26/06/26
79	OPR	1 jour?	Ven 26/06/26	Ven 26/06/26
80	LEVEE DE RESERVES	1 semaine	Lun 29/06/26	Ven 03/07/26
81	NETTOYAGE 2 : APRES RECEPTION - Lot peinture	1 semaine	Lun 06/07/26	Ven 10/07/26

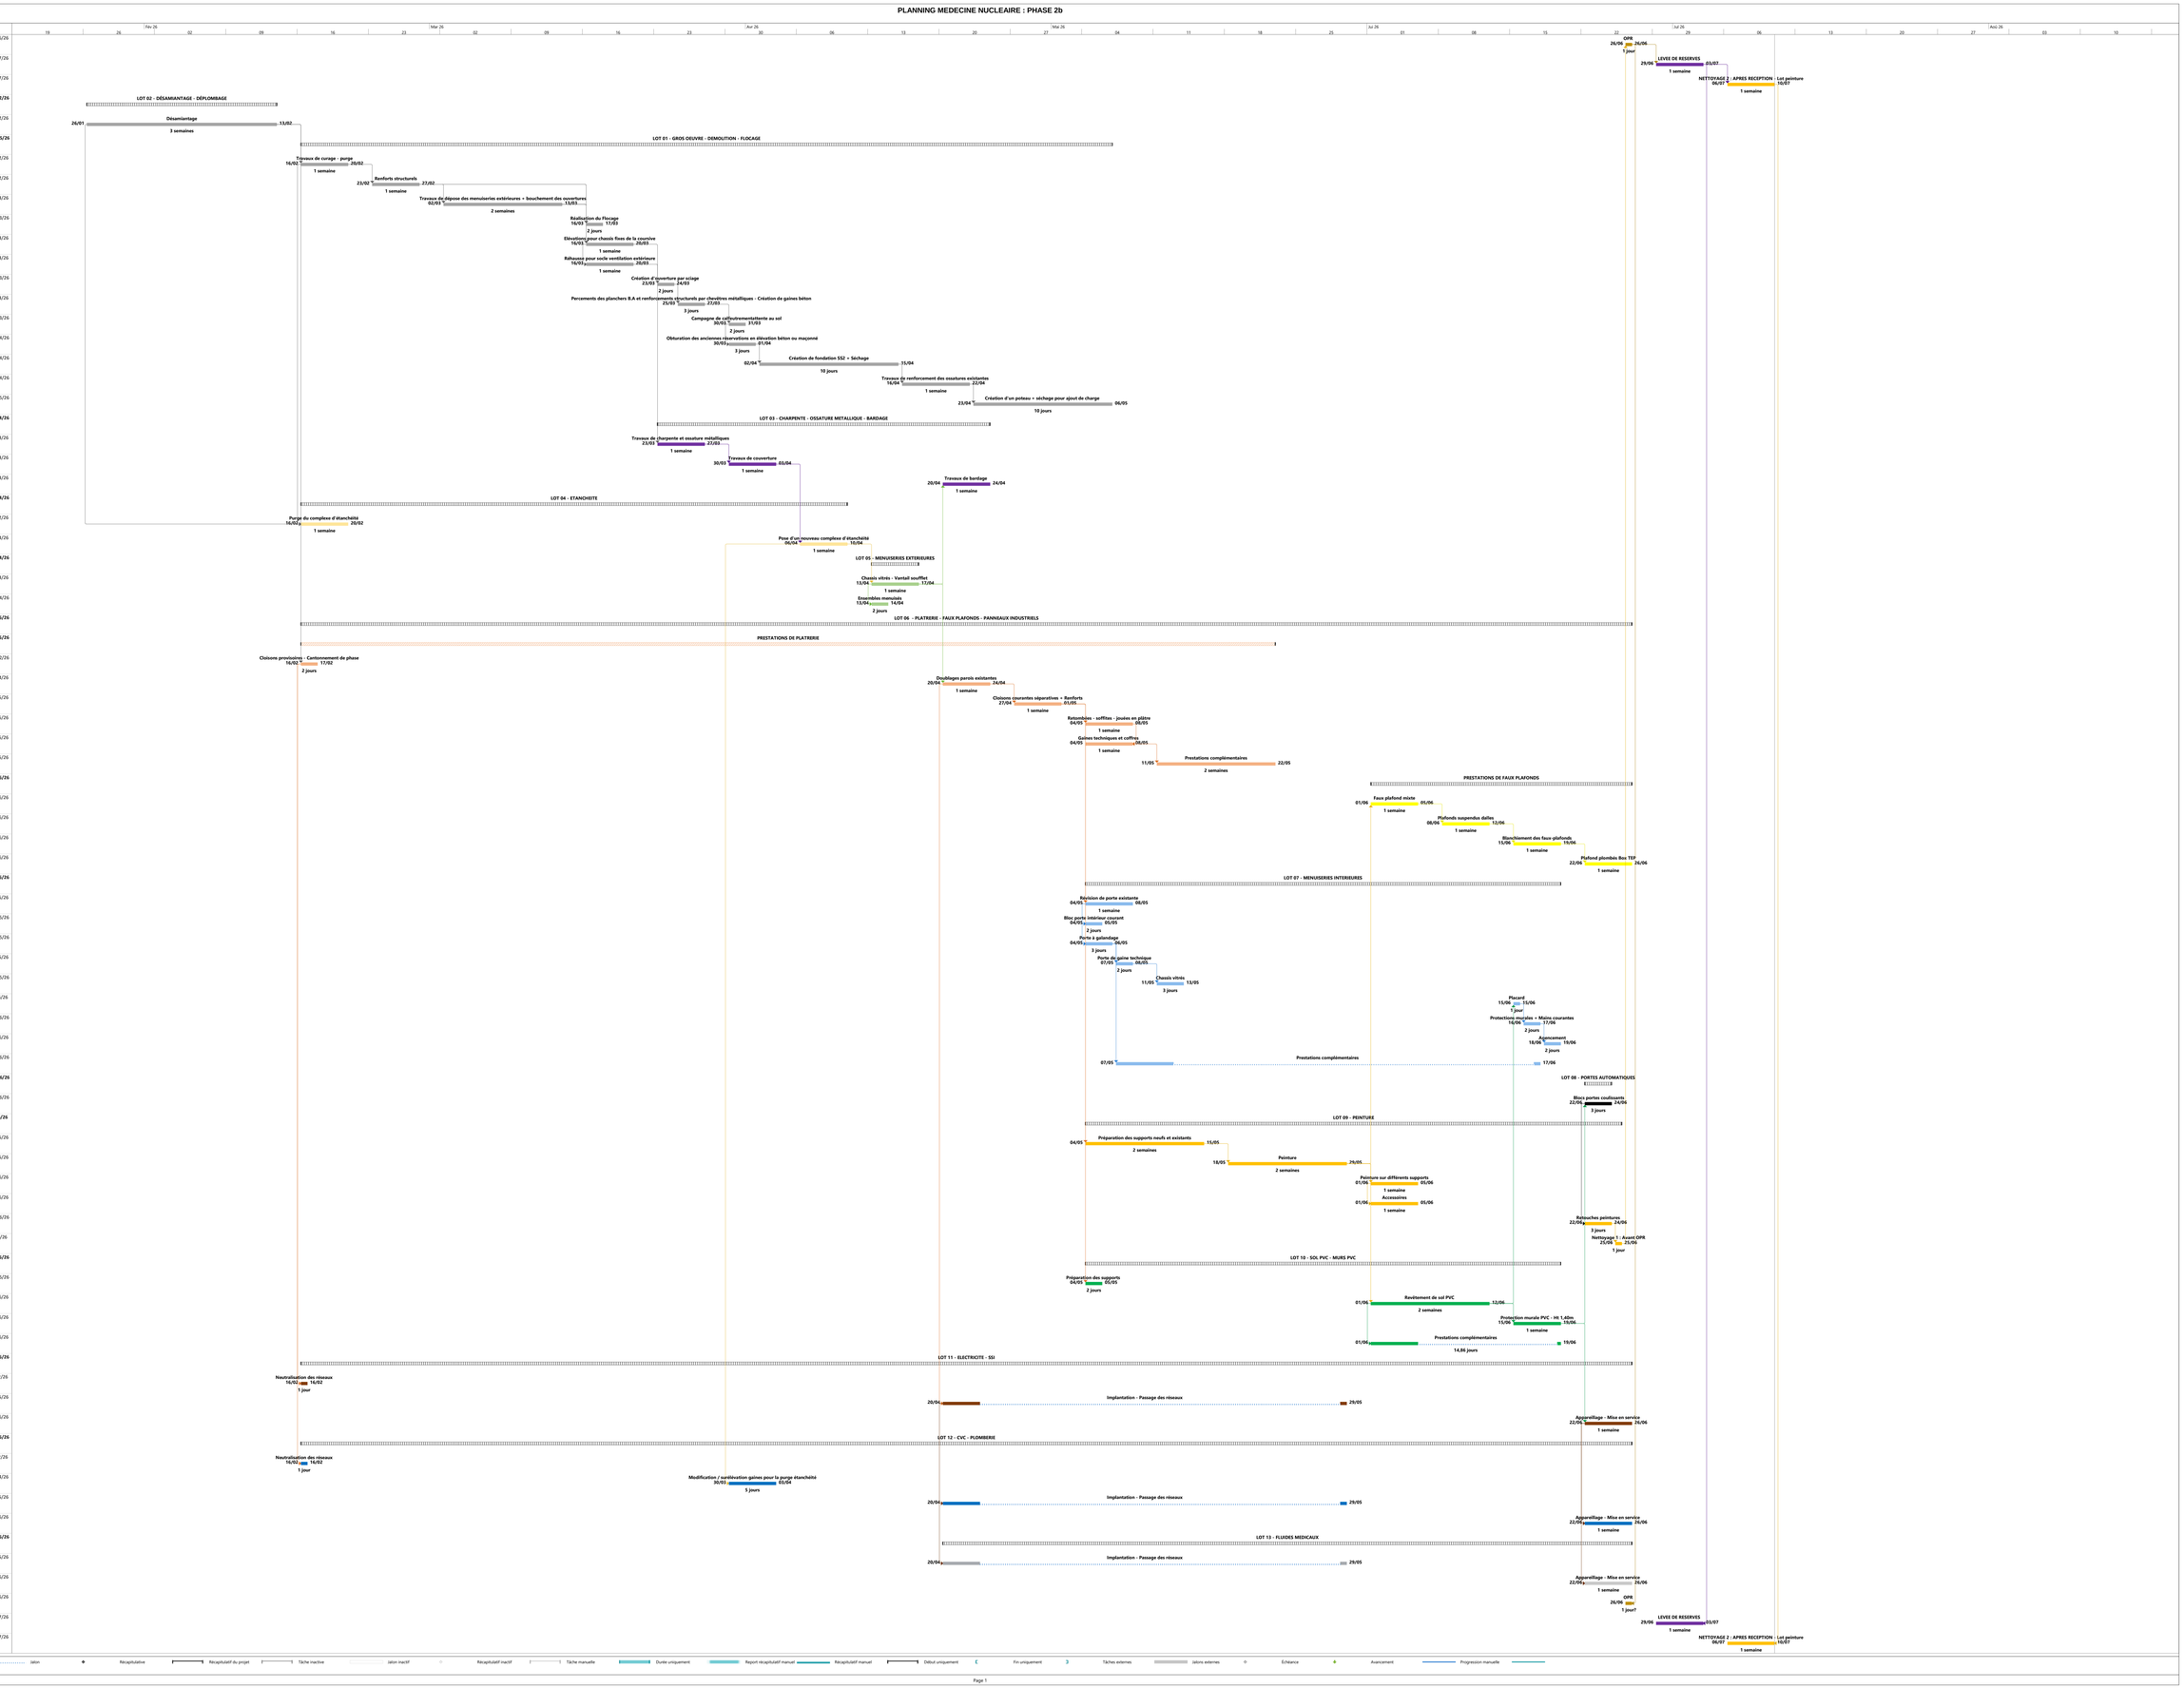

Projet : 2024-07-01 - PHASE 2
Date : Ven 13/06/25

Tâche · Fractionnement · Jalon · Récapitulative · Récapitulatif du projet · Tâche inactive · Jalon inactif · Récapitulatif inactif · Tâche manuelle · Durée uniquement · Report récapitulatif manuel · Récapitulatif manuel · Début uniquement · Fin uniquement · Tâches externes · Jalons externes · Échéance · Avancement · Progression manuelle
