PLANNING MEDECINE NUCLEAIRE : PHASE 3

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	OPR	1 jour	Ven 09/10/26	Ven 09/10/26
2	LEVEE DE RESERVES	1 semaine	Lun 12/10/26	Ven 16/10/26
3	NETTOYAGE 2 : APRES RECEPTION - Lot peinture	1 semaine	Lun 19/10/26	Ven 23/10/26
4	**LOT 02 - DESAMIANTAGE - DEPLOMBAGE**	**15 jours**	**Lun 06/07/26**	**Ven 24/07/26**
5	Désamiantage	3 semaines	Lun 06/07/26	Ven 24/07/26
6	**LOT 01 - GROS OEUVRE - DEMOLITION - FLOCAGE**	**15 jours**	**Lun 27/07/26**	**Ven 14/08/26**
7	Travaux de curage - purge	1 semaine	Lun 27/07/26	Ven 31/07/26
8	Création d'ouverture par sciage	2 jours	Lun 03/08/26	Mar 04/08/26
9	Percements des planchers B.A et renforcements structurels par chevêtres métalliques	1 semaine	Mer 05/08/26	Mar 11/08/26
10	Réalisation du Flocage	2 jours	Lun 10/08/26	Mar 11/08/26
11	Campagne de calfeutrementattente au sol	3 jours	Mer 12/08/26	Ven 14/08/26
12	Obturation des anciennes réservations en élévation béton ou maçonné	2 jours	Jeu 13/08/26	Ven 14/08/26
13	**LOT 06 - PLATRERIE - FAUX PLAFONDS - PANNEAUX INDUSTRIELS**	**51 jours**	**Lun 27/07/26**	**Lun 05/10/26**
14	**PRESTATIONS DE PLATRERIE**	**30 jours**	**Lun 27/07/26**	**Ven 04/09/26**
15	Accès chantier + Cloisons provisoires - Cantonnement de phase	2 jours	Lun 27/07/26	Mar 28/07/26
16	Doublages parois existantes	3 jours	Lun 17/08/26	Mer 19/08/26
17	Cloisons courantes séparatives + Renforts	1 semaine	Jeu 20/08/26	Mer 26/08/26
18	Gaines techniques et coffres	2 jours	Jeu 27/08/26	Ven 28/08/26
19	Retombées - soffites - jouées en plâtre	2 jours	Jeu 27/08/26	Ven 28/08/26
20	Prestations complémentaires	1 semaine	Lun 31/08/26	Ven 04/09/26
21	**PRESTATIONS DE FAUX PLAFONDS**	**26 jours**	**Lun 31/08/26**	**Lun 05/10/26**
22	Plafonds plâtre	2 jours	Lun 31/08/26	Mar 01/09/26
23	Faux plafond mixte	1 jour	Lun 21/09/26	Lun 21/09/26
24	Plafonds suspendus dalles	1 semaine	Mar 22/09/26	Lun 28/09/26
25	Blanchiement des faux-plafonds	1 semaine	Mar 29/09/26	Lun 05/10/26
26	**LOT 07 - MENUISERIES INTERIEURES**	**25 jours**	**Jeu 27/08/26**	**Mer 30/09/26**
27	Révision de porte existante	1 semaine	Jeu 27/08/26	Mer 02/09/26
28	Bloc porte intérieur courant	2 jours	Jeu 27/08/26	Ven 28/08/26
29	Porte à galandage	3 jours	Jeu 27/08/26	Lun 31/08/26
30	Porte de gaine technique	2 jours	Lun 31/08/26	Mar 01/09/26
31	Chassis vitrés	3 jours	Mer 02/09/26	Ven 04/09/26
32	Placard	1 jour	Lun 28/09/26	Lun 28/09/26
33	Agencement	2 jours	Mar 29/09/26	Mer 30/09/26
34	Protections murales + Mains courantes	2 jours	Mar 29/09/26	Mer 30/09/26
35	Prestations complémentaires	22 jours	Mar 01/09/26	Mer 30/09/26
36	**LOT 08 - PORTES AUTOMATIQUES**	**5 jours**	**Jeu 01/10/26**	**Mer 07/10/26**
37	Blocs portes coulissants	1 semaine	Jeu 01/10/26	Mer 07/10/26
38	**LOT 09 - PEINTURE**	**24 jours**	**Lun 07/09/26**	**Jeu 08/10/26**
39	Préparation des supports neufs et existants	1 semaine	Lun 07/09/26	Ven 11/09/26
40	Peinture	1 semaine	Lun 14/09/26	Ven 18/09/26
41	Peinture sur différents supports	1 semaine	Lun 21/09/26	Ven 25/09/26
42	Accessoires	1 semaine	Lun 21/09/26	Ven 25/09/26
43	Retouches peintures	3 jours	Lun 05/10/26	Mer 07/10/26
44	Nettoyage 1 : Avant OPR	1 jour	Jeu 08/10/26	Jeu 08/10/26
45	**LOT 10 - SOL PVC - MURS PVC**	**27 jours**	**Jeu 27/08/26**	**Ven 02/10/26**
46	Préparation des supports	2 jours	Jeu 27/08/26	Ven 28/08/26
47	Revêtement de sol PVC	1 semaine	Lun 21/09/26	Ven 25/09/26
48	Revêtement PVC - Concept douche	1 semaine	Lun 28/09/26	Ven 02/10/26
49	Protection murale PVC - Ht 1,40m	1 semaine	Lun 28/09/26	Ven 02/10/26
50	Prestations complémentaires	9,86 jours	Lun 21/09/26	Ven 02/10/26
51	**LOT 11 - ELECTRICITE - SSI**	**55 jours**	**Lun 27/07/26**	**Ven 09/10/26**
52	Neutralisation des réseaux	1 jour	Lun 27/07/26	Lun 27/07/26
53	Implantation - Passage des réseaux	10 jours	Lun 17/08/26	Ven 28/08/26
54	Appareillage - Mise en service	1 semaine	Lun 05/10/26	Ven 09/10/26
55	**LOT 12 - CVC - PLOMBERIE**	**55 jours**	**Lun 27/07/26**	**Ven 09/10/26**
56	Neutralisation des réseaux	1 jour	Lun 27/07/26	Lun 27/07/26
57	Implantation - Passage des réseaux	10 jours	Lun 17/08/26	Ven 28/08/26
58	Appareillage - Mise en service	1 semaine	Lun 05/10/26	Ven 09/10/26
59	**LOT 13 - FLUIDES MEDICAUX**	**40 jours**	**Lun 17/08/26**	**Ven 09/10/26**
60	Implantation - Passage des réseaux	10 jours	Lun 17/08/26	Ven 28/08/26
61	Appareillage - Mise en service	1 semaine	Lun 05/10/26	Ven 09/10/26
62	OPR	1 jour?	Ven 09/10/26	Ven 09/10/26
63	LEVEE DE RESERVES	1 semaine	Lun 12/10/26	Ven 16/10/26
64	NETTOYAGE 2 : APRES RECEPTION - Lot peinture	1 semaine	Lun 19/10/26	Ven 23/10/26

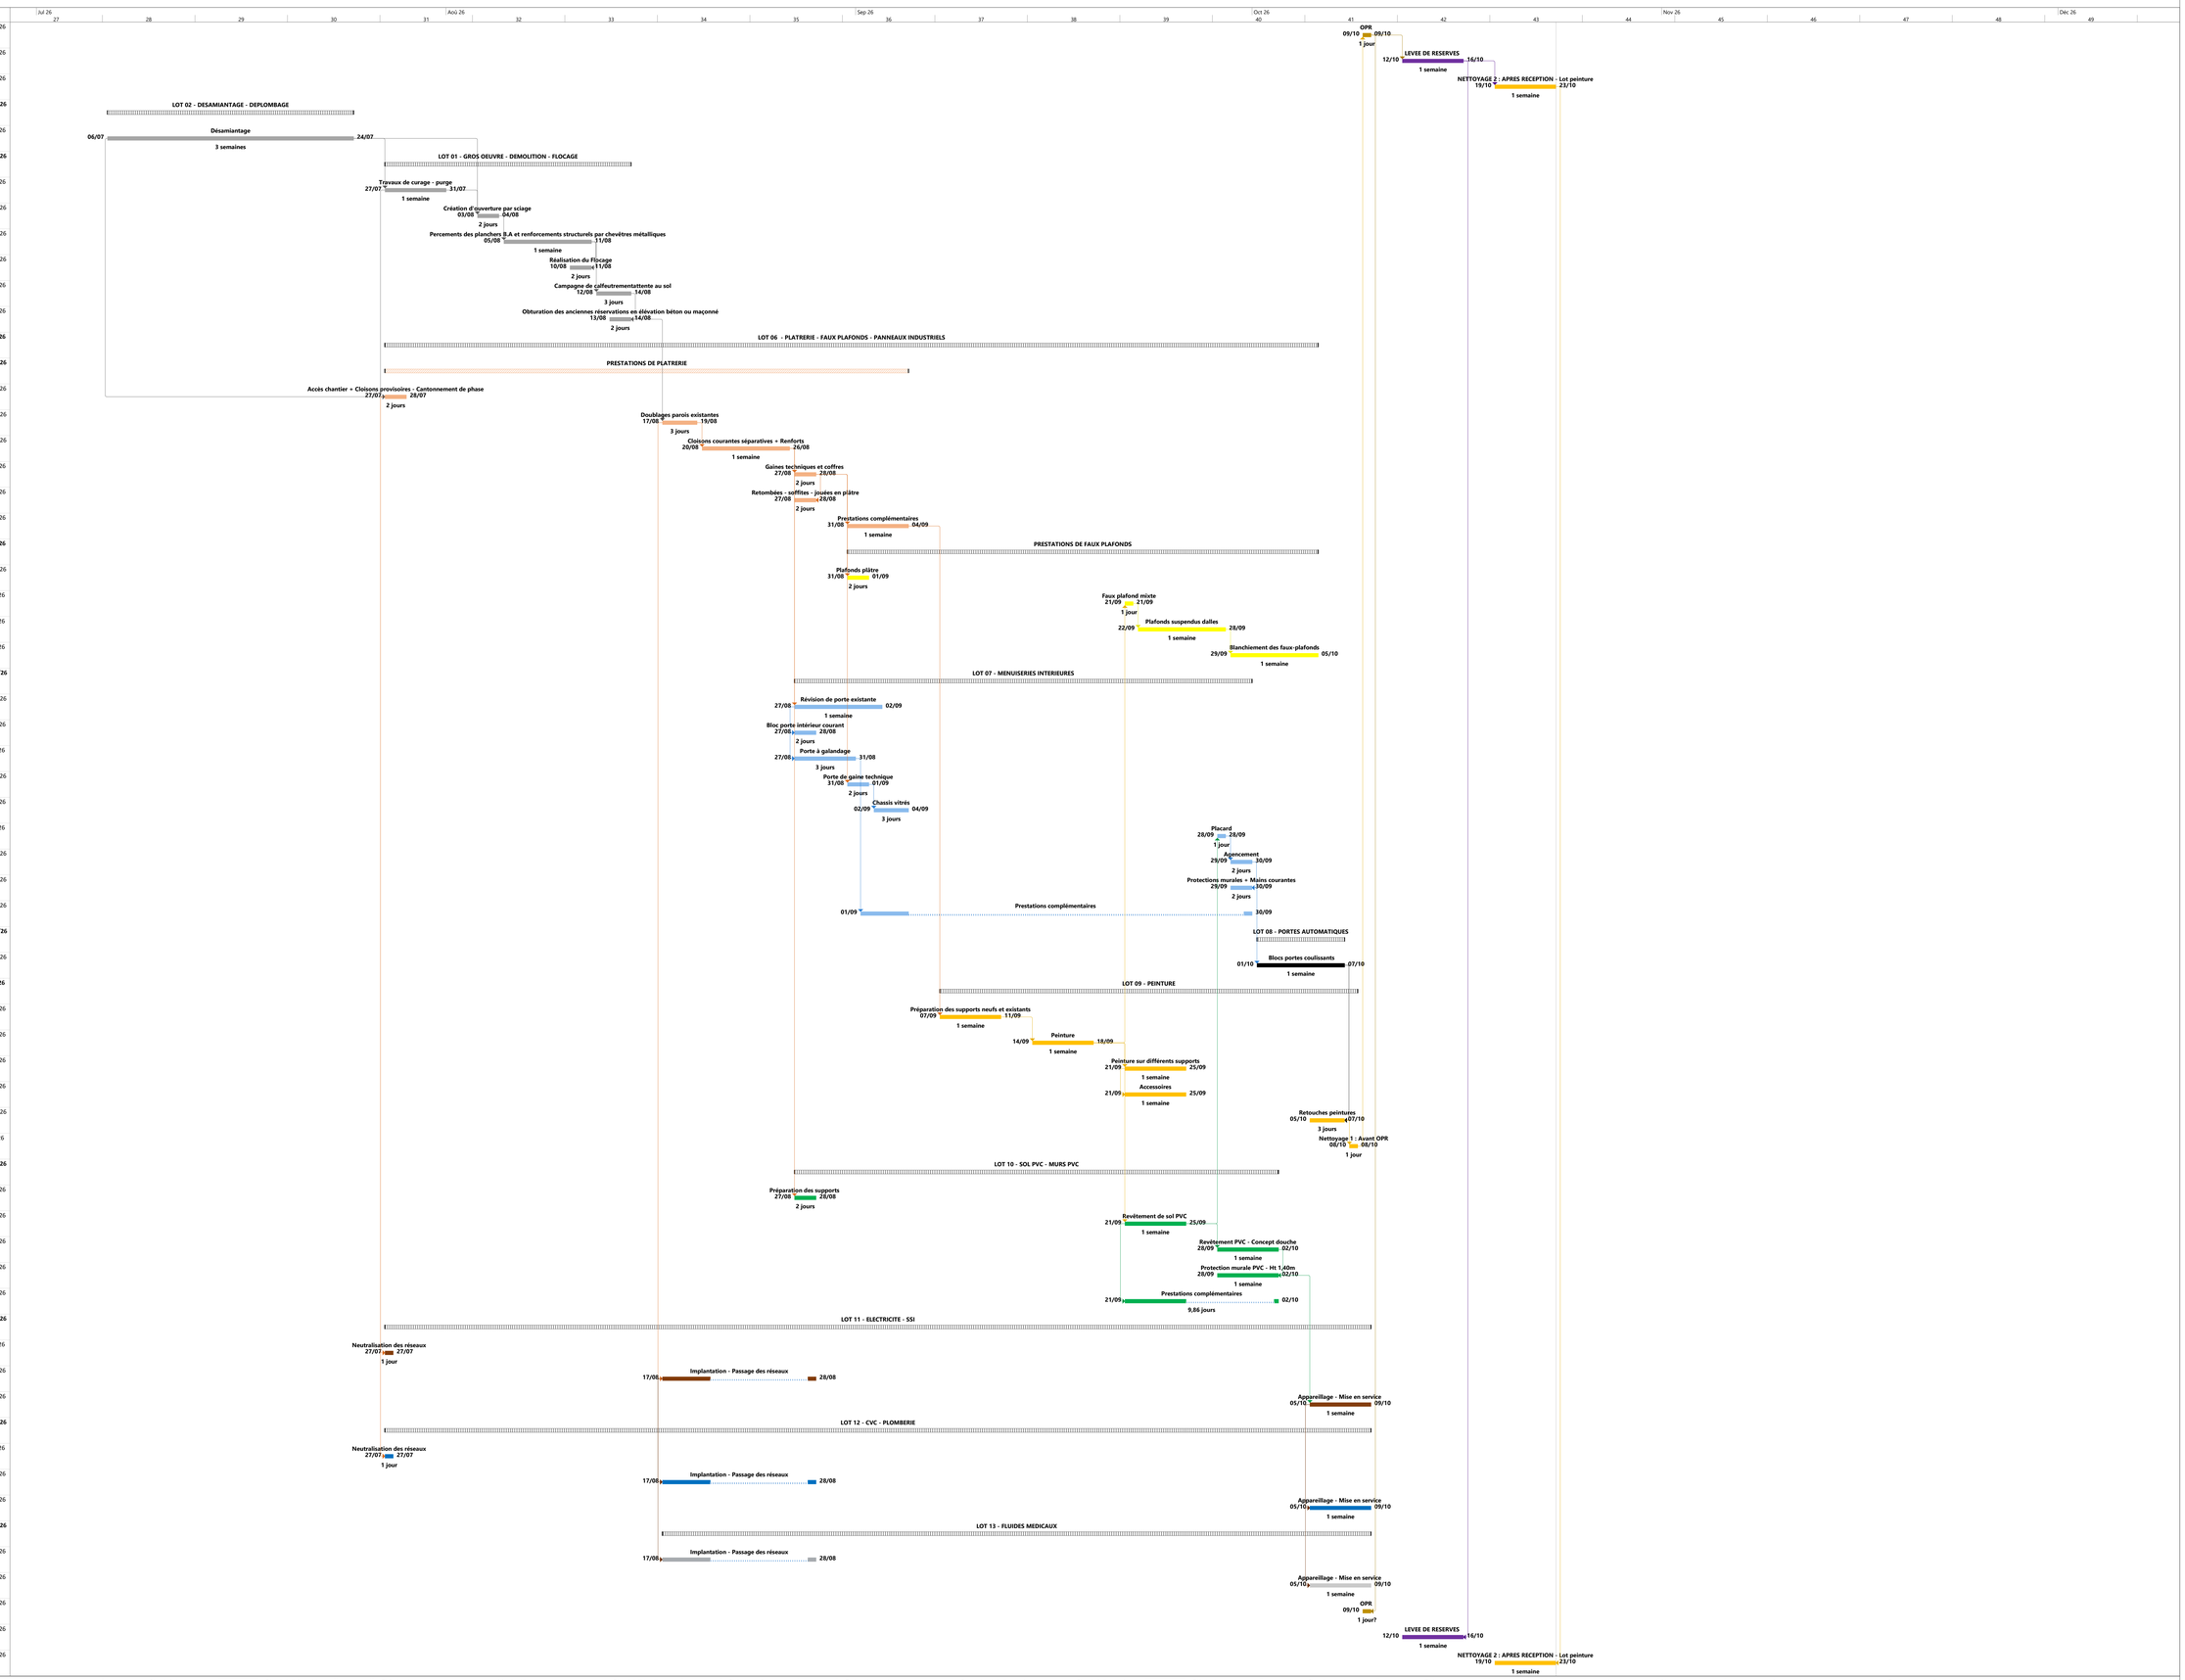

Projet : 2024-07-01 - PHASE 2
Date : Ven 13/06/25

Tâche | Fractionnement | Jalon | Récapitulative | Récapitulatif du projet | Tâche inactive | Jalon inactif | Récapitulatif inactif | Tâche manuelle | Durée uniquement | Report récapitulatif manuel | Récapitulatif manuel | Début uniquement | Fin uniquement | Tâches externes | Jalons externes | Échéance | Avancement | Progression manuelle
