CCI AVON
TRAVAUX DE REDUCTION DES CONSOMMATIONS D'ENERGIE DANS LE CADRE DE L'OBJECTIF 2030
DU DECRET TERTIAIRE POUR LES BATIMENTS DU SITE D'AVON DE LA CCI SEINE-ET-MARNE

Planning prévisionnel

Phase PRO - Ind A
26/09/2025
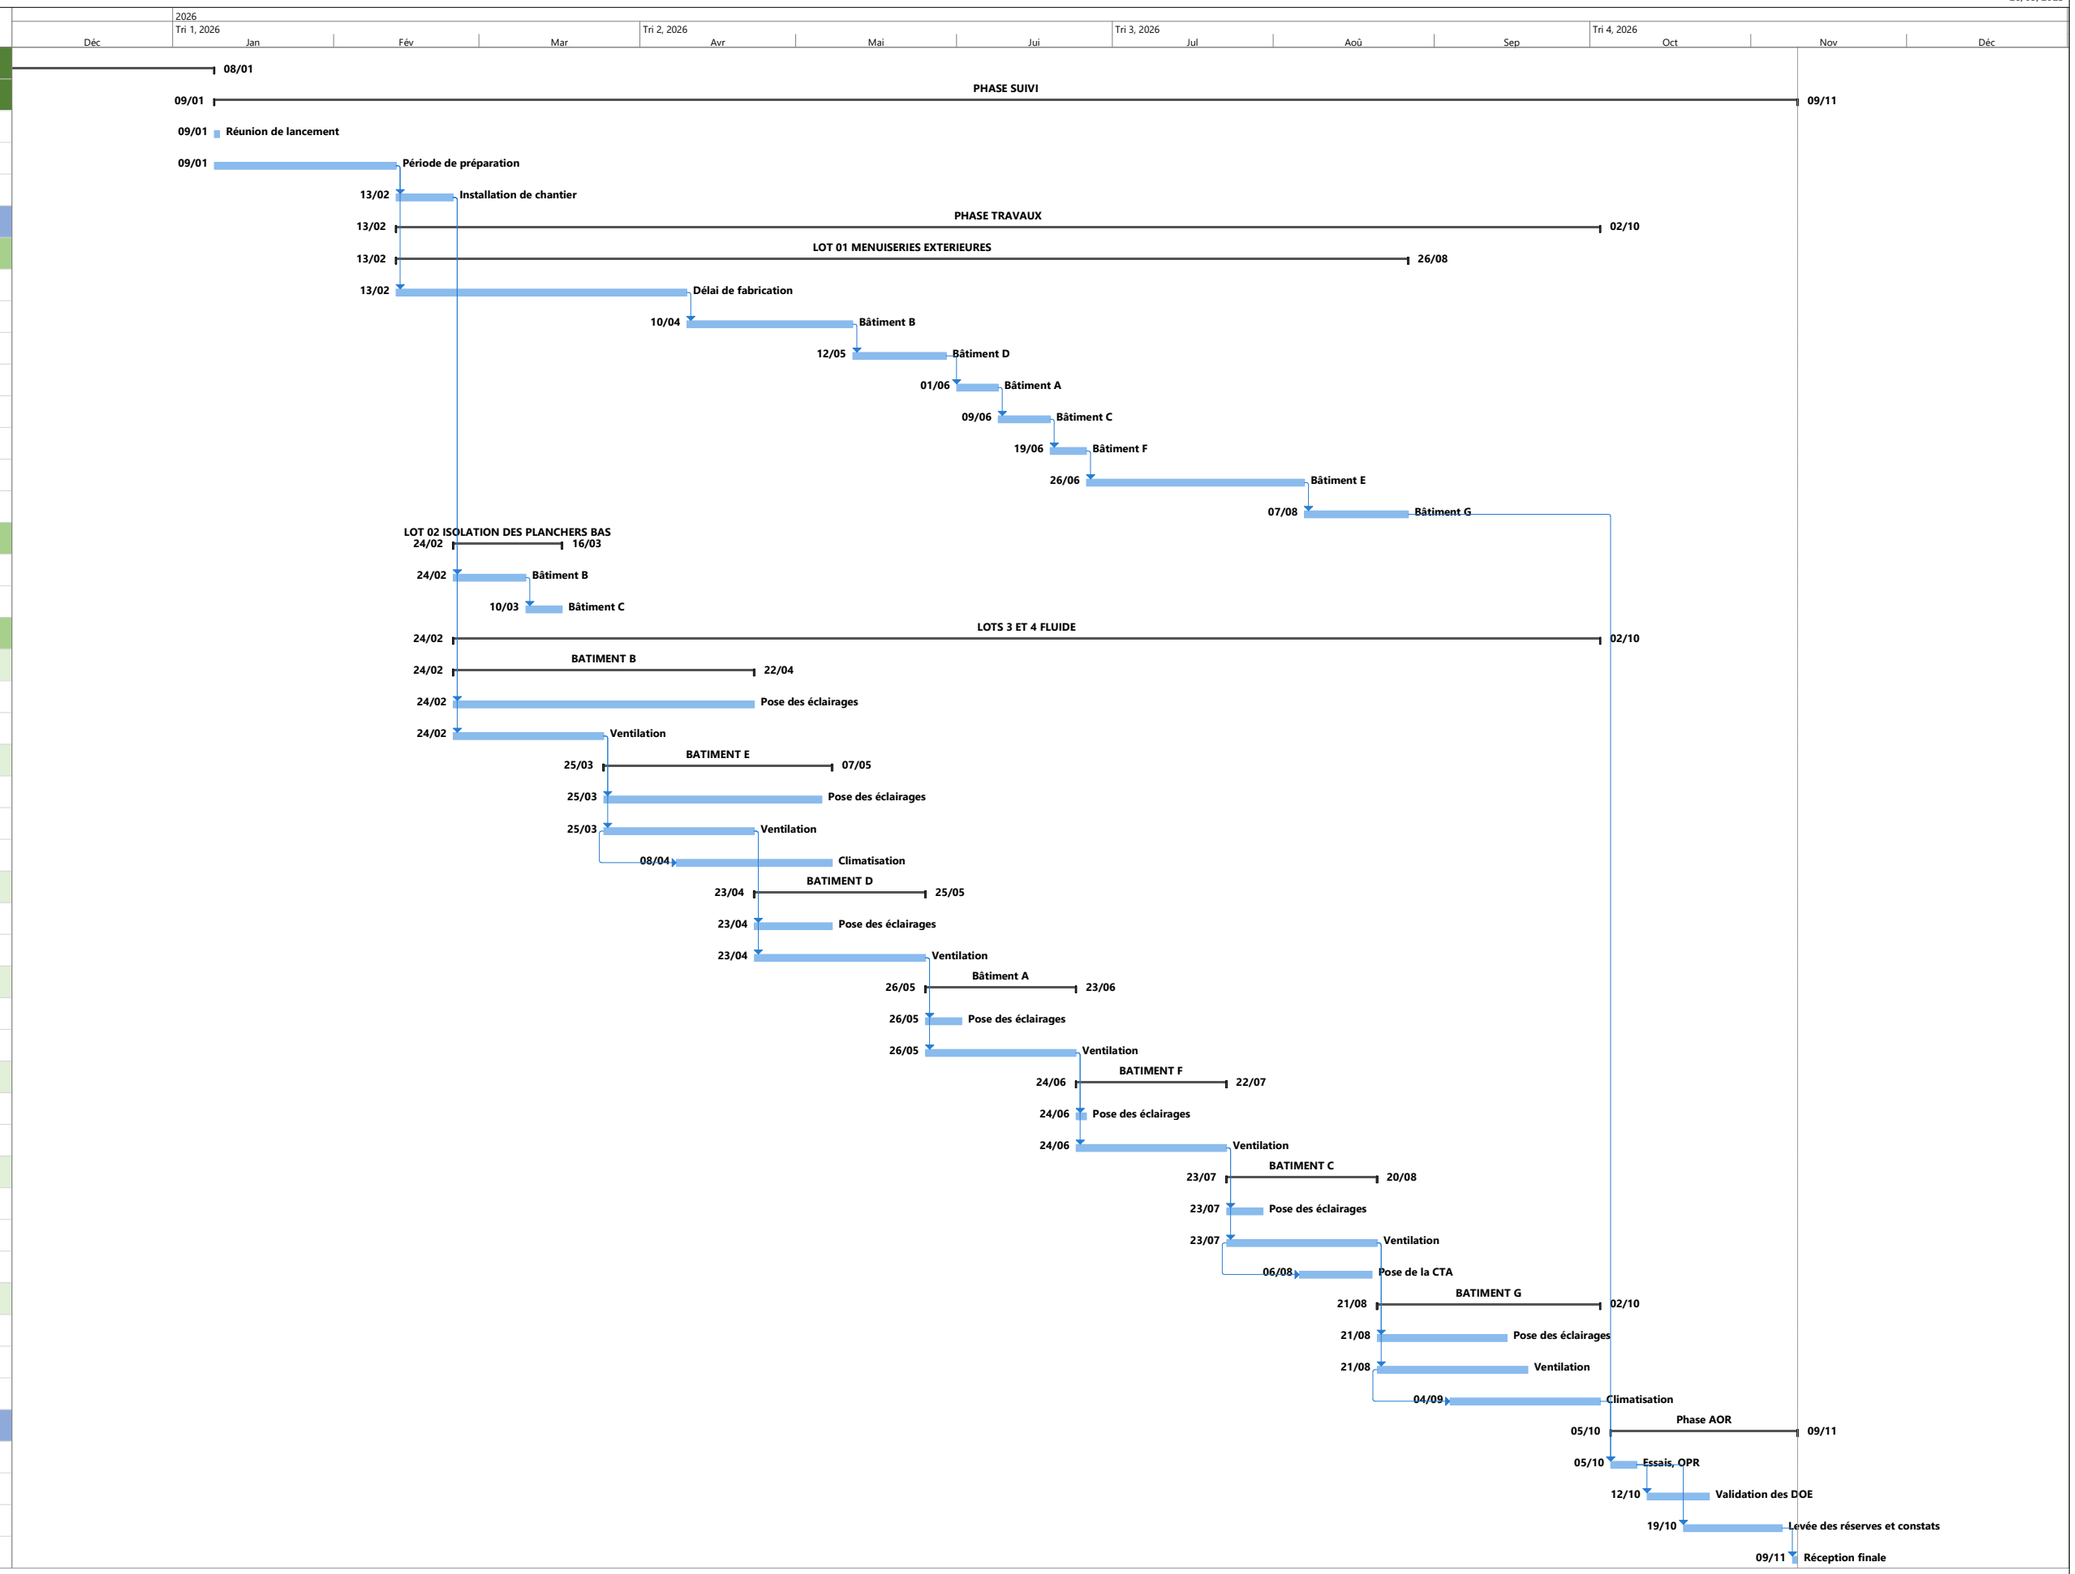
N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1		**PHASE ETUDE**	**109 jours**	**Mer 30/07/25**	**Jeu 08/01/26**
19		**PHASE SUIVI**	**215 jours**	**Ven 09/01/26**	**Lun 09/11/26**
20		Réunion de lancement	1 jour	Ven 09/01/26	Ven 09/01/26
21		Période de préparation	25 jours	Ven 09/01/26	Jeu 12/02/26
22		Installation de chantier	7 jours	Ven 13/02/26	Lun 23/02/26
23		**PHASE TRAVAUX**	**164 jours**	**Ven 13/02/26**	**Ven 02/10/26**
24		**LOT 01 MENUISERIES EXTERIEURES**	**137 jours**	**Ven 13/02/26**	**Mer 26/08/26**
25		Délai de fabrication	40 jours	Ven 13/02/26	Jeu 09/04/26
26		Bâtiment B	20 jours	Ven 10/04/26	Lun 11/05/26
27		Bâtiment D	14 jours	Mar 12/05/26	Ven 29/05/26
28		Bâtiment A	6 jours	Lun 01/06/26	Lun 08/06/26
29		Bâtiment C	8 jours	Mar 09/06/26	Jeu 18/06/26
30		Bâtiment F	5 jours	Ven 19/06/26	Jeu 25/06/26
31		Bâtiment E	30 jours	Ven 26/06/26	Jeu 06/08/26
32		Bâtiment G	14 jours	Ven 07/08/26	Mer 26/08/26
33		**LOT 02 ISOLATION DES PLANCHERS BAS**	**15 jours**	**Mar 24/02/26**	**Lun 16/03/26**
34		Bâtiment B	10 jours	Mar 24/02/26	Lun 09/03/26
35		Bâtiment C	5 jours	Mar 10/03/26	Lun 16/03/26
36		**LOTS 3 ET 4 FLUIDE**	**157 jours**	**Mar 24/02/26**	**Ven 02/10/26**
37		**BATIMENT B**	**42 jours**	**Mar 24/02/26**	**Mer 22/04/26**
38		Pose des éclairages	42 jours	Mar 24/02/26	Mer 22/04/26
39		Ventilation	21 jours	Mar 24/02/26	Mar 24/03/26
40		**BATIMENT E**	**31 jours**	**Mer 25/03/26**	**Jeu 07/05/26**
41		Pose des éclairages	29 jours	Mer 25/03/26	Mar 05/05/26
42		Ventilation	21 jours	Mer 25/03/26	Mer 22/04/26
43		Climatisation	21 jours	Mer 08/04/26	Jeu 07/05/26
44		**BATIMENT D**	**21 jours**	**Jeu 23/04/26**	**Lun 25/05/26**
45		Pose des éclairages	10 jours	Jeu 23/04/26	Jeu 07/05/26
46		Ventilation	21 jours	Jeu 23/04/26	Lun 25/05/26
47		**Bâtiment A**	**21 jours**	**Mar 26/05/26**	**Mar 23/06/26**
48		Pose des éclairages	5 jours	Mar 26/05/26	Lun 01/06/26
49		Ventilation	21 jours	Mar 26/05/26	Mar 23/06/26
50		**BATIMENT F**	**21 jours**	**Mer 24/06/26**	**Mer 22/07/26**
51		Pose des éclairages	2 jours	Mer 24/06/26	Jeu 25/06/26
52		Ventilation	21 jours	Mer 24/06/26	Mer 22/07/26
53		**BATIMENT C**	**21 jours**	**Jeu 23/07/26**	**Jeu 20/08/26**
54		Pose des éclairages	5 jours	Jeu 23/07/26	Mer 29/07/26
55		Ventilation	21 jours	Jeu 23/07/26	Jeu 20/08/26
56		Pose de la CTA	10 jours	Jeu 06/08/26	Mer 19/08/26
57		**BATIMENT G**	**31 jours**	**Ven 21/08/26**	**Ven 02/10/26**
58		Pose des éclairages	17 jours	Ven 21/08/26	Lun 14/09/26
59		Ventilation	21 jours	Ven 21/08/26	Ven 18/09/26
60		Climatisation	21 jours	Ven 04/09/26	Ven 02/10/26
61		**Phase AOR**	**26 jours**	**Lun 05/10/26**	**Lun 09/11/26**
62		Essais, OPR	5 jours	Lun 05/10/26	Ven 09/10/26
63		Validation des DOE	10 jours	Lun 12/10/26	Ven 23/10/26
64		Levée des réserves et constats	15 jours	Lun 19/10/26	Ven 06/11/26
65		Réception finale	1 jour	Lun 09/11/26	Lun 09/11/26
