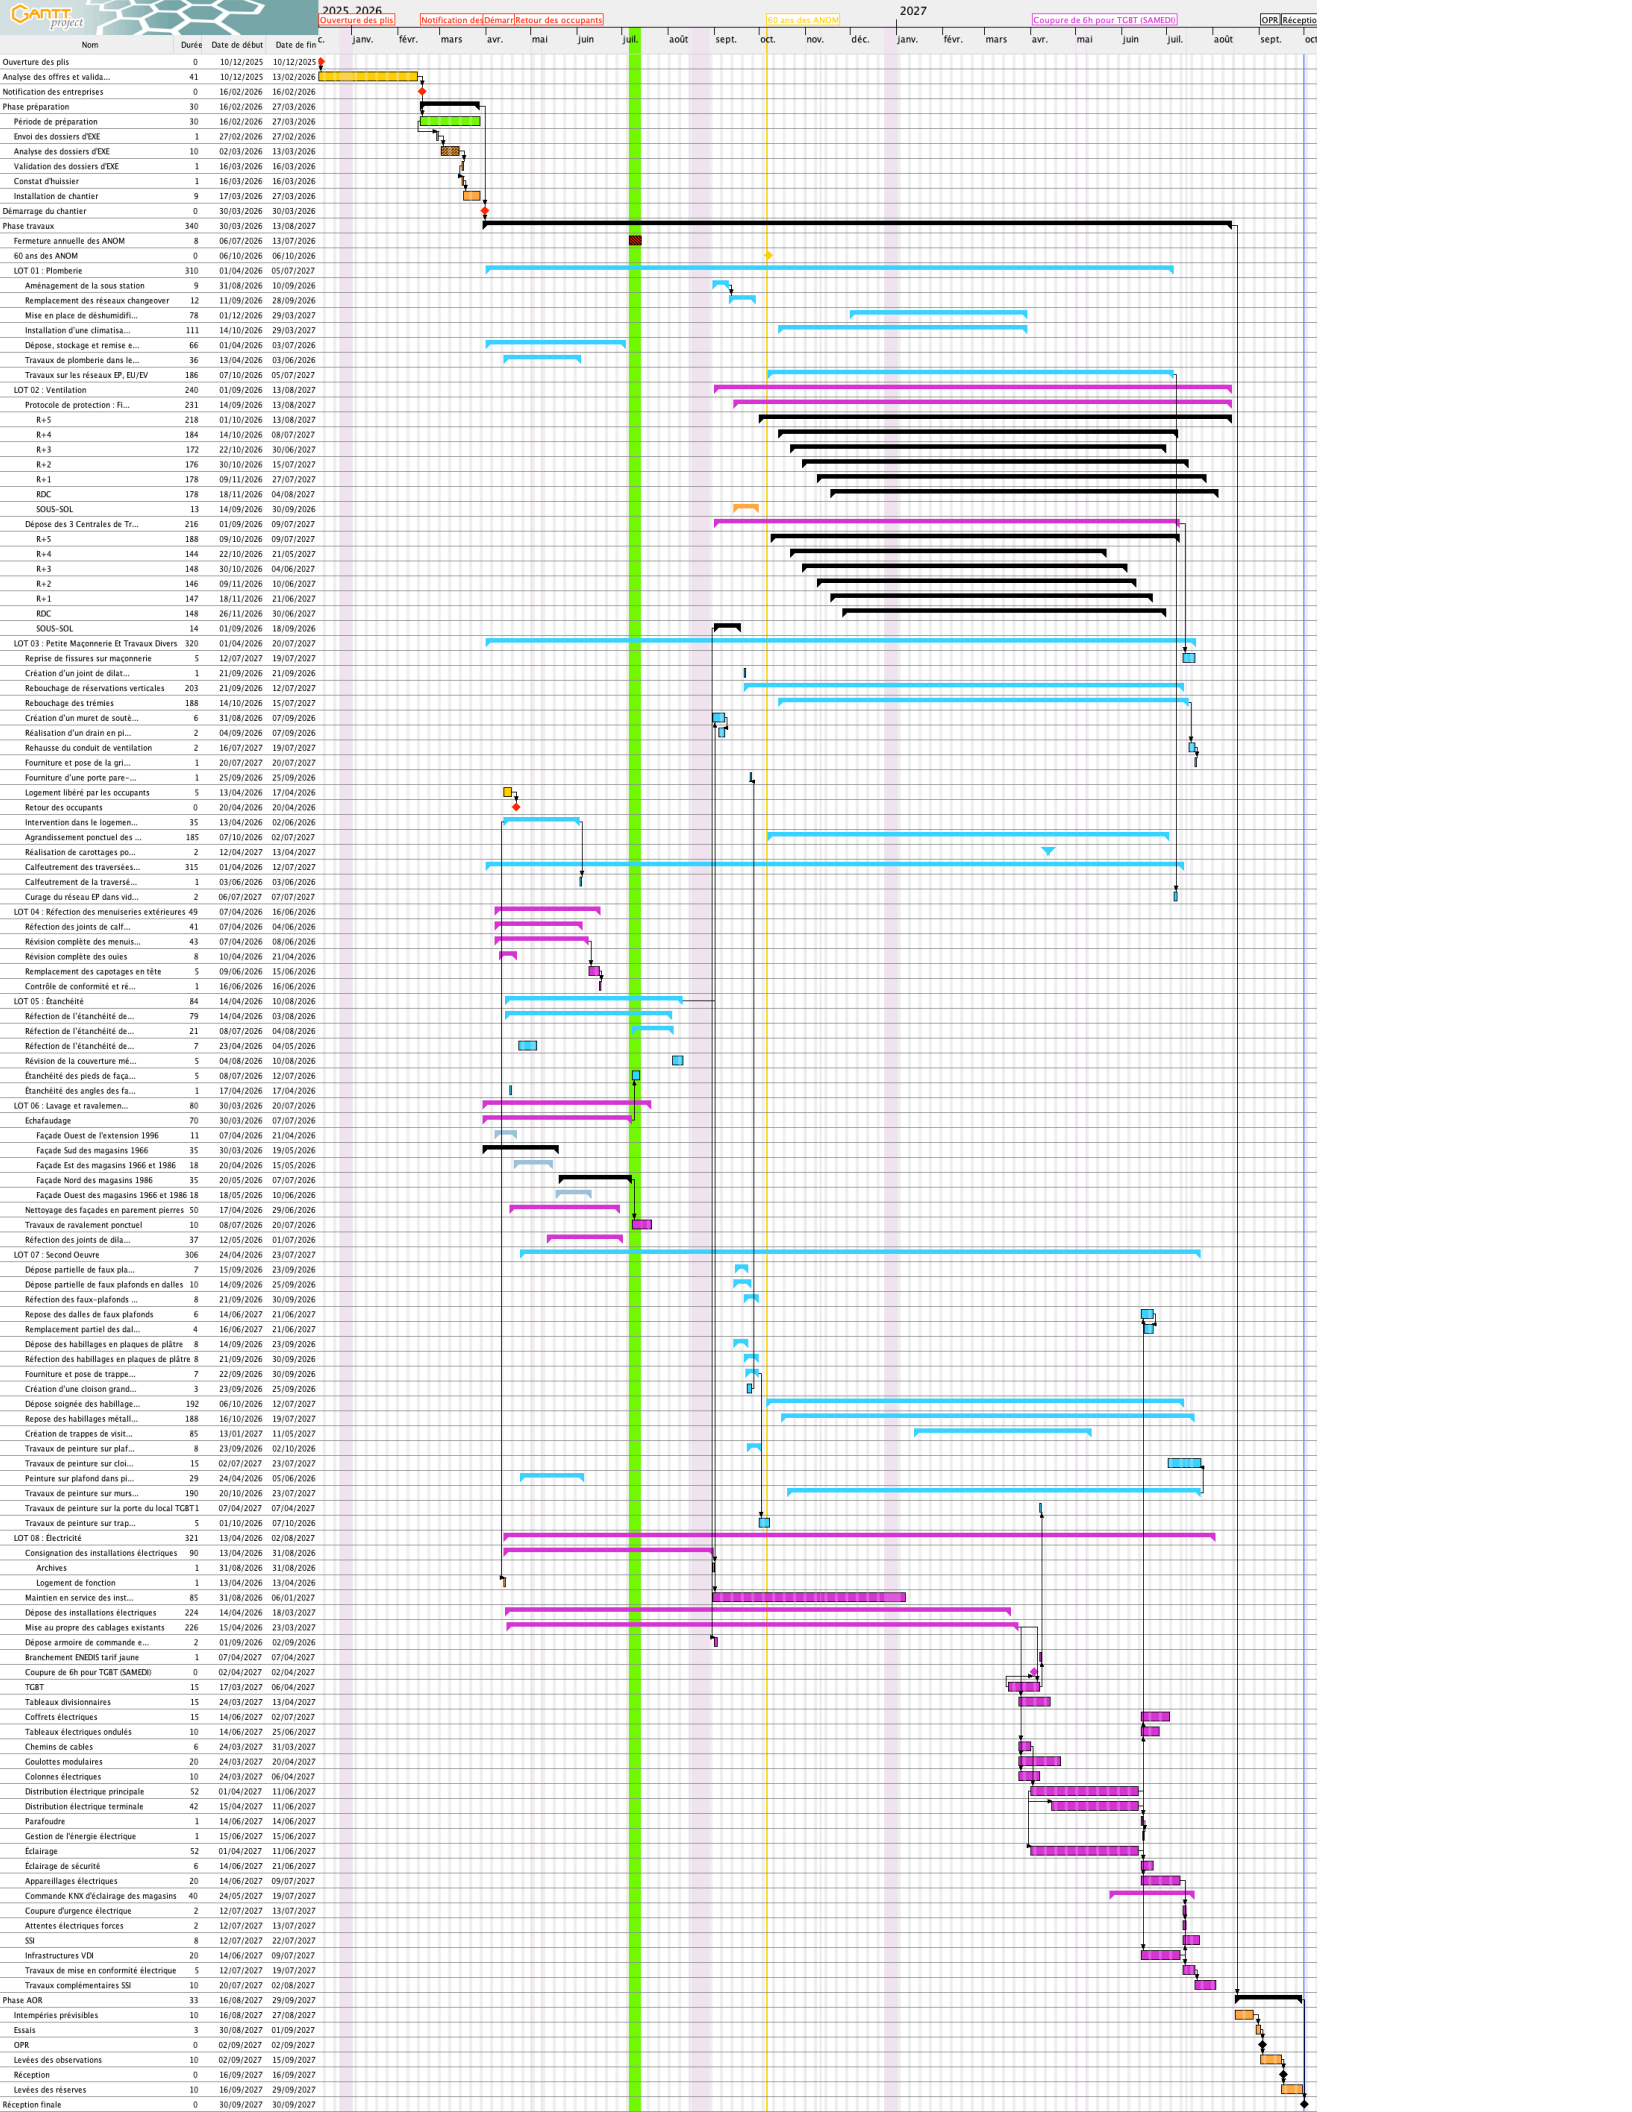

Nom	Durée	Date de début	Date de fin
Ouverture des plis	0	10/12/2025	10/12/2025
Analyse des offres et valida...	41	10/12/2025	13/02/2026
Notification des entreprises	0	16/02/2026	16/02/2026
Phase préparation	30	16/02/2026	27/03/2026
Période de préparation	30	16/02/2026	27/03/2026
Envoi des dossiers d'EXE	1	27/02/2026	27/02/2026
Analyse des dossiers d'EXE	10	02/03/2026	13/03/2026
Validation des dossiers d'EXE	1	16/03/2026	16/03/2026
Constat d'huissier	1	16/03/2026	16/03/2026
Installation de chantier	9	17/03/2026	27/03/2026
Démarrage du chantier	0	30/03/2026	30/03/2026
Phase travaux	340	30/03/2026	13/08/2027
Fermeture annuelle des ANOM	8	06/07/2026	13/07/2026
60 ans des ANOM	0	06/10/2026	06/10/2026
LOT 01 : Plomberie	310	01/04/2026	05/07/2027
Aménagement de la sous station	9	31/08/2026	10/09/2026
Remplacement des réseaux changeover	12	11/09/2026	28/09/2026
Mise en place de déshumidifi...	78	01/12/2026	29/03/2027
Installation d'une climatisa...	111	14/10/2026	29/03/2027
Dépose, stockage et remise e...	66	01/04/2026	03/07/2026
Travaux de plomberie dans le...	36	13/04/2026	03/06/2026
Travaux sur les réseaux EP, EU/EV	186	07/10/2026	05/07/2027
LOT 02 : Ventilation	240	01/09/2026	13/08/2027
Protocole de protection : Fi...	231	14/09/2026	13/08/2027
R+5	218	01/10/2026	13/08/2027
R+4	184	14/10/2026	08/07/2027
R+3	172	22/10/2026	30/06/2027
R+2	176	30/10/2026	15/07/2027
R+1	178	09/11/2026	27/07/2027
RDC	178	18/11/2026	04/08/2027
SOUS-SOL	13	14/09/2026	30/09/2026
Dépose des 3 Centrales de Tr...	216	01/09/2026	09/07/2027
R+5	188	09/10/2026	09/07/2027
R+4	144	22/10/2026	21/05/2027
R+3	148	30/10/2026	04/06/2027
R+2	146	09/11/2026	10/06/2027
R+1	147	18/11/2026	21/06/2027
RDC	148	26/11/2026	30/06/2027
SOUS-SOL	14	01/09/2026	18/09/2026
LOT 03 : Petite Maçonnerie Et Travaux Divers	320	01/04/2026	20/07/2027
Reprise de fissures sur maçonnerie	5	12/07/2027	19/07/2027
Création d'un joint de dilat...	1	21/09/2026	21/09/2026
Rebouchage de réservations verticales	203	21/09/2026	12/07/2027
Rebouchage des trémies	188	14/10/2026	15/07/2027
Création d'un muret de soutè...	6	31/08/2026	07/09/2026
Réalisation d'un drain en pi...	2	04/09/2026	07/09/2026
Rehausse du conduit de ventilation	2	16/07/2027	19/07/2027
Fourniture et pose de la gri...	1	20/07/2027	20/07/2027
Fourniture d'une porte pare-...	1	25/09/2026	25/09/2026
Logement libéré par les occupants	5	13/04/2026	17/04/2026
Retour des occupants	0	20/04/2026	20/04/2026
Intervention dans le logemen...	35	13/04/2026	02/06/2026
Agrandissement ponctuel des ...	185	07/10/2026	02/07/2027
Réalisation de carottages po...	2	12/04/2027	13/04/2027
Calfeutrement des traversées...	315	01/04/2026	12/07/2027
Calfeutrement de la traversé...	1	03/06/2026	03/06/2026
Curage du réseau EP dans vid...	2	06/07/2027	07/07/2027
LOT 04 : Réfection des menuiseries extérieures	49	07/04/2026	16/06/2026
Réfection des joints de calf...	41	07/04/2026	04/06/2026
Révision complète des menuis...	43	07/04/2026	08/06/2026
Révision complète des ouies	8	10/04/2026	21/04/2026
Remplacement des capotages en tête	5	09/06/2026	15/06/2026
Contrôle de conformité et ré...	1	16/06/2026	16/06/2026
LOT 05 : Étanchéité	84	14/04/2026	10/08/2026
Réfection de l'étanchéité de...	79	14/04/2026	03/08/2026
Réfection de l'étanchéité de...	21	08/07/2026	04/08/2026
Réfection de l'étanchéité de...	7	23/04/2026	04/05/2026
Révision de la couverture mé...	5	04/08/2026	10/08/2026
Étanchéité des pieds de faça...	5	08/07/2026	12/07/2026
Étanchéité des angles des fa...	1	17/04/2026	17/04/2026
LOT 06 : Lavage et ravalemen...	80	30/03/2026	20/07/2026
Échafaudage	70	30/03/2026	07/07/2026
Façade Ouest de l'extension 1996	11	07/04/2026	21/04/2026
Façade Sud des magasins 1966	35	30/03/2026	19/05/2026
Façade Est des magasins 1966 et 1986	18	20/04/2026	15/05/2026
Façade Nord des magasins 1986	35	20/05/2026	07/07/2026
Façade Ouest des magasins 1966 et 1986	18	18/05/2026	10/06/2026
Nettoyage des façades en parement pierres	50	17/04/2026	29/06/2026
Travaux de ravalement ponctuel	10	08/07/2026	20/07/2026
Réfection des joints de dila...	37	12/05/2026	01/07/2026
LOT 07 : Second Oeuvre	306	24/04/2026	23/07/2027
Dépose partielle de faux pla...	7	15/09/2026	23/09/2026
Dépose partielle de faux plafonds en dalles	10	14/09/2026	25/09/2026
Réfection des faux-plafonds ...	8	21/09/2026	30/09/2026
Repose des dalles de faux plafonds	6	14/06/2027	21/06/2027
Remplacement partiel des dal...	4	16/06/2027	21/06/2027
Dépose des habillages en plaques de plâtre	8	14/09/2026	23/09/2026
Réfection des habillages en plaques de plâtre	8	21/09/2026	30/09/2026
Fourniture et pose de trappe...	7	22/09/2026	30/09/2026
Création d'une cloison grand...	3	23/09/2026	25/09/2026
Dépose soignée des habillage...	192	06/10/2026	12/07/2027
Repose des habillages métall...	188	16/10/2026	19/07/2027
Création de trappes de visit...	85	13/01/2027	11/05/2027
Travaux de peinture sur plaf...	8	23/09/2026	02/10/2026
Travaux de peinture sur cloi...	15	02/07/2027	23/07/2027
Peinture sur plafond dans pi...	29	24/04/2026	05/06/2026
Travaux de peinture sur murs...	190	20/10/2026	23/07/2027
Travaux de peinture sur la porte du local TGBT	1	07/04/2027	07/04/2027
Travaux de peinture sur trap...	5	01/10/2026	07/10/2026
LOT 08 : Électricité	321	13/04/2026	02/08/2027
Consignation des installations électriques	90	13/04/2026	31/08/2026
Archives	1	31/08/2026	31/08/2026
Logement de fonction	1	13/04/2026	13/04/2026
Maintien en service des inst...	85	31/08/2026	06/01/2027
Dépose des installations électriques	224	14/04/2026	18/03/2027
Mise au propre des cablages existants	226	15/04/2026	23/03/2027
Dépose armoire de commande e...	2	01/09/2026	02/09/2026
Branchement ENEDIS tarif jaune	1	07/04/2027	07/04/2027
Coupure de 6h pour TGBT (SAMEDI)	0	02/04/2027	02/04/2027
TGBT	15	17/03/2027	06/04/2027
Tableaux divisionnaires	15	24/03/2027	13/04/2027
Coffrets électriques	15	14/06/2027	02/07/2027
Tableaux électriques ondulés	10	14/06/2027	25/06/2027
Chemins de cables	6	24/03/2027	31/03/2027
Goulottes modulaires	20	24/03/2027	20/04/2027
Colonnes électriques	10	24/03/2027	06/04/2027
Distribution électrique principale	52	01/04/2027	11/06/2027
Distribution électrique terminale	42	15/04/2027	11/06/2027
Parafoudre	1	14/06/2027	14/06/2027
Gestion de l'énergie électrique	1	15/06/2027	15/06/2027
Éclairage	52	01/04/2027	11/06/2027
Éclairage de sécurité	6	14/06/2027	21/06/2027
Appareillages électriques	20	14/06/2027	09/07/2027
Commande KNX d'éclairage des magasins	40	24/05/2027	19/07/2027
Coupure d'urgence électrique	2	12/07/2027	13/07/2027
Attentes électriques forces	2	12/07/2027	13/07/2027
SSI	8	12/07/2027	22/07/2027
Infrastructures VDI	20	14/06/2027	09/07/2027
Travaux de mise en conformité électrique	5	12/07/2027	19/07/2027
Travaux complémentaires SSI	10	20/07/2027	02/08/2027
Phase AOR	33	16/08/2027	29/09/2027
Intempéries prévisibles	10	16/08/2027	27/08/2027
Essais	3	30/08/2027	01/09/2027
OPR	0	02/09/2027	02/09/2027
Levées des observations	10	02/09/2027	15/09/2027
Réception	0	16/09/2027	16/09/2027
Levées des réserves	10	16/09/2027	29/09/2027
Réception finale	0	30/09/2027	30/09/2027
