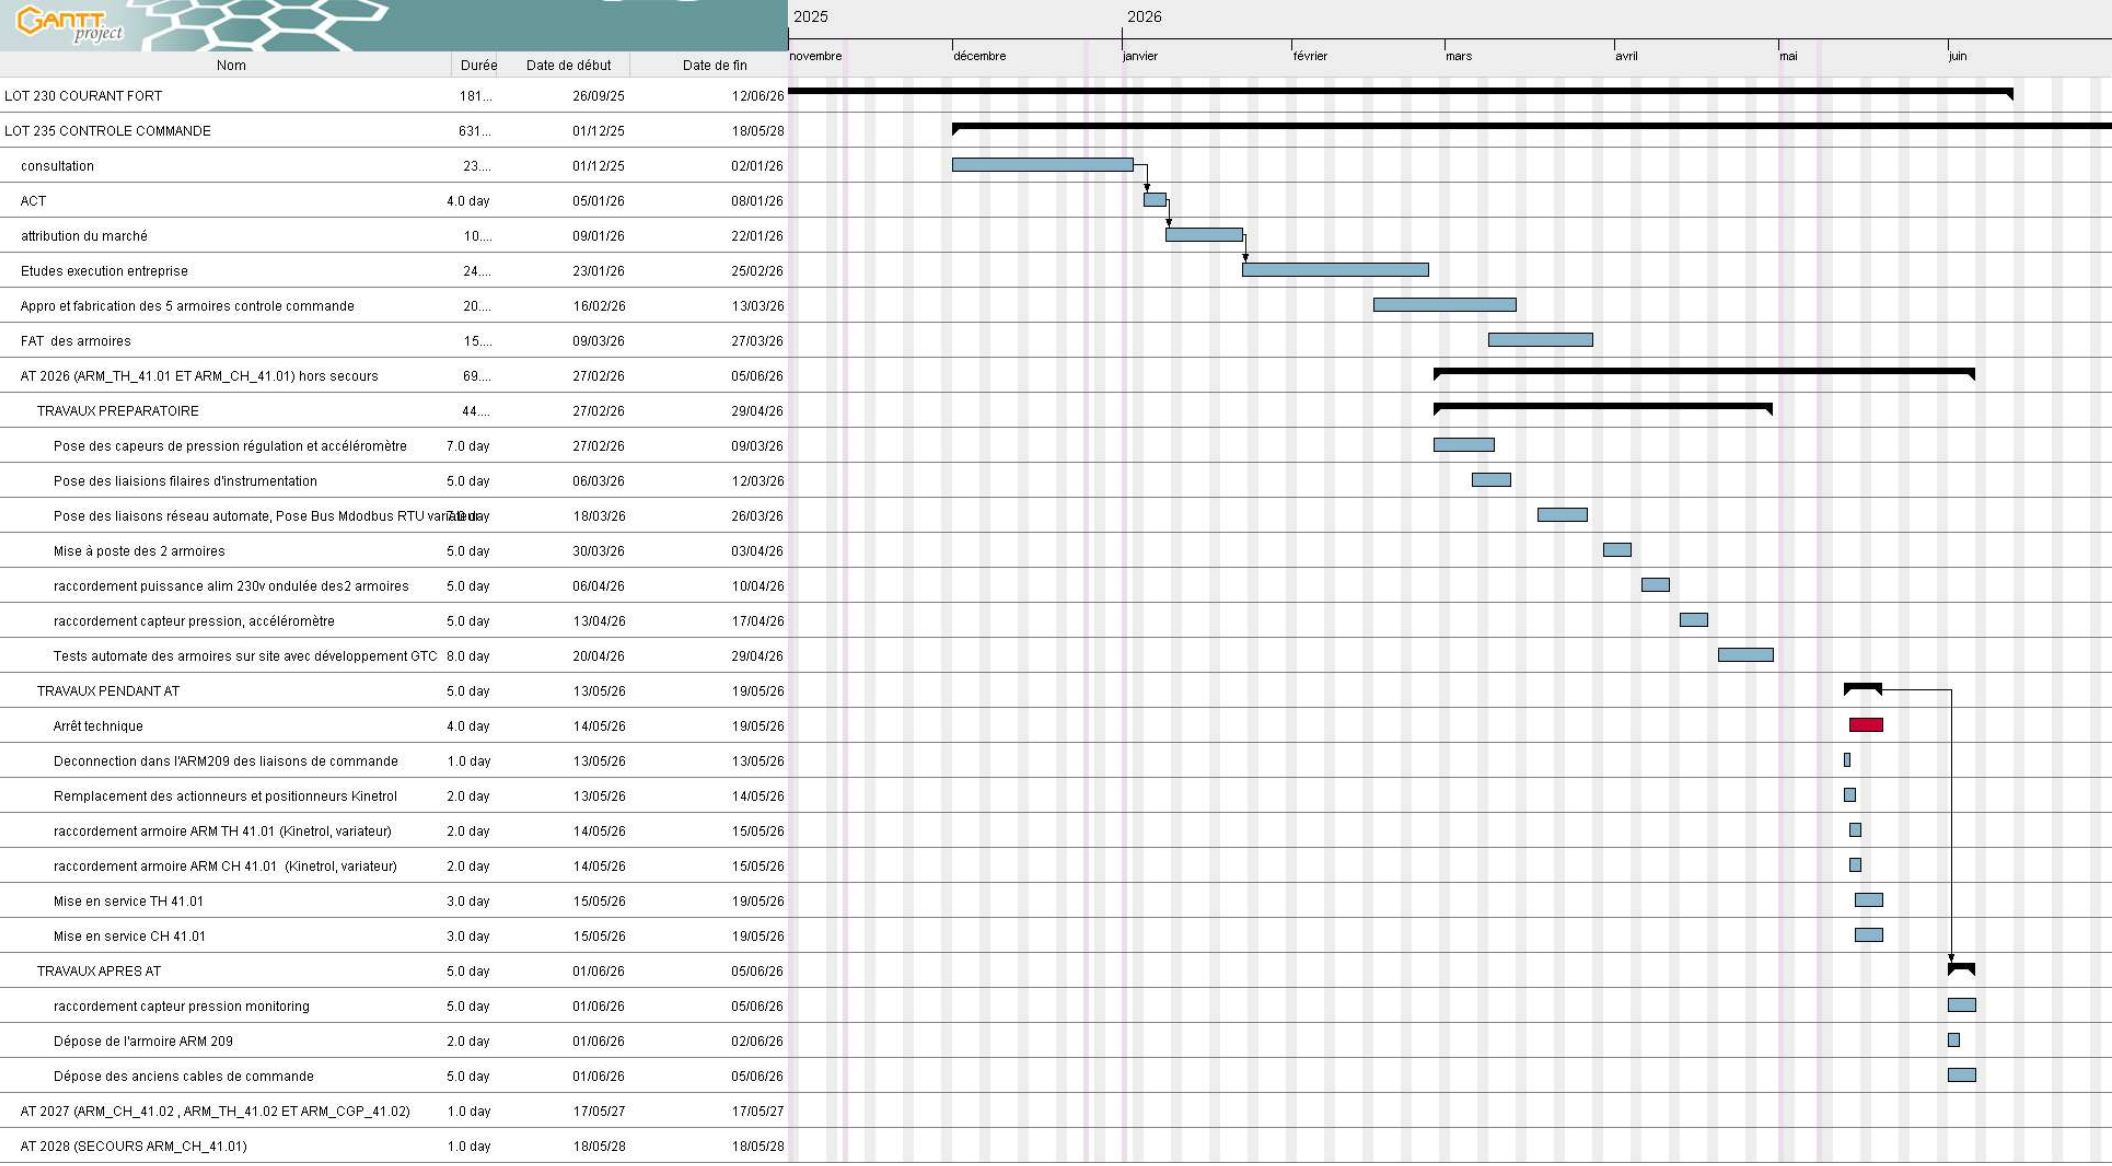

Nom	Durée	Date de début	Date de fin
LOT 230 COURANT FORT	181...	26/09/25	12/06/26
LOT 235 CONTROLE COMMANDE	631...	01/12/25	18/05/28
consultation	23....	01/12/25	02/01/26
ACT	4.0 day	05/01/26	08/01/26
attribution du marché	10....	09/01/26	22/01/26
Etudes execution entreprise	24....	23/01/26	25/02/26
Appro et fabrication des 5 armoires controle commande	20....	16/02/26	13/03/26
FAT des armoires	15....	09/03/26	27/03/26
AT 2026 (ARM_TH_41.01 ET ARM_CH_41.01) hors secours	69....	27/02/26	05/06/26
TRAVAUX PREPARATOIRE	44....	27/02/26	29/04/26
Pose des capeurs de pression régulation et accéléromètre	7.0 day	27/02/26	09/03/26
Pose des liaisions filaires d'instrumentation	5.0 day	06/03/26	12/03/26
Pose des liaisons réseau automate, Pose Bus Mdodbus RTU variateur	7.0 day	18/03/26	26/03/26
Mise à poste des 2 armoires	5.0 day	30/03/26	03/04/26
raccordement puissance alim 230v ondulée des2 armoires	5.0 day	06/04/26	10/04/26
raccordement capteur pression, accéléromètre	5.0 day	13/04/26	17/04/26
Tests automate des armoires sur site avec développement GTC	8.0 day	20/04/26	29/04/26
TRAVAUX PENDANT AT	5.0 day	13/05/26	19/05/26
Arrêt technique	4.0 day	14/05/26	19/05/26
Deconnection dans l'ARM209 des liaisons de commande	1.0 day	13/05/26	13/05/26
Remplacement des actionneurs et positionneurs Kinetrol	2.0 day	13/05/26	14/05/26
raccordement armoire ARM TH 41.01 (Kinetrol, variateur)	2.0 day	14/05/26	15/05/26
raccordement armoire ARM CH 41.01 (Kinetrol, variateur)	2.0 day	14/05/26	15/05/26
Mise en service TH 41.01	3.0 day	15/05/26	19/05/26
Mise en service CH 41.01	3.0 day	15/05/26	19/05/26
TRAVAUX APRES AT	5.0 day	01/06/26	05/06/26
raccordement capteur pression monitoring	5.0 day	01/06/26	05/06/26
Dépose de l'armoire ARM 209	2.0 day	01/06/26	02/06/26
Dépose des anciens cables de commande	5.0 day	01/06/26	05/06/26
AT 2027 (ARM_CH_41.02 , ARM_TH_41.02 ET ARM_CGP_41.02)	1.0 day	17/05/27	17/05/27
AT 2028 (SECOURS ARM_CH_41.01)	1.0 day	18/05/28	18/05/28
