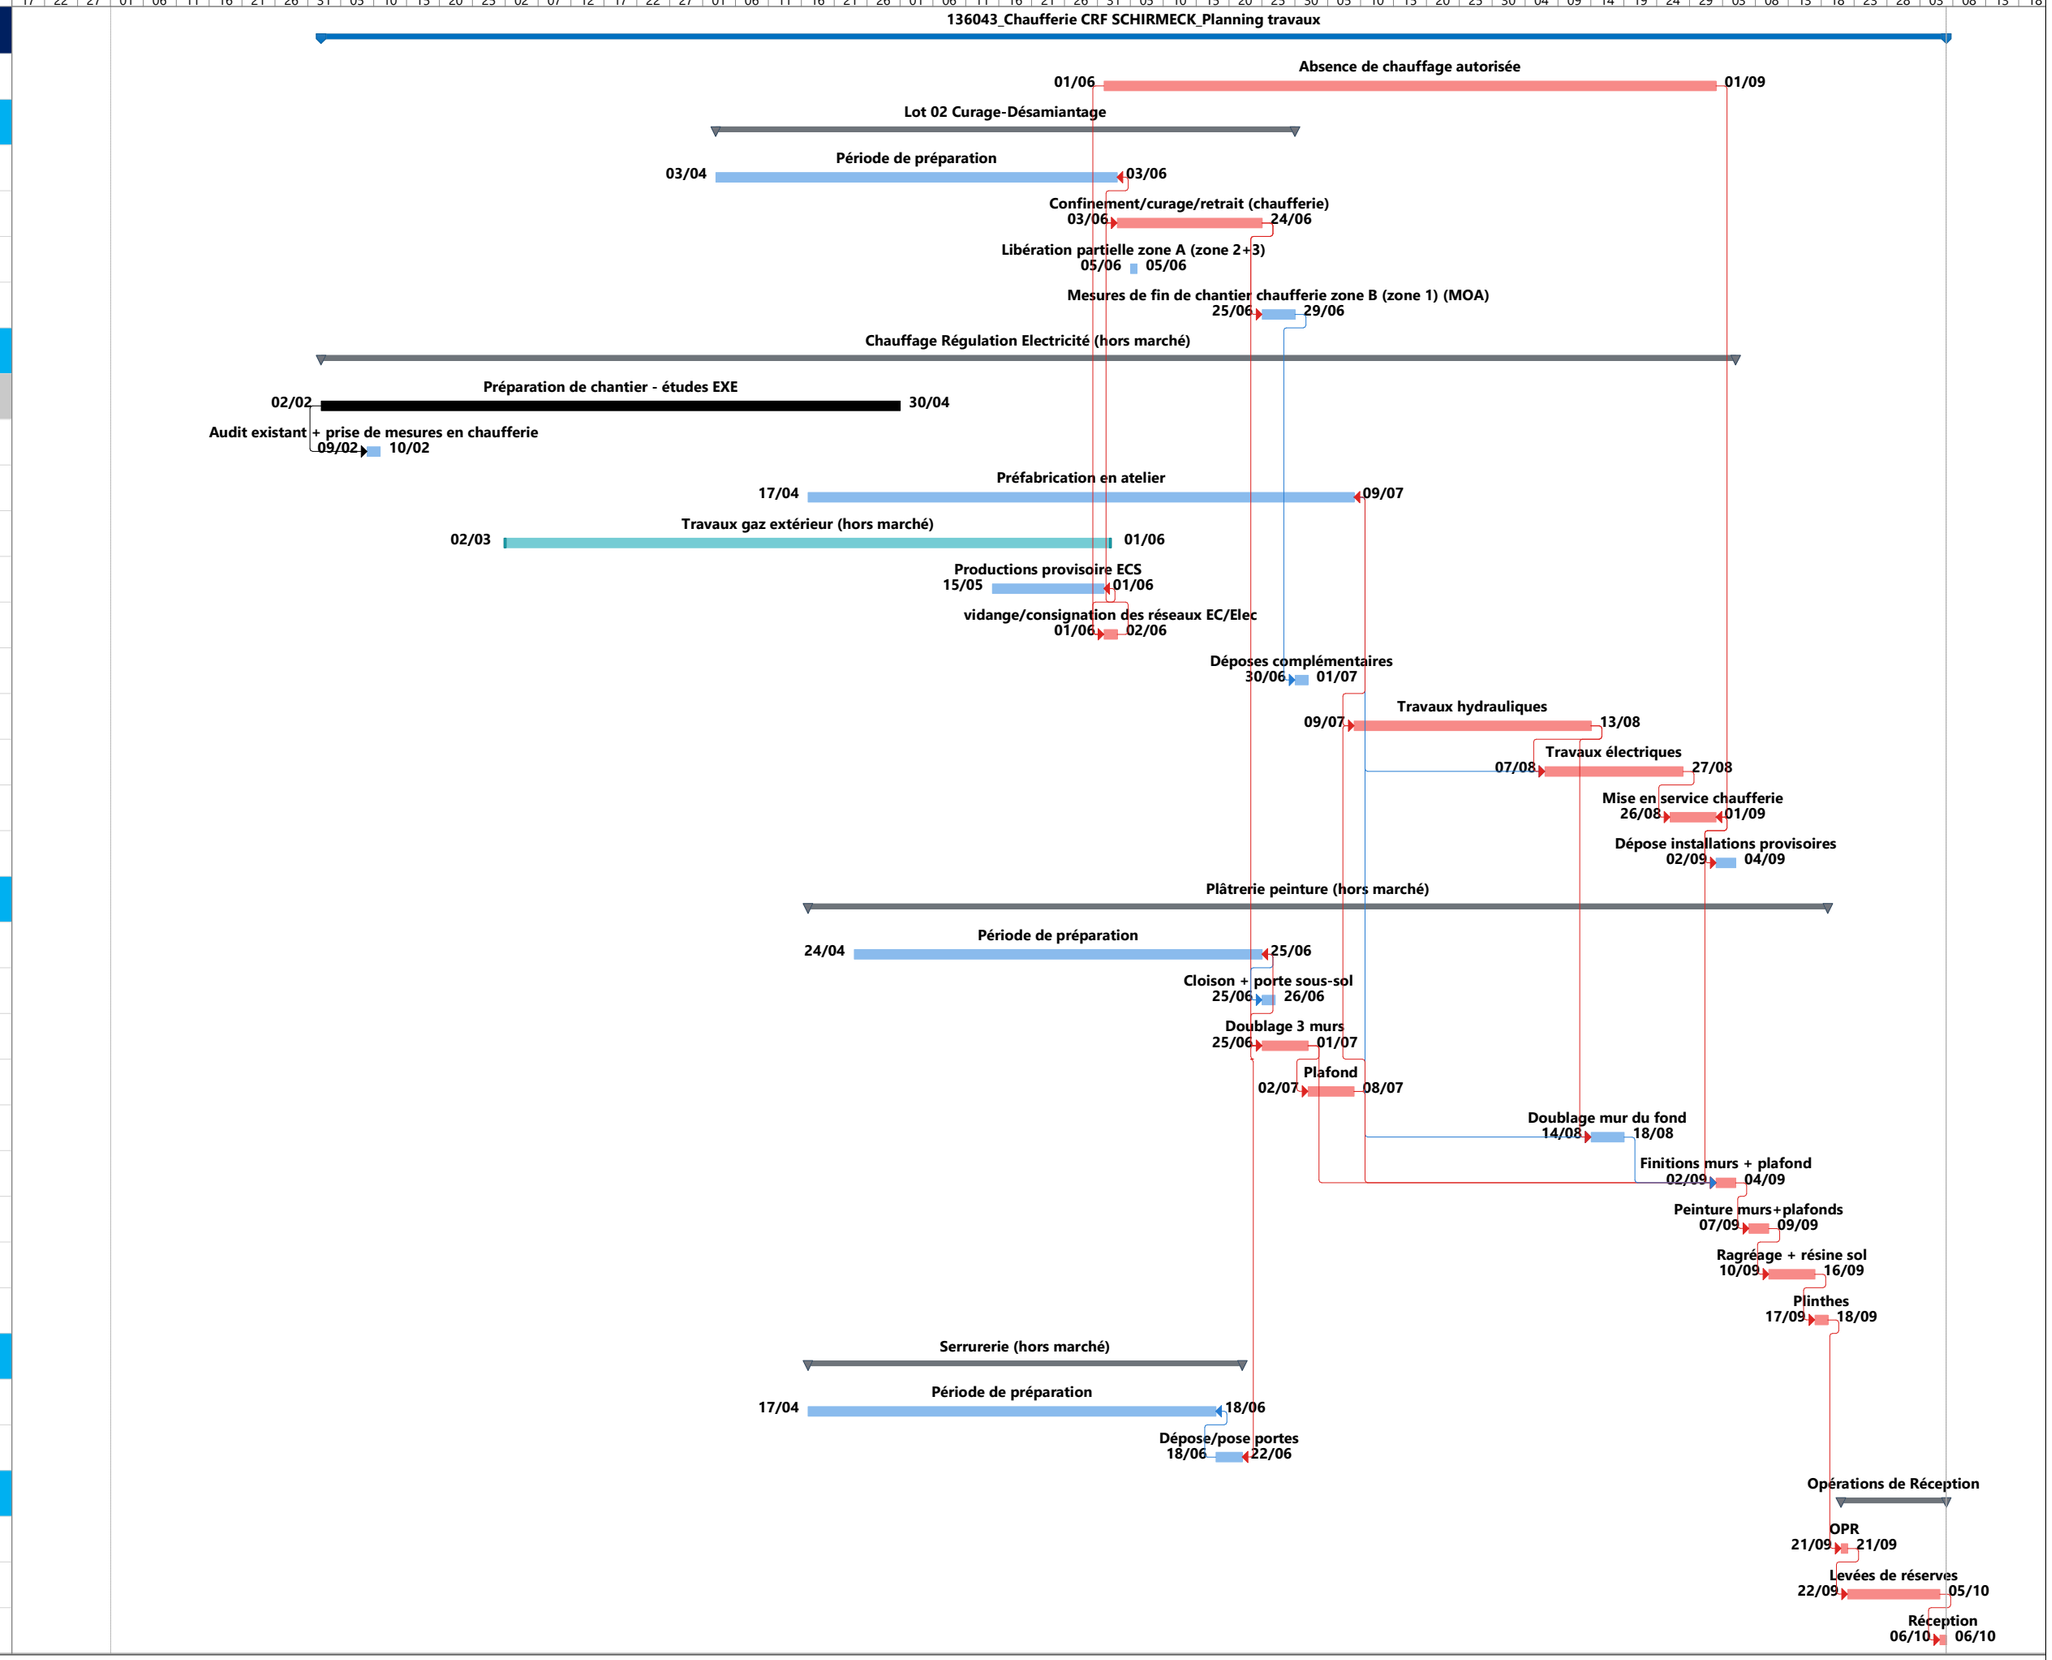N°	Nom de la tâche	Durée	Début
0	**136043_Chaufferie CRF SCHIRMECK_Planning travaux**	**172 jours**	**Lun 02/02/26**
1	Absence de chauffage autorisée	65 jours	Lun 01/06/26
2	**Lot 02 Curage-Désamiantage**	**58 jours**	**Ven 03/04/26**
3	Période de préparation	40 jours	Ven 03/04/26
4	Confinement/curage/retrait (chaufferie)	15 jours	Mer 03/06/26
5	Libération partielle zone A (zone 2+3)	1 jour	Ven 05/06/26
6	Mesures de fin de chantier chaufferie zone B (zone 1)	3 jours	Jeu 25/06/26
7	**Chauffage Régulation Electricité (hors marché)**	**150 jours**	**Lun 02/02/26**
8	Préparation de chantier - études EXE	64 jours	Lun 02/02/26
9	Audit existant + prise de mesures en chaufferie	2 jours	Lun 09/02/26
10	Préfabrication en atelier	55 jours	Ven 17/04/26
11	Travaux gaz extérieur (hors marché)	63 jours	Lun 02/03/26
12	Productions provisoire ECS	10 jours	Ven 15/05/26
13	vidange/consignation des réseaux EC/Elec	2 jours	Lun 01/06/26
14	Déposes complémentaires	2 jours	Mar 30/06/26
15	Travaux hydrauliques	25 jours	Jeu 09/07/26
16	Travaux électriques	15 jours	Ven 07/08/26
17	Mise en service chaufferie	5 jours	Mer 26/08/26
18	Dépose installations provisoires	3 jours	Mer 02/09/26
19	**Plâtrerie peinture (hors marché)**	**106 jours**	**Ven 17/04/26**
20	Période de préparation	40 jours	Ven 24/04/26
21	Cloison + porte sous-sol	2 jours	Jeu 25/06/26
22	Doublage 3 murs	5 jours	Jeu 25/06/26
23	Plafond	5 jours	Jeu 02/07/26
24	Doublage mur du fond	3 jours	Ven 14/08/26
25	Finitions murs + plafond	3 jours	Mer 02/09/26
26	Peinture murs+plafonds	3 jours	Lun 07/09/26
27	Ragréage + résine sol	5 jours	Jeu 10/09/26
28	Plinthes	2 jours	Jeu 17/09/26
29	**Serrurerie (hors marché)**	**42 jours**	**Ven 17/04/26**
30	Période de préparation	40 jours	Ven 17/04/26
31	Dépose/pose portes	2 jours	Jeu 18/06/26
32	**Opérations de Réception**	**12 jours**	**Lun 21/09/26**
33	OPR	1 jour	Lun 21/09/26
34	Levées de réserves	10 jours	Mar 22/09/26
35	Réception	1 jour	Mar 06/10/26
