DCE Trémies et rétablissements Rue des Sablons et Rue Louis Thébault

Planning indicatif

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	Noms ressources
1	**CONTRAINTES**	**1839 jrs?**	**Mar 01/04/25**	**Sam 17/04/32**		
2	**Environnement (conforme arrêté environnemental)**	**921 jrs?**	**Jeu 24/04/25**	**Jeu 02/11/28**		
3	**Période d'étiage**	**921 jrs**	**Jeu 24/04/25**	**Jeu 02/11/28**		
8	**Défrichement/Décapage possible**	**824 jrs**	**Lun 01/09/25**	**Jeu 26/10/28**		
13	**Abattage des arbres**	**824 jrs**	**Lun 01/09/25**	**Jeu 26/10/28**		
18	Mesures environnementales	715 jrs?	Lun 05/01/26	Ven 29/09/28		
19	**Rabattement de nappe et rejet sur réseau DSEA**	**1839 jrs**	**Mar 01/04/25**	**Sam 17/04/32**		
20	Autorisation Rejet sur réseau DSEA (48 mois)	48 m	Mar 01/04/25	Lun 04/12/28		
21	Pompage GAUTHEY (hors marché)	41 mé	Lun 04/12/28	Sam 17/04/32	20	
22	Rabattement de nappe (assainissement provisoire trémies)	851 jrs	Jeu 26/03/26	Jeu 28/06/29	39;92FF	
23	**Interfaces/ travaux concomittants**	**863 jrs**	**Lun 02/06/25**	**Mer 20/09/28**		
24	**Travaux RER A**	**863 jrs**	**Lun 02/06/25**	**Mer 20/09/28**		
29	**Exploitation**	**586 jrs**	**Lun 01/12/25**	**Mar 29/02/28**		
30	Circulation provisoire Rue Louis Thébault	187 jrs	Jeu 29/01/26	Ven 16/10/26		
31	Fermeture Rue Louis Thébault	214 jrs	Lun 19/10/26	Jeu 12/08/27	30	
32	Rétablissement circulation définitive Rue Louis Thébaut	0 jr	Jeu 12/08/27	Jeu 12/08/27	61FF	
33	**Intempéries terrassement (Prévisions)**	**586 jrs**	**Lun 01/12/25**	**Mar 29/02/28**		
37	**REA - MARCHE TREMIES**	**650 jrs**	**Ven 02/01/26**	**Jeu 29/06/28**		
38	**Travaux OA-GC**	**650 jrs**	**Ven 02/01/26**	**Jeu 29/06/28**		
39	Période de préparation	3 m	Ven 02/01/26	Jeu 26/03/26		
40	Études d'exécution (EXE)	6 m	Lun 02/02/26	Ven 17/07/26		
41	Procédures administratives	3 m	Ven 02/01/26	Jeu 26/03/26	39OD	
42	**Bassin et mesures compensatoires**	**260 jrs**	**Ven 27/03/26**	**Jeu 25/03/27**		
43	Bassin Sud	4 m	Ven 27/03/26	Jeu 16/07/26	39	
44	Mesures compensatoires	9 m	Ven 17/07/26	Jeu 25/03/27	43	
45	**Trémie Sud + OA RS**	**230 jrs**	**Ven 27/03/26**	**Jeu 11/02/27**		
46	Pré-terassement	2 sem.	Ven 27/03/26	Jeu 09/04/26	39	
47	Réalisation des micropieux de confortement	2 m	Ven 10/04/26	Jeu 04/06/26	46	
48	**Plot A**	**80 jrs**	**Ven 05/06/26**	**Jeu 24/09/26**		
49	Radier	2 m	Ven 05/06/26	Jeu 30/07/26	47	
50	Piédroits	2 m	Ven 31/07/26	Jeu 24/09/26	49	
51	**Plot B**	**140 jrs**	**Ven 31/07/26**	**Jeu 11/02/27**		
52	Radier	2 m	Ven 31/07/26	Jeu 24/09/26	49	
53	Piédroits	2 m	Ven 25/09/26	Jeu 19/11/26	52	
54	Tablier OA RS	2 m	Ven 20/11/26	Jeu 14/01/27	53	
55	Equipements (étanchéité, relevés, GC, enrobés...)	1 m	Ven 15/01/27	Jeu 11/02/27	54	
56	**Plot C**	**80 jrs**	**Ven 25/09/26**	**Jeu 14/01/27**		
57	Radier	1 m	Ven 25/09/26	Jeu 22/10/26	52	
58	Piédroits	1 m	Ven 23/10/26	Jeu 19/11/26	57	
59	Travaux de finitions (recépages palplances, déblais, remblais)	2 m	Ven 20/11/26	Jeu 14/01/27	58	
60	**OA RLT & Trémie Nord**	**270 jrs**	**Ven 31/07/26**	**Jeu 12/08/27**		
61	**OARLT**	**270 jrs**	**Ven 31/07/26**	**Jeu 12/08/27**		
62	Terrassement + Dépose tirants SNCF + Démolitions	3 m	Ven 31/07/26	Jeu 22/10/26	49	
63	Terrassement + tirants passe 1	1,5 m	Ven 23/10/26	Jeu 03/12/26	62	
64	Terrassement + tirants passe 2	1,5 m	Ven 04/12/26	Jeu 14/01/27	63	
65	Radier	1,5 m	Ven 12/03/27	Jeu 22/04/27	71	
66	Piédroits	1,5 m	Ven 23/04/27	Jeu 03/06/27	65	
67	Tablier	1,5 m	Ven 04/06/27	Jeu 15/07/27	66	
68	Equipements (étanchéité, relevés, GC, enrobés...)	1 m	Ven 16/07/27	Jeu 12/08/27	67	
69	**TREMIE NORD**	**380 jrs**	**Ven 15/01/27**	**Jeu 29/06/28**		
70	**Plots 1 et 2 (25,8 m + Chambre de relevage 8,7 m)**	**240 jrs**	**Ven 15/01/27**	**Jeu 16/12/27**		
71	Terrassement + tirants	2 m	Ven 15/01/27	Jeu 11/03/27	64	
72	Radier	4 m	Ven 07/05/27	Jeu 26/08/27	75	
73	Piédroits	4 m	Ven 27/08/27	Jeu 16/12/27	72	
74	**Plots 3 et 4 (20 m + 20 m)**	**200 jrs**	**Ven 12/03/27**	**Jeu 16/12/27**		
75	Terrassement + tirants	2 m	Ven 12/03/27	Jeu 06/05/27	71	
76	Radier	2 m	Ven 30/07/27	Jeu 23/09/27	80	
77	Piédroits	3 m	Ven 24/09/27	Jeu 16/12/27	76	
78	**Plots 5 et 6 (20 m + 20 m)**	**200 jrs**	**Ven 07/05/27**	**Jeu 10/02/28**		
79	Terrassement + tirants	2 m	Ven 07/05/27	Jeu 01/07/27	75	
80	Purge et substitution	1 m	Ven 02/07/27	Jeu 29/07/27	79	
81	Radier	2 m	Ven 24/09/27	Jeu 18/11/27	84	
82	Piédroits	3 m	Ven 19/11/27	Jeu 10/02/28	81	
83	**Plots 7 et 8 (20 m + 10 m)**	**140 jrs**	**Ven 30/07/27**	**Jeu 10/02/28**		
84	Terrassement + tirants	2 m	Ven 30/07/27	Jeu 23/09/27	80	
85	Inclusion rigide	1 m	Ven 24/09/27	Jeu 21/10/27	84	
86	Radier	1 m	Ven 22/10/27	Jeu 18/11/27	85	
87	Piédroits	2 m	Ven 19/11/27	Jeu 13/01/28	86	
88	Mur en retour fermeture talus	1 m	Ven 14/01/28	Jeu 10/02/28	87	
89	**Chambre de relevage - Equipements & Connexion Bassin Sud**	**100 jrs**	**Ven 11/02/28**	**Jeu 29/06/28**		
90	Aménagement et travaux VRD piste bassin Sud	3 m	Ven 11/02/28	Jeu 04/05/28	88	
91	Equipements et branchement des pompes	1 m	Ven 05/05/28	Jeu 01/06/28	90	
92	Essais et mise en service	1 m	Ven 02/06/28	Jeu 29/06/28	91	
93	**Rétablissements routiers Rue des Sablons & Rue Louis Thébault**	**248 jrs**	**Mar 01/09/26**	**Jeu 12/08/27**		
94	Travaux préparatoires	4 m	Mar 01/09/26	Lun 21/12/26		
95	TACE Rétablissement RS	4 m	Ven 12/02/27	Jeu 03/06/27	45	
96	TACE Rétablissement RLT	3 mé	Ven 14/05/27	Jeu 12/08/27	61FF	

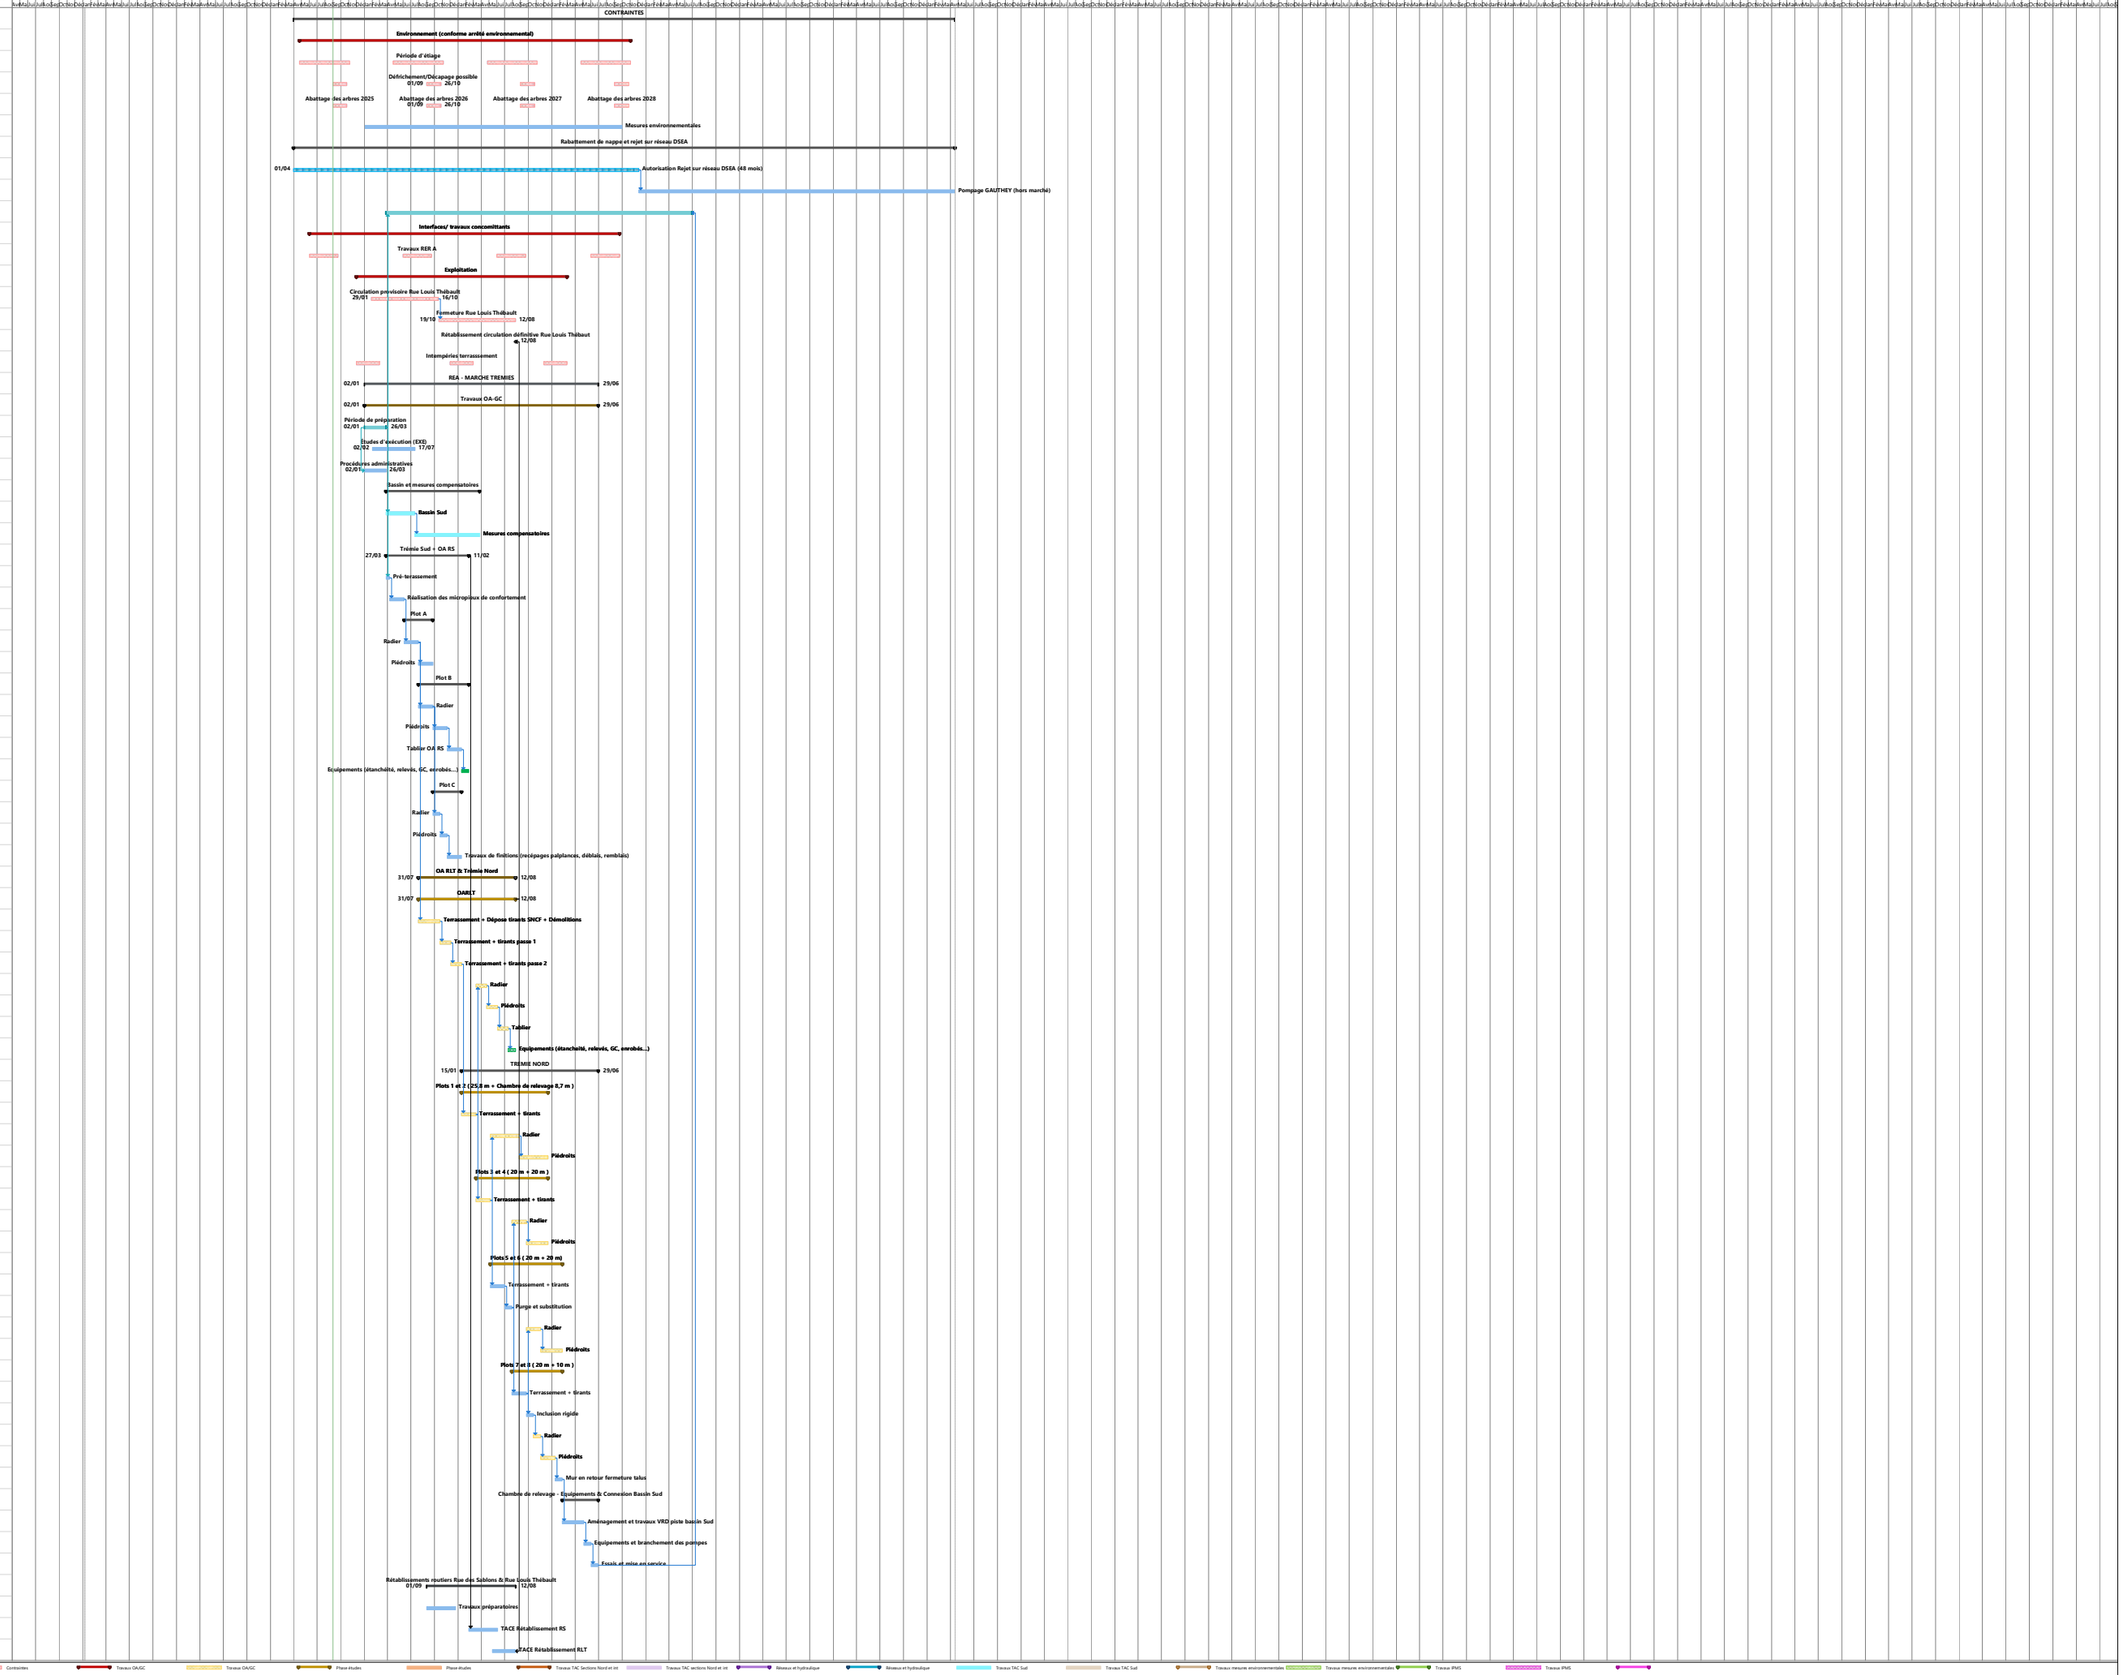

Projet : Port de Bonneuil , PLG
Date : Lun 01/06/25

Aménagements paysagers · Aménagements paysagers · Contraintes · Contraintes · Travaux OA/GC · Travaux OA/GC · Phase études · Phase études · Travaux TAC Sections Nord et int · Travaux TAC Sections Nord et int · Réseaux et hydraulique · Réseaux et hydraulique · Travaux TAC Sud · Travaux TAC Sud · Travaux mesures environnementales · Travaux mesures environnementales · Travaux IPMS · Travaux IPMS
