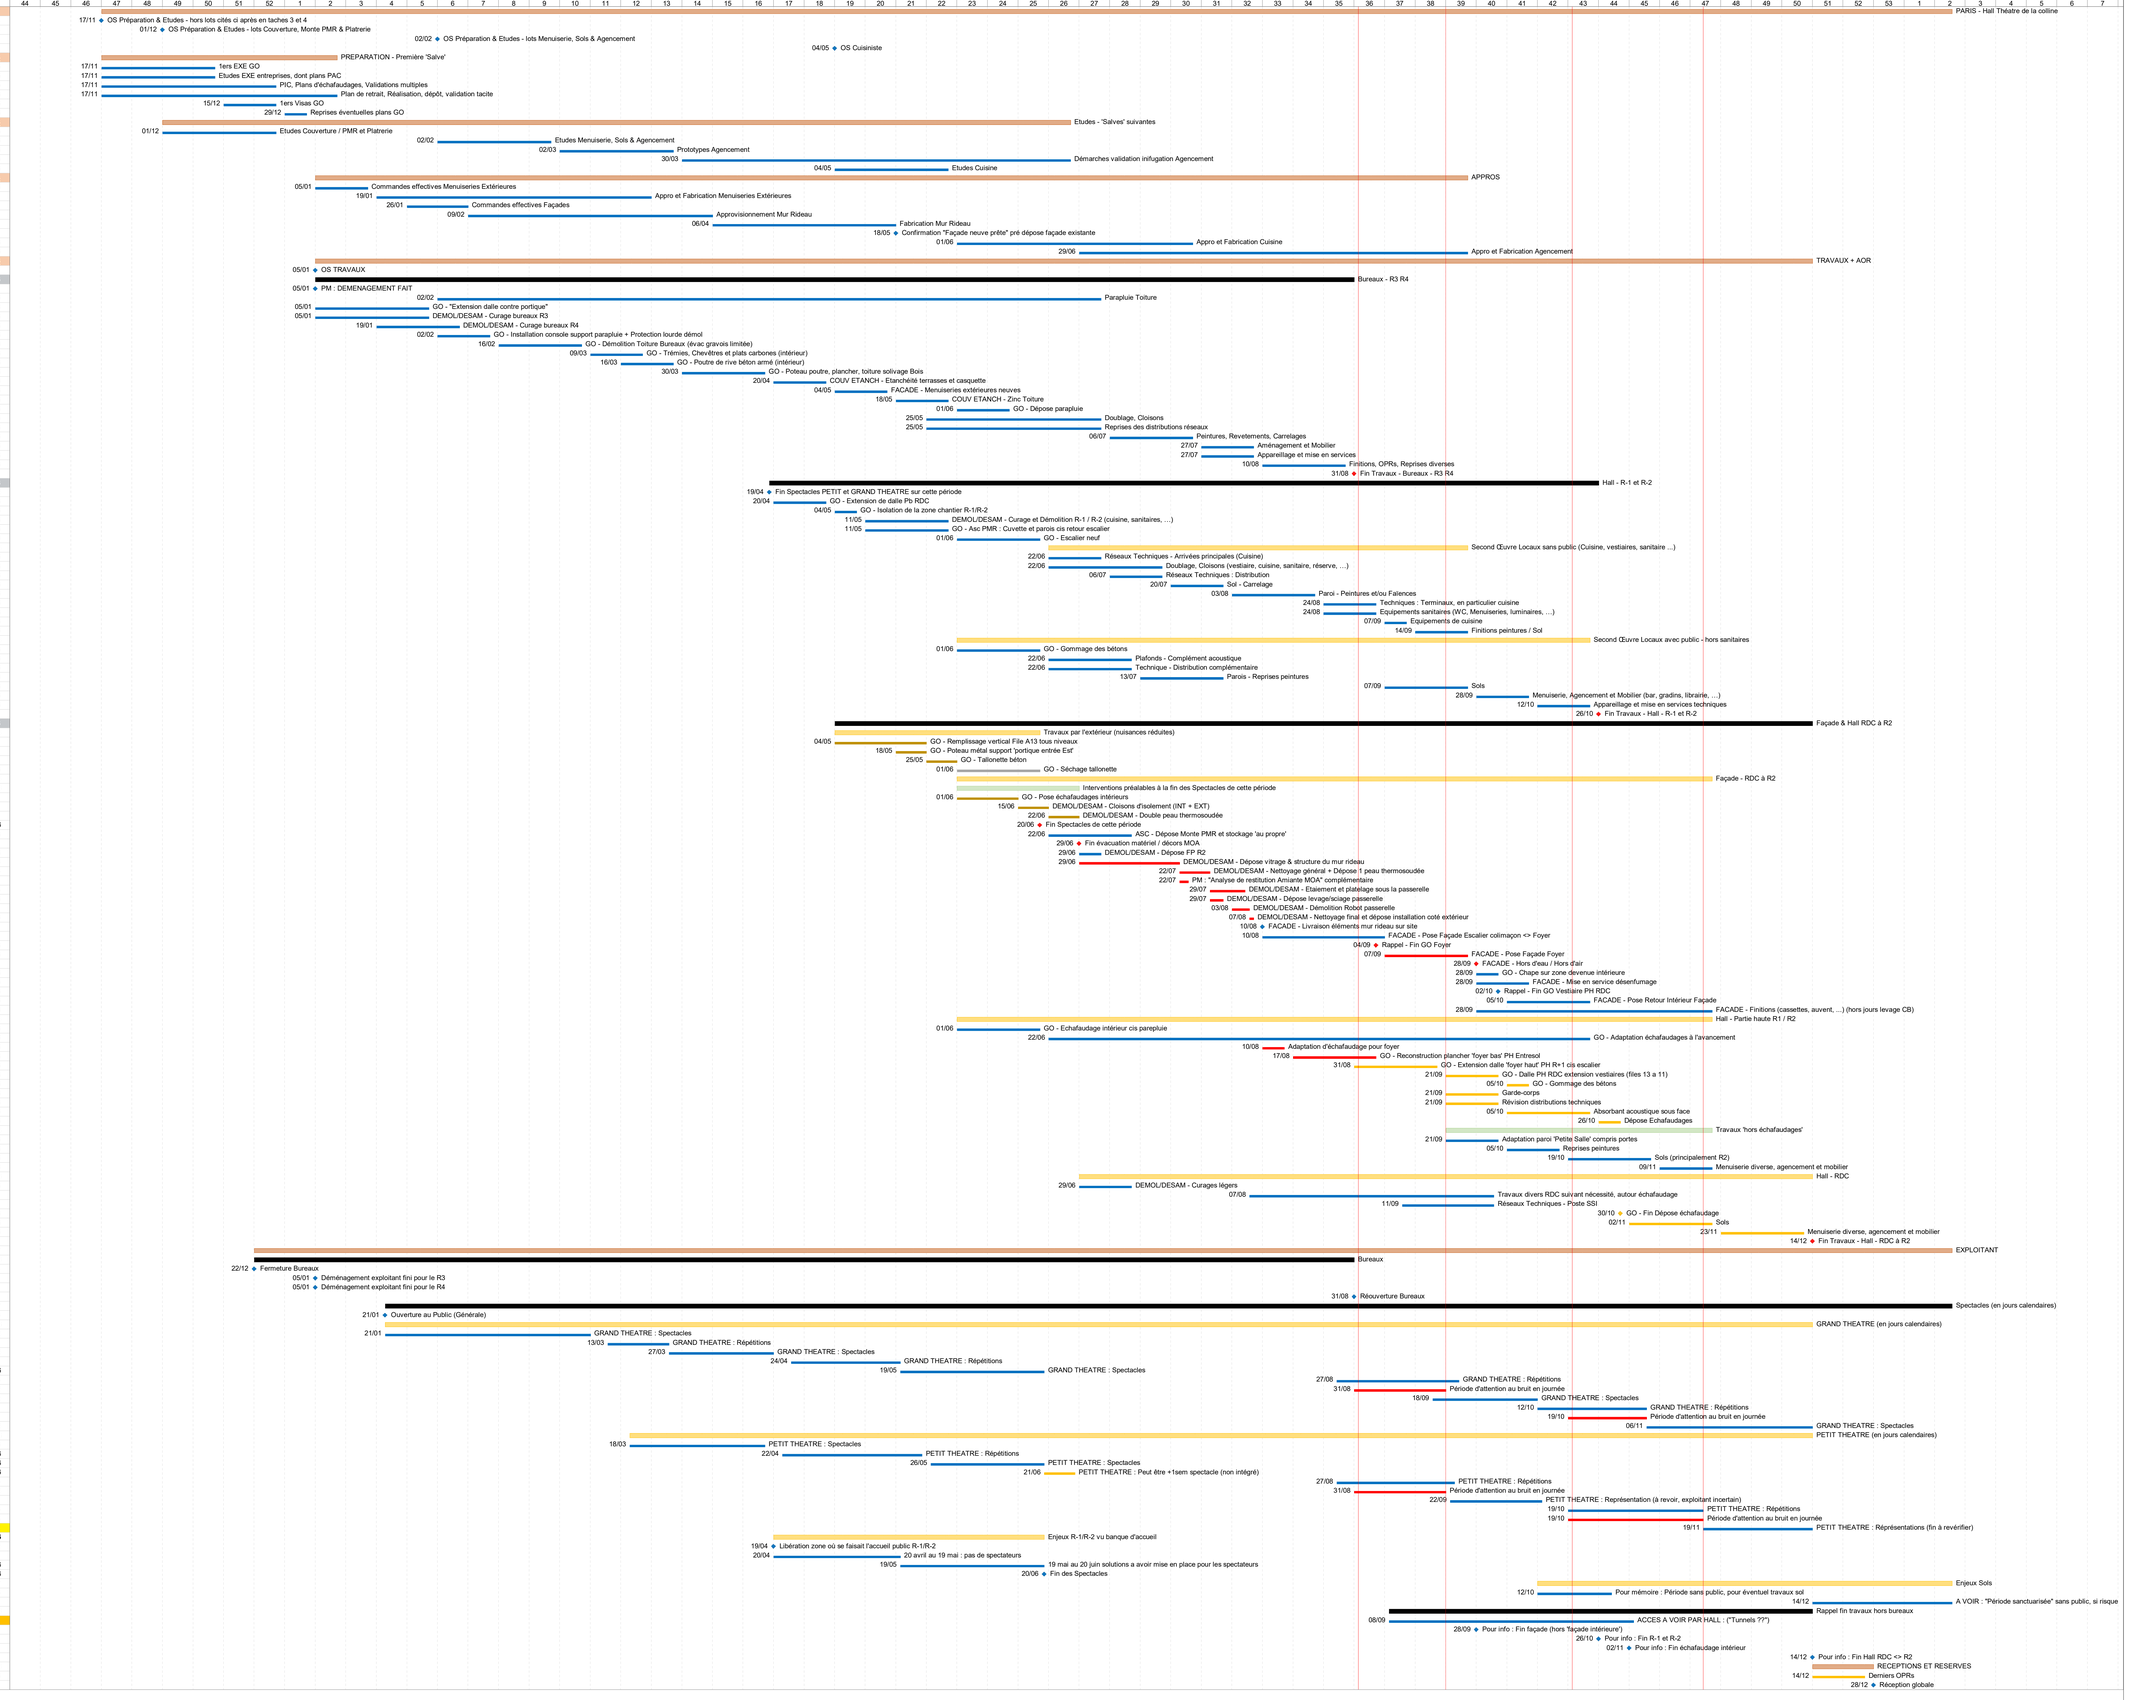N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	**PARIS - Hall Théatre de la colline**	**304 jours**	**Lun 17/11/25**	**Jeu 14/01/27**
2	OS Préparation & Etudes - hors lots cités ci après en taches 3 et 4	0 jour	Lun 17/11/25	Lun 17/11/25
3	OS Préparation & Etudes - lots Couverture, Monte PMR & Platrerie	0 jour	Lun 01/12/25	Lun 01/12/25
4	OS Préparation & Etudes - lots Menuiserie, Sols & Agencement	0 jour	Lun 02/02/26	Lun 02/02/26
5	OS Cuisiniste	0 jour	Lun 04/05/26	Lun 04/05/26
6	**PREPARATION - Première 'Salve'**	**40 jours**	**Lun 17/11/25**	**Ven 09/01/26**
7	1ers EXE GO	20 jours	Lun 17/11/25	Ven 12/12/25
8	Etudes EXE entreprises, dont plans PAC	20 jours	Lun 17/11/25	Ven 12/12/25
9	PIC, Plans d'échafaudages, Validations multiples	30 jours	Lun 17/11/25	Ven 26/12/25
10	Plan de retrait, Réalisation, dépôt, validation tacite	40 jours	Lun 17/11/25	Ven 09/01/26
11	1ers Visas GO	10 jours	Lun 15/12/25	Ven 26/12/25
12	Reprises éventuelles plans GO	5 jours	Lun 29/12/25	Ven 02/01/26
13	**Etudes - 'Salves' suivantes**	**150 jours**	**Lun 01/12/25**	**Ven 26/06/26**
14	Etudes Couverture / PMR et Platrerie	20 jours	Lun 01/12/25	Ven 26/12/25
15	Etudes Menuiserie, Sols & Agencement	20 jours	Lun 02/02/26	Ven 27/02/26
16	Prototypes Agencement	20 jours	Lun 02/03/26	Ven 27/03/26
17	Démarches validation inifugation Agencement	65 jours	Lun 30/03/26	Ven 26/06/26
18	Etudes Cuisine	20 jours	Lun 04/05/26	Ven 29/05/26
19	**APPROS**	**190 jours**	**Lun 05/01/26**	**Ven 25/09/26**
20	Commandes effectives Menuiseries Extérieures	10 jours	Lun 05/01/26	Ven 16/01/26
21	Appro et Fabrication Menuiseries Extérieures	45 jours	Lun 19/01/26	Lun 23/03/26
22	Commandes effectives Façades	10 jours	Lun 26/01/26	Lun 09/02/26
23	Approvisionnement Mur Rideau	40 jours	Lun 09/02/26	Lun 06/04/26
24	Fabrication Mur Rideau	30 jours	Lun 06/04/26	Lun 18/05/26
25	Confirmation "Façade neuve prête" pré dépose façade existante	0 jour	Lun 18/05/26	Lun 18/05/26
26	Appro et Fabrication Cuisine	40 jours	Lun 01/06/26	Ven 24/07/26
27	Appro et Fabrication Agencement	65 jours	Lun 29/06/26	Ven 25/09/26
28	**TRAVAUX + AOR**	**245 jours**	**Lun 05/01/26**	**Lun 14/12/26**
29	OS TRAVAUX	0 jour	Lun 05/01/26	Lun 05/01/26
30	**Bureaux - R3 R4**	**170 jours**	**Lun 05/01/26**	**Lun 31/08/26**
31	PM : DEMENAGEMENT FAIT	0 jour	Lun 05/01/26	Lun 05/01/26
32	Parapluie Toiture	110 jours	Lun 02/02/26	Ven 03/07/26
33	GO - "Extension dalle contre portique"	20 jours	Lun 05/01/26	Ven 30/01/26
34	DEMOL/DESAM - Curage bureaux R3	20 jours	Lun 05/01/26	Ven 30/01/26
35	DEMOL/DESAM - Curage bureaux R4	15 jours	Lun 19/01/26	Ven 06/02/26
36	GO - Installation console support parapluie + Protection lourde démol	10 jours	Lun 02/02/26	Ven 13/02/26
37	GO - Démolition Toiture Bureaux (évac gravois limitée)	15 jours	Lun 16/02/26	Ven 06/03/26
38	GO - Trémies, Chevêtres et plats carbones (intérieur)	10 jours	Lun 09/03/26	Ven 20/03/26
39	GO - Poutre de rive béton armé (intérieur)	10 jours	Lun 16/03/26	Ven 27/03/26
40	GO - Poteau poutre, plancher, toiture solivage Bois	15 jours	Lun 30/03/26	Ven 17/04/26
41	COUV ETANCH - Etanchéité terrasses et casquette	10 jours	Lun 20/04/26	Ven 01/05/26
42	FACADE - Menuiseries extérieures neuves	10 jours	Lun 04/05/26	Ven 15/05/26
43	COUV ETANCH - Zinc Toiture	10 jours	Lun 18/05/26	Ven 29/05/26
44	GO - Dépose parapluie	10 jours	Lun 01/06/26	Ven 12/06/26
45	Doublage, Cloisons	30 jours	Lun 25/05/26	Ven 03/07/26
46	Reprises des distributions réseaux	30 jours	Lun 25/05/26	Ven 03/07/26
47	Peintures, Revetements, Carrelages	15 jours	Lun 06/07/26	Ven 24/07/26
48	Aménagement et Mobilier	10 jours	Lun 27/07/26	Ven 07/08/26
49	Appareillage et mise en services	10 jours	Lun 27/07/26	Ven 07/08/26
50	Finitions, OPRs, Reprises diverses	15 jours	Lun 10/08/26	Ven 28/08/26
51	Fin Travaux - Bureaux - R3 R4	0 jour	Lun 31/08/26	Lun 31/08/26
52	**Hall - R-1 et R-2**	**135 jours**	**Dim 19/04/26**	**Lun 26/10/26**
53	Fin Spectacles PETIT et GRAND THEATRE sur cette période	0 jour	Dim 19/04/26	Dim 19/04/26
54	GO - Extension de dalle Pb RDC	10 jours	Lun 20/04/26	Ven 01/05/26
55	GO - Isolation de la zone chantier R-1/R-2	5 jours	Lun 04/05/26	Ven 08/05/26
56	DEMOL/DESAM - Curage et Démolition R-1 / R-2 (cuisine, sanitaires, …)	15 jours	Lun 11/05/26	Ven 29/05/26
57	GO - Asc PMR : Cuvette et parois cis retour escalier	15 jours	Lun 11/05/26	Ven 29/05/26
58	GO - Escalier neuf	15 jours	Lun 01/06/26	Ven 19/06/26
59	**Second Œuvre Locaux sans public (Cuisine, vestiaires, sanitaire …)**	**70 jours**	**Lun 22/06/26**	**Ven 25/09/26**
60	Réseaux Techniques - Arrivées principales (Cuisine)	10 jours	Lun 22/06/26	Ven 03/07/26
61	Doublage, Cloisons (vestiaire, cuisine, sanitaire, réserve, …)	20 jours	Lun 22/06/26	Ven 17/07/26
62	Réseaux Techniques : Distribution	10 jours	Lun 06/07/26	Ven 17/07/26
63	Sol - Carrelage	10 jours	Lun 20/07/26	Ven 31/07/26
64	Paroi - Peintures et/ou Faiences	15 jours	Lun 03/08/26	Ven 21/08/26
65	Techniques : Terminaux, en particulier cuisine	10 jours	Lun 24/08/26	Ven 04/09/26
66	Equipements sanitaires (WC, Menuiseries, luminaires, …)	10 jours	Lun 24/08/26	Ven 04/09/26
67	Equipements de cuisine	5 jours	Lun 07/09/26	Ven 11/09/26
68	Finitions peintures / Sol	10 jours	Lun 14/09/26	Ven 25/09/26
69	**Second Œuvre Locaux avec public - hors sanitaires**	**105 jours**	**Lun 01/06/26**	**Ven 23/10/26**
70	GO - Gommage des bétons	15 jours	Lun 01/06/26	Ven 19/06/26
71	Plafonds - Complément acoustique	15 jours	Lun 22/06/26	Ven 10/07/26
72	Technique - Distribution complémentaire	15 jours	Lun 22/06/26	Ven 10/07/26
73	Parois - Reprises peintures	15 jours	Lun 13/07/26	Ven 31/07/26
74	Sols	15 jours	Lun 07/09/26	Ven 25/09/26
75	Menuiserie, Agencement et Mobilier (bar, gradins, librairie, …)	10 jours	Lun 28/09/26	Ven 09/10/26
76	Appareillage et mise en services techniques	10 jours	Lun 12/10/26	Ven 23/10/26
77	Fin Travaux - Hall - R-1 et R-2	0 jour	Lun 26/10/26	Lun 26/10/26
78	**Façade & Hall RDC à R2**	**160 jours**	**Lun 04/05/26**	**Lun 14/12/26**
79	**Travaux par l'extérieur (nuisances réduites)**	**35 jours**	**Lun 04/05/26**	**Ven 19/06/26**
80	GO - Remplissage vertical File A13 tous niveaux	15 jours	Lun 04/05/26	Lun 25/05/26
81	GO - Poteau métal support 'portique entrée Est'	5 jours	Lun 18/05/26	Lun 25/05/26
82	GO - Tallonette béton	5 jours	Lun 25/05/26	Lun 01/06/26
83	GO - Séchage tallonette	15 jours	Lun 01/06/26	Ven 19/06/26
84	**Façade - RDC à R2**	**125 jours**	**Lun 01/06/26**	**Ven 20/11/26**
85	**Interventions préalables à la fin des Spectacles de cette période**	**20 jours**	**Lun 01/06/26**	**Lun 29/06/26**
86	GO - Pose échafaudages intérieurs	10 jours	Lun 01/06/26	Lun 15/06/26
87	DEMOL/DESAM - Cloisons d'isolement (INT + EXT)	5 jours	Lun 15/06/26	Lun 22/06/26
88	DEMOL/DESAM - Double peau thermosoudée	5 jours	Lun 22/06/26	Lun 29/06/26
89	Fin Spectacles de cette période	0 jour	Sam 20/06/26	Sam 20/06/26
90	ASC - Dépose Monte PMR et stockage 'au propre'	15 jours	Lun 22/06/26	Ven 10/07/26
91	Fin évacuation matériel / décors MOA	0 jour	Lun 29/06/26	Lun 29/06/26
92	DEMOL/DESAM - Dépose FP R2	5 jours	Lun 29/06/26	Ven 03/07/26
93	DEMOL/DESAM - Dépose vitrage & structure du mur rideau	17 jours	Lun 29/06/26	Mar 21/07/26
94	DEMOL/DESAM - Nettoyage général + Dépose 1 peau thermosoudée	5 jours	Mer 22/07/26	Mar 28/07/26
95	PM : "Analyse de restitution Amiante MOA" complémentaire	2 jours	Mer 22/07/26	Jeu 23/07/26
96	DEMOL/DESAM - Etalement et platelage sous la passerelle	6 jours	Mer 29/07/26	Mer 05/08/26
97	DEMOL/DESAM - Dépose levage/sciage passerelle	3 jours	Mer 29/07/26	Ven 31/07/26
98	DEMOL/DESAM - Démolition Robot passerelle	4 jours	Lun 03/08/26	Jeu 06/08/26
99	DEMOL/DESAM - Nettoyage final et dépose installation coté extérieur	1 jour	Ven 07/08/26	Ven 07/08/26
100	FACADE - Livraison éléments mur rideau sur site	0 jour	Lun 10/08/26	Lun 10/08/26
101	FACADE - Pose Façade Escalier colimaçon <> Foyer	20 jours	Lun 10/08/26	Lun 07/09/26
102	Rappel - Fin GO Foyer	0 jour	Ven 04/09/26	Ven 04/09/26
103	FACADE - Pose Façade Foyer	15 jours	Lun 07/09/26	Ven 25/09/26
104	FACADE - Hors d'eau / Hors d'air	0 jour	Lun 28/09/26	Lun 28/09/26
105	GO - Chape sur zone devenue intérieure	5 jours	Lun 28/09/26	Ven 02/10/26
106	FACADE - Mise en service désenfumage	10 jours	Lun 28/09/26	Ven 09/10/26
107	Rappel - Fin GO Vestiaire PH RDC	0 jour	Ven 02/10/26	Ven 02/10/26
108	FACADE - Pose Retour Intérieur Façade	15 jours	Lun 05/10/26	Ven 23/10/26
109	FACADE - Finitions (cassettes, auvent, …) (hors jours levage CB)	40 jours	Lun 28/09/26	Ven 20/11/26
110	**Hall - Partie haute R1 / R2**	**125 jours**	**Lun 01/06/26**	**Ven 20/11/26**
111	GO - Echafaudage intérieur cis parepluie	15 jours	Lun 01/06/26	Ven 19/06/26
112	GO - Adaptation échafaudages à l'avancement	90 jours	Lun 22/06/26	Ven 23/10/26
113	Adaptation d'échafaudage pour foyer	5 jours	Lun 10/08/26	Ven 14/08/26
114	GO - Reconstruction plancher 'foyer bas' PH Entresol	15 jours	Lun 17/08/26	Ven 04/09/26
115	GO - Extension dalle 'foyer haut' PH R+1 cis escalier	15 jours	Lun 31/08/26	Ven 18/09/26
116	GO - Dalle PH RDC extension vestiaires (files 13 a 11)	10 jours	Lun 21/09/26	Ven 02/10/26
117	GO - Gommage des bétons	5 jours	Lun 05/10/26	Ven 09/10/26
118	Garde-corps	10 jours	Lun 21/09/26	Ven 02/10/26
119	Révision distributions techniques	10 jours	Lun 21/09/26	Ven 02/10/26
120	Absorbant acoustique sous face	15 jours	Lun 05/10/26	Ven 23/10/26
121	Dépose Echafaudages	5 jours	Lun 26/10/26	Ven 30/10/26
122	**Travaux 'hors échafaudages'**	**45 jours**	**Lun 21/09/26**	**Ven 20/11/26**
123	Adaptation paroi 'Petite Salle' compris portes	10 jours	Lun 21/09/26	Ven 02/10/26
124	Reprises peintures	10 jours	Lun 05/10/26	Ven 16/10/26
125	Sols (principalement R2)	15 jours	Lun 19/10/26	Ven 06/11/26
126	Menuiserie diverse, agencement et mobilier	10 jours	Lun 09/11/26	Ven 20/11/26
127	**Hall - RDC**	**120 jours**	**Lun 29/06/26**	**Lun 14/12/26**
128	DEMOL/DESAM - Curages légers	10 jours	Lun 29/06/26	Ven 10/07/26
129	Travaux divers RDC suivant nécessité, autour échafaudage	40 jours	Ven 07/08/26	Jeu 01/10/26
130	Réseaux Techniques - Poste SSI	15 jours	Ven 11/09/26	Jeu 01/10/26
131	GO - Fin Dépose échafaudage	0 jour	Ven 30/10/26	Ven 30/10/26
132	Sols	15 jours	Lun 02/11/26	Ven 20/11/26
133	Menuiserie diverse, agencement et mobilier	15 jours	Lun 23/11/26	Ven 11/12/26
134	Fin Travaux - Hall - RDC à R2	0 jour	Lun 14/12/26	Lun 14/12/26
135	**EXPLOITANT**	**273 jours**	**Lun 22/12/25**	**Jeu 14/01/27**
136	**Bureaux**	**180 jours**	**Lun 22/12/25**	**Lun 31/08/26**
137	Fermeture Bureaux	0 jour	Lun 22/12/25	Lun 22/12/25
138	Déménagement exploitant fini pour le R3	0 jour	Lun 05/01/26	Lun 05/01/26
139	Déménagement exploitant fini pour le R4	0 jour	Lun 05/01/26	Lun 05/01/26
140	Réouverture Bureaux	0 jour	Lun 31/08/26	Lun 31/08/26
141	**Spectacles (en jours calendaires)**	**359 jours**	**Mer 21/01/26**	**Jeu 14/01/27**
142	Ouverture au Public (Générale)	0 jour	Mer 21/01/26	Mer 21/01/26
143	**GRAND THEATRE (en jours calendaires)**	**327 jours**	**Mer 21/01/26**	**Dim 13/12/26**
144	GRAND THEATRE : Spectacles	47 jours	Mer 21/01/26	Dim 08/03/26
145	GRAND THEATRE : Répétitions	14 jours	Ven 13/03/26	Jeu 26/03/26
146	GRAND THEATRE : Spectacles	24 jours	Ven 27/03/26	Dim 19/04/26
147	GRAND THEATRE : Répétitions	25 jours	Ven 24/04/26	Lun 18/05/26
148	GRAND THEATRE : Spectacles	33 jours	Mar 19/05/26	Sam 20/06/26
149	GRAND THEATRE : Répétitions	28 jours	Jeu 27/08/26	Mer 23/09/26
150	Période d'attention au bruit en journée	21 jours	Lun 31/08/26	Dim 20/09/26
151	GRAND THEATRE : Spectacles	24 jours	Ven 18/09/26	Dim 11/10/26
152	GRAND THEATRE : Répétitions	25 jours	Lun 12/10/26	Jeu 05/11/26
153	Période d'attention au bruit en journée	18 jours	Lun 19/10/26	Jeu 05/11/26
154	GRAND THEATRE : Spectacles	38 jours	Ven 06/11/26	Dim 13/12/26
155	**PETIT THEATRE (en jours calendaires)**	**271 jours**	**Mer 18/03/26**	**Dim 13/12/26**
156	PETIT THEATRE : Spectacles	31 jours	Mer 18/03/26	Ven 17/04/26
157	PETIT THEATRE : Répétitions	32 jours	Mer 22/04/26	Sam 23/05/26
158	PETIT THEATRE : Spectacles	26 jours	Mar 26/05/26	Sam 20/06/26
159	PETIT THEATRE : Peut être +1sem spectacle (non intégré)	7 jours	Dim 21/06/26	Sam 27/06/26
160	PETIT THEATRE : Répétitions	27 jours	Jeu 27/08/26	Mar 22/09/26
161	Période d'attention au bruit en journée	21 jours	Lun 31/08/26	Dim 20/09/26
162	PETIT THEATRE : Représentation (à revoir, exploitant incertain)	21 jours	Mar 22/09/26	Lun 12/10/26
163	PETIT THEATRE : Répétitions	31 jours	Lun 19/10/26	Mer 18/11/26
164	Période d'attention au bruit en journée	31 jours	Lun 19/10/26	Mer 18/11/26
165	PETIT THEATRE : Répresentations (fin à revérifier)	25 jours	Jeu 19/11/26	Dim 13/12/26
166	**Enjeux R-1/R-2 vu banque d'accueil**	**45 jours**	**Dim 19/04/26**	**Sam 20/06/26**
167	Libération zone où se faisait l'accueil public R-1/R-2	0 jour	Dim 19/04/26	Dim 19/04/26
168	20 avril au 19 mai : pas de spectateurs	29 jours	Lun 20/04/26	Lun 18/05/26
169	19 mai au 20 juin solutions a avoir mise en place pour les spectateurs	33 jours	Mar 19/05/26	Sam 20/06/26
170	Fin des Spectacles	0 jour	Sam 20/06/26	Sam 20/06/26
171	**Enjeux Sols**	**69 jours**	**Lun 12/10/26**	**Jeu 14/01/27**
172	Pour mémoire : Période sans public, pour éventuel travaux sol	17 jours	Lun 12/10/26	Mer 28/10/26
173	A VOIR : "Période sanctuarisée" sans public, si risque	32 jours	Lun 14/12/26	Jeu 14/01/27
174	**Rappel fin travaux hors bureaux**	**69 jours**	**Mar 08/09/26**	**Lun 14/12/26**
175	ACCES A VOIR PAR HALL : ("Tunnels ??")	40 jours	Mar 08/09/26	Lun 02/11/26
176	Pour info : Fin façade (hors 'façade intérieure')	0 jour	Lun 28/09/26	Lun 28/09/26
177	Pour info : Fin R-1 et R-2	0 jour	Lun 26/10/26	Lun 26/10/26
178	Pour info : Fin échafaudage intérieur	0 jour	Lun 02/11/26	Lun 02/11/26
179	Pour info : Fin Hall RDC <> R2	0 jour	Lun 14/12/26	Lun 14/12/26
180	**RECEPTIONS ET RESERVES**	**10 jours**	**Lun 14/12/26**	**Lun 28/12/26**
181	Derniers OPRs	10 jours	Lun 14/12/26	Ven 25/12/26
182	Réception globale	0 jour	Lun 28/12/26	Lun 28/12/26
