Maître d'ouvrage :
Comédie Française
1 Place Colette 75001 Paris

COMEDIE FRANCAISE - SITE RICHELIEU
1 Place Colette, 75001 Paris
TRAVAUX DE RENOVATION DU FOYER
PIERRE DUX

CALENDRIER D'EXECUTION TRAVAUX_PRO/DCE
FPDU-2026
25.07.2025

N°	Entité	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Année
1		CF_COM_OPC_CLD_TZN_TSN_CALENDRIER GENERAL D'EXECUTION TCE_02	1621 jr	Ven 14/04/23	Mer 17/10/29	
82		Travaux rénovation énergétique 2025 à 2029	1621 jr	Ven 14/04/23	Mer 17/10/29	RE 2025
736		Travaux direction technique 2026 (phase 3)	269 jrs	Lun 28/07/25	Mer 26/08/26	DT 2026
1149		Travaux Foyer Pierre Dux 2026	203 jrs	Lun 03/11/25	Lun 31/08/26	PDU
1150	TCE	Période de préparation de chantier travaux Pierre Dux	53 jrs	Lun 03/11/25	Ven 23/01/26	PDU
1151	MOA	Fermeture du théâtre au public en 2026	156 jrs	Ven 16/01/26	Lun 31/08/26	PDU
1152	MOA	Déménagement de la Comédie	6 jrs	Ven 16/01/26	Ven 23/01/26	PDU
1153	TCE	Travaux Foyer Pierre Dux	120 jrs	Lun 19/01/26	Ven 10/07/26	PDU
1154		Remplacement des menuiseries extérieures FPDux + GTB	5 jrs	Lun 26/01/26	Ven 30/01/26	RE 2026
1155	Lot Men. Ext	Remplacement fenêtres R+2/R+3- type A2 (5 unités)	5 jrs	Lun 26/01/26	Ven 30/01/26	RE 2026
1156		Curage bar + réseaux existants	10 jrs	Lun 19/01/26	Ven 30/01/26	PDU
1157	MOA	Déménagement mobiliers existants, équipements bars, bustes et lustres	5 jrs	Lun 19/01/26	Ven 23/01/26	PDU
1158	MOA	Consignation CVC/PLB	1 jr	Lun 26/01/26	Lun 26/01/26	PDU
1159	MOA	Consignations CFO/CFA	1 jr	Lun 26/01/26	Lun 26/01/26	PDU
1160	Lot CFO/CFA	Curage TD EL13bis	2 jrs	Mar 27/01/26	Mer 28/01/26	PDU
1161	Lot agencement bar	Curage du bar existant (yc réseaux CFO/CFA et ECS/EFS)	4 jrs	Mar 27/01/26	Ven 30/01/26	PDU
1162		Tirage de nouveaux réseaux	25 jrs	Mar 27/01/26	Lun 02/03/26	PDU
1163	Lot menuiseries/ parquet	Dépose soignée du parquet pour passage des réseaux	5 jrs	Mar 27/01/26	Lun 02/02/26	PDU
1164	Lot menuiseries/ parquet	Intégration de trappes pour les boitiers électriques dans les socles des bustes	4 jrs	Mar 03/02/26	Ven 06/02/26	PDU
1165	Lot maçonnerie/ marbrerie/ ferronnerie	Saignée entre la galerie des bustes et le Foyer pour passage des réseaux	1 jr	Mar 03/02/26	Mar 03/02/26	PDU
1166	Lot CVC/PLB/GTB	Pose des boitiers GTB et boitiers stores	2 jrs	Mar 03/02/26	Mer 04/02/26	RE 2026
1167	Lot CVC/PLB/GTB	Tirage des réseaux liés aux boitiers GTB et raccordement aux stores	4 jrs	Mer 04/02/26	Lun 09/02/26	RE 2026
1168	Lot stores	Pose et raccordement des 5 stores motorisés à la GTB façade Ouest	3 jrs	Mar 10/02/26	Jeu 12/02/26	RE 2026
1169	Lot CFO/CFA	Tirages de câbles CFO pour eclairage de l'escalier d'honneur	3 jrs	Mer 04/02/26	Ven 06/02/26	PDU
1170	Lot CVC/PLB/GTB	Dévoiement réseaux ECS/EF et EU pour nouvelle position du bar	5 jrs	Mar 03/02/26	Lun 09/02/26	PDU
1171	Lot CVC/PLB/GTB	Tirage réseaux CVC pour les VCO	5 jrs	Mar 10/02/26	Lun 16/02/26	PDU
1172	Lot CFO/CFA	Tirages de câbles CFO/CFA pour le bar	5 jrs	Mar 10/02/26	Lun 16/02/26	PDU
1173	Lot CFO/CFA	Tirages de câbles CFO/CFA pour la coque FPDU	5 jrs	Mar 17/02/26	Lun 23/02/26	PDU
1174	Lot CFO/CFA	Pose de boitiers dans les colonnes de bustes	5 jrs	Mar 24/02/26	Lun 02/03/26	PDU
1175	Lot CVC/PLB/GTB	Pose des 4 VCO sous les fenêtres extérieures	2 jrs	Mar 17/02/26	Mer 18/02/26	PDU
1176	Lot CVC/PLB/GTB	Pose des 3 VCO au niveau de l'arrière bar	2 jrs	Jeu 19/02/26	Ven 20/02/26	PDU
1177	MOE	Bon pour fermeture	0 jr	Ven 20/02/26	Ven 20/02/26	PDU
1178	Lot menuiseries/ parquet	Repose du parquet déposé	5 jrs	Lun 23/02/26	Ven 27/02/26	PDU
1179		Bureaux Niveaux R+1	20 jrs	Mar 10/02/26	Lun 09/03/26	
1180	Lot CFO/CFA	Tirages de câbles CFO/CFA pour le bar	5 jrs	Mar 10/02/26	Lun 16/02/26	PDU
1181	Lot CFO/CFA	Tirages de câbles CFO/CFA pour la coque FPDU	5 jrs	Mar 17/02/26	Lun 23/02/26	PDU
1182	MOE	Bon pour fermeture	0 jr	Lun 23/02/26	Lun 23/02/26	PDU
1183	Lot restauration de décors/ staff/ stuc/ marbre/ peinture décorative/ dorure	Fourniture et pose de caissons droit en façon retombées de plafonds en panneaux bois menuisés	5 jrs	Mar 24/02/26	Lun 02/03/26	PDU
1184	Lot restauration de décors/ staff/ stuc/ marbre/ peinture décorative/ dorure	Peinture des caissons	5 jrs	Mar 03/03/26	Lun 09/03/26	PDU
1185		Restauration de la coque du FPDux	71 jrs	Lun 02/03/26	Lun 15/06/26	PDU
1186	Lot restauration de décors/ staff/ stuc/ marbre/ peinture décorative/ dorure	Pose échaffaudage + platelage (pour la toile tendue du plafond + les élévations) + sapine	3 jrs	Lun 02/03/26	Mer 04/03/26	PDU
1187	Lot restauration de décors/ staff/ stuc/ marbre/ peinture décorative/ dorure	Restauration/nettoyage peintures toile tendue	15 jrs	Jeu 05/03/26	Mer 25/03/26	PDU
1188	Lot restauration de décors/ staff/ stuc/ marbre/ peinture décorative/ dorure	Restauration des peintures et dorures en partie murale sur élévations plombées	20 jrs	Jeu 19/03/26	Jeu 16/04/26	PDU
1189	Lot restauration de décors/ staff/ stuc/ marbre/ peinture décorative/ dorure	Restitution des décors en parties hautes des élévations - en option	20 jrs	Jeu 26/03/26	Jeu 23/04/26	PDU
1190	Lot menuiseries/ parquet	Révision sur place des portes-fenêtres existantes (élevations Nord, Est et Sud)	7 jrs	Ven 24/04/26	Mar 05/05/26	PDU
1191	Lot menuiseries/ parquet	Restitution des vitrages clairs	3 jrs	Lun 04/05/26	Mer 06/05/26	PDU
1192	Lot restauration de décors/ staff/ stuc/ marbre/ peinture décorative/ dorure	Dépose de l'échaffaudage + platelage	2 jrs	Jeu 07/05/26	Lun 11/05/26	PDU
1193	Lot menuiseries/ parquet	Révision sur place de lambris d'appui, plinthes et cimaises plates	5 jrs	Mar 12/05/26	Mar 19/05/26	PDU
1194	Lot menuiseries/ parquet	Restauration partielle du parquet, ponçage et vitrification	8 jrs	Lun 18/05/26	Jeu 28/05/26	PDU
1195	Lot menuiseries/ parquet	Restauration des gaines de bustes existantes conservées	5 jrs	Ven 29/05/26	Jeu 04/06/26	PDU
1196	Lot restauration de décors/ staff/ stuc/ marbre/ peinture décorative/ dorure	Restauration de la peinture des gaines de bustes	5 jrs	Mer 03/06/26	Mar 09/06/26	PDU
1197	Lot CVC/PLB/GTB	Pose des terminaux CVC	1 jr	Mer 10/06/26	Mer 10/06/26	PDU
1198	Lot CFO/CFA	Pose des terminaux CFO/CFA	2 jrs	Mer 10/06/26	Jeu 11/06/26	PDU
1199	Lot CFO/CFA	Mise en place nouveau TD elec	2 jrs	Ven 12/06/26	Lun 15/06/26	PDU
1200		Restitution du conduit de la cheminée - en option	46 jrs	Lun 26/01/26	Lun 30/03/26	PDU
1201	MOA	Consignation CVC/PLB	1 jr	Lun 26/01/26	Lun 26/01/26	PDU

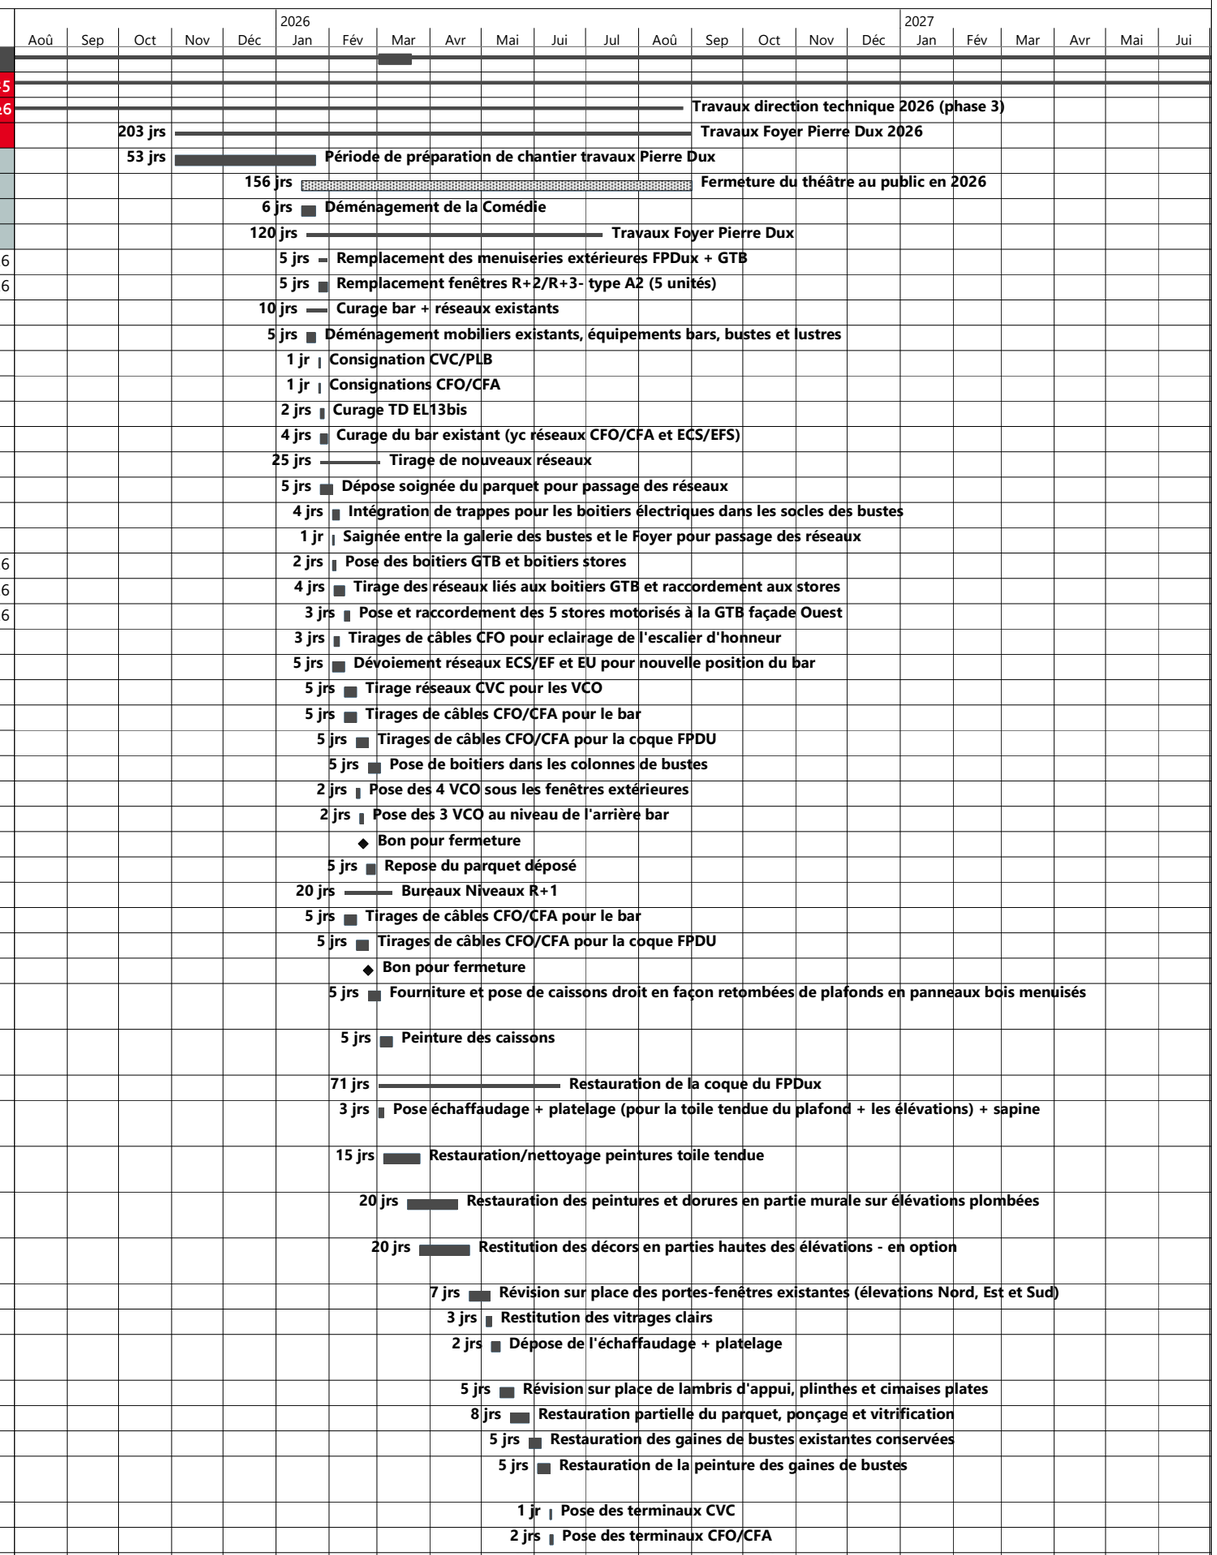

Maître d'ouvrage :
Comédie Française
1 Place Colette 75001 Paris

COMEDIE FRANCAISE - SITE RICHELIEU
1 Place Colette, 75001 Paris
TRAVAUX DE RENOVATION DU FOYER
PIERRE DUX

CALENDRIER D'EXECUTION TRAVAUX_PRO/DCE
FPDU-2026
25.07.2025
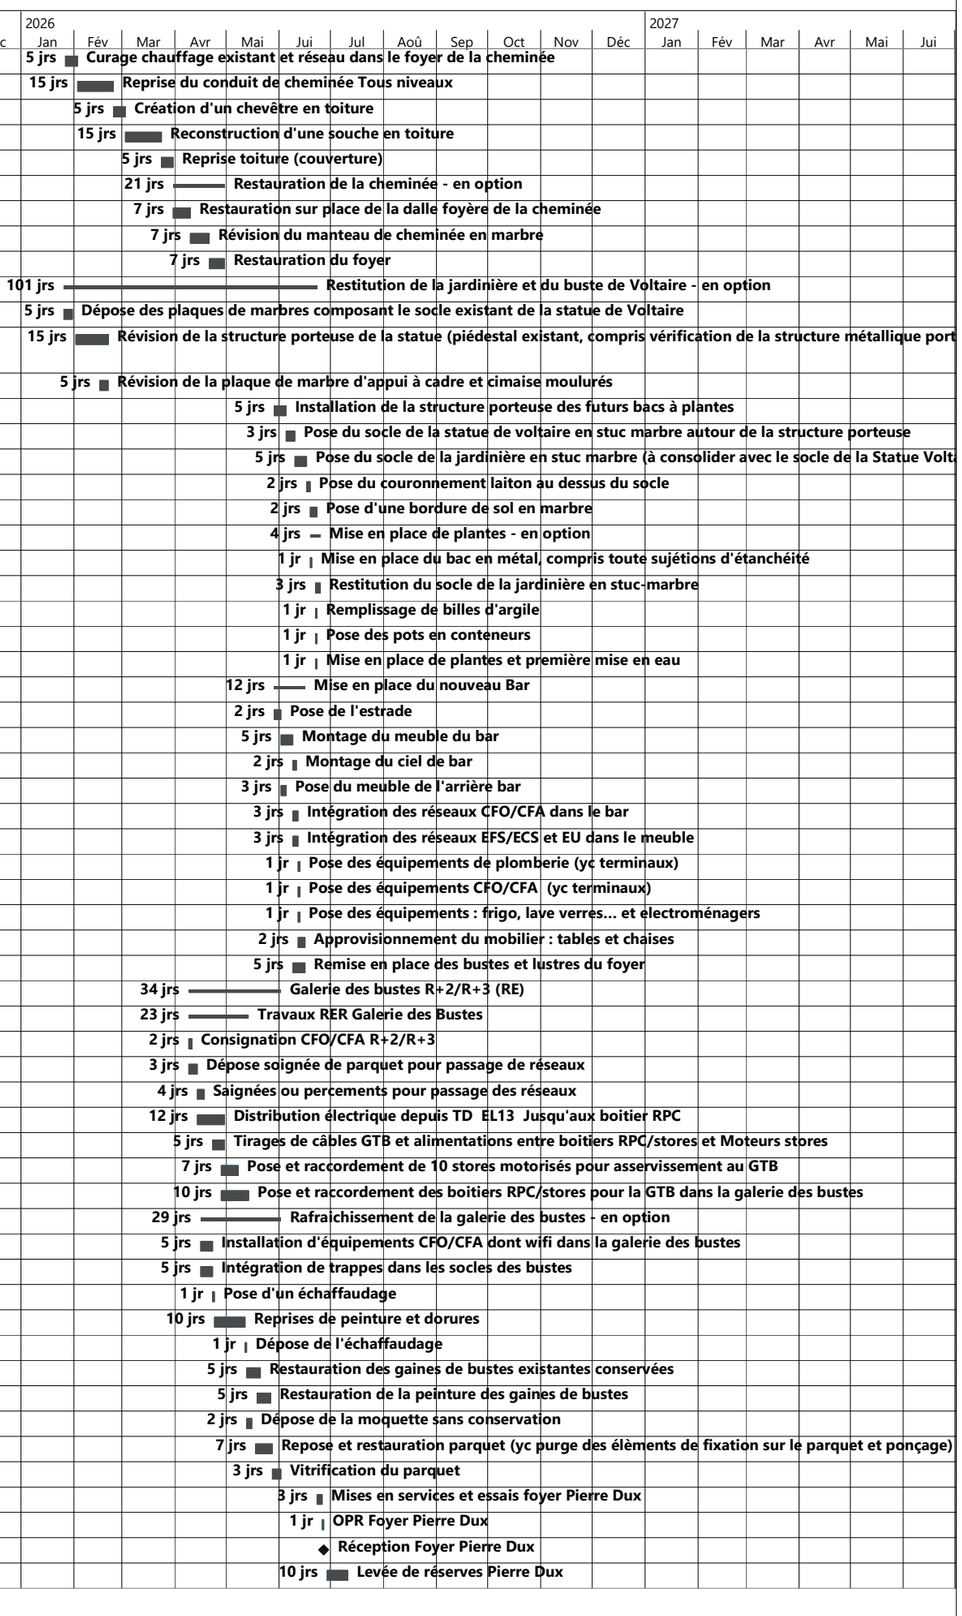
N°	Entité	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Année
1202	Lot CVC/PLB/GTB	Curage chauffage existant et réseau dans le foyer de la cheminée	5 jrs	Mar 27/01/26	Lun 02/02/26	PDU
1203	Lot maçonnerie/ marbrerie/ ferronnerie	Reprise du conduit de cheminée Tous niveaux	15 jrs	Mar 03/02/26	Lun 23/02/26	PDU
1204	Lot maçonnerie/ marbrerie/ ferronnerie	Création d'un chevêtre en toiture	5 jrs	Mar 24/02/26	Lun 02/03/26	PDU
1205	Lot maçonnerie/ marbrerie/ ferronnerie	Reconstruction d'une souche en toiture	15 jrs	Mar 03/03/26	Lun 23/03/26	PDU
1206	Lot maçonnerie/ marbrerie/ ferronnerie	Reprise toiture (couverture)	5 jrs	Mar 24/03/26	Lun 30/03/26	PDU
1207		**Restauration de la cheminée - en option**	**21 jrs**	**Mar 31/03/26**	**Mer 29/04/26**	**PDU**
1208	Lot maçonnerie/ marbrerie/ ferronnerie	Restauration sur place de la dalle foyère de la cheminée	7 jrs	Mar 31/03/26	Jeu 09/04/26	PDU
1209	Lot maçonnerie/ marbrerie/ ferronnerie	Révision du manteau de cheminée en marbre	7 jrs	Ven 10/04/26	Lun 20/04/26	PDU
1210	Lot maçonnerie/ marbrerie/ ferronnerie	Restauration du foyer	7 jrs	Mar 21/04/26	Mer 29/04/26	PDU
1211		**Restitution de la jardinière et du buste de Voltaire - en option**	**101 jrs**	**Lun 26/01/26**	**Lun 22/06/26**	**PDU**
1212	Lot maçonnerie/ marbrerie/ ferronnerie	Dépose des plaques de marbres composant le socle existant de la statue de Voltaire	5 jrs	Lun 26/01/26	Ven 30/01/26	PDU
1213	Lot maçonnerie/ marbrerie/ ferronnerie	Révision de la structure porteuse de la statue (piédestal existant, compris vérification de la structure métallique porteuse, dépose/repose des jouées d'habillage en marbre)	15 jrs	Lun 02/02/26	Ven 20/02/26	PDU
1214	Lot maçonnerie/ marbrerie/ ferronnerie	Révision de la plaque de marbre d'appui à cadre et cimaise moulurés	5 jrs	Lun 16/02/26	Ven 20/02/26	PDU
1215	Lot maçonnerie/ marbrerie/ ferronnerie	Installation de la structure porteuse des futurs bacs à plantes	5 jrs	Ven 29/05/26	Jeu 04/06/26	PDU
1216	Lot restauration de décors/ staff/ stuc/ r	Pose du socle de la statue de voltaire en stuc marbre autour de la structure porteuse	3 jrs	Ven 05/06/26	Mar 09/06/26	PDU
1217	Lot restauration de décors/ staff/ stuc/ r	Pose du socle de la jardinière en stuc marbre (à consolider avec le socle de la Statue Voltaire	5 jrs	Mer 10/06/26	Mar 16/06/26	PDU
1218	Lot restauration de décors/ staff/ stuc/ r	Pose du couronnement laiton au dessus du socle	2 jrs	Mer 17/06/26	Jeu 18/06/26	PDU
1219	Lot maçonnerie/ marbrerie/ ferronnerie	Pose d'une bordure de sol en marbre	2 jrs	Ven 19/06/26	Lun 22/06/26	PDU
1220		**Mise en place de plantes - en option**	**4 jrs**	**Ven 19/06/26**	**Mer 24/06/26**	
1221	Lot restauration de décors/ staff/ stuc/ r	Mise en place du bac en métal, compris toute sujétions d'étanchéité	1 jr	Ven 19/06/26	Ven 19/06/26	PDU
1222	Lot restauration de décors/ staff/ stuc/ r	Restitution du socle de la jardinière en stuc-marbre	3 jrs	Lun 22/06/26	Mer 24/06/26	PDU
1223	Lot restauration de décors/ staff/ stuc/ r	Remplissage de billes d'argile	1 jr	Lun 22/06/26	Lun 22/06/26	PDU
1224	Lot restauration de décors/ staff/ stuc/ r	Pose des pots en conteneurs	1 jr	Lun 22/06/26	Lun 22/06/26	PDU
1225	Lot restauration de décors/ staff/ stuc/ r	Mise en place de plantes et première mise en eau	1 jr	Lun 22/06/26	Lun 22/06/26	PDU
1226		**Mise en place du nouveau Bar**	**12 jrs**	**Ven 29/05/26**	**Lun 15/06/26**	**PDU**
1227	Lot agencement bar	Pose de l'estrade	2 jrs	Ven 29/05/26	Lun 01/06/26	PDU
1228	Lot agencement bar	Montage du meuble du bar	5 jrs	Mar 02/06/26	Lun 08/06/26	PDU
1229	Lot agencement bar	Montage du ciel de bar	2 jrs	Mar 09/06/26	Mer 10/06/26	PDU
1230	Lot agencement bar	Pose du meuble de l'arrière bar	3 jrs	Mar 02/06/26	Jeu 04/06/26	PDU
1231	Lot CFO/CFA	Intégration des réseaux CFO/CFA dans le bar	3 jrs	Mar 09/06/26	Jeu 11/06/26	PDU
1232	Lot CVC/PLB/GTB	Intégration des réseaux EFS/ECS et EU dans le meuble	3 jrs	Mar 09/06/26	Jeu 11/06/26	PDU
1233	Lot CVC/PLB/GTB	Pose des équipements de plomberie (yc terminaux)	1 jr	Ven 12/06/26	Ven 12/06/26	PDU
1234	Lot CFO/CFA	Pose des équipements CFO/CFA (yc terminaux)	1 jr	Ven 12/06/26	Ven 12/06/26	PDU
1235	Lot CVC/PLB/GTB	Pose des équipements : frigo, lave verres... et electroménagers	1 jr	Ven 12/06/26	Ven 12/06/26	PDU
1236	Lot agencement bar	Approvisionnement du mobilier : tables et chaises	2 jrs	Ven 12/06/26	Lun 15/06/26	PDU
1237	MOA	Remise en place des bustes et lustres du foyer	5 jrs	Mar 09/06/26	Lun 15/06/26	PDU
1238		**Galerie des bustes R+2/R+3 (RE)**	**34 jrs**	**Jeu 09/04/26**	**Lun 01/06/26**	**RE 2026**
1239		**Travaux RER Galerie des Bustes**	**23 jrs**	**Jeu 09/04/26**	**Mer 13/05/26**	
1240	MOA	Consignation CFO/CFA R+2/R+3	2 jrs	Jeu 09/04/26	Ven 10/04/26	RE 2026
1241	Lot second oeuvre, plâtrerie, peinture	Dépose soignée de parquet pour passage de réseaux	3 jrs	Jeu 09/04/26	Lun 13/04/26	RE 2026
1242	Lot gros oeuvre	Saignées ou percements pour passage des réseaux	4 jrs	Mar 14/04/26	Ven 17/04/26	RE 2026
1243	Lot CFO/CFA	Distribution électrique depuis TD EL13 Jusqu'aux boitier RPC	12 jrs	Mar 14/04/26	Mer 29/04/26	RE 2026
1244	Lot CVC/PLB/GTB et lot CFO/CFA	Tirages de câbles GTB et alimentations entre boitiers RPC/stores et Moteurs stores	5 jrs	Jeu 23/04/26	Mer 29/04/26	RE 2026
1245	Lot stores	Pose et raccordement de 10 stores motorisés pour asservissement au GTB	7 jrs	Mar 28/04/26	Jeu 07/05/26	RE 2026
1246	Lot CVC/PLB/GTB	Pose et raccordement des boitiers RPC/stores pour la GTB dans la galerie des bustes	10 jrs	Mar 28/04/26	Mer 13/05/26	RE 2026
1247		**Rafraichissement de la galerie des bustes - en option**	**29 jrs**	**Jeu 16/04/26**	**Lun 01/06/26**	
1248	Lot CFO/CFA	Installation d'équipements CFO/CFA dont wifi dans la galerie des bustes	5 jrs	Jeu 16/04/26	Mer 22/04/26	PDU
1249	Lot menuiseries/ parquet	Intégration de trappes dans les socles des bustes	5 jrs	Jeu 16/04/26	Mer 22/04/26	PDU
1250	Lot restauration de décors/ staff/ stuc/ r	Pose d'un échaffaudage	1 jr	Jeu 23/04/26	Jeu 23/04/26	PDU
1251	Lot restauration de décors/ staff/ stuc/ r	Reprises de peinture et dorures	10 jrs	Ven 24/04/26	Lun 11/05/26	PDU
1252	Lot restauration de décors/ staff/ stuc/ r	Dépose de l'échaffaudage	1 jr	Mar 12/05/26	Mar 12/05/26	PDU
1253	Lot menuiseries/ parquet	Restauration des gaines de bustes existantes conservées	5 jrs	Mer 13/05/26	Mer 20/05/26	PDU
1254	Lot restauration de décors/ staff/ stuc/ r	Restauration de la peinture des gaines de bustes	5 jrs	Mar 19/05/26	Mar 26/05/26	PDU
1255	Lot menuiseries/ parquet	Dépose de la moquette sans conservation	2 jrs	Mer 13/05/26	Ven 15/05/26	PDU
1256	Lot menuiseries/ parquet	Repose et restauration parquet (yc purge des élèments de fixation sur le parquet et ponç	7 jrs	Lun 18/05/26	Mer 27/05/26	PDU
1257	Lot menuiseries/ parquet	Vitrification du parquet	3 jrs	Jeu 28/05/26	Lun 01/06/26	PDU
1258	Lots techniques	Mises en services et essais foyer Pierre Dux	3 jrs	Mar 23/06/26	Jeu 25/06/26	PDU
1259	MOE	OPR Foyer Pierre Dux	1 jr	Ven 26/06/26	Ven 26/06/26	PDU
1260	MOA	Réception Foyer Pierre Dux	0 jr	Ven 26/06/26	Ven 26/06/26	PDU
1261	TCE	Levée de réserves Pierre Dux	10 jrs	Lun 29/06/26	Ven 10/07/26	PDU
