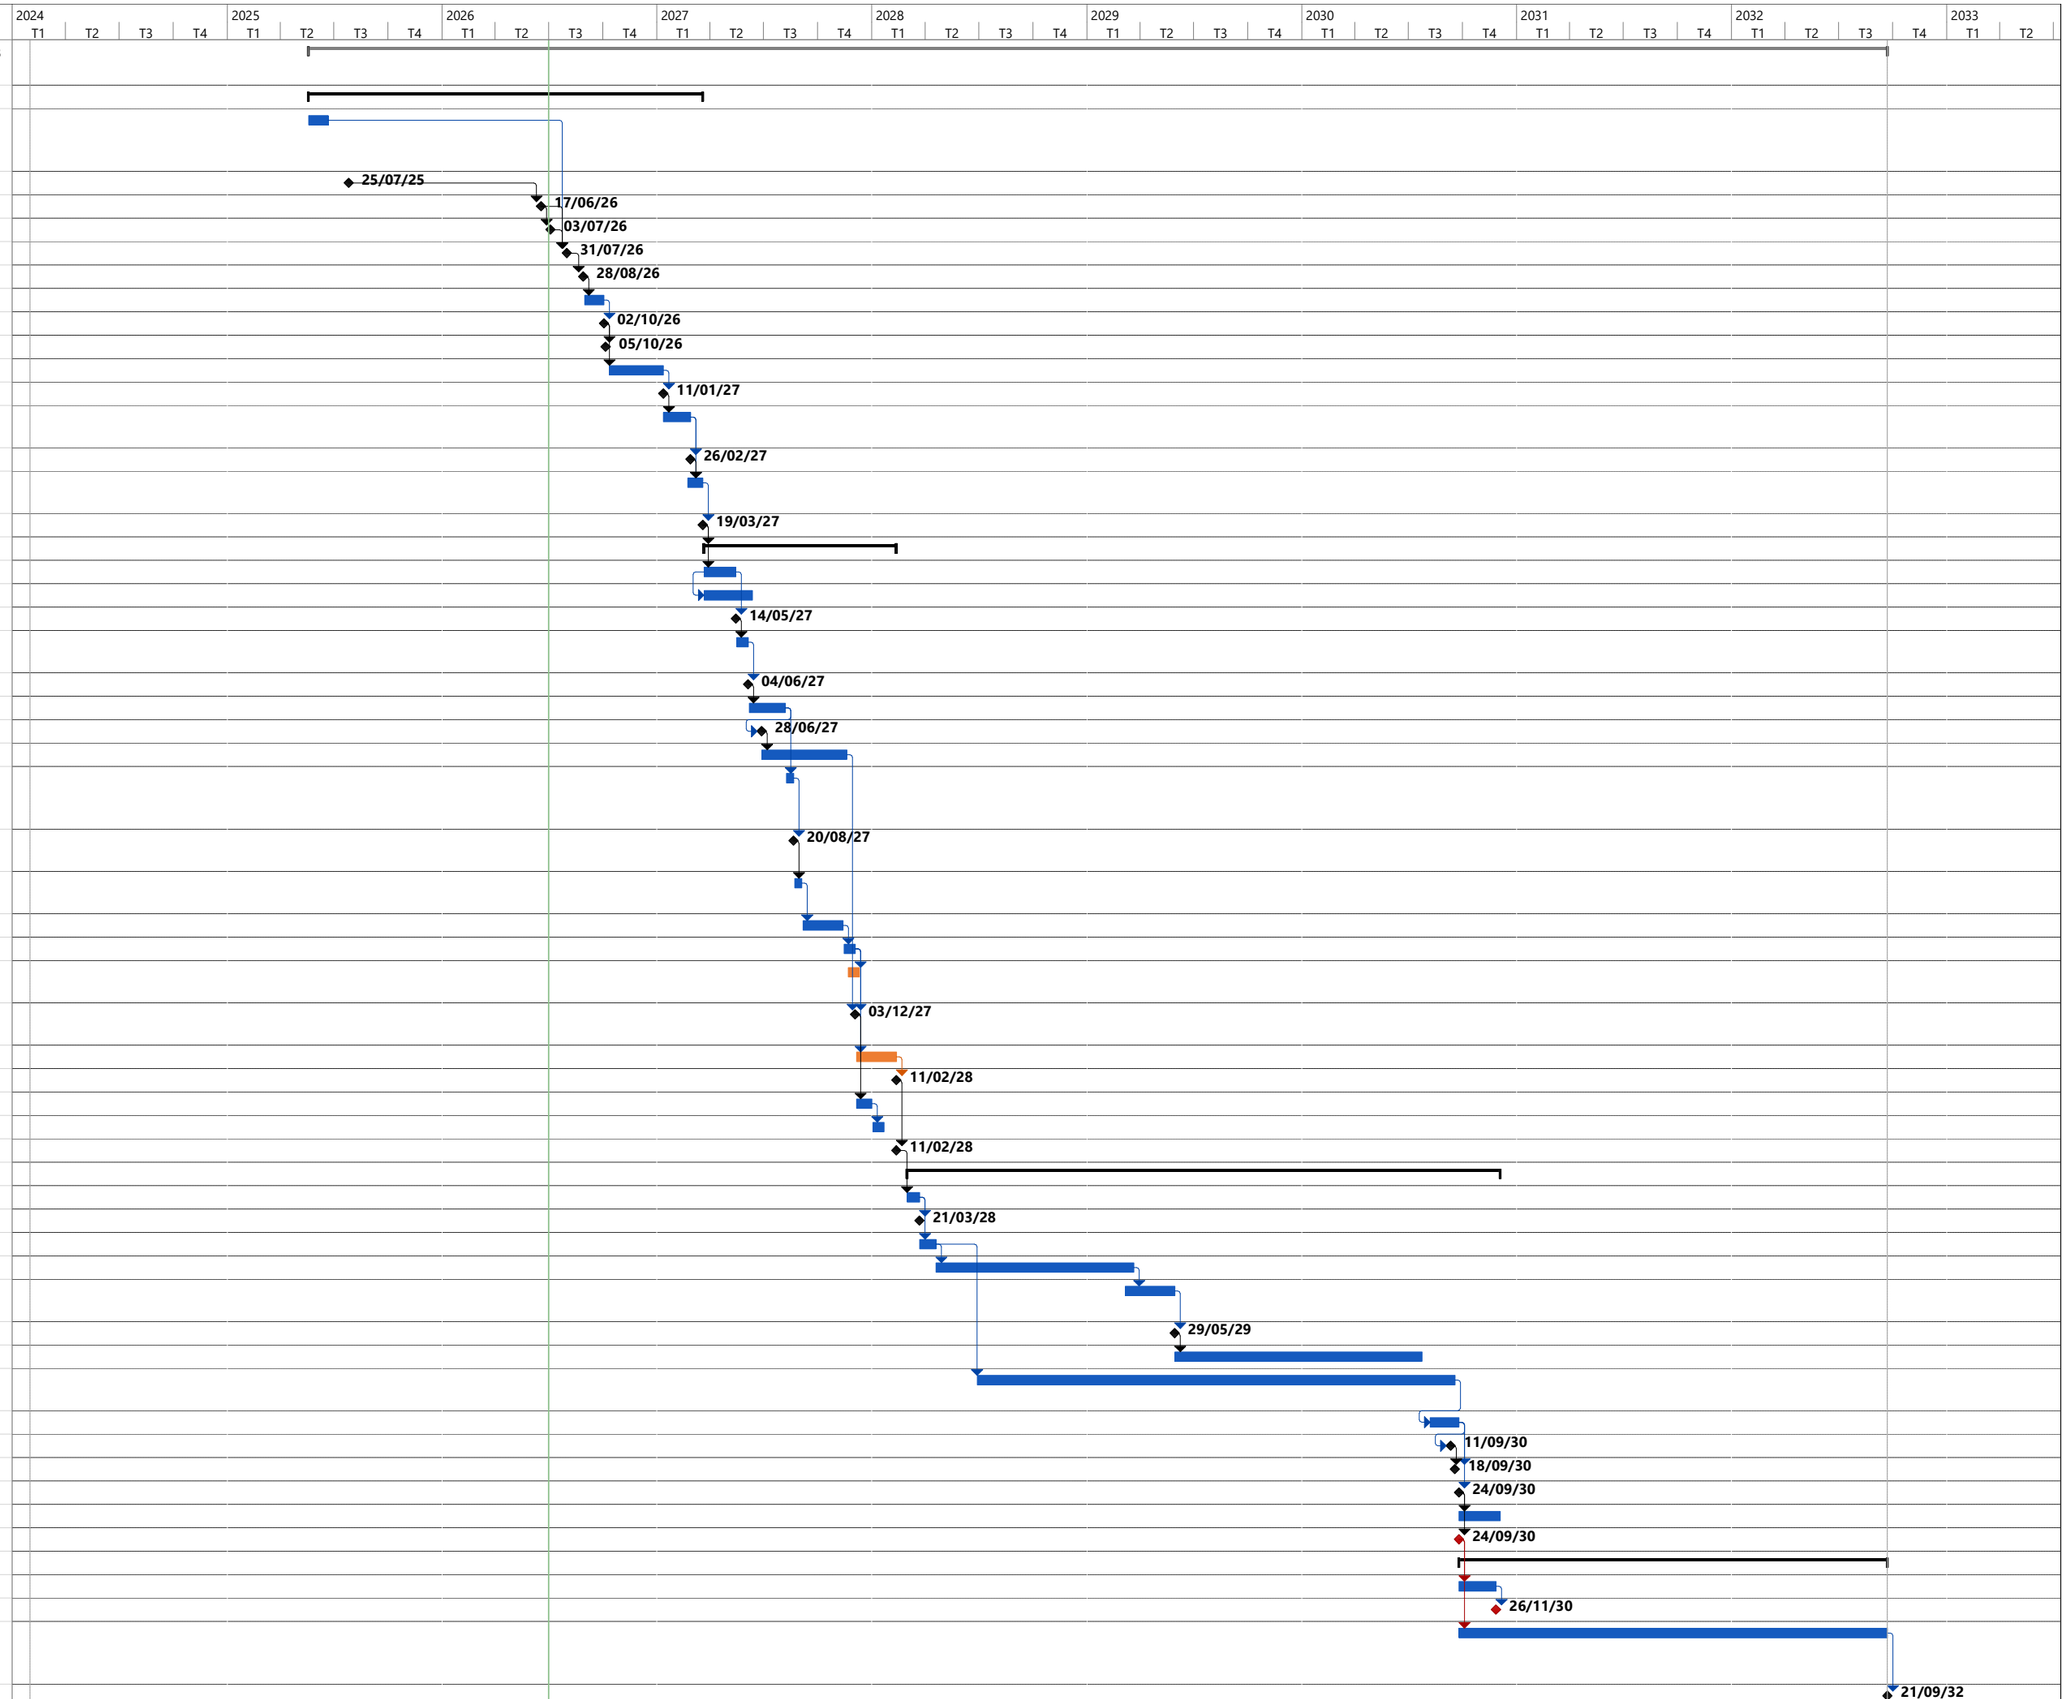N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée
0		**Planning CH MONT DORE 11-03-2026**	**1917 jours**
1		**Phase Programmation - Concour**	**480 jours**
2		RSE 3 - Finalisation programmation et préparation marché	25 jours
3		**Envoi ARS**	0 jour
4		Accord pour appel à candidatu	0 jour
5		Appel à candidature	0 jour
6		Limite questions candidats	0 jour
7		Dépôt des candidatures	0 jour
8		Analyse candidatures	25 jours
9		1er Jury : Choix des candidats	0 jour
10		Lancement concours	0 jour
11		Phase esquisses candidats	66 jours
12		**Rendu esquisses**	0 jour
13		Commission technique - analyse des esquisses	34 jours
14		2ème jury : choix du lauréat	0 jour
15		Négociation avec le Lauréat y compris mise au point	20 jours
16		Notification au Lauréat	0 jour
17		**Phase études**	**235 jours**
18		APS dont STD	40 jours
19		Mission loi sur l'eau	60 jours
20		Rendu APS avec STD provisoire	0 jour
21		Examen APS par CH/ETOT/BD/CSSI/CSPS	15 jours
22		Validation APS	0 jour
23		APD dont STD définitive	45 jours
24		**Dépôt de permis de construire**	0 jour
25		Instruction permis de construir	105 jours
26		Première validation APD et chiffrage par CH/ETOT/BC/CSSI/CSPS	10 jours
27		Réunion revue de conception avec CD et ARS	0 jour
28		Revue APD suite à revue de conception avec CD et ARS	10 jours
29		PRO/DCE	50 jours
30		Validation PRO-DCE par CH/ET	15 jours
31		Mise au point pièces pour la consultations entreprises	15 jours
32		**Lancement consultations entreprises**	0 jour
33		Etudes et offres entreprises	50 jours
34		Remise des offres entreprises	0 jour
35		Analyse des offres des entrepri	20 jours
36		Négociations avec entreprises	15 jours
37		**Notification marchés entrepri**	0 jour
38		**Phase Travaux - réception**	**720 jours**
39		Préparation de chantier	15 jours
40		Première pierre	0 jour
41		Terrassement	20 jours
42		Fondations - gros oeuvre	240 jours
43		Etanchéité - couverture - hors d'eau hors d'air	60 jours
44		Hors d'eau - hors d'air	0 jour
45		Lots second oeuvre / façades	300 jours
46		Lots techniques (hors gros œuvre) y compris VRD	580 jours
47		Pré OPR et OPR	35 jours
48		DOE - RVRAT - DIUO	0 jour
49		Commisssion de sécurité	0 jour
50		Fin des OPR suite à commissio	0 jour
51		Levée des réserves	50 jours
52		**Réception**	0 jour
53		**Déménagement - garantie**	**520 jours**
54		Mobilier - déménagement	45 jours
55		**Inauguration**	0 jour
56		Garantie de parfait achèvement (y compris performances énergétiques)	520 jours
57		**Fin de la garantie de parfait achèvement**	0 jour
