RESTRUCTURATION DU BATIMENT T
ENTPE à Vaulx en Velin
Planning Prévisionnel - PHASE DCE CURAGE-DESAMIANTAGE du Ven 23/01/26
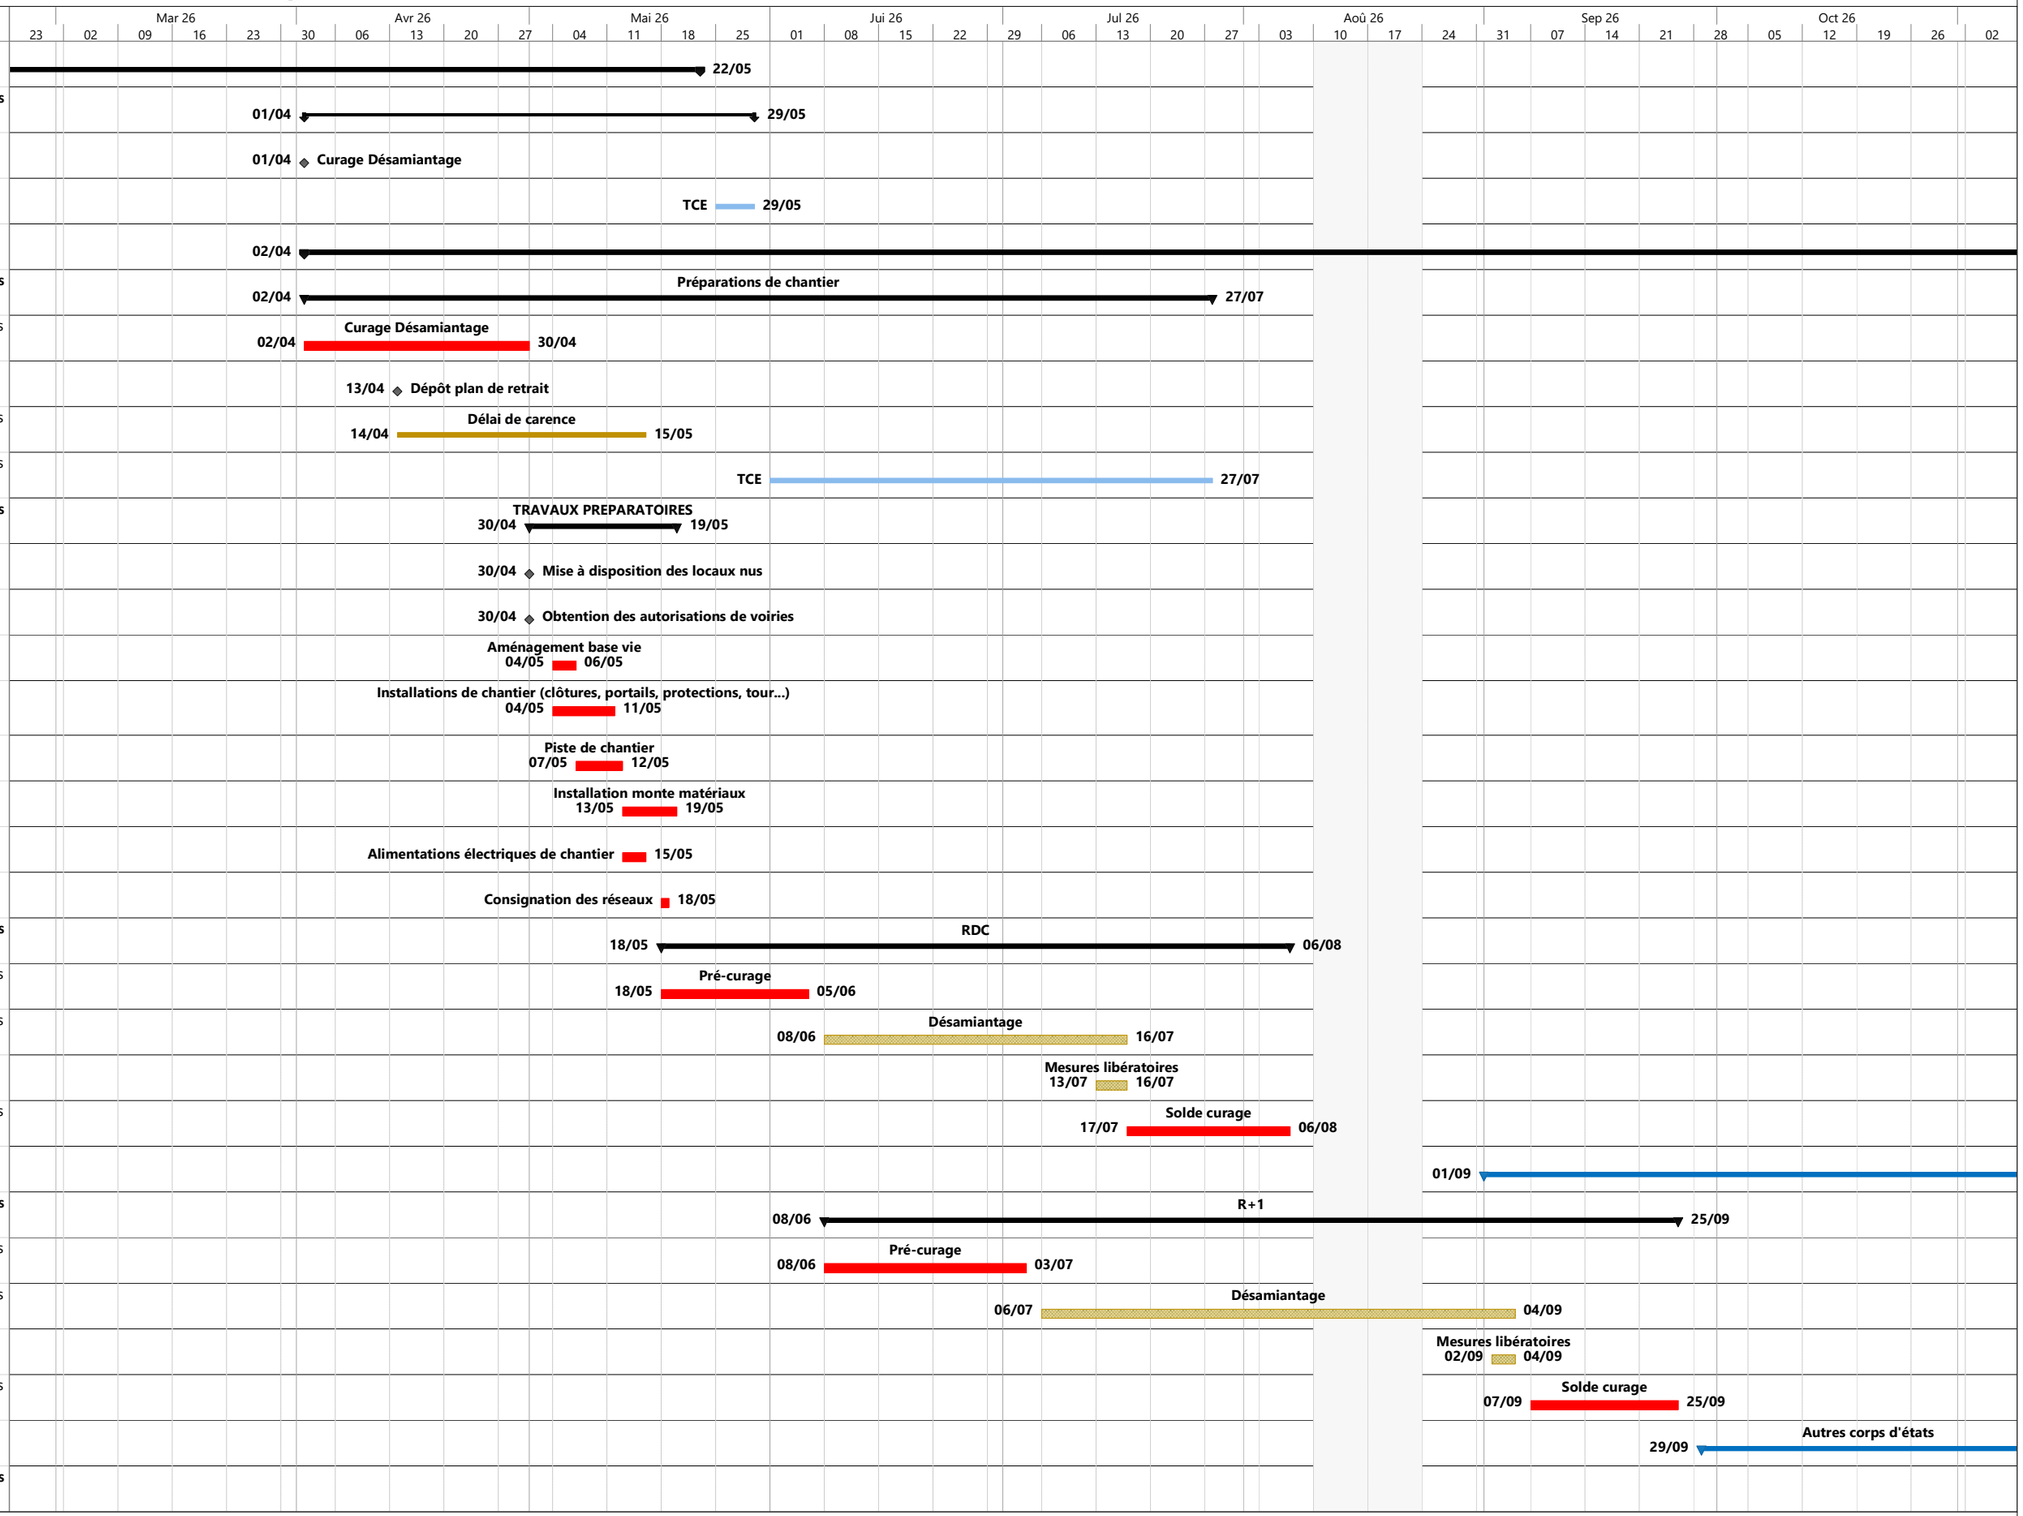
N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	**ETUDES**	**296 jours**		22/05
23	**Notification Ordres de service**	**38 jours**	01/04	29/05
24	Curage Désamiantage	0 jour	01/04	01/04
25	TCE	5 jours	25/05	29/05
26	**TRAVAUX**	**313 jours**	02/04	
27	**Préparations de chantier**	**78 jours**	02/04	27/07
28	Curage Désamiantage	20 jours	02/04	30/04
29	Dépôt plan de retrait	0 jour	13/04	13/04
30	Délai de carence	21 jours	14/04	15/05
31	TCE	40 jours	25/05	27/07
32	**TRAVAUX PREPARATOIRES**	**10 jours**	30/04	19/05
33	Mise à disposition des locaux nus	0 jour	30/04	30/04
34	Obtention des autorisations de voiries	0 jour	30/04	30/04
35	Aménagement base vie	3 jours	04/05	06/05
36	Installations de chantier (clôtures, portails, protections, tour...)	5 jours	04/05	11/05
37	Piste de chantier	3 jours	07/05	12/05
38	Installation monte matériaux	4 jours	13/05	19/05
39	Alimentations électriques de chantier	2 jours	13/05	15/05
40	Consignation des réseaux	1 jour	18/05	18/05
41	**RDC**	**58 jours**	18/05	06/08
42	Pré-curage	15 jours	18/05	05/06
43	Désamiantage	28 jours	08/06	16/07
44	Mesures libératoires	3 jours	13/07	16/07
45	Solde curage	15 jours	17/07	06/08
46	**Autres corps d'états**	**195 jours**	01/09	
60	**R+1**	**69 jours**	08/06	25/09
61	Pré-curage	20 jours	08/06	03/07
62	Désamiantage	34 jours	06/07	04/09
63	Mesures libératoires	3 jours	02/09	04/09
64	Solde curage	15 jours	07/09	25/09
65	**Autres corps d'états**	**200 jours**	29/09	
80	**OPR**	**37 jours**
