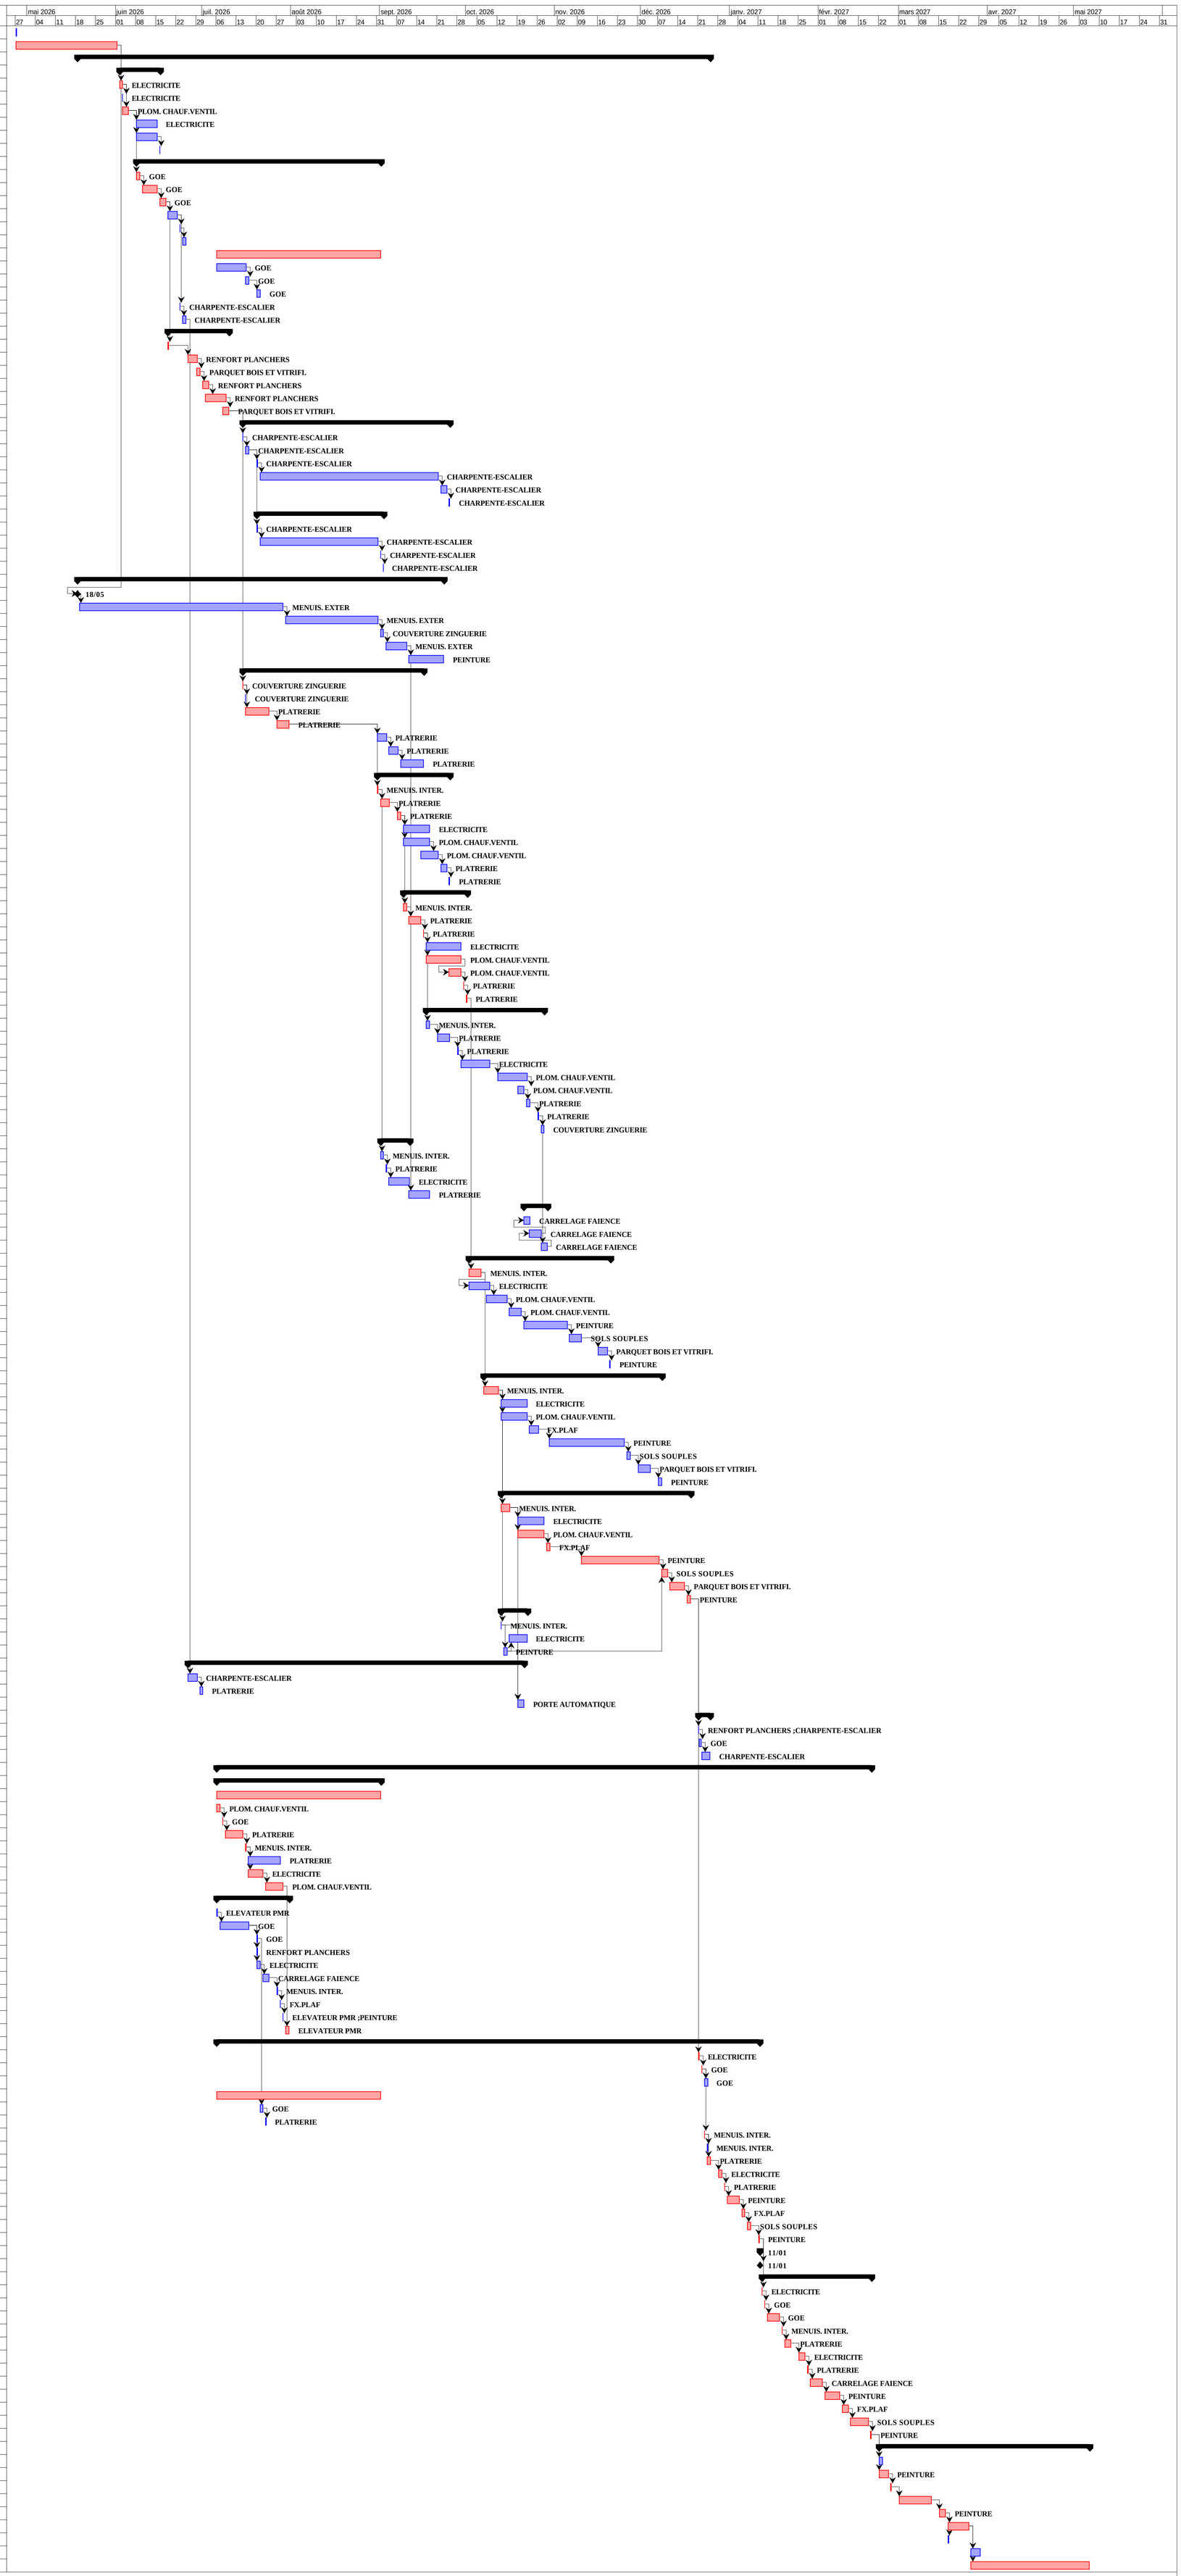		Nom	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	Noms des ressources
1		SIGNATURE MARCHE NOTIFICATION	1 jour?	27/04/2026 08:00	27/04/2026 17:00		
2		PERIODE DE PREPARATION DE CHANTIER	22 jours	27/04/2026 08:00	01/06/2026 17:00		
3		**27 RUE BECLARD**	**133,5 jours**	**18/05/2026 17:00**	**25/12/2026 13:00**		
4		**DEBUT DE CHANTIER**	**11 jours**	**02/06/2026 08:00**	**16/06/2026 17:00**		
5		Mise en place tableaux de chantier électricté par niveau	2 jours	02/06/2026 08:00	03/06/2026 17:00	2	ELECTRICITE
6		Eclairage chantier des cages d'escaliers	1 jour	03/06/2026 08:00	03/06/2026 17:00	5FS-1 jour	ELECTRICITE
7		Neutralisation des réseaux Electricité plomb. Chauf	3 jours	03/06/2026 08:00	05/06/2026 17:00	5FS-1 jour	PLOM. CHAUF.VENTIL
8		Dépose des installaitons électriques	6 jours	08/06/2026 08:00	15/06/2026 17:00	7	ELECTRICITE
9		Dépose de l'installation de plomberie	6 jours	08/06/2026 08:00	15/06/2026 17:00	7	
10		Dépose de la chaudière	1 jour	16/06/2026 08:00	16/06/2026 17:00	9	
11		**ADAPTATION GOE au 27**	**40 jours**	**08/06/2026 08:00**	**01/09/2026 17:00**		
12		Poutre renfort 1° étage pour conserver plafond sur ...	2 jours	08/06/2026 08:00	09/06/2026 17:00	7	GOE
13		Démolition cloisons et plafond du comble comble	4 jours	10/06/2026 08:00	15/06/2026 17:00	12	GOE
14		percement s ouverture ou modification baie	3 jours	16/06/2026 08:00	18/06/2026 17:00	13	GOE
15		Démolition chape SAM état actuel RDC	2 jours	19/06/2026 08:00	22/06/2026 17:00	14	
16		Cave : local cuve : adaptation ouverture	1 jour	23/06/2026 08:00	23/06/2026 17:00	15	
17		Cave : dégazage - évacuation cuve	2 jours	24/06/2026 08:00	25/06/2026 17:00	16	
18		vacances été	20 jours	06/07/2026 07:00	01/09/2026 17:00		
19		Percement baies entre le 25 et 27 pendant des vacanc...	7 jours	06/07/2026 08:00	16/07/2026 17:00		GOE
20		Clôture chantier entre le N°25 et n°27	2 jours	16/07/2026 08:00	17/07/2026 17:00	19FS-1 jour	GOE
21		Percements pour réseaux	2 jours	20/07/2026 08:00	21/07/2026 17:00	20	GOE
22		Vérification Charpente	1 jour	23/06/2026 08:00	23/06/2026 17:00	15	CHARPENTE-ESCALIER
23		création plateforme pour VMC	2 jours	24/06/2026 08:00	25/06/2026 17:00	22	CHARPENTE-ESCALIER
24		**RENFORT PLANCHER AU 27**	**16 jours**	**19/06/2026 08:00**	**10/07/2026 17:00**		
25		Cave sommier pour poutre HEA 200	1 jour	19/06/2026 08:00	19/06/2026 17:00	14	
26		renfort poutre Cave	2 jours	26/06/2026 08:00	29/06/2026 17:00	25FS+4 jours	RENFORT PLANCHERS
27		dépose des parquets	2 jours	29/06/2026 08:00	30/06/2026 17:00	26FS-1 jour	PARQUET BOIS ET VITRIFI.
28		plats sur poutres	3 jours	01/07/2026 08:00	03/07/2026 17:00	27	RENFORT PLANCHERS
29		renfort fixations solive sur poutres	6 jours	02/07/2026 08:00	09/07/2026 17:00	28FS-2 jours	RENFORT PLANCHERS
30		repose parquet	3 jours	08/07/2026 08:00	10/07/2026 17:00	29FS-2 jours	PARQUET BOIS ET VITRIFI.
31		**CREATION ESCALIER ENTRE 1° ET 2° ETAGE AU...**	**33 jours**	**15/07/2026 08:00**	**25/09/2026 17:00**		
32		Dépose escalier existant	1 jour	15/07/2026 08:00	15/07/2026 17:00	30	CHARPENTE-ESCALIER
33		Trémie à créer - adaptation du solivage	2 jours	16/07/2026 08:00	17/07/2026 17:00	32	CHARPENTE-ESCALIER
34		Prise de cote	1 jour	20/07/2026 08:00	20/07/2026 17:00	33	CHARPENTE-ESCALIER
35		Fabrication de l'escalier	25 jours	21/07/2026 08:00	21/09/2026 17:00	34	CHARPENTE-ESCALIER
36		pose du nouvel escalier avec sa rampe	3 jours	22/09/2026 08:00	24/09/2026 17:00	35	CHARPENTE-ESCALIER
37		protection de l'escalier	1 jour	25/09/2026 08:00	25/09/2026 17:00	36	CHARPENTE-ESCALIER
38		**ADAPTATION RAMPE ESCALIER ENTRE RDC ET ...**	**12,5 jours**	**20/07/2026 08:00**	**02/09/2026 13:00**		
39		Dépose rampe et pose GC de chantier	1 jour	20/07/2026 08:00	20/07/2026 17:00	33	CHARPENTE-ESCALIER
40		fabrication GC	10 jours	21/07/2026 08:00	31/08/2026 17:00	39	CHARPENTE-ESCALIER
41		Pose	1 jour	01/09/2026 08:00	01/09/2026 17:00	40	CHARPENTE-ESCALIER
42		protection marches et rampes	0,5 jours	02/09/2026 08:00	02/09/2026 13:00	41	CHARPENTE-ESCALIER
43		**MENUISERIES EXTERIEURES**	**70 jours**	**18/05/2026 17:00**	**23/09/2026 17:00**		
44		commande	0 jours	18/05/2026 17:00	18/05/2026 17:00	2FS-10 jours	MENUIS. EXTER
45		Fabrication	50 jours	19/05/2026 08:00	29/07/2026 17:00	44	MENUIS. EXTER
46		Dépose menuiseries	3 jours	30/07/2026 08:00	31/08/2026 17:00	45	MENUIS. EXTER
47		Reprise appui zinc	2 jours	01/09/2026 08:00	02/09/2026 17:00	46	COUVERTURE ZINGUERIE
48		pose des menuiseries	6 jours	03/09/2026 08:00	10/09/2026 17:00	47	MENUIS. EXTER
49		Peinture des menuiseries et volets	9 jours	11/09/2026 08:00	23/09/2026 17:00	48	PEINTURE
50		**PLAFOND CF**	**26 jours**	**15/07/2026 08:00**	**16/09/2026 17:00**		
51		Pose velux de désenfumage	1 jour	15/07/2026 08:00	15/07/2026 17:00	30	COUVERTURE ZINGUERIE
52		Pose des sorties de toitures VMC décompression	0,5 jours	16/07/2026 08:00	16/07/2026 13:00	51	COUVERTURE ZINGUERIE
53		Comble compris isolant	7 jours	16/07/2026 08:00	24/07/2026 17:00	51	PLATRERIE
54		1° étage	5 jours	27/07/2026 08:00	31/07/2026 17:00	53	PLATRERIE
55		RDC	4 jours	31/08/2026 08:00	03/09/2026 17:00	54	PLATRERIE
56		Porche	2 jours	04/09/2026 08:00	07/09/2026 17:00	55	PLATRERIE
57		Cave	7 jours	08/09/2026 08:00	16/09/2026 17:00	56	PLATRERIE
58		**NOUVEAU CLOISONNEMENTS COMBLE**	**20 jours**	**31/08/2026 08:00**	**25/09/2026 17:00**		
59		adaptation et livraison portes et gaines	1 jour	31/08/2026 08:00	31/08/2026 17:00	54	MENUIS. INTER.
60		cloisons	4 jours	01/09/2026 08:00	04/09/2026 17:00	59	PLATRERIE
61		gaines techniques	2 jours	07/09/2026 08:00	08/09/2026 17:00	60	PLATRERIE
62		réseaux électriques encastrés	8 jours	09/09/2026 08:00	18/09/2026 17:00	61	ELECTRICITE
63		passage gaine de ventilation	8 jours	09/09/2026 08:00	18/09/2026 17:00	61	PLOM. CHAUF.VENTIL
64		Chauffage : adaptation	5 jours	15/09/2026 08:00	21/09/2026 17:00	63FS-4 jours	PLOM. CHAUF.VENTIL
65		finiton cloisons	3 jours	22/09/2026 08:00	24/09/2026 17:00	64	PLATRERIE
66		raccord divers	1 jour	25/09/2026 08:00	25/09/2026 17:00	65	PLATRERIE
67		**NOUVEAU CLOISONNEMENTS 1°ETAGE**	**17 jours**	**09/09/2026 08:00**	**01/10/2026 17:00**		
68		adaptation et livraison portes et gaines	2 jours	09/09/2026 08:00	10/09/2026 17:00	61	MENUIS. INTER.
69		cloisons	3 jours	11/09/2026 08:00	15/09/2026 17:00	68	PLATRERIE
70		gaines techniques	1 jour	16/09/2026 08:00	16/09/2026 17:00	69	PLATRERIE
71		réseaux électriques encastrés	9 jours	17/09/2026 08:00	29/09/2026 17:00	70	ELECTRICITE
72		passage gaine de ventilation	9 jours	17/09/2026 08:00	29/09/2026 17:00	70	PLOM. CHAUF.VENTIL
73		chauffage : adaptation	3 jours	25/09/2026 08:00	29/09/2026 17:00	72FS-3 jours	PLOM. CHAUF.VENTIL
74		finiton cloisons	1 jour	30/09/2026 08:00	30/09/2026 17:00	73	PLATRERIE
75		raccord divers	1 jour	01/10/2026 08:00	01/10/2026 17:00	74	PLATRERIE
76		**NOUVEAU CLOISONNEMENTS RDC**	**30 jours**	**17/09/2026 08:00**	**28/10/2026 17:00**		
77		adaptation et livraison portes et gaines	2 jours	17/09/2026 08:00	18/09/2026 17:00	70	MENUIS. INTER.
78		cloisons	5 jours	21/09/2026 08:00	25/09/2026 17:00	77	PLATRERIE
79		gaines techniques	1 jour	28/09/2026 08:00	28/09/2026 17:00	78	PLATRERIE
80		réseaux électriques encastrés	9 jours	29/09/2026 08:00	09/10/2026 17:00	79	ELECTRICITE
81		passage gaine de ventilation	9 jours	12/10/2026 08:00	22/10/2026 17:00	80	PLOM. CHAUF.VENTIL
82		Chauffage : adaptation	3 jours	19/10/2026 08:00	21/10/2026 17:00	81FS-4 jours	PLOM. CHAUF.VENTIL
83		finiton cloisons	2 jours	22/10/2026 08:00	23/10/2026 17:00	82	PLATRERIE
84		raccord divers	1 jour	26/10/2026 08:00	26/10/2026 17:00	83	PLATRERIE
85		Pose commande de désenfumage	2 jours	27/10/2026 08:00	28/10/2026 17:00	84	COUVERTURE ZINGUERIE
86		**NOUVEAU CLOISONNEMENTS CAVE : local techni...**	**9 jours**	**01/09/2026 08:00**	**11/09/2026 17:00**		
87		adaptation et livraison portes et gaines	2 jours	01/09/2026 08:00	02/09/2026 17:00	59	MENUIS. INTER.
88		gaines techniques	1 jour	03/09/2026 08:00	03/09/2026 17:00	87	PLATRERIE
89		Electricité	6 jours	04/09/2026 08:00	11/09/2026 17:00	88	ELECTRICITE
90		RACCORDS PLATRE APRES POSE MENUISERIE EXTE...	6 jours	11/09/2026 08:00	18/09/2026 17:00	48	PLATRERIE
91		**CARRELAGE FAIENCE**	**7 jours**	**21/10/2026 08:00**	**29/10/2026 17:00**		
92		WC 2° étage	3 jours	21/10/2026 08:00	23/10/2026 17:00	93FS-5 jours	CARRELAGE FAIENCE
93		WC 1° étage	3 jours	23/10/2026 08:00	27/10/2026 17:00	94FS-5 jours	CARRELAGE FAIENCE
94		WC RDC	3 jours	27/10/2026 08:00	29/10/2026 17:00	84	CARRELAGE FAIENCE
95		**FINITIONS COMBLES**	**33 jours**	**02/10/2026 08:00**	**20/11/2026 17:00**		
96		Finition menuiserie	3 jours	02/10/2026 08:00	06/10/2026 17:00	75	MENUIS. INTER.
97		Finition Electricité	6 jours	02/10/2026 08:00	09/10/2026 17:00	96FS-3 jours	ELECTRICITE
98		Finition plomb.chauf. ventil	6 jours	08/10/2026 08:00	15/10/2026 17:00	97FS-2 jours	PLOM. CHAUF.VENTIL
99		Faux-plafond	3 jours	16/10/2026 08:00	20/10/2026 17:00	98	PLOM. CHAUF.VENTIL
100		Peinture	12 jours	21/10/2026 08:00	05/11/2026 17:00	99	PEINTURE
101		sol PVC	3 jours	06/11/2026 08:00	10/11/2026 17:00	100	SOLS SOUPLES
102		ponçage vitrification parquet	4 jours	16/11/2026 08:00	19/11/2026 17:00	101	PARQUET BOIS ET VITRIFI.
103		Reprise peinture plinthes	1 jour	20/11/2026 08:00	20/11/2026 17:00	102	PEINTURE
104		**FINITIONS 1°ETAGE**	**42 jours**	**07/10/2026 08:00**	**08/12/2026 17:00**		
105		Finition menuiserie	4 jours	07/10/2026 08:00	12/10/2026 17:00	96	MENUIS. INTER.
106		Finition Electricité	8 jours	13/10/2026 08:00	22/10/2026 17:00	105	ELECTRICITE
107		Finition plomb.chauf. ventil	8 jours	13/10/2026 08:00	22/10/2026 17:00	105	PLOM. CHAUF.VENTIL
108		Faux-plafond	2 jours	23/10/2026 08:00	26/10/2026 17:00	107	FX.PLAF
109		Peinture	16 jours	30/10/2026 08:00	25/11/2026 17:00	108FS+3 jours	PEINTURE
110		sol PVC	2 jours	26/11/2026 08:00	27/11/2026 17:00	109	SOLS SOUPLES
111		ponçage vitrification parquet	5 jours	30/11/2026 08:00	04/12/2026 17:00	110	PARQUET BOIS ET VITRIFI.
112		Reprise peinture plinthes	2 jours	07/12/2026 08:00	08/12/2026 17:00	111	PEINTURE
113		**FINITIONS RDC**	**46 jours**	**13/10/2026 08:00**	**18/12/2026 17:00**		
114		Finition menuiserie	4 jours	13/10/2026 08:00	16/10/2026 17:00	105	MENUIS. INTER.
115		Finition Electricité	8 jours	19/10/2026 08:00	28/10/2026 17:00	114	ELECTRICITE
116		Finition plomb.chauf. ventil	8 jours	19/10/2026 08:00	28/10/2026 17:00	114	PLOM. CHAUF.VENTIL
117		Faux-plafond	2 jours	29/10/2026 08:00	30/10/2026 17:00	116	FX.PLAF
118		Peinture	17 jours	10/11/2026 08:00	07/12/2026 17:00	117FS+6 jours	PEINTURE
119		sol PVC	3 jours	08/12/2026 08:00	10/12/2026 17:00	118;125	SOLS SOUPLES
120		ponçage vitrification parquet	4 jours	11/12/2026 08:00	16/12/2026 17:00	119	PARQUET BOIS ET VITRIFI.
121		Reprise peinture plinthes	2 jours	17/12/2026 08:00	18/12/2026 17:00	120	PEINTURE
122		**FINITION CAVE**	**8 jours**	**13/10/2026 08:00**	**22/10/2026 17:00**		
123		Finition menuiserie	1 jour	13/10/2026 08:00	13/10/2026 17:00	105	MENUIS. INTER.
124		Finition Electricité	5 jours	16/10/2026 08:00	22/10/2026 17:00	125	ELECTRICITE
125		Peinture	2 jours	14/10/2026 08:00	15/10/2026 17:00	123	PEINTURE
126		**PORTE AUTOMATIQUE PORTE RDC**	**62 jours**	**26/06/2026 08:00**	**21/10/2026 17:00**		
127		Ossature plafond - platelage	2 jours	26/06/2026 08:00	29/06/2026 17:00	23	CHARPENTE-ESCALIER
128		plafond placo	2 jours	30/06/2026 08:00	01/07/2026 17:00	127	PLATRERIE
129		pose porte autmatique	3 jours	19/10/2026 08:00	21/10/2026 17:00	114;123	PORTE AUTOMATIQUE
130		**TERRASSE EXTERIEURE CHANGEMENT**	**4,5 jours**	**21/12/2026 08:00**	**25/12/2026 13:00**		**CHARPENTE-ESCALIER**
131		Dépose terrasse existante	0,5 jours	21/12/2026 08:00	21/12/2026 13:00	121	RENFORT PLANCHERS ;CHAR...
132		reprise empierrement	1 jour	21/12/2026 13:00	22/12/2026 13:00	131	GOE
133		pose nouvelle terresse bois	3 jours	22/12/2026 13:00	25/12/2026 13:00	132	CHARPENTE-ESCALIER
134		**23, 25, RUE BECLARD**	**140 jours?**	**06/07/2026 07:00**	**19/02/2027 17:00**		
135		**CHAUFFERIE ET CAVES**	**20 jours**	**06/07/2026 07:00**	**01/09/2026 17:00**		
136		vacances scolairess	20 jours	06/07/2026 07:00	01/09/2026 17:00		
137		Dépose de la chaudière en période chaude	2 jours	06/07/2026 08:00	07/07/2026 17:00		PLOM. CHAUF.VENTIL
138		Dépose du plafond	1 jour	08/07/2026 08:00	08/07/2026 17:00	137	GOE
139		Repose plafond CF 2H	3 jours	09/07/2026 08:00	15/07/2026 17:00	138	PLATRERIE
140		Pose porte chaufferie CF1H	1 jour	16/07/2026 08:00	16/07/2026 17:00	139	MENUIS. INTER.
141		Pose plafond CF 1H en cave	8 jours	17/07/2026 08:00	28/07/2026 17:00	140	PLATRERIE
142		adaptation électricité	4 jours	17/07/2026 08:00	22/07/2026 17:00	140	ELECTRICITE
143		Repose chaufferie	5 jours	23/07/2026 08:00	29/07/2026 17:00	142	PLOM. CHAUF.VENTIL
144		**MODIFICATION ENTREE ELEVATEUR**	**18 jours?**	**06/07/2026 08:00**	**31/07/2026 17:00**		
145		Dépose élévateur existant : à disposition du MO	1 jour	06/07/2026 08:00	06/07/2026 17:00		ELEVATEUR PMR
146		Modification escalier béton	7 jours	07/07/2026 08:00	17/07/2026 17:00	145	GOE
147		Percement pour visiophone	1 jour	20/07/2026 08:00	20/07/2026 17:00	146	GOE
148		prise cote pour GC	1 jour?	20/07/2026 08:00	20/07/2026 17:00	146	RENFORT PLANCHERS
149		Electricité	2 jours	20/07/2026 08:00	21/07/2026 17:00	146	ELECTRICITE
150		Carrelage	3 jours	22/07/2026 08:00	24/07/2026 17:00	149	CARRELAGE FAIENCE
151		Pose système d'ouverture automatique porte principale	1 jour	27/07/2026 08:00	27/07/2026 17:00	150	MENUIS. INTER.
152		Faux plafond	1 jour	28/07/2026 08:00	28/07/2026 17:00	151	FX.PLAF
153		peinture	1 jour	29/07/2026 08:00	29/07/2026 17:00	152	ELEVATEUR PMR ;PEINTURE
154		Pose élévateur	2 jours	30/07/2026 08:00	31/07/2026 17:00	143	ELEVATEUR PMR
155		**MODIFICATION 2°ETAGE**	**111 jours**	**06/07/2026 07:00**	**11/01/2027 17:00**		
156		Neutralisation réseaux	1 jour	21/12/2026 08:00	21/12/2026 17:00	121	ELECTRICITE
157		Protectiion	1 jour	22/12/2026 08:00	22/12/2026 17:00	156	GOE
158		Démolition Fx. Plaf et cloisons bureau 201/ dégt.	2 jours	23/12/2026 08:00	24/12/2026 17:00	157	GOE
159		vacances scolairess	20 jours	06/07/2026 07:00	01/09/2026 17:00		
160		Percement porte entre bur 201 et 202	2 jours	21/07/2026 08:00	22/07/2026 17:00	147	GOE
161		finition platrerie	1 jour	23/07/2026 08:00	23/07/2026 17:00	160	PLATRERIE
162		Pose porte porte entre bur 201 et 202	1 jour	23/12/2026 08:00	23/12/2026 17:00	157	MENUIS. INTER.
163		Livraison porte bur 201/ dégt.	1 jour	24/12/2026 08:00	24/12/2026 17:00	162	MENUIS. INTER.
164		Cloisons bur 201/dégt.	2 jours	24/12/2026 08:00	25/12/2026 17:00	162	PLATRERIE
165		Réseaux électriques	2 jours	28/12/2026 08:00	29/12/2026 17:00	164	ELECTRICITE
166		raccord platrerie	1 jour	30/12/2026 08:00	30/12/2026 17:00	165	PLATRERIE
167		Peinture dans bureau 201 dégagement	3 jours	31/12/2026 08:00	04/01/2027 17:00	166	PEINTURE
168		Fx. Plafond	2 jours	05/01/2027 08:00	06/01/2027 17:00	167	FX.PLAF
169		Sol souple dans circulations	2 jours	07/01/2027 08:00	08/01/2027 17:00	168	SOLS SOUPLES
170		Reprise peinture plinthes	1 jour	11/01/2027 08:00	11/01/2027 17:00	169	PEINTURE
171		**MODIFICATION 1° ETAGE**	**0 jours**	**11/01/2027 17:00**	**11/01/2027 17:00**		
172		Reprise peinture autour de l'ouverture vers le n° 27	0 jours	11/01/2027 17:00	11/01/2027 17:00	170	PEINTURE
173		**MODIFICATION RDC**	**29 jours**	**12/01/2027 08:00**	**19/02/2027 17:00**		
174		Neutralisation réseaux	1 jour	12/01/2027 08:00	12/01/2027 17:00	170	ELECTRICITE
175		Protectiion	1 jour	13/01/2027 08:00	13/01/2027 17:00	174	GOE
176		Démolition Fx. Plaf et cloisons WC et attente	3 jours	14/01/2027 08:00	18/01/2027 17:00	175	GOE
177		Livraison porte placard activité 1	1 jour	19/01/2027 08:00	19/01/2027 17:00	176	MENUIS. INTER.
178		Cloisons WC placard	3 jours	20/01/2027 08:00	22/01/2027 17:00	177	PLATRERIE
179		Réseaux électriques	3 jours	25/01/2027 08:00	27/01/2027 17:00	178	ELECTRICITE
180		Raccord salle d'attente	1 jour	28/01/2027 08:00	28/01/2027 17:00	179	PLATRERIE
181		Carrelage faience WC Placard	3 jours	29/01/2027 08:00	02/02/2027 17:00	180	CARRELAGE FAIENCE
182		Peinture dans circulations Hall attente	4 jours	03/02/2027 08:00	08/02/2027 17:00	181	PEINTURE
183		Fx. Plafond	3 jours	09/02/2027 08:00	11/02/2027 17:00	182	FX.PLAF
184		Sol souple dans circulations	5 jours	12/02/2027 08:00	18/02/2027 17:00	183	SOLS SOUPLES
185		Reprise peinture plinthes	1 jour	19/02/2027 08:00	19/02/2027 17:00	184	PEINTURE
186		**RECEPTION**	**54 jours**	**22/02/2027 08:00**	**06/05/2027 17:00**		
187		mise en service des équipements	2 jours	22/02/2027 08:00	23/02/2027 17:00	185	
188		nettoyage	4 jours	22/02/2027 08:00	25/02/2027 17:00	185	PEINTURE
189		OPR	1 jour	26/02/2027 08:00	26/02/2027 17:00	188	
190		Levée des réserves	10 jours	01/03/2027 08:00	12/03/2027 17:00	189	
191		Nettoyage de réception	3 jours	15/03/2027 08:00	17/03/2027 17:00	190	PEINTURE
192		RECEPTION	6 jours	18/03/2027 08:00	25/03/2027 17:00	191	
193		DOE	1 jour	18/03/2027 08:00	18/03/2027 17:00	191	
194		DAACT	2 jours	26/03/2027 08:00	29/03/2027 17:00	192	
195		DGD	30 jours	26/03/2027 08:00	06/05/2027 17:00	192
