Diagramme de Gantt
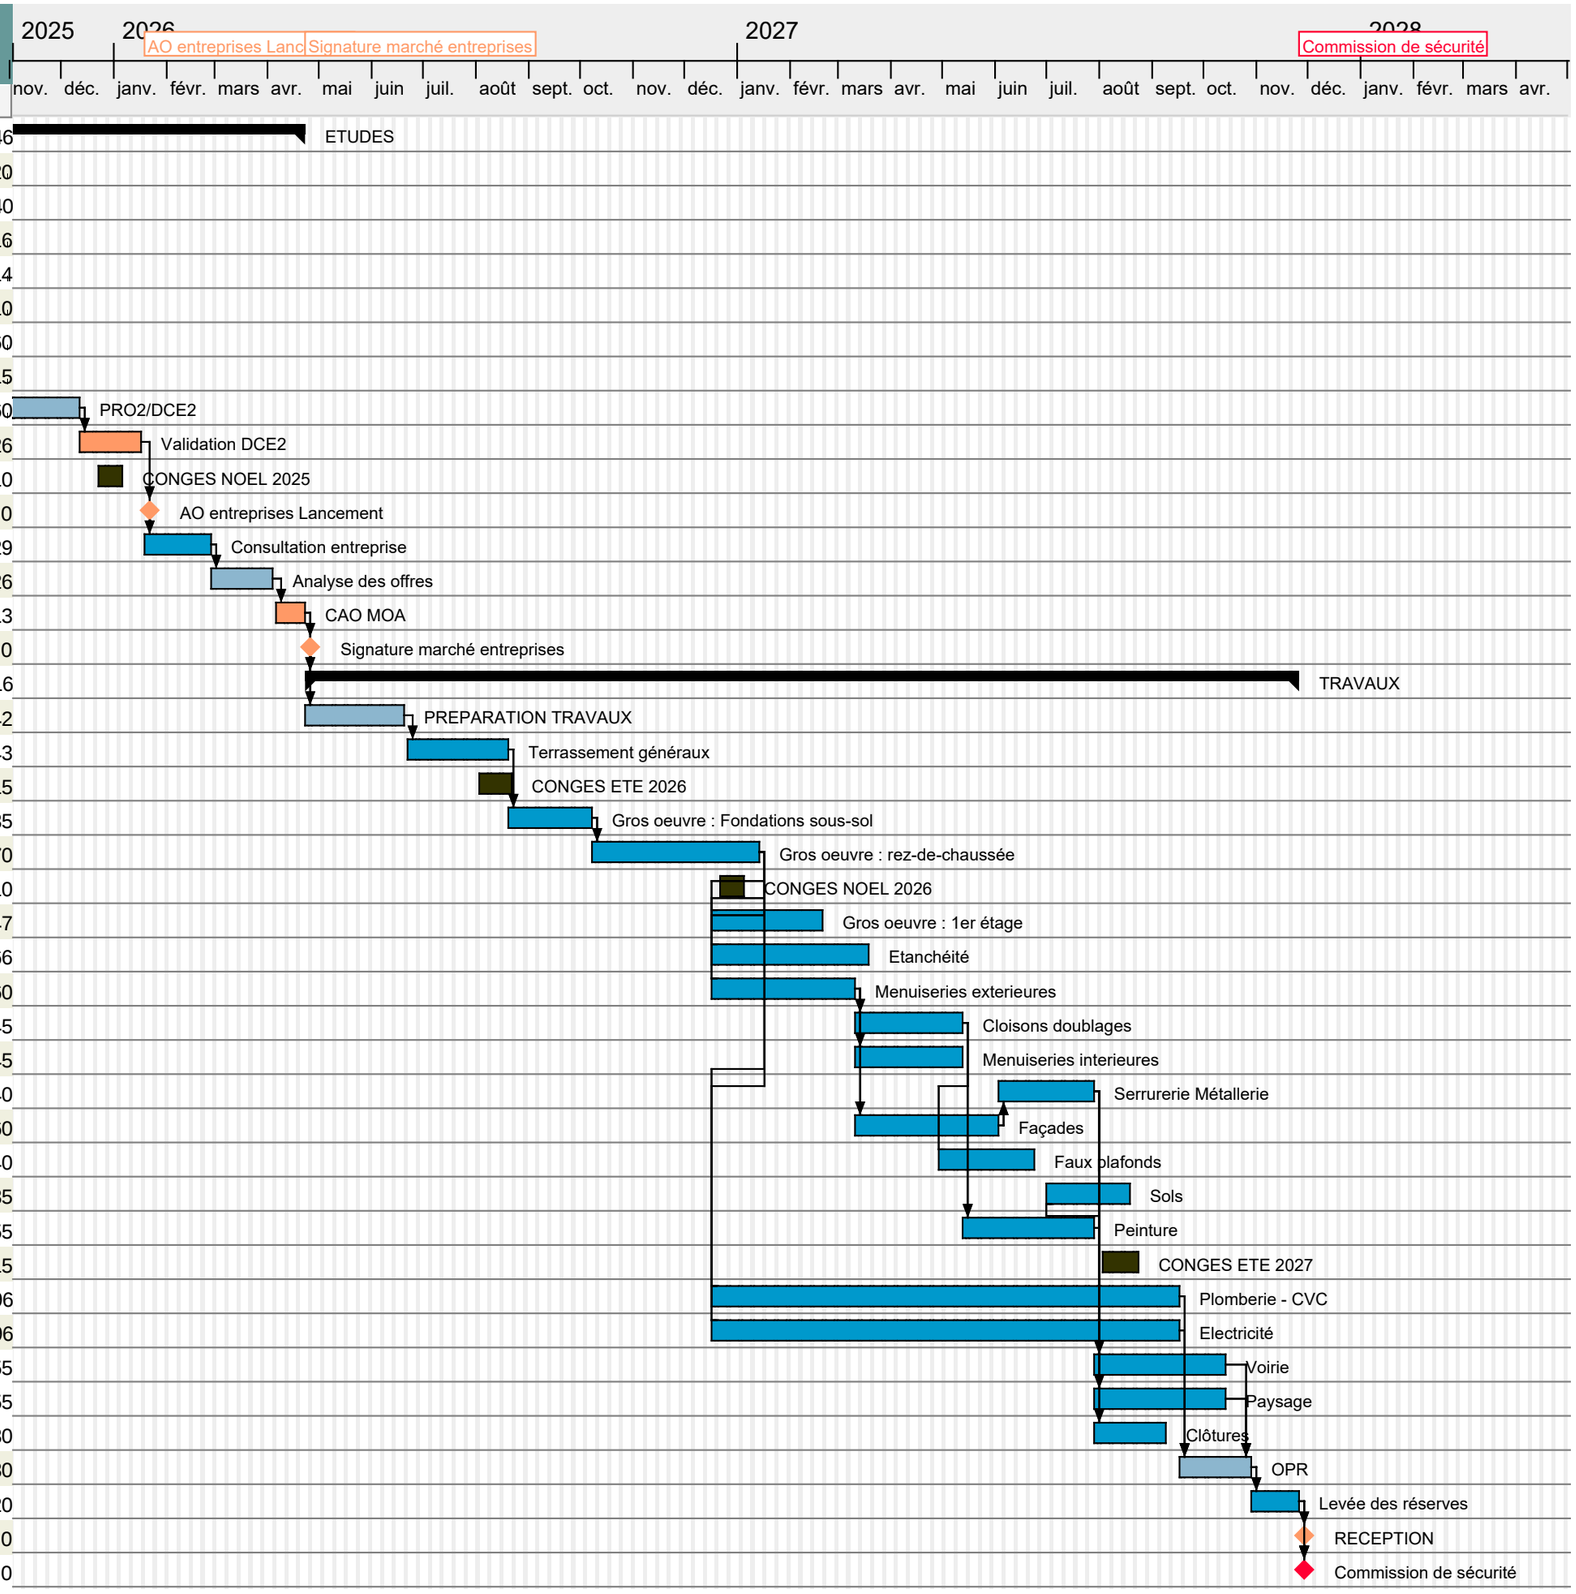
Nom	Date de d...	Date de fin	Semaine	Durée
ETUDES	01/11/23	22/04/26		646
ESQ modifiée	01/11/23	28/11/23	4	20
Etudes réalisées	29/11/23	05/08/25		440
DCE	02/05/25	23/05/25	3	16
validation DCE	26/05/25	12/06/25	3	14
Etudes complémentaires	13/06/25	26/06/25	2	10
Validations	27/06/25	18/09/25	12	60
CONGES ETE 2025	04/08/25	22/08/25	3	15
PRO2/DCE2	19/09/25	11/12/25	12	60
Validation DCE2	12/12/25	16/01/26	5	26
CONGES NOEL 2025	23/12/25	05/01/26	2	10
AO entreprises Lancement	19/01/26	19/01/26	0	0
Consultation entreprise	19/01/26	26/02/26	6	29
Analyse des offres	27/02/26	03/04/26	5	26
CAO MOA	06/04/26	22/04/26	2.5	13
Signature marché entreprises	23/04/26	23/04/26	0	0
TRAVAUX	23/04/26	25/11/27	83.2	416
PREPARATION TRAVAUX	23/04/26	19/06/26	8.4	42
Terrassement généraux	22/06/26	19/08/26	8.6	43
CONGES ETE 2026	03/08/26	21/08/26	3	15
Gros oeuvre : Fondations sous...	20/08/26	07/10/26	7	35
Gros oeuvre : rez-de-chaussée	08/10/26	13/01/27	14	70
CONGES NOEL 2026	22/12/26	04/01/27	2	10
Gros oeuvre : 1er étage	17/12/26	19/02/27	9	47
Etanchéité	17/12/26	18/03/27	13.2	66
Menuiseries exterieures	17/12/26	10/03/27	9	60
Cloisons doublages	11/03/27	12/05/27	9	45
Menuiseries interieures	11/03/27	12/05/27	9	45
Serrurerie Métallerie	03/06/27	28/07/27	8	40
Façades	11/03/27	02/06/27	12	60
Faux plafonds	29/04/27	23/06/27	8	40
Sols	01/07/27	18/08/27	7	35
Peinture	13/05/27	28/07/27	11	55
CONGES ETE 2027	03/08/27	23/08/27	3	15
Plomberie - CVC	17/12/26	16/09/27	39.2	196
Electricité	17/12/26	16/09/27	39.2	196
Voirie	29/07/27	13/10/27	11	55
Paysage	29/07/27	13/10/27	11	55
Clôtures	29/07/27	08/09/27	6	30
OPR	17/09/27	28/10/27	6	30
Levée des réserves	29/10/27	25/11/27	4	20
RECEPTION	26/11/27	26/11/27	0	0
Commission de sécurité	26/11/27	26/11/27	0	0
