ENSCR - Ecole Nationale de Chimie de Rennes

RENOVATION ET REAMENAGEMENT DES ESPACES DE TRAVAIL: CREATION D'UN PLATEAU ADMINISTRATIF

N°	Lot	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1		O.S. ENTREPRISES	5 jours	Lun 13/04/26	Ven 17/04/26
2	TCE	Période Préparation Chantier	17 jours	Lun 20/04/26	Ven 15/05/26
3	TCE	Période Travaux	117 jours	Lun 18/05/26	Ven 13/11/26
4	TCE	Période Réception	20 jours	Lun 16/11/26	Ven 11/12/26
5	02	Constat d'huissier	1 jour	Jeu 30/04/26	Jeu 30/04/26
6	02	Installation de chantier (base vie, clotûres, etc...)	8 jours	Lun 04/05/26	Ven 15/05/26
7	02	Protections des Existants	8 jours	Lun 04/05/26	Ven 15/05/26
8	02	Installation de chantier (Raccordement, coffrets, éclairages, etc...)	8 jours	Lun 04/05/26	Ven 15/05/26
9	04	Neutralisation des réseaux existants	1 jour	Lun 04/05/26	Lun 04/05/26
10	02	Démolition doublage bois,faux plafonds, mobiliers zone vestiaire/douche RDC	5 jours	Lun 18/05/26	Ven 22/05/26
11	01	Démolitions des Doublages R+1	15 jours	Lun 18/05/26	Lun 08/06/26
12	01	GOE - Création et Modification d'ouvertures	10 jours	Mar 26/05/26	Lun 08/06/26
13	02	Remplacement vitrage salle de conseil (panneau plein)	1 jour	Jeu 21/05/26	Jeu 21/05/26
14	01	Reconnaissance Fondations existantes	1 jour	Lun 11/05/26	Lun 11/05/26
15	01	Etude BA	8 jours	Mar 12/05/26	Ven 22/05/26
16	01	Renforcement fondations existantes	3 jours	Mar 26/05/26	Jeu 28/05/26
17	01	GOE - Création renforts Salle du conseil R+1	10 jours	Ven 29/05/26	Jeu 11/06/26
18	03	Démolition carelage devant escalier R+1	1 jour	Lun 18/05/26	Lun 18/05/26
19	03	Démolition chape emprise douche au RDC	2 jours	Mar 26/05/26	Mer 27/05/26
20	01	Percement siphon sol vestiaire RDC	0,5 jour	Jeu 28/05/26	Jeu 28/05/26
21	03	Chape douche rdc	1 jour	Lun 01/06/26	Lun 01/06/26
22	03	Séchage chape	40 jours	Mar 02/06/26	Mar 28/07/26
23	03	Chape fluide R+1	2 jours	Mar 09/06/26	Mer 10/06/26
24	03	Mise en place mortier réparation fibré au sol R+1	2 jours	Jeu 11/06/26	Ven 12/06/26
25	02	Remplacement vitrage douche RDC	1 jour	Lun 08/06/26	Lun 08/06/26
26	02	Remplacement marche escalier	0,5 jour	Mar 09/06/26	Mar 09/06/26
27	02	Adaptation précadres bois MExt existantes	5 jours	Lun 15/06/26	Ven 19/06/26
28	02	Approvisionnement des matériaux plaquisterie au R+1 et RDC	5 jours	Lun 08/06/26	Ven 12/06/26
29	02	Doublage, Cloisonnement, travaux divers Plaquisterie, encoffrements, pose des huisseries, bâtis, trappes, etc... zone R+1 (compris finitions bandes)	39 jours	Lun 15/06/26	Ven 07/08/26
30	02	Cloisonnement grande circulation (de part et d'autre) compris bandes pour lot technique	15 jours	Lun 15/06/26	Ven 03/07/26
31	02	Doublage, Cloisonnement douche RDC (compris finitions bandes)	5 jours	Lun 22/06/26	Ven 26/06/26
32	02	Réalisation des joues retombée de plafond	20 jours	Lun 06/07/26	Lun 03/08/26
33	02	Pose des plinthes bois	10 jours	Lun 27/07/26	Ven 07/08/26
34	03	Etanchéité et revetement carrelage douche italienne rdc	5 jours	Mer 29/07/26	Mar 04/08/26
35	10	Ossatures faux plafonds	15 jours	Lun 27/07/26	Ven 28/08/26
36	10	Ossatures faux plafonds circulation	5 jours	Lun 07/09/26	Ven 11/09/26
37	03	Peinture boiseries	15 jours	Lun 24/08/26	Ven 11/09/26
38	03	Peinture mural & plafond, tuyauterie, etc...	55 jours	Lun 24/08/26	Ven 06/11/26
39	03	Finition Retouches Peintures	9 jours	Lun 09/11/26	Ven 20/11/26
40	02	Approvisionnement des portes et réglages	5 jours	Lun 31/08/26	Ven 04/09/26
41	02	Pose des vitrages sur menuiseries intérieures	10 jours	Lun 14/09/26	Ven 25/09/26
42	03	Ragréage et sol souple R+1	20 jours	Lun 05/10/26	Ven 30/10/26
43	02	Plan travail vestiaire RDC	1 jour	Jeu 01/10/26	Jeu 01/10/26
44	02	Remplacement système d'ouverture porte RDC	1 jour	Jeu 01/10/26	Jeu 01/10/26
45	02	Meuble cuisine espace convivialité & Meuble kichenette salle du conseil	5 jours	Lun 26/10/26	Ven 30/10/26
46	02	Pose dalles faux plafonds et plafonds collés	15 jours	Lun 19/10/26	Ven 06/11/26
47	02	Pose des claustras bois & stores	14 jours	Lun 26/10/26	Ven 13/11/26
48	02	Pose des quincaillerie de finitions portes, butée, film dépoli, signalétiques, miroirs, patères, etc...	10 jours	Lun 26/10/26	Ven 06/11/26
49	03	Vitrification escalier	3 jours	Lun 09/11/26	Jeu 12/11/26
50	04	Dépose des installations ELEC existantes (continuité service niveau)	13 jours	Lun 04/05/26	Ven 22/05/26
51	04	Distribution chemins câbles et réseaux CFO-CFA R+1 & RDC	39 jours	Lun 15/06/26	Ven 07/08/26
52	04	Pose des équipements de finition en plafond	35 jours	Lun 03/08/26	Ven 02/10/26
53	04	Contrôle des équipements avec MOE avant fermetures plafonds	5 jours	Lun 12/10/26	Ven 16/10/26
54	04	Pose des équipements de finitions muraux	25 jours	Lun 05/10/26	Ven 06/11/26
55	04	Tests, Recettage et Mise en service	10 jours	Lun 26/10/26	Ven 06/11/26
56	05	Dépose des installations existantes CVP (continuité service niveau)	13 jours	Lun 04/05/26	Ven 22/05/26
57	05	Distribution réseaux Ventilation R+1 & RDC	29 jours	Lun 29/06/26	Ven 07/08/26
58	05	Distribution réseaux Chauffage et Plomberie RDC & R+1	20 jours	Lun 15/06/26	Ven 07/08/26
59	05	Pose CTA en toiture	2 jours	Lun 27/07/26	Mar 28/07/26
60	05	Distribution réseaux Ventilation R+2	10 jours	Lun 24/08/26	Ven 04/09/26
61	05	Pose des équipements en plenum	20 jours	Lun 27/07/26	Ven 04/09/26
62	05	Contrôle des équipements avec MOE avant fermetures plafonds	5 jours	Lun 12/10/26	Ven 16/10/26
63	05	Pose des équipements de finitions	20 jours	Lun 12/10/26	Ven 06/11/26
64	05	Tests et Mise en service	10 jours	Lun 26/10/26	Ven 06/11/26
65	06	Sonorisation et video Salle du conseil	7 jours	Lun 02/11/26	Mar 10/11/26
66	06	Tests et Mise en service	2 jours	Lun 09/11/26	Mar 10/11/26
67	02	Repli des installations de chantier	3 jours	Mer 02/12/26	Ven 04/12/26
68	03	Nettoyage avant OPR	9 jours	Lun 02/11/26	Ven 13/11/26
69	TCE	O.P.R. TCE	5 jours	Lun 16/11/26	Ven 20/11/26
70	TCE	Levées des Réserves	15 jours	Lun 23/11/26	Ven 11/12/26
71	03	Nettoyage de livraison	1 jour	Ven 11/12/26	Ven 11/12/26

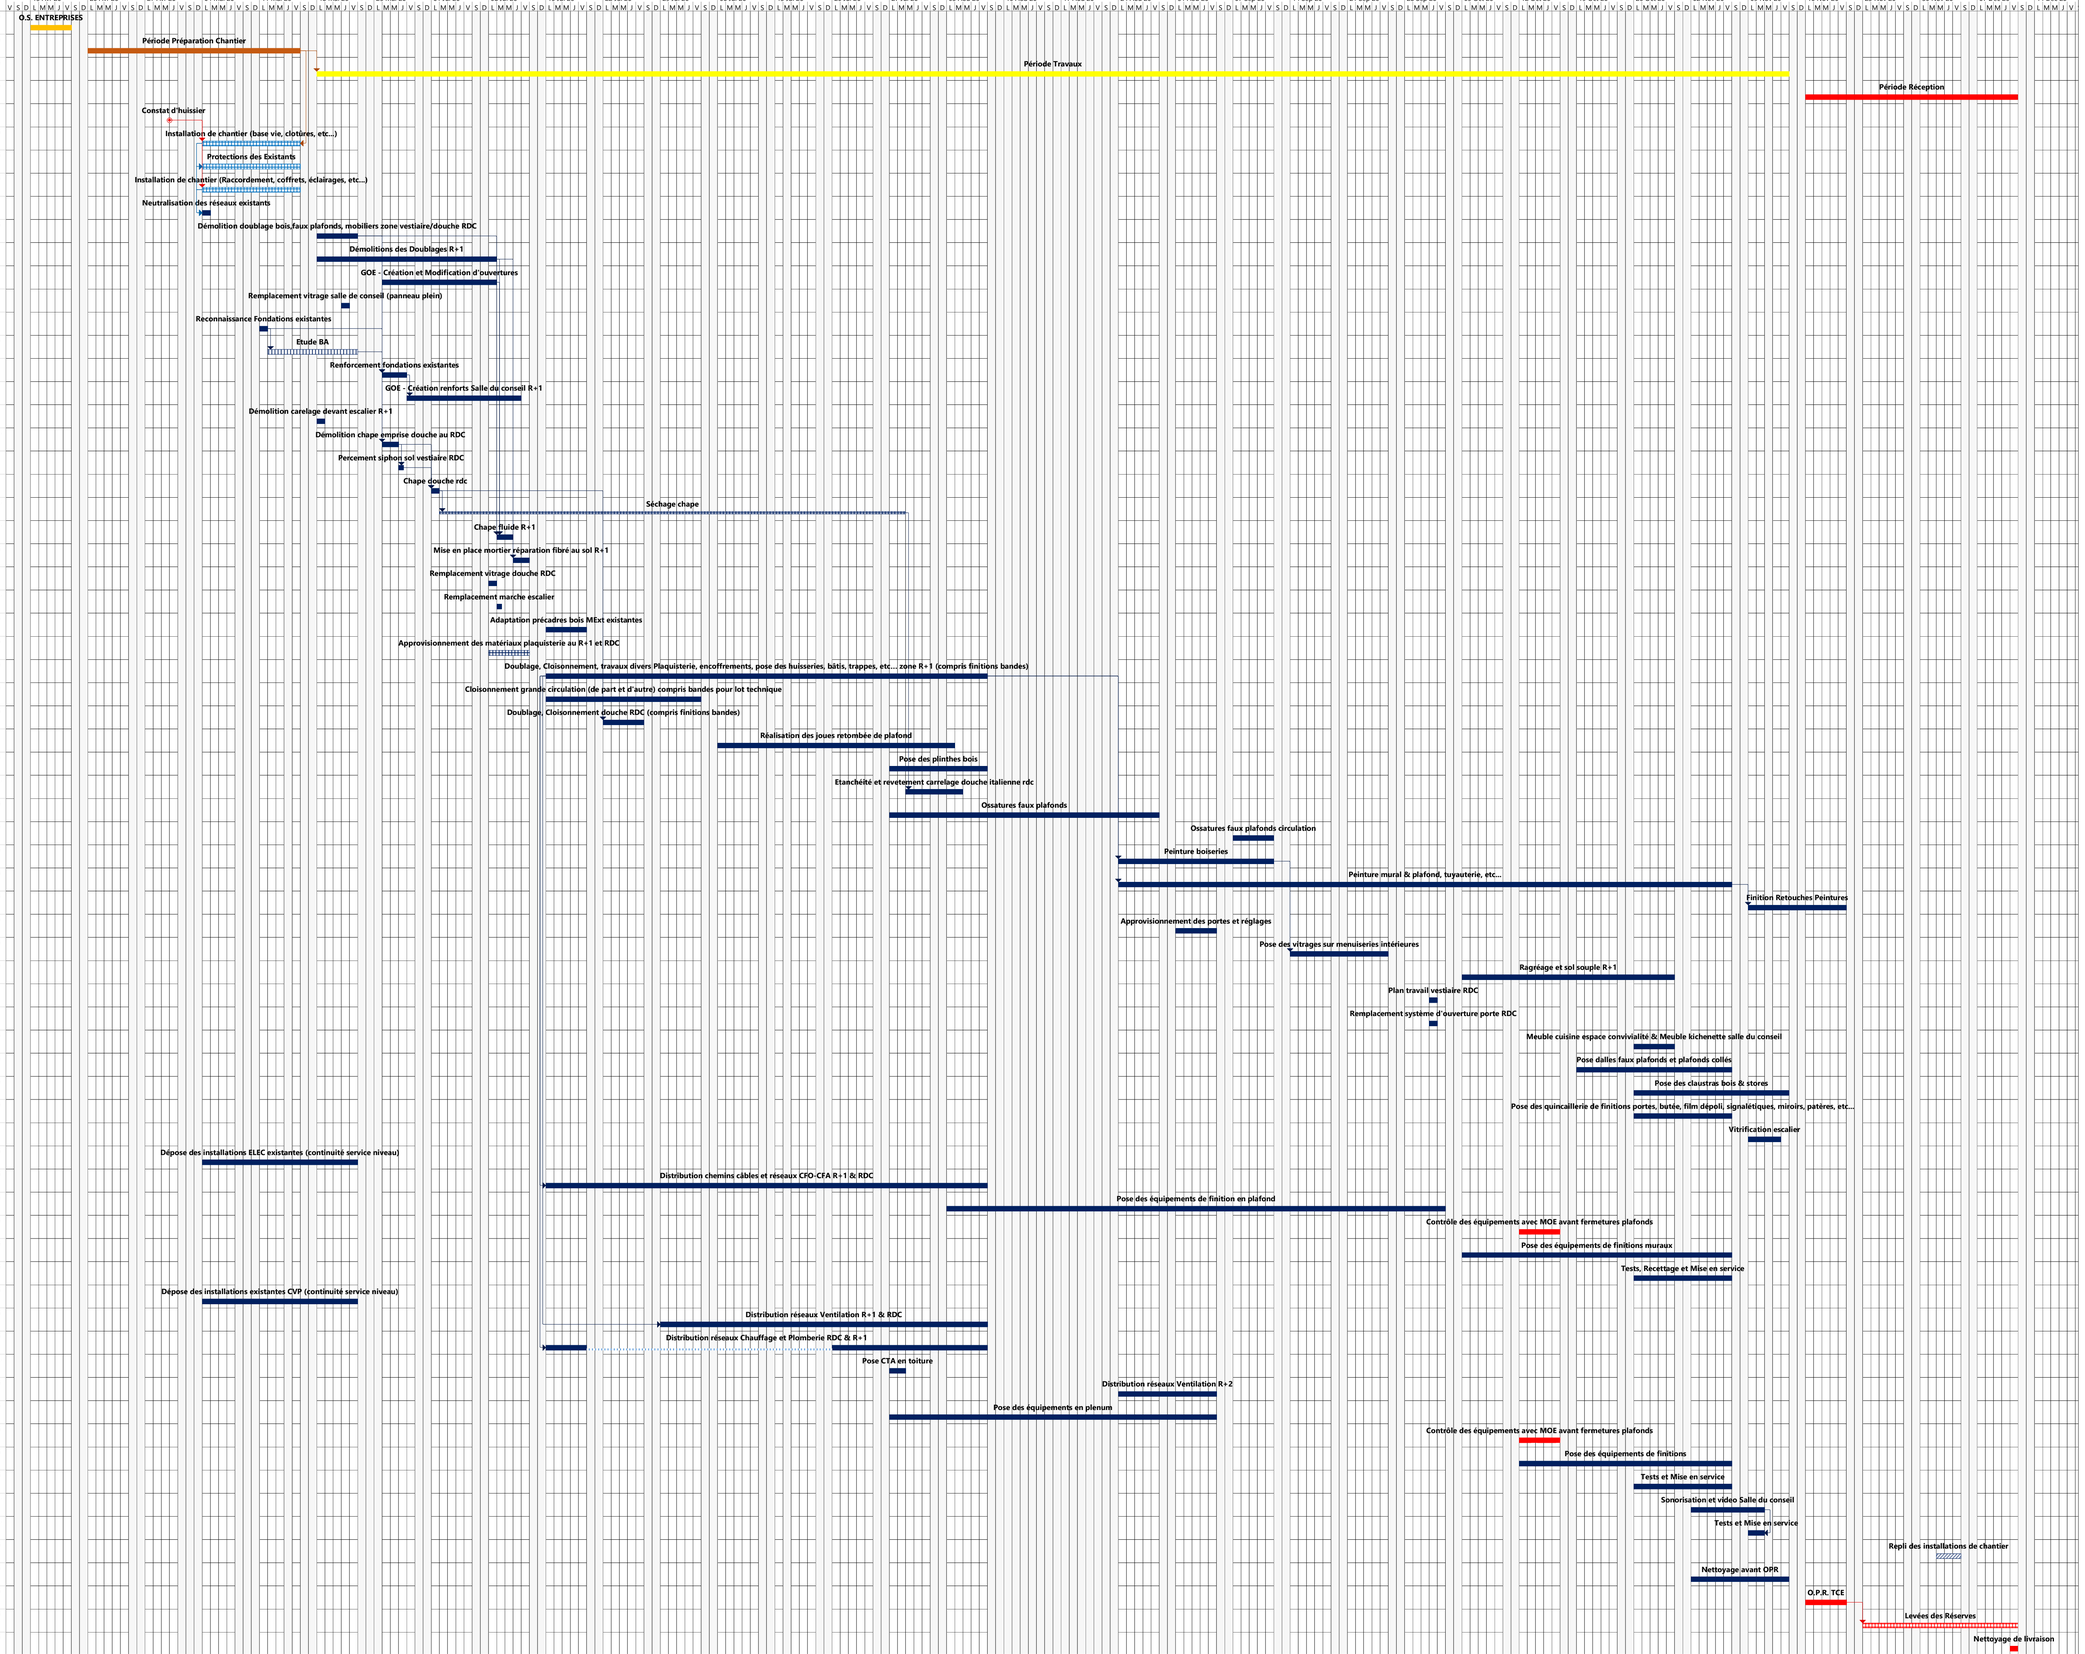

Projet : FUSION
Date : DCE

Tâche — Jalon — Récapitulatif du projet — Jalon inactif — Tâche manuelle — Report récapitulatif manuel — Début uniquement — Tâches externes — Échéance — Progression manuelle

Fractionnement — Récapitulative — Tâche inactive — Récapitulatif inactif — Durée uniquement — Récapitulatif manuel — Fin uniquement — Jalons externes — Avancement
