2503 Fac de Droit aile Nord RDC - R+1 - Unistra

19 nov. 2025

echo architecture
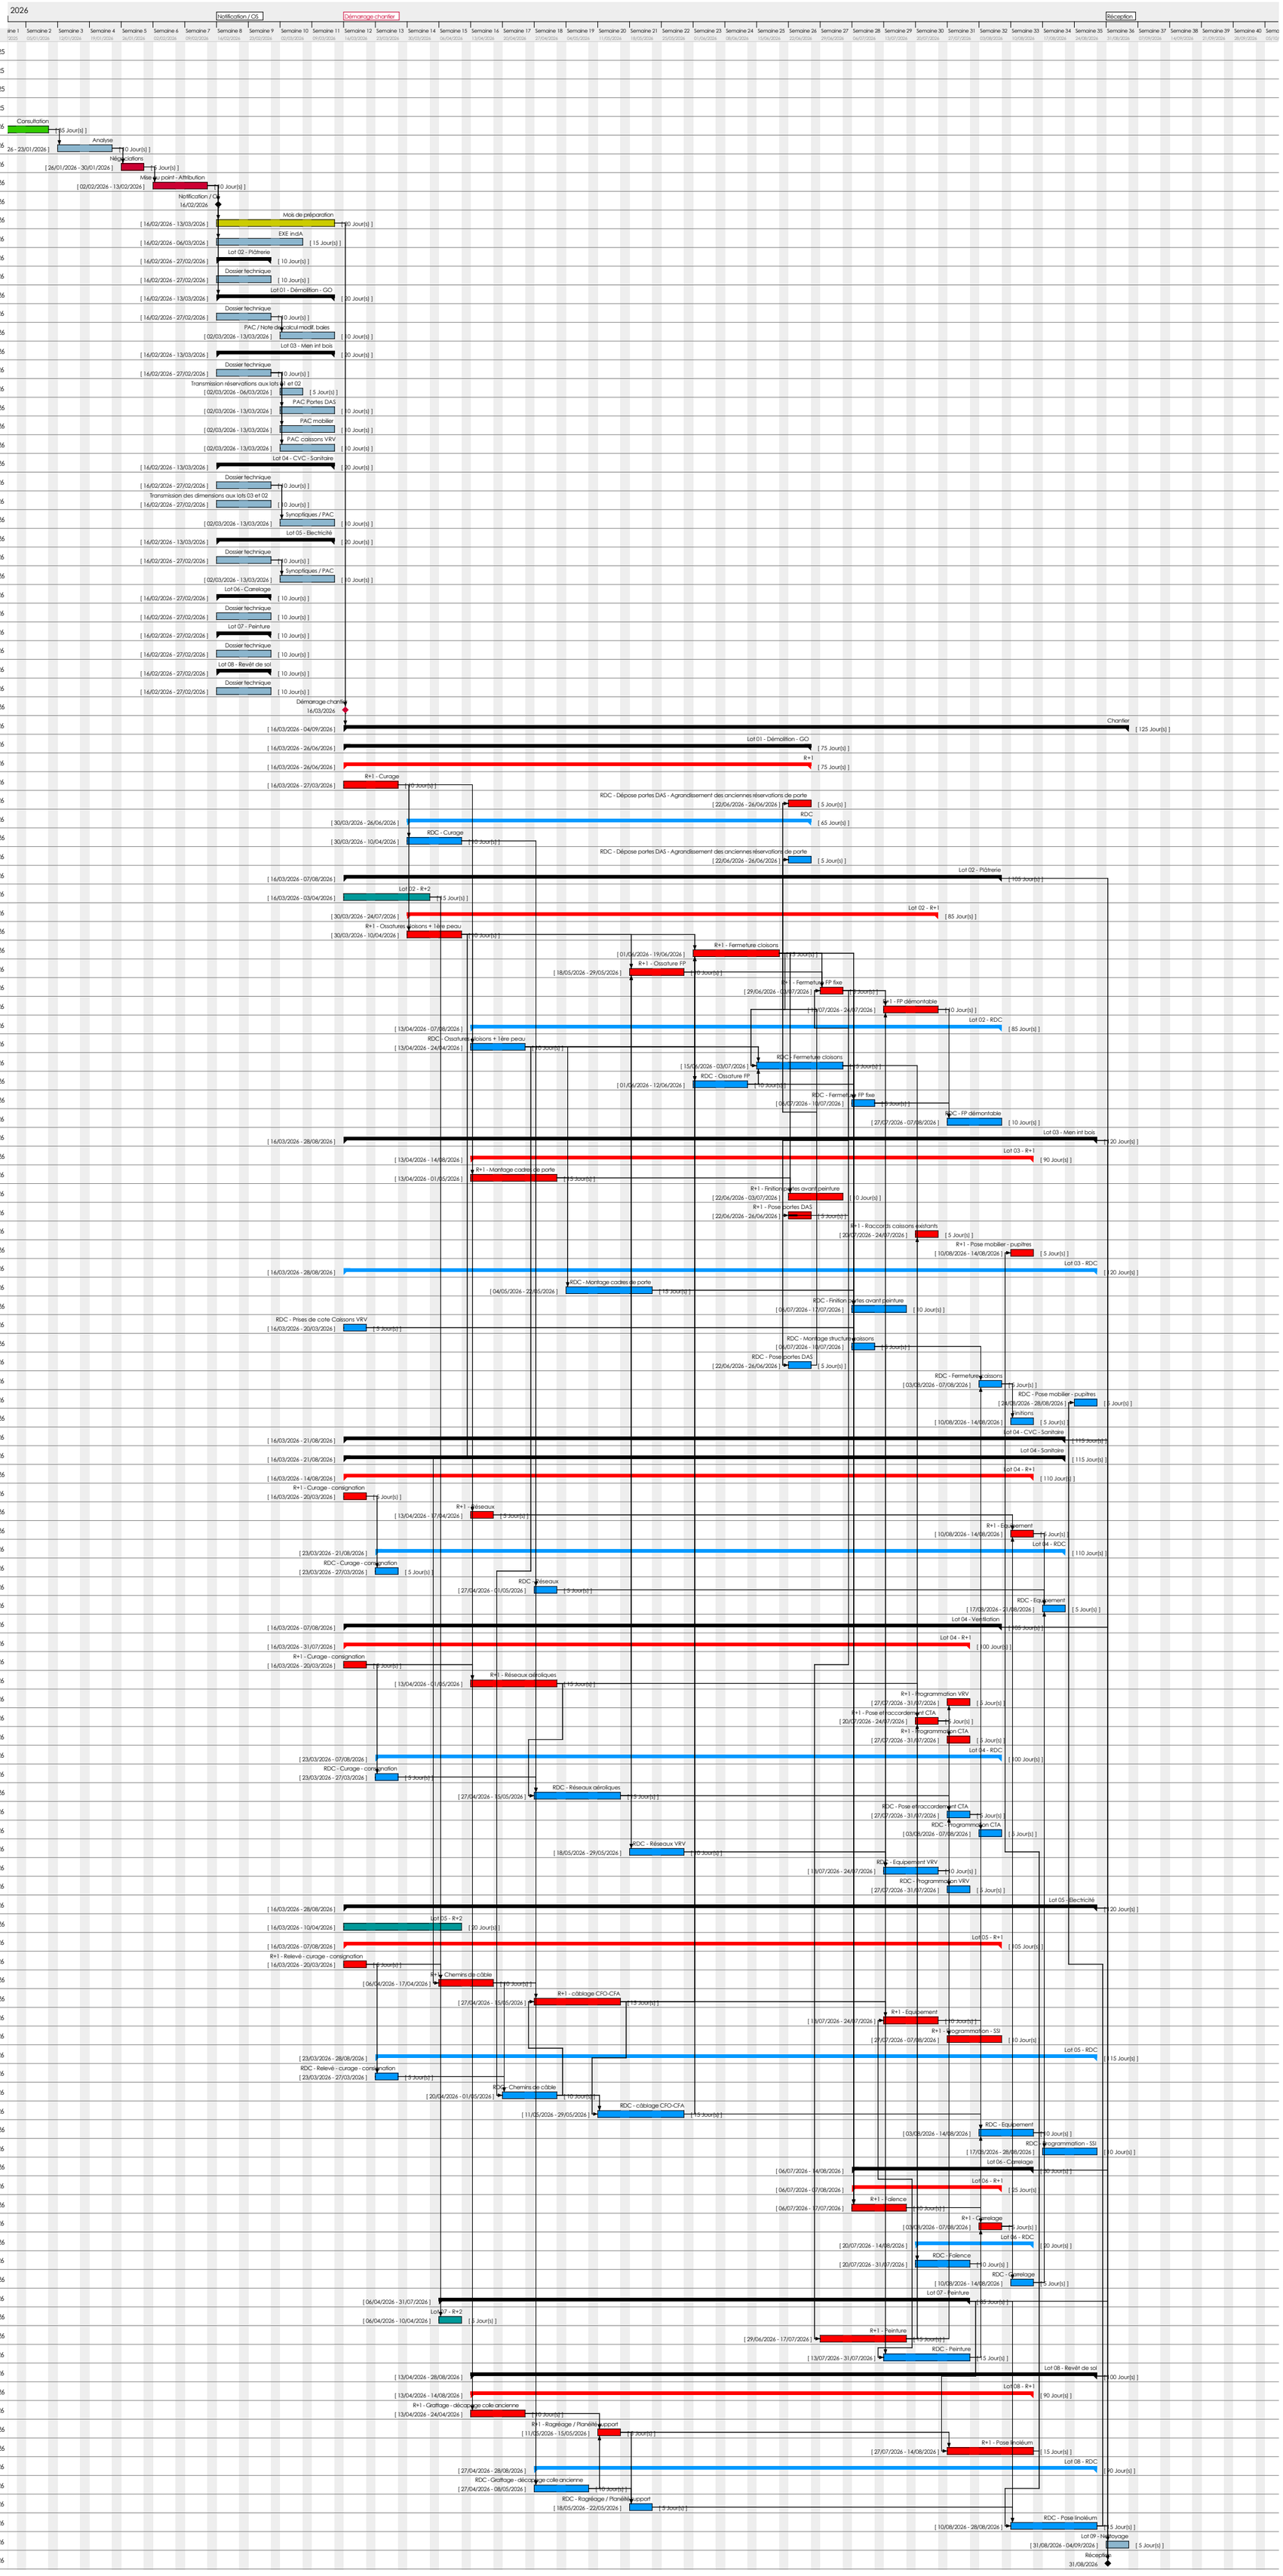
Nom	Date de début	Date de fin
PRO	15/09/2025	10/10/2025
Validation PRO	13/10/2025	24/10/2025
DCE	27/10/2025	14/11/2025
Validation DCE - Publication	17/11/2025	21/11/2025
Consultation	24/11/2025	09/01/2026
Analyse	12/01/2026	23/01/2026
Négociations	26/01/2026	30/01/2026
Mise au point - Attribution	02/02/2026	13/02/2026
Notification / OS	16/02/2026	16/02/2026
Mois de préparation	16/02/2026	13/03/2026
EXE indA	16/02/2026	06/03/2026
Lot 02 - Plâtrerie	16/02/2026	27/02/2026
Dossier technique	16/02/2026	27/02/2026
Lot 01 - Démolition - GO	16/02/2026	13/03/2026
Dossier technique	16/02/2026	27/02/2026
PAC / Note de calcul modif. baies	02/03/2026	13/03/2026
Lot 03 - Men int bois	16/02/2026	13/03/2026
Dossier technique	16/02/2026	27/02/2026
Transmission réservations aux lots 01 et 02	02/03/2026	06/03/2026
PAC Portes DAS	02/03/2026	13/03/2026
PAC mobilier	02/03/2026	13/03/2026
PAC caissons VRV	02/03/2026	13/03/2026
Lot 04 - CVC - Sanitaire	16/02/2026	13/03/2026
Dossier technique	16/02/2026	27/02/2026
Transmission des dimensions aux lots 03 et 02	16/02/2026	27/02/2026
Synoptiques / PAC	02/03/2026	13/03/2026
Lot 05 - Electricité	16/02/2026	13/03/2026
Dossier technique	16/02/2026	27/02/2026
Synoptiques / PAC	02/03/2026	13/03/2026
Lot 06 - Carrelage	16/02/2026	27/02/2026
Dossier technique	16/02/2026	27/02/2026
Lot 07 - Peinture	16/02/2026	27/02/2026
Dossier technique	16/02/2026	27/02/2026
Lot 08 - Revêt de sol	16/02/2026	27/02/2026
Dossier technique	16/02/2026	27/02/2026
Démarrage chantier	16/03/2026	16/03/2026
Chantier	16/03/2026	04/09/2026
Lot 01 - Démolition - GO	16/03/2026	26/06/2026
R+1	16/03/2026	26/06/2026
R+1 - Curage	16/03/2026	27/03/2026
RDC - Dépose portes DAS - Agrandis...	22/06/2026	26/06/2026
RDC	30/03/2026	26/06/2026
RDC - Curage	30/03/2026	10/04/2026
RDC - Dépose portes DAS - Agrandis...	22/06/2026	26/06/2026
Lot 02 - Plâtrerie	16/03/2026	07/08/2026
Lot 02 - R+2	16/03/2026	03/04/2026
Lot 02 - R+1	30/03/2026	24/07/2026
R+1 - Ossatures cloisons + 1ère peau	30/03/2026	10/04/2026
R+1 - Fermeture cloisons	01/06/2026	19/06/2026
R+1 - Ossature FP	18/05/2026	29/05/2026
R+1 - Fermeture FP fixe	29/06/2026	03/07/2026
R+1 - FP démontable	13/07/2026	24/07/2026
Lot 02 - RDC	13/04/2026	07/08/2026
RDC - Ossatures cloisons + 1ère peau	13/04/2026	24/04/2026
RDC - Fermeture cloisons	15/06/2026	03/07/2026
RDC - Ossature FP	01/06/2026	12/06/2026
RDC - Fermeture FP fixe	06/07/2026	10/07/2026
RDC - FP démontable	27/07/2026	07/08/2026
Lot 03 - Men int bois	16/03/2026	28/08/2026
Lot 03 - R+1	13/04/2026	14/08/2026
R+1 - Montage cadres de porte	13/04/2026	01/05/2026
R+1 - Finition portes avant peinture	22/06/2026	03/07/2026
R+1 - Pose portes DAS	22/06/2026	26/06/2026
R+1 - Raccords caissons existants	20/07/2026	24/07/2026
R+1 - Pose mobilier - pupitres	10/08/2026	14/08/2026
Lot 03 - RDC	16/03/2026	28/08/2026
RDC - Montage cadres de porte	04/05/2026	22/05/2026
RDC - Finition portes avant peinture	06/07/2026	17/07/2026
RDC - Prises de cote Caissons VRV	16/03/2026	20/03/2026
RDC - Montage structure caissons	06/07/2026	10/07/2026
RDC - Pose portes DAS	22/06/2026	26/06/2026
RDC - Fermeture caissons	03/08/2026	07/08/2026
RDC - Pose mobilier - pupitres	24/08/2026	28/08/2026
Finitions	10/08/2026	14/08/2026
Lot 04 - CVC - Sanitaire	16/03/2026	21/08/2026
Lot 04 - Sanitaire	16/03/2026	21/08/2026
Lot 04 - R+1	16/03/2026	14/08/2026
R+1 - Curage - consignation	16/03/2026	20/03/2026
R+1 - Réseaux	13/04/2026	17/04/2026
R+1 - Equipement	10/08/2026	14/08/2026
Lot 04 - RDC	23/03/2026	21/08/2026
RDC - Curage - consignation	23/03/2026	27/03/2026
RDC - Réseaux	27/04/2026	01/05/2026
RDC - Equipement	17/08/2026	21/08/2026
Lot 04 - Ventilation	16/03/2026	07/08/2026
Lot 04 - R+1	16/03/2026	31/07/2026
R+1 - Curage - consignation	16/03/2026	20/03/2026
R+1 - Réseaux aéroliques	13/04/2026	01/05/2026
R+1 - Programmation VRV	27/07/2026	31/07/2026
R+1 - Pose et raccordement CTA	20/07/2026	24/07/2026
R+1 - Programmation CTA	27/07/2026	31/07/2026
Lot 04 - RDC	23/03/2026	07/08/2026
RDC - Curage - consignation	23/03/2026	27/03/2026
RDC - Réseaux aéroliques	27/04/2026	15/05/2026
RDC - Pose et raccordement CTA	27/07/2026	31/07/2026
RDC - Programmation CTA	03/08/2026	07/08/2026
RDC - Réseaux VRV	18/05/2026	29/05/2026
RDC - Equipement VRV	13/07/2026	24/07/2026
RDC - Programmation VRV	27/07/2026	31/07/2026
Lot 05 - Electricité	16/03/2026	28/08/2026
Lot 05 - R+2	16/03/2026	10/04/2026
Lot 05 - R+1	16/03/2026	07/08/2026
R+1 - Relevé - curage - consignation	16/03/2026	20/03/2026
R+1 - Chemins de câble	06/04/2026	17/04/2026
R+1 - câblage CFO-CFA	27/04/2026	15/05/2026
R+1 - Equipement	13/07/2026	24/07/2026
R+1 - Programmation - SSI	27/07/2026	07/08/2026
Lot 05 - RDC	23/03/2026	28/08/2026
RDC - Relevé - curage - consignation	23/03/2026	27/03/2026
RDC - Chemins de câble	20/04/2026	01/05/2026
RDC - câblage CFO-CFA	11/05/2026	29/05/2026
RDC - Equipement	03/08/2026	14/08/2026
RDC - Programmation - SSI	17/08/2026	28/08/2026
Lot 06 - Carrelage	06/07/2026	14/08/2026
Lot 06 - R+1	06/07/2026	07/08/2026
R+1 - Faïence	06/07/2026	17/07/2026
R+1 - Carrelage	03/08/2026	07/08/2026
Lot 06 - RDC	20/07/2026	14/08/2026
RDC - Faïence	20/07/2026	31/07/2026
RDC - Carrelage	10/08/2026	14/08/2026
Lot 07 - Peinture	06/04/2026	31/07/2026
Lot 07 - R+2	06/04/2026	10/04/2026
R+1 - Peinture	29/06/2026	17/07/2026
RDC - Peinture	13/07/2026	31/07/2026
Lot 08 - Revêt de sol	13/04/2026	28/08/2026
Lot 08 - R+1	13/04/2026	14/08/2026
R+1 - Grattage - décapage colle ancienne	13/04/2026	24/04/2026
R+1 - Ragréage / Planéité support	11/05/2026	15/05/2026
R+1 - Pose linoléum	27/07/2026	14/08/2026
Lot 08 - RDC	27/04/2026	28/08/2026
RDC - Grattage - décapage colle ancienne	27/04/2026	08/05/2026
RDC - Ragréage / Planéité support	18/05/2026	22/05/2026
RDC - Pose linoléum	10/08/2026	28/08/2026
Lot 09 - Nettoyage	31/08/2026	04/09/2026
Réception	31/08/2026	31/08/2026
