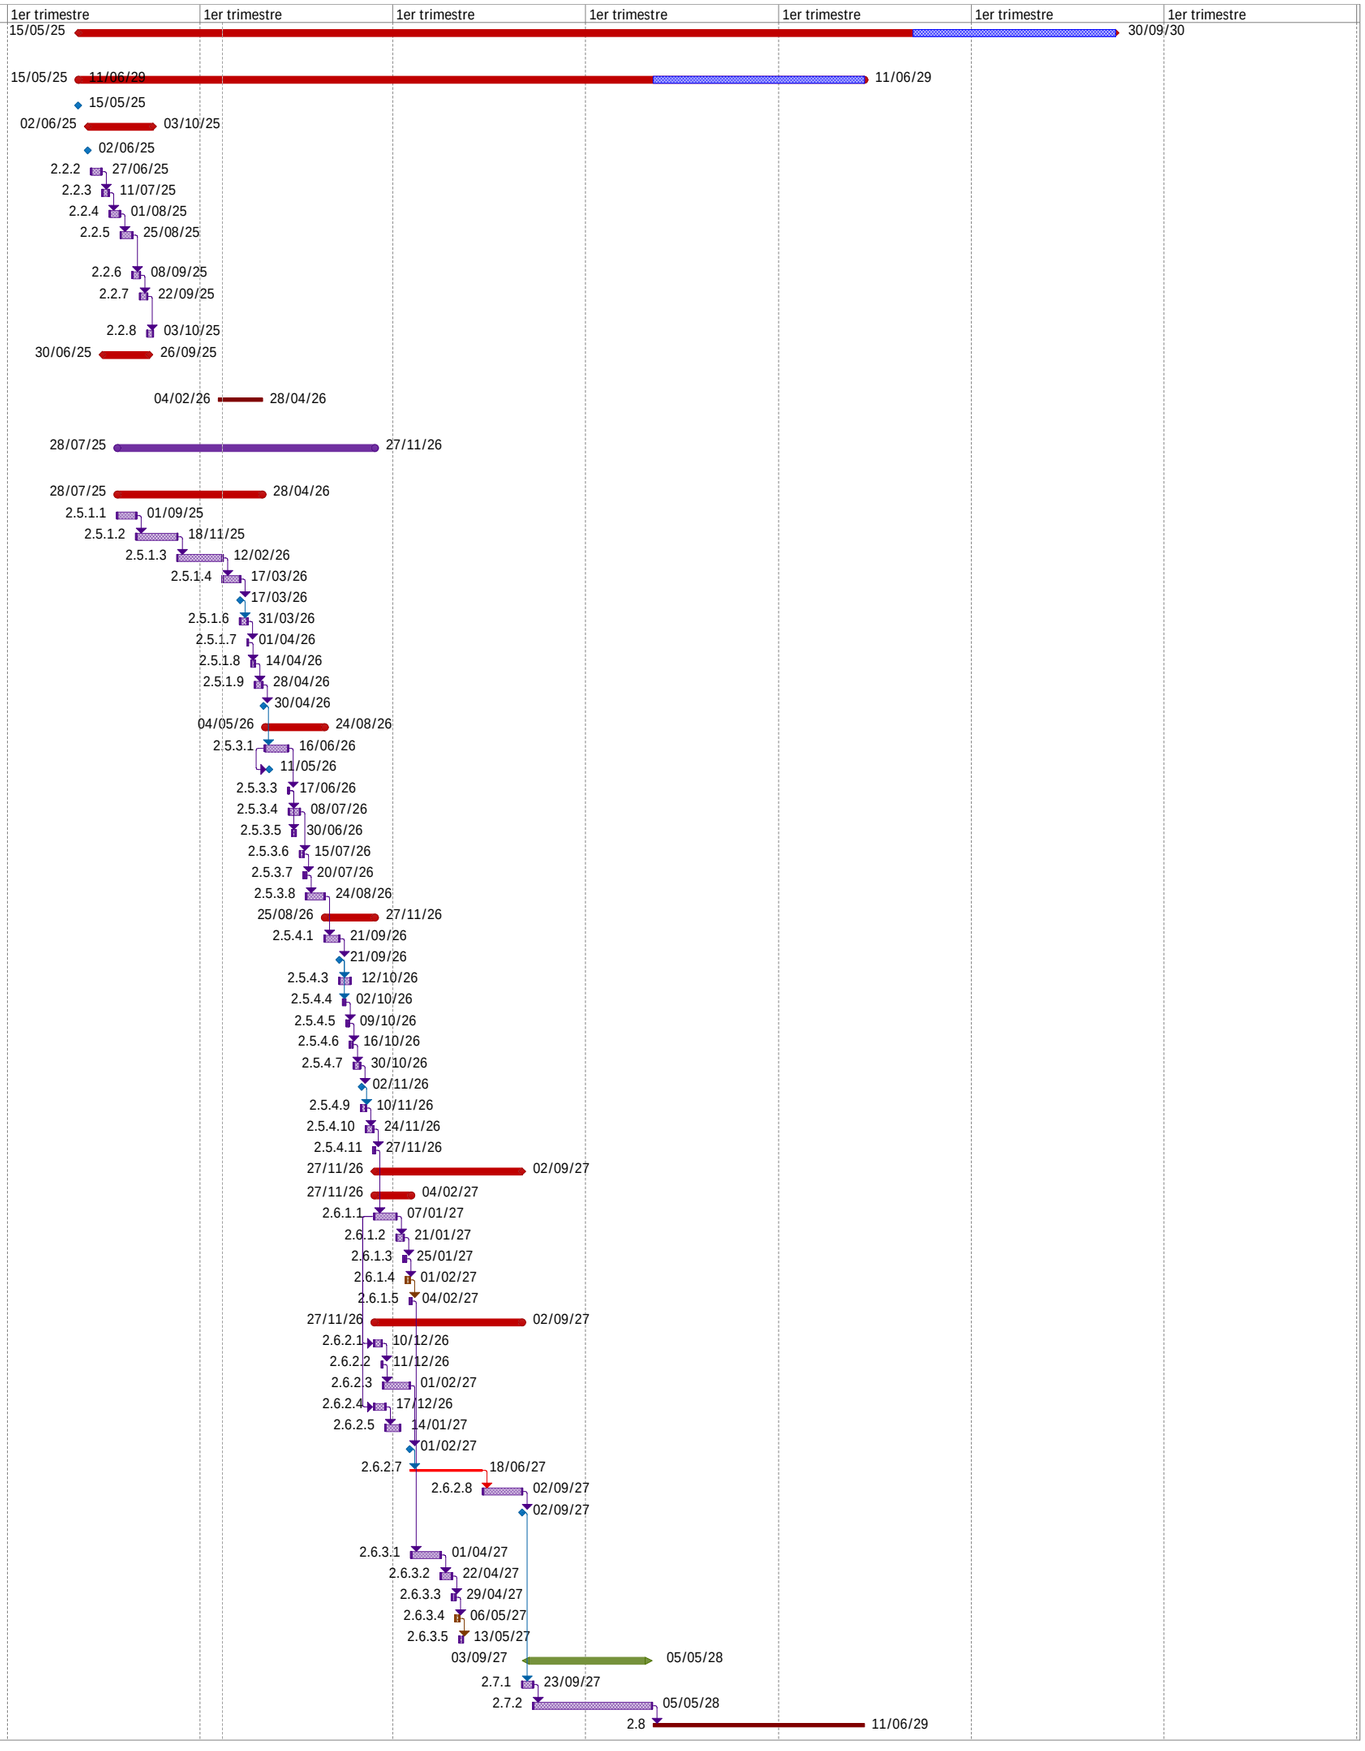N°	WBS	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	1	RECONSTRUCTION PUI	58,68 m	Jeu 15/05/25	Lun 30/09/30
87					
88	2	PARKING : RELOCALISATION PLACES STATIONNEMENT	44,27 m	Jeu 15/05/25	Lun 11/06/29
89	2.1	Initialisation de la mission	0 jr	Jeu 15/05/25	Jeu 15/05/25
90	2.2	Programmation Général en marché global sectoriel	3,59 m	Lun 02/06/25	Ven 03/10/25
91	2.2.1	Visite de site	0 jr	Lun 02/06/25	Lun 02/06/25
92	2.2.2	Réalisation Etude de faisabilité afin de consolider l'adéquation au site	3 sem.	Lun 09/06/25	Ven 27/06/25
93	2.2.3	Validation de l'Etude de faisabilité par le CHU	2 sem.	Lun 30/06/25	Ven 11/07/25
94	2.2.4	Rédaction du Programme Général	3 sem.	Lun 14/07/25	Ven 01/08/25
95	2.2.5	Restitution du programme Général à l'équipe projet en visioconférence	5 jrs	Lun 04/08/25	Lun 25/08/25
96	2.2.6	Validation du programme Général par l'équipe projet	2 sem.	Mar 26/08/25	Lun 08/09/25
97	2.2.7	Prise en compte des demandes d'adaptation et transmission de la version consolidée	2 sem.	Mar 09/09/25	Lun 22/09/25
98	2.2.8	Validation du programme Général par le CHU	9 jrs	Mar 23/09/25	Ven 03/10/25
99	2.3	Consultations autres prestataires intellectuels "Dossier de site" (Charge MOA)	2,45 m	Lun 30/06/25	Ven 26/09/25
104	2.4	Consultations autres prestataires intellectuels de l'acte à construire (BC et CSPS)	2,73 m	Mer 04/02/26	Mar 28/04/26
109	2.5	CHOIX DU GROUPEMENT ATTRIBUTAIRE DU MARCHE GLOBAL SECTORIEL	14,09 m	Lun 28/07/25	Ven 27/11/26
110	2.5.1	Phase Candidatures	7,95 m	Lun 28/07/25	Mar 28/04/26
111	2.5.1.1	Elaboration des pièces de consultation MOE	3 sem.	Lun 28/07/25	Lun 01/09/25
112	2.5.1.2	Validation de pièces de consultation par la MOA	11 sem.	Mar 02/09/25	Mar 18/11/25
113	2.5.1.3	Finalisation des pièces de consultation	52 jrs	Mer 19/11/25	Jeu 12/02/26
114	2.5.1.4	Lancement de l'AAPC / Candidatures	23 jrs	Ven 13/02/26	Mar 17/03/26
115	2.5.1.5	Ouverture des candidatures	0 jr	Mar 17/03/26	Mar 17/03/26
116	2.5.1.6	Analyse candidatures	2 sem.	Mer 18/03/26	Mar 31/03/26
117	2.5.1.7	Restitution de l'analyse en équipe projet	1 jr	Mer 01/04/26	Mer 01/04/26
118	2.5.1.8	Jury n°1 / Choix des 3 Groupements MGS admis à remettre une offre initial	5 jrs	Mer 08/04/26	Mar 14/04/26
119	2.5.1.9	Validation par le CHU	2 sem.	Mer 15/04/26	Mar 28/04/26
120	2.5.2	Envoi du DCE	0 jr	Jeu 30/04/26	Jeu 30/04/26
121	2.5.3	Phase Offres initiales	2,91 m	Lun 04/05/26	Lun 24/08/26
122	2.5.3.1	Elaboration des offres initiales	6 sem.	Lun 04/05/26	Mar 16/06/26
123	2.5.3.2	Visite de site par les 3 Equipes	0 jr	Lun 11/05/26	Lun 11/05/26
124	2.5.3.3	Remise des offres initiales à l'AMO pour analyse	1 jr	Mer 17/06/26	Mer 17/06/26
125	2.5.3.4	Analyse des offres initiales par AMO	3 sem.	Jeu 18/06/26	Mer 08/07/26
126	2.5.3.5	Réunions de Commission Technique avec le groupe de travail	4 jrs	Jeu 25/06/26	Mar 30/06/26
127	2.5.3.6	Finalisation du rapport de Commission Technique	1 sem.	Jeu 09/07/26	Mer 15/07/26
128	2.5.3.7	Jury n°2 de jugement des offres initiales / Audition des groupements MGS	3 jrs	Jeu 16/07/26	Lun 20/07/26
129	2.5.3.8	Négociation des offres initiales avec les groupements MGS	2 sem.	Mar 21/07/26	Lun 24/08/26
130	2.5.4	Phase Offres finales	3,14 m	Mar 25/08/26	Ven 27/11/26
131	2.5.4.1	Elaboration des offres finales	4 sem.	Mar 25/08/26	Lun 21/09/26
132	2.5.4.2	Remise des offres finales	0 jr	Lun 21/09/26	Lun 21/09/26
133	2.5.4.3	Analyse des offres finales par AMO	3 sem.	Mar 22/09/26	Lun 12/10/26
134	2.5.4.4	Réunions de Commission Technique avec le groupe de travail	4 jrs	Mar 29/09/26	Ven 02/10/26
135	2.5.4.5	Finalisation du rapport de Commission Technique	1 sem.	Lun 05/10/26	Ven 09/10/26
136	2.5.4.6	Jury n°3 de jugement des offres finales / Audition des groupements MGS	1 sem.	Lun 12/10/26	Ven 16/10/26
137	2.5.4.7	Validation par le CHU / Décision d'attribution du MGS	2 sem.	Lun 19/10/26	Ven 30/10/26
138	2.5.4.8	Information et transmission courriers aux non retenus	0 m	Lun 02/11/26	Lun 02/11/26
139	2.5.4.9	Délai STAND STILL	7 jrs	Lun 02/11/26	Mar 10/11/26
140	2.5.4.10	Mise au point groupement	2 sem.	Mer 11/11/26	Mar 24/11/26
141	2.5.4.11	Notification du MGS	3 jrs	Mer 25/11/26	Ven 27/11/26
142	2.6	ETUDES DE CONCEPTION	8,18 m	Ven 27/11/26	Jeu 02/09/27
143	2.6.1	Avant Projet Détaillé	1,82 m	Ven 27/11/26	Jeu 04/02/27
144	2.6.1.1	Mise au point du Dossier APD	4 sem.	Ven 27/11/26	Jeu 07/01/27
145	2.6.1.2	Analyse du Dossier	2 sem.	Ven 08/01/27	Jeu 21/01/27
146	2.6.1.3	Restitution au groupe de travail	3 jrs	Jeu 21/01/27	Lun 25/01/27
147	2.6.1.4	Validation interne CHU du rapport de synthèse de phase de conception	1 sem.	Mar 26/01/27	Lun 01/02/27
148	2.6.1.5	Validation Comité de Pilotage + OS par AMO	3 jrs	Mar 02/02/27	Jeu 04/02/27
149	2.6.2	Autorisations administratives	8,18 m	Ven 27/11/26	Jeu 02/09/27
150	2.6.2.1	Elaboration et validation MOA du dossier cas par cas	2 sem.	Ven 27/11/26	Jeu 10/12/26
151	2.6.2.2	Dépôt du dossier cas par cas à l'autorité environnementale	1 jr	Ven 11/12/26	Ven 11/12/26
152	2.6.2.3	Délai d'instruction du dossier cas par cas et exemption d'étude d'impact	26 jrs	Lun 14/12/26	Lun 01/02/27
153	2.6.2.4	Elaboration du dossier Permis de Construire	3 sem.	Ven 27/11/26	Jeu 17/12/26
154	2.6.2.5	Validation du dossier Permis de Construire par la maîtrise d'ouvrage	2 sem.	Ven 18/12/26	Jeu 14/01/27
155	2.6.2.6	Dépôt du Permis de Construire aux services instructeurs	0 jr	Lun 01/02/27	Lun 01/02/27
156	2.6.2.7	Délai d'instruction des demandes d'autorisations administratives	4,5 m	Mar 02/02/27	Ven 18/06/27
157	2.6.2.8	Délais de recours des tiers	2 m	Lun 21/06/27	Jeu 02/09/27
158	2.6.2.9	Obtention du Permis de Construire	0 m	Jeu 02/09/27	Jeu 02/09/27
159	2.6.3	Projet	3,18 m	Ven 05/02/27	Jeu 13/05/27
160	2.6.3.1	Elaboration du dossier PROJET	8 sem.	Ven 05/02/27	Jeu 01/04/27
161	2.6.3.2	Analyse	3 sem.	Ven 02/04/27	Jeu 22/04/27
162	2.6.3.3	Restitution au groupe de travail technique	1 sem.	Ven 23/04/27	Jeu 29/04/27
163	2.6.3.4	Validation interne CHU du rapport de synthèse de phase de conception	1 sem.	Ven 30/04/27	Jeu 06/05/27
164	2.6.3.5	Validation Comité de Pilotage + OS par AMO	1 sem.	Ven 07/05/27	Jeu 13/05/27
165	2.7	TRAVAUX & MISE EN SERVICE	7,68 m	Ven 03/09/27	Ven 05/05/28
166	2.7.1	Préparation et installations de chantier	3 sem.	Ven 03/09/27	Jeu 23/09/27
167	2.7.2	Travaux de construction et réception	7 m	Ven 24/09/27	Ven 05/05/28
168	2.8	GPA	12 m	Lun 08/05/28	Lun 11/06/29
