PLANNING D'EXÉCUTION DE LA RÉHABILITATION DU BÂTIMENT 051 - FRÉJUS
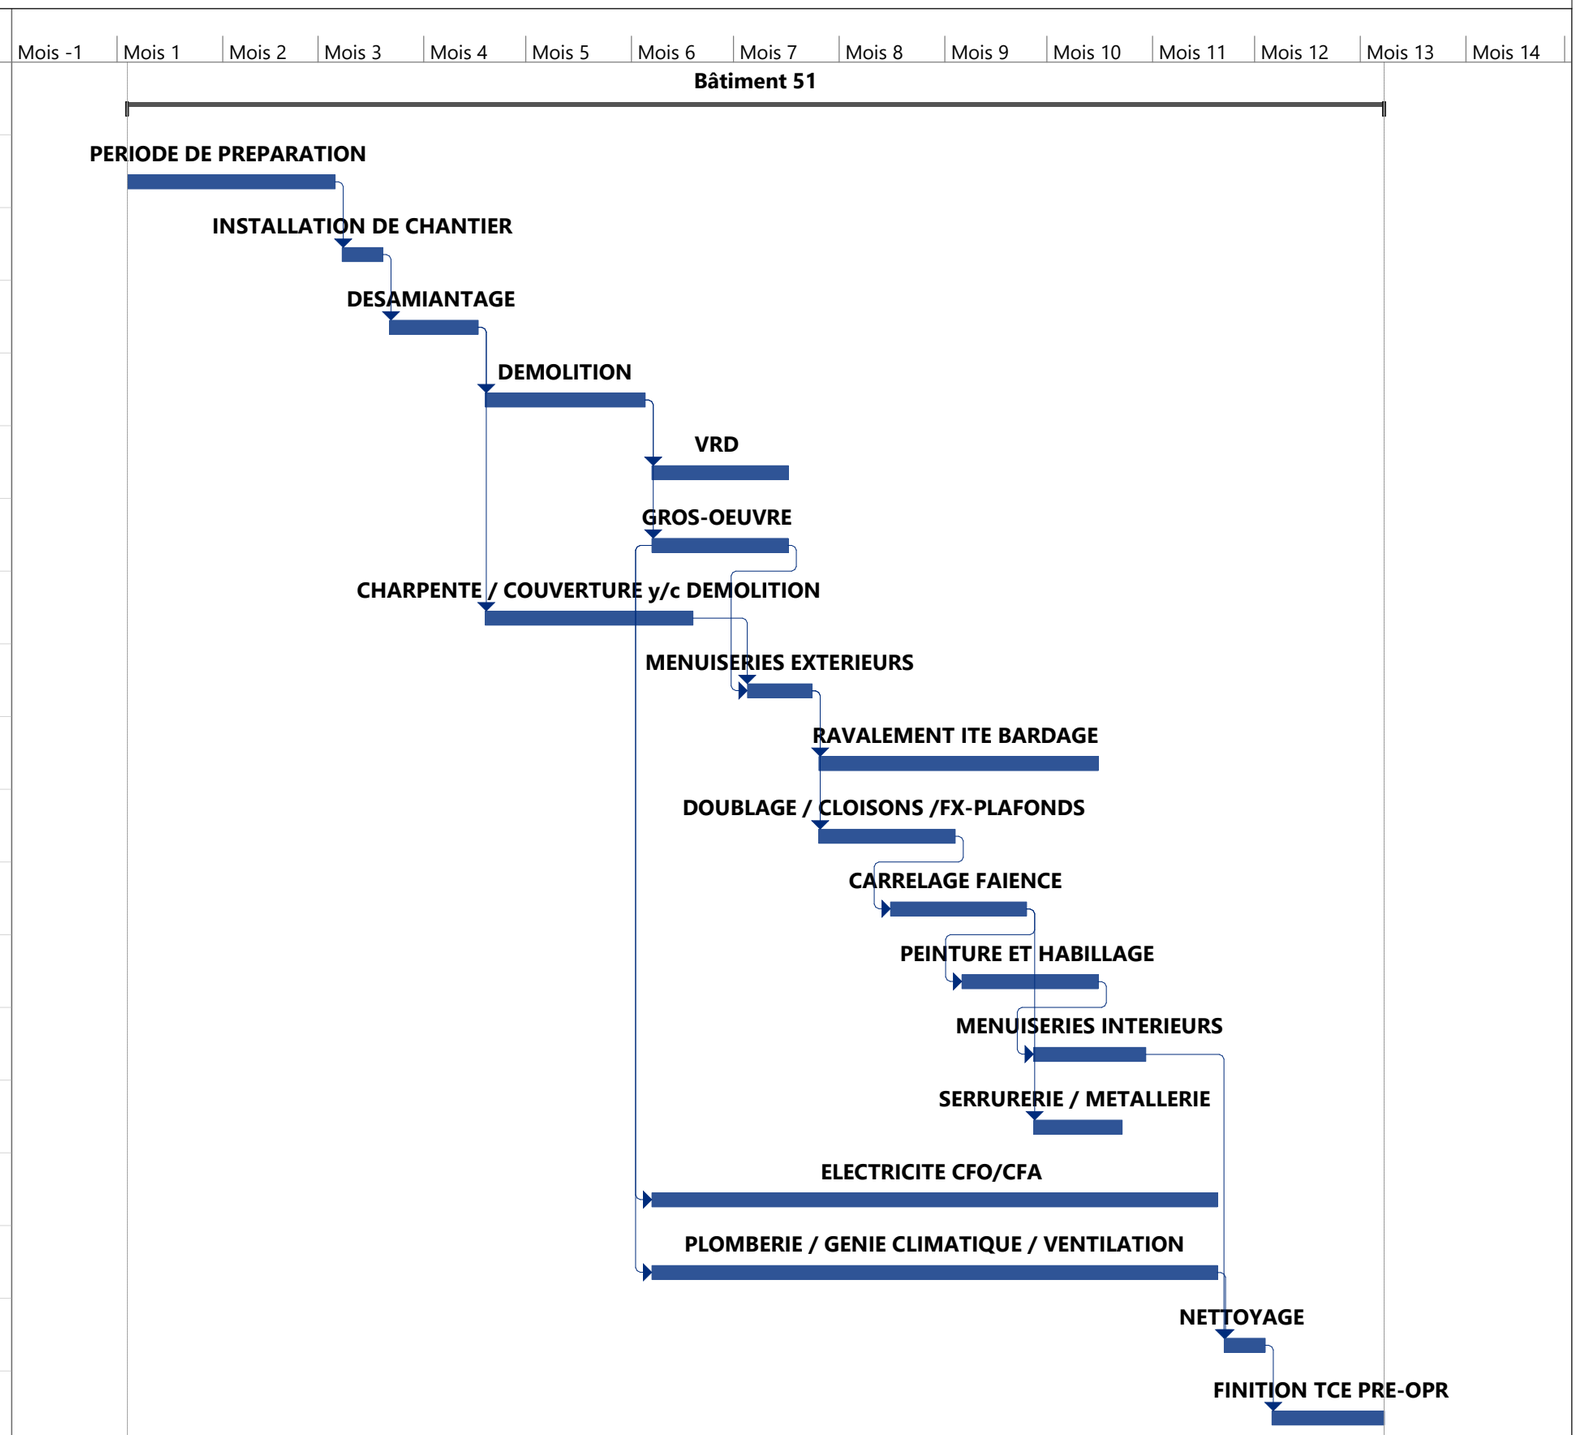
N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	**Bâtiment 51**	**265 jrs**	**Lun 04/01/27**	**Ven 07/01/28**
2	PERIODE DE PREPARATION	45 jrs	Lun 04/01/27	Ven 05/03/27
3	INSTALLATION DE CHANTIER	10 jrs	Lun 08/03/27	Ven 19/03/27
4	DESAMIANTAGE	20 jrs	Lun 22/03/27	Ven 16/04/27
5	DEMOLITION	35 jrs	Lun 19/04/27	Ven 04/06/27
6	VRD	30 jrs	Lun 07/06/27	Ven 16/07/27
7	GROS-OEUVRE	30 jrs	Lun 07/06/27	Ven 16/07/27
8	CHARPENTE / COUVERTURE y/c DEMOLITION	45 jrs	Lun 19/04/27	Ven 18/06/27
9	MENUISERIES EXTERIEURS	15 jrs	Lun 05/07/27	Ven 23/07/27
10	RAVALEMENT ITE BARDAGE	60 jrs	Lun 26/07/27	Ven 15/10/27
11	DOUBLAGE / CLOISONS /FX-PLAFONDS	30 jrs	Lun 26/07/27	Ven 03/09/27
12	CARRELAGE FAIENCE	30 jrs	Lun 16/08/27	Ven 24/09/27
13	PEINTURE ET HABILLAGE	30 jrs	Lun 06/09/27	Ven 15/10/27
14	MENUISERIES INTERIEURS	25 jrs	Lun 27/09/27	Ven 29/10/27
15	SERRURERIE / METALLERIE	20 jrs	Lun 27/09/27	Ven 22/10/27
16	ELECTRICITE CFO/CFA	120 jrs	Lun 07/06/27	Ven 19/11/27
17	PLOMBERIE / GENIE CLIMATIQUE / VENTILATION	120 jrs	Lun 07/06/27	Ven 19/11/27
18	NETTOYAGE	10 jrs	Lun 22/11/27	Ven 03/12/27
19	FINITION TCE PRE-OPR	25 jrs	Lun 06/12/27	Ven 07/01/28
