Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de NANCY
Désamiantage et mise en conformité des systèmes de ventilation désenfumage et SSI

N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs
1		Période de vacances Avril 2026	11 jours	Lun 06/04/26	Lun 20/04/26	
2		Période de vacance été 2026	41 jours	Lun 06/07/26	Lun 31/08/26	
3		Rentée Scolaire	1 jour	Mar 01/09/26	Mar 01/09/26	
4						
5						
6		**Notification**	**1 jour**	**Lun 02/03/26**	**Lun 02/03/26**	
7		Réunion de démarrage	1 jour	Lun 02/03/26	Lun 02/03/26	
8		**Période de préparation**	**30 jours**	**Lun 02/03/26**	**Ven 10/04/26**	**7DD**
9		Plan de retrait	30 jours	Lun 02/03/26	Ven 10/04/26	7DD
10		Etudes PAC	30 jours	Lun 02/03/26	Ven 10/04/26	7DD
11		Déménagement des équipements MOA	10 jours	Lun 02/03/26	Ven 13/03/26	7DD
12		Visa	30 jours	Lun 02/03/26	Ven 10/04/26	7DD
13		Installations de chantier	1 jour	Lun 06/04/26	Lun 06/04/26	1DD
14		**Phasage période de vacances d'Avril 2026**	**109 jours**	**Mar 07/04/26**	**Sam 05/09/26**	
15		Livraisons levage des gros équipements	5 jours	Mar 07/04/26	Lun 13/04/26	1DD
16		Diverses interventions sur le SSI	109,93 jours	Mar 07/04/26	Sam 05/09/26	13
17		Consignation des réseaux + électricité n-1 Ventilation TGBT	1 jour	Mar 07/04/26	Mar 07/04/26	1DD
18		Protection des zones de travaux	1 jour	Mar 07/04/26	Mar 07/04/26	1DD
19		Tirage des réseaux SSI en attente sur l'ensemble du bâtiment	10 jours	Mar 07/04/26	Lun 20/04/26	1DD
20		Dépose et repose divers équipements pour passages de réseaux + compléments	10 jours	Mar 07/04/26	Lun 20/04/26	1DD
21		Flocage gaines de désenfumage (N-1 Hors zones de désamiantage)	10 jours	Mar 07/04/26	Lun 20/04/26	1DD
22		Dépose de cloisons légères RDC	5 jours	Mar 07/04/26	Lun 13/04/26	1DD
23		Désamiantage zone TGBT - Baie - N-1 technique	5 jours	Mar 07/04/26	Lun 13/04/26	1DD
24		Nettoyage mesures empoussièrement	3 jours	Lun 13/04/26	Mer 15/04/26	23
25		Rebouchage des tremis passages de murs CF N-1 TGBT	3 jours	Jeu 16/04/26	Lun 20/04/26	24
26		Remise en service des réseaux + éléctricité	2 jours	Jeu 16/04/26	Ven 17/04/26	24
27		Repli de chantier et remise en état des lieux pour ouverture de la rentrée	1 jour	Jeu 16/04/26	Jeu 16/04/26	24
28		Auto-contrôles et vérifications de sécurité	1 jour	Ven 17/04/26	Ven 17/04/26	27
29						
30		**Phase période de vacances d'été 2026**	**30 jours**	**Lun 06/07/26**	**Ven 14/08/26**	
31		Installation de chantier	1 jour	Lun 06/07/26	Lun 06/07/26	2DD
32		Consignations des réseaux + électricité toutes zones de travaux	1 jour	Mar 07/07/26	Mar 07/07/26	31
33		Dépose de plancher techniques des amphithéatres + signalétique	2 jours	Mar 07/07/26	Mer 08/07/26	31
34		Désamaintage zone amphithéatre	5 jours	Mer 08/07/26	Mar 14/07/26	32
35		Désamiantage Zone R+2	2 jours	Mer 08/07/26	Jeu 09/07/26	32
36		Désamiantage zone R+1	2 jours	Ven 10/07/26	Lun 13/07/26	35
37		Désammiantage Zone RDC	5 jours	Mar 14/07/26	Lun 20/07/26	36
38		Désamaintage zone techniques N-1	5 jours	Mer 15/07/26	Mar 21/07/26	34
39		Nettoyage mesures d'empoussièrement	3 jours	Mer 22/07/26	Ven 24/07/26	38
40		Divers finitions	4 jours	Lun 27/07/26	Jeu 30/07/26	39
41						
42		Travaux sur SSI	5 jours	Mer 08/07/26	Mar 14/07/26	32
43		Installations des moteurs en toiture	5 jours	Mer 08/07/26	Mar 14/07/26	32
44		Pose des nouveaux clapets / volets CF / gaines / manchons et accessoires	10 jours	Lun 27/07/26	Ven 07/08/26	39
45		Percements et chevêtrages atrium	8 jours	Mar 07/07/26	Jeu 16/07/26	31
46		Amenée d'air de l'atrium	10 jours	Lun 27/07/26	Ven 07/08/26	39
47		Etanchéité des pénétrations atrium	5 jours	Lun 10/08/26	Ven 14/08/26	46
48		Raccordements des réseaux de désenfumage	5 jours	Lun 10/08/26	Ven 14/08/26	46
49		Repose des planchers amphithéatre	10 jours	Mer 15/07/26	Mar 28/07/26	34
50		**Mise en service essais (RVRAT)**	**1 jour**	**Lun 17/08/26**	**Lun 17/08/26**	**48**
51		Divers finitions nettoyage	17,93 jours	Lun 17/08/26	Mer 09/09/26	48
52		Commission sécurité	9,07 jours	Mar 01/09/26	Ven 11/09/26	
53		Réception	9,07 jours	Mar 01/09/26	Ven 11/09/26	51

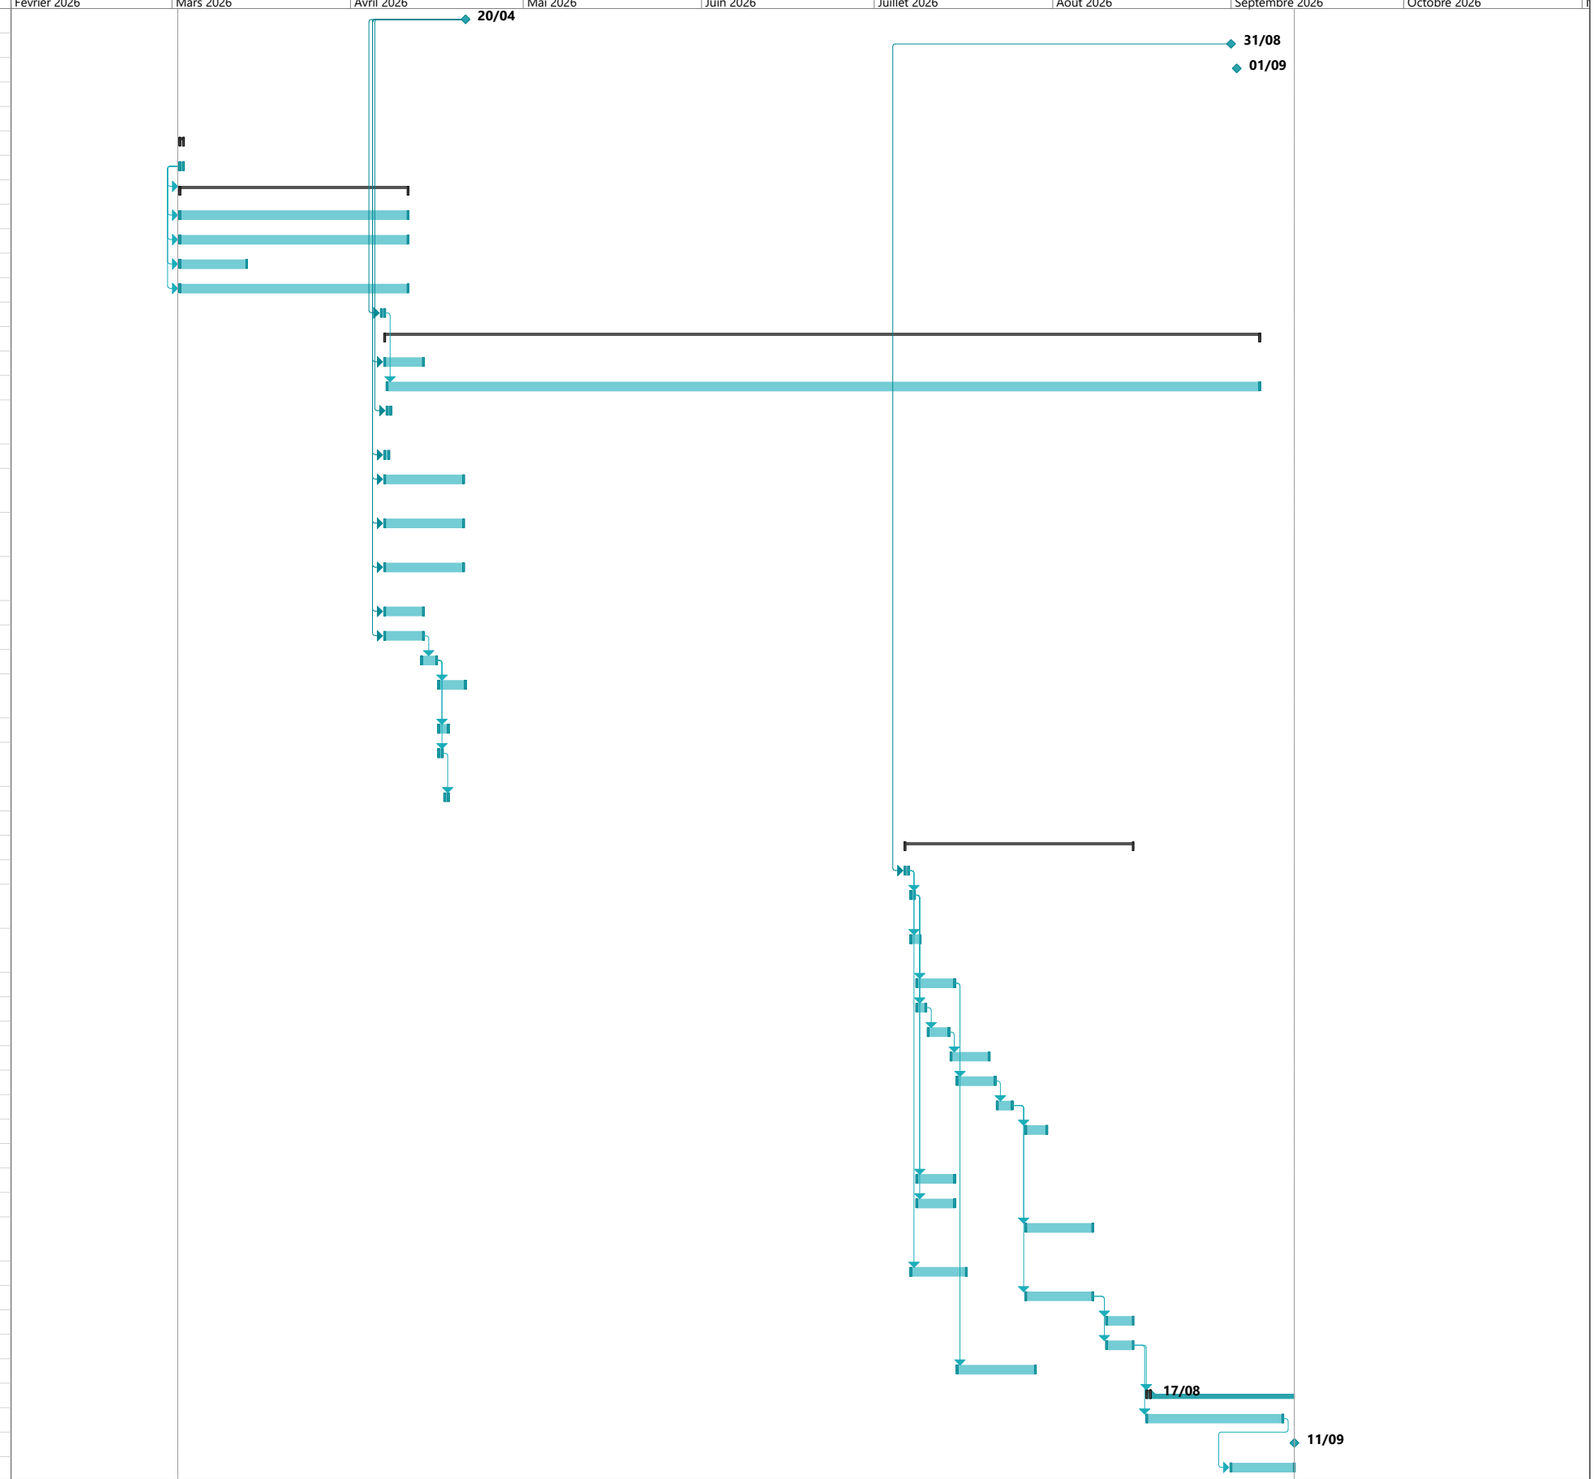

Projet : Plannig projet Décemb
Date : Lun 08/12/25

Tâche
Fractionnement
Jalon
Récapitulative
Récapitulatif du projet
Tâche inactive
Jalon inactif
Récapitulatif inactif
Tâche manuelle
Durée uniquement
Report récapitulatif manuel
Récapitulatif manuel
Début uniquement
Fin uniquement
Tâches externes
Jalons externes
Échéance
Avancement
Progression manuelle
