Construction du centre de périnatalité CH Laborit 86021 POITIERS

Lun 02/02/26

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	**23010 - Construction du centre de périnatalité CH Laborit 86021 POITIERS**	2 j?		
2				
3	**CALENDRIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX**	1 j?		
4	OS Démarrage travaux	0 j	Lun 01/06	OS Démarrage travaux
5	Période préparation 2 mois	40 j	Lun 01/06	Période préparation 2 mois
6	Travaux 15 mois	290 j	Lun 27/07	Travaux 15 mois
7				
8	**LOT 01 TERRASSEMENT - VRD - ESPACES VERTS**	**30 j**		
9	Dévoiement réseau / terrassement	30 j	Lun 29/06	Dévoiement réseau / terrassement
10				
11	**LOT 02 FONDATIONS SPECIALES**	**15 j**		
12	Fondations spéciales (pieux)	15 j	Lun 31/08	Fondations spéciales (pieux)
13				
14	**LOT 03 GROS ŒUVRE**	**145 j**		
15	Installation de chantier (base vie / clôture)	10 j	Lun 15/06	Installation de chantier (base vie / clôture)
16	Gros œuvre	90 j	Lun 21/09	Gros œuvre
17	Fabrication mur terre	110 j	Lun 15/06	Fabrication mur terre
18	Pose mur terre	35 j	Lun 07/12	Pose mur terre
19				
20	**LOT 04 CHARPENTE ET BARDAGE BOIS**	**65 j**		
21	Charpente bois	25 j	Lun 08/02	Charpente bois
22	Bardage bois	45 j	Lun 08/03	Bardage bois
23				
24	**LOT 05 ETANCHEITE**	**10 j**		
25	Etanchéité toit terrasse	10 j	Lun 15/03	Etanchéité toit terrasse
26				
27	**LOT 06 COUVERTURE TUILES - ZINGUERIE**	**25 j**		
28	Couverture tuiles - zinguerie	25 j	Lun 01/03	Couverture tuiles - zinguerie
29				
30	**LOT 07 SERRURERIE**	**15 j**		
31	Serrurerie	15 j	Lun 05/04	Serrurerie
32				
33	**LOT 08 MENUISERIE EXTERIEURE BOIS ET MIXTE BOIS / ALU**	**35 j**		
34	Chassis bois	35 j	Lun 22/03	Chassis bois
35	Mur rideau bois mixte bois/aluminium	35 j	Lun 22/03	Mur rideau bois mixte bois/aluminium
36				
37	**LOT 09 MENUISERIE INTERIEURE BOIS - MOBILIER**	**60 j**		
38	Menuiserie intérieure bois	60 j	Lun 26/04	Menuiserie intérieure bois
39				
40	**LOT 10 CLOISONS SECHES**	**60 j**		
41	Cloisons sèches	60 j	Lun 26/04	Cloisons sèches
42				
43	**LOT 11 PLAFONDS SUSPENDUS**	**35 j**		
44	Plafonds suspendus	35 j	Lun 05/07	Plafonds suspendus
45				
46	**LOT 12 CHAPE FLOTTANTE**	**35 j**		
47	Chapes flottantes R+1	10 j	Lun 31/05	Chapes flottantes R+1
48	Chapes flottantes Rdc	10 j	Lun 05/07	Chapes flottantes Rdc
49				
50	**LOT 13 SOLS COLLES**	**40 j**		
51	Sols collés	40 j	Lun 19/07	Sols collés
52				
53	**LOT 14 PEINTURE NETTOYAGE**	**70 j**		
54	Peinture	65 j	Lun 14/06	Peinture
55	Nettoyage	5 j	Lun 04/10	Nettoyage
56				
57	**LOT 15 ASCENSEUR**	**20 j**		
58	Ascenseur	20 j	Lun 10/05	Ascenseur
59				
60	**LOT 16 ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES**	**250 j**		
61	Electricité CF/Cf	250 j	Lun 21/09	Electricité CF/Cf
62				
63	**LOT 17 PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE RAFRAICHISSEMENT VENTILATION**	**250 j**		
64	Plomberie sanitaire chauffage rafraichissement ventilation	250 j	Lun 21/09	Plomberie sanitaire chauffage rafraichiss
65				
66	**LOT 18 PHOTOVOLTAIQUE**	**20 j**		
67	Photovoltaique	20 j	Lun 05/04	Photovoltaique
68				
69	**LOT 19 FORAGES**	**20 j**		
70	Forages	20 j	Lun 11/01	Forages
71				
72	**OPERATIONS DE RECEPTION**	**15 j**		
73	Visite des Opérations de Réception (OPR)	15 j	Lun 11/10	Visite des Opérations de Réception (OPR)
74	Livraison au MOA	0 j	Ven 29/10	Livraison au MOA

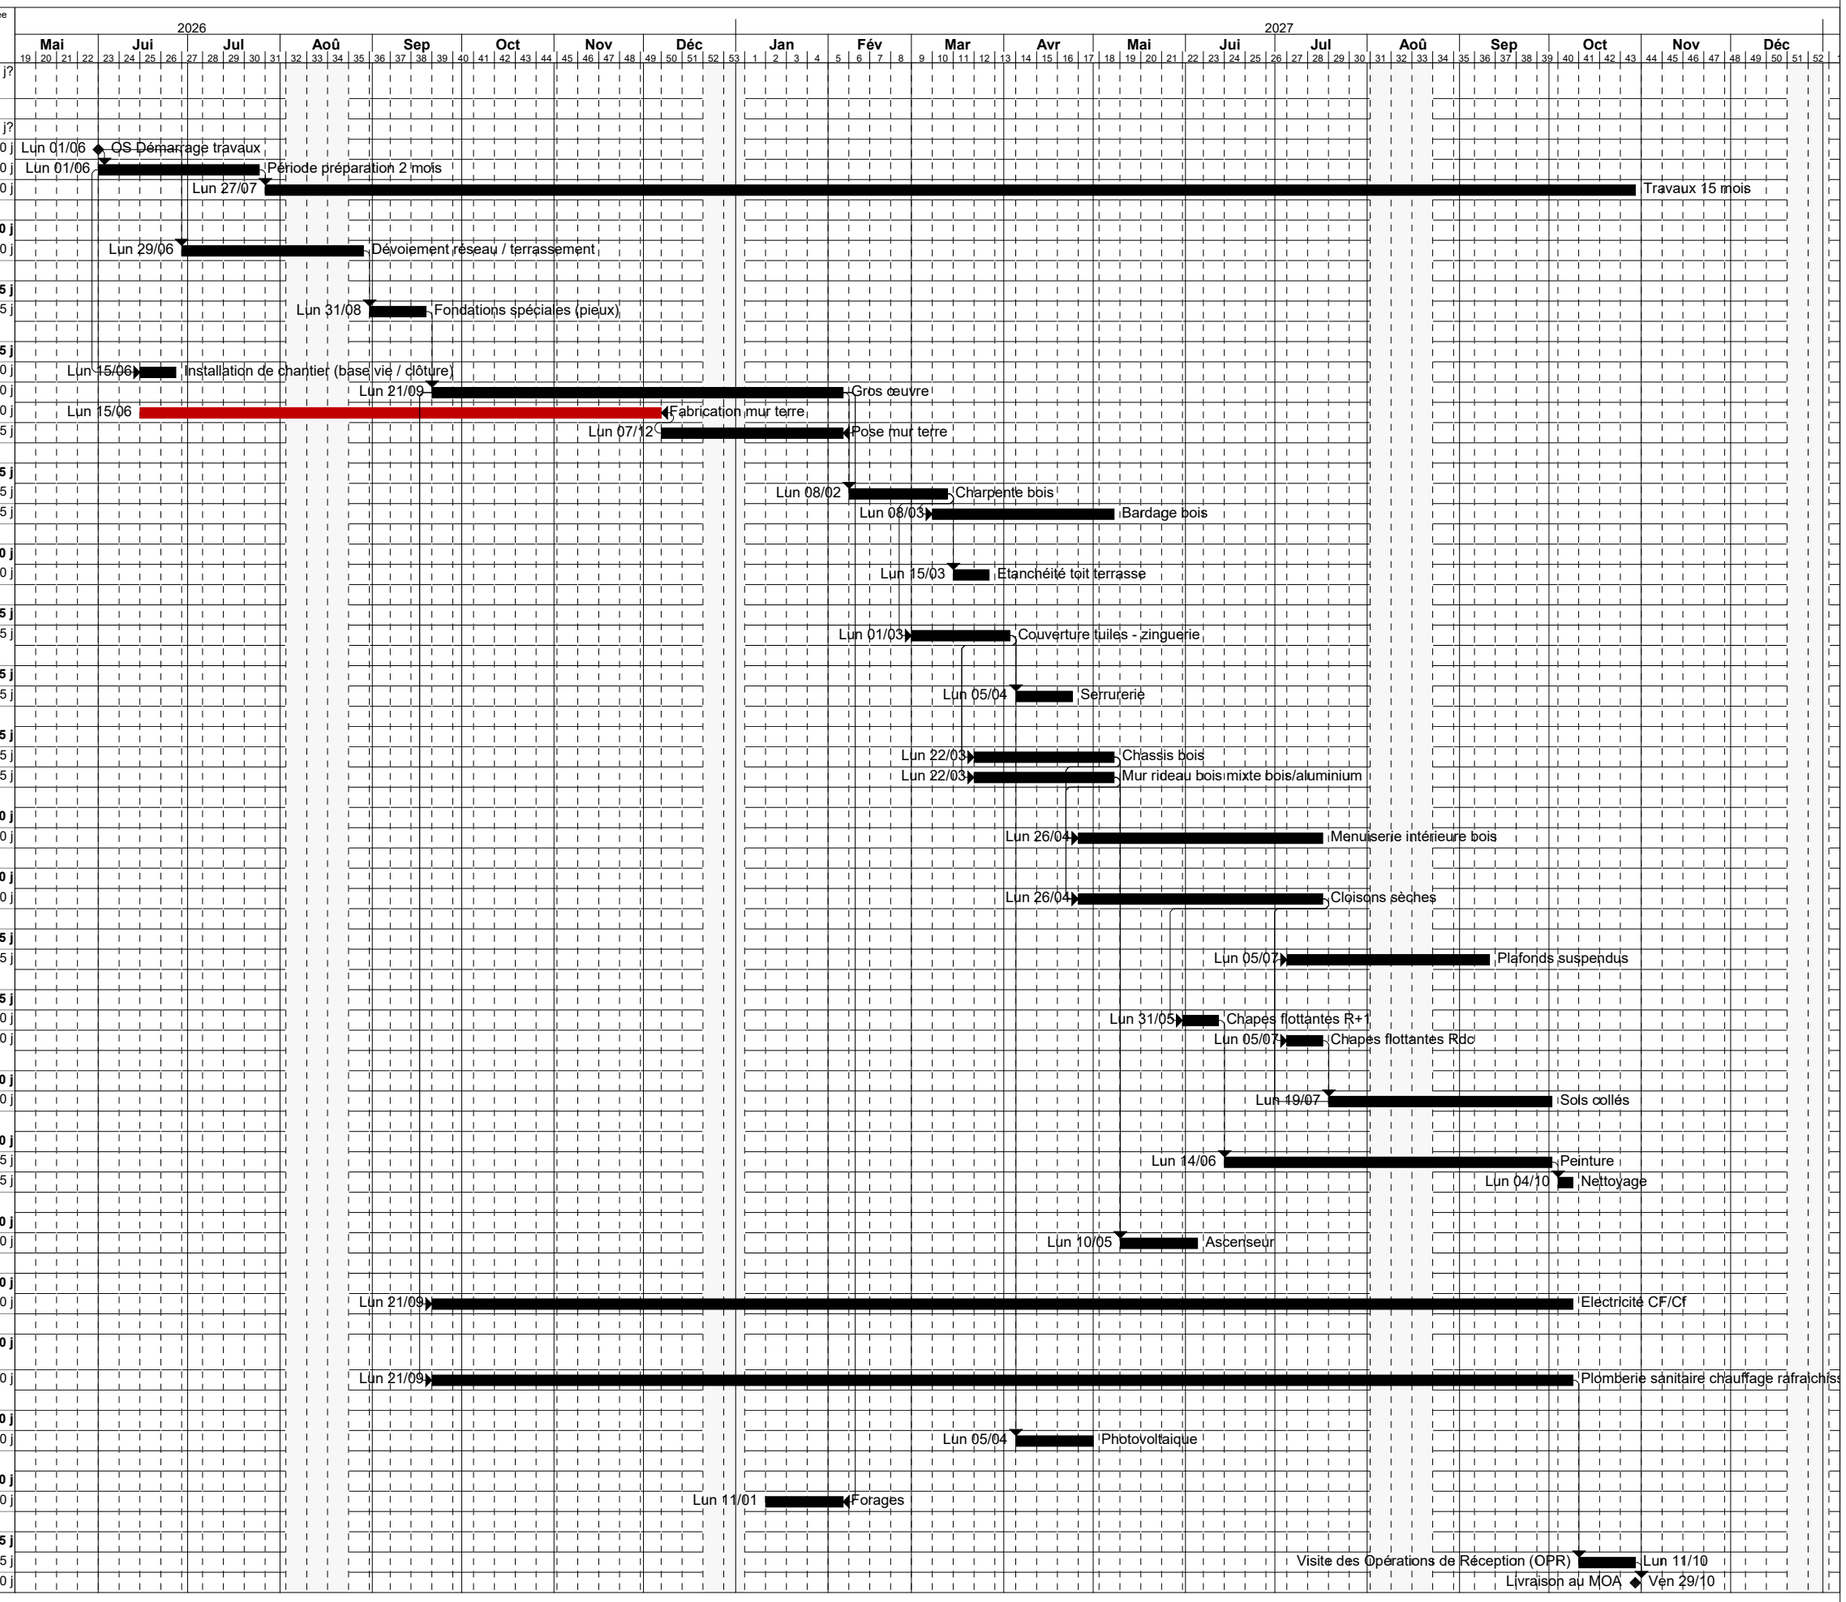

Téléphone 05 49 95 03 37 - CABINET MARET et associés SARL - Email : contact@cabinetmaret.fr
