**Bureau Veritas Exploitation SAS**
OSNY
Immeuble «Le Louisiane»
10 chaussée Jules César
ZA des Beaux Soleils
BP 338
95526 CERGY-PONTOISE Cedex France
Téléphone : 01 30 31 93 40
Mail : null

**A l'attention de RASANDY Holy**
MINISTERE DE LA JUSTICE
1 QUAI DE LA CORSE
75004 PARIS

# Pré-Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

**Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020 du 5 aout 2017**

**Dates de la visite :** 14/05/2018 **au** 07/06/2018

**Coordonnées du site :**
**Nom du site :** TGI BOBIGNY

**Immeuble bâti objet du repérage :**
Tribunal de Grande Instance de Bobigny
169-173 avenue Paul Vaillant Couturier
93000 BOBIGNY

**Numéro d'affaire :** 7129567
**Référence du rapport :** 7129567/S1.1.2.R
**Rédigé le :** 17/07/2018
**Opérateur de repérage :** Didier DENAVEAUT
**Date de la commande :** 19/01/2018

**Certification de compétence :** Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par QUALIXPERT 17 Rue Borrel, 81100 Castres Certificat n° C0425

| | Date de début de validité | Date de fin de validité |
|---|---|---|
| Amiante sans mention | 17/08/2017 | 16/08/2022 |
| Amiante avec mention | 17/08/2017 | 16/08/2022 |

Ce rapport contient **271** pages y compris les annexes et ne peut être reproduit qu'intégralement .

**Signature :**

# SOMMAIRE

**1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION....3**
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre....3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage....3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage....3

**2. CONCLUSIONS....4**
2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante....4
2.2. Investigation(s) approfondie(s) devant être réalisée(s) par le donneur d'ordre....5
2.3. Obligation d'information....8

**3. INFORMATIONS GENERALES....9**
3.1. Immeuble bâti objet de la mission....9
3.2. Intervenants....9
3.3. Opérateur(s) de repérage....9
3.4. Laboratoire(s)....9

**4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE....10**
4.1. Textes réglementaires....10
4.2. Méthodologie de la mission....10
4.3. Limites de la mission....10

**5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE....12**
5.1. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite....12
5.2. Conditions de visite....14

**6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE....15**

**7. ANNEXES....44**
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées....44
7.2. Croquis de repérage....49
7.3. Photos....113
7.4. Attestation d'assurance....149
7.5. Certificat de compétence....150
7.6. Rapports d'essais de laboratoire....151

# 1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

## 1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

| Description succincte du programme des travaux |
|---|
| Rénovation et mise aux normes des installations électriques conformément au Cahier des Clauses Techniques et Particulières du BET CPS en date du 09/2015 comprenant le remplacement des luminaires, des BAES, des câbles CFO/CFA, des câbles VDI, les tableaux divisionnaires TD-E/TD-O/TD-S et coffrets électriques ondulés conformément aux plans du dossier DCE. Sondage d'une PCF à 2 vantaux avec clapet-coupe dans les archives Niveau T / R-3 / TGI / T.40 à la demande de Monsieur BASLE. La rénovation comprends également la dépose et repose des faux-plafonds suivant le carnet de plans des zones. |

## 1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il est établi préalablement au repérage et définit les ouvrages et parties d'ouvrages du tableau A.1 de la norme NF X 46-020 concernés par les travaux prévus, susceptibles d'être présents dans l'immeuble bâti.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.
Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

*Ouvrages et parties d'ouvrages du tableau A.1 A de la norme NF X 46-020 concernés par les travaux prévus*

| Ouvrages de la construction | Parties d'ouvrage |
|---|---|
| Murs et cloisons maçonnés | / |
| Gaines et coffres verticaux | / |
| Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | / |
| Plafonds | / |
| Poutres et charpentes | / |
| Poteaux | / |
| Cloisons sêches (assemblées, préfabriquées) | / |
| Canalisations électriques préfabriquées | / |
| Faux plafonds | / |
| Revêtements de sol | / |
| Conduits et fourreaux | / |
| Clapets / volets coupe-feu | / |

## 1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

- parties du bâtiment :

  Ensemble des locaux du Tribunal de Grande Instance de Bobigny hors mis les zones déjà restructurées. Investigations approfondies non destructives en milieu occupé uniquement au droit des plafonds, des murs, des cloisons ainsi que les planchers techniques des locaux techniques et les placards techniques.

## 2. CONCLUSIONS

**L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies et/ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques.**

**Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.**

### 2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante


Copyright BUREAU VERITAS

| Matériaux et produits listés en annexe A de la norme NF X 46-020 concernés par les travaux prévus | | | |
|---|---|---|---|
| **Localisation** | **Ouvrage** | **Matériau ou produit** | **Description** |
| Niveau GT / Sous-sol / R-4 / Galerie(s) Technique(s) | Conduit | Enveloppe de calorifugeage | bitumineux, noir(e) |
| Niveau GT / Sous-sol / R-4 / Galerie(s) Technique(s) | Mur | Fourreau | fibre-ciment, gris(e) |
| Niveau T : Ssol / Bât. Annexe / Parkings | Conduit | Enveloppe de calorifugeage | bitumineux, noir(e) |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Aires de manœuvre | Mur | Fourreau | fibre-ciment, gris(e), encastré dans voile béton en partie basse vers aire de stationnement 190 |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Ventilation T09 | Conduit | Enveloppe de calorifugeage | bitumineux, noir(e) |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Groupe froid | Conduit | Enveloppe de calorifugeage | bitumineux, noir(e) |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Autocom T15 | Plancher | Fourreau | fibre-ciment, gris(e) |
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / LT 01 CTA | Conduit | Enveloppe de calorifugeage | bitumineux, noir(e) |
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / LT 01 CTA | Conduit d'air | Mastic | compact, marron |
| Niveau : 2ème étage / TGI / R+2 | Plafond | Joint de dilatation | mousse, gris(e), sous couvre-joint métallique (idem sols et murs) |
| Niveau : 3ème étage / TGI / R+3 | Plafond | Joint de dilatation | mousse, gris(e), sous couvre-joint métallique (idem sols et murs) |
| Niveau : 3ème étage / TGI / R+3 / Dégagements et zones d'attente | Plancher | Joint de dilatation | mousse, gris(e), dans zone attente de l'escalier B |
| Niveau : 4ème étage / TGI / R+4 | Plafond | Joint de dilatation | mousse, gris(e), sous couvre-joint métallique (idem sols et murs) |
| Niveau : 5ème étage / TGI / R+5 | Plafond | Joint de dilatation | mousse, gris(e), sous couvre-joint métallique (idem sols et murs) |
| Niveau : 5ème étage / TGI / R+5 / Zone locaux techniques | Conduit | Enveloppe de calorifugeage | bitumineux, noir(e) |
| Niveau : 6ème étage / TGI / R+6 | Plafond | Joint de dilatation | mousse, gris(e), sous couvre-joint métallique (idem sols et murs) |
| Niveau : 7ème étage / TGI / R+7 / Zones locaux techniques | Conduit | Enveloppe de calorifugeage | bitumineux, noir(e) |
| Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe / R-1 / LT CTA S04 | Conduit | Enveloppe de calorifugeage | bitumineux, noir(e) |
| Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe / R-1 / Archives Ind.S | Conduit | Enveloppe de calorifugeage | bitumineux, noir(e) |
| Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe / R-1 / Dégagements | Revêtement de sol | Dalle de sol | gris(e), Dalle vinyle 30x30 avec colle noire dans dégagement vers escalier A |
| Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe / R-1 / Sanitaires | Gaine | Joint | mastic, beige, sur gaine VMC |
| Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe / R-1 / Placard technique électrique | Plancher | Fourreau | fibre-ciment, gris(e) |

## 2.2. Investigation(s) approfondie(s) devant être réalisée(s) par le donneur d'ordre


Copyright BUREAU VERITAS

| Volumes, ouvrages, matériaux ou produits restant à investiguer | Motifs | Investigations approfondies à réaliser par le donneur d'ordre |
|---|---|---|
| Niveau GT / Sous-sol / Isolants des câbles électriques | Sous tension | Prévoir consignation électrique suivant la NFC 18-510 |
| Niveau GT / Sous-sol / Zones en pénétration des lignes fluides et chemins de câbles | Non accessibles | Prévoir consignation électrique suivant la NFC 18-510 |
| Niveau GT / Sous-sol / Joints entre brides et presse-étoupes sur anciennes vannes | Pour information - Matériaux ou produits de proximité (hors travaux) | Ne pas endommager les matériaux lors des travaux de rénovation et mise aux normes des installations électriques |
| Niveau T : Ssol / Bât. Annexe / Parkings / Isolants des câbles électriques | Sous tension | Prévoir consignation électrique suivant la NFC 18-510 |
| Niveau T : Ssol / Bât. Annexe / Parkings / Chambre de tirage | Non visible et accessible | Prévoir le retrait des trappes béton |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / Isolants des câbles électriques | Sous tension | Prévoir consignation électrique suivant la NFC 18-510 |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / Chambres de tirage (3 unités) dans zone archives scellés | Non visible et accessible (zone encombrée) | Prévoir le retrait des trappes béton |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / Vide sous plancher technique dans pièce T.15 | Difficile d'accès - Plancher technique bridé | Prévoir les moyens de démontage |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / Vides des plénums difficiles d'accès dans les pièces T.10, T.11 et T.20 | Faux-plafonds à lames bois clouées | Prévoir dépose du faux-plafond |
| Niveau S : R-2 / RDC / Parkings / Isolants des câbles électriques | Sous tension | Prévoir consignation électrique suivant la NFC 18-510 |
| Niveau S : R-2 / RDC / Parkings / TD.S et boites relais BAE | Non visibles et accessibles | Prévoir consignation électrique suivant la NFC 18-510 |
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / Zone "EX. CUISINE" | Hors programme | DAAT à réaliser ultérieurement |
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / TD.S dans local PC Sécurité S.40 | Sous tension | Prévoir consignation électrique suivant NFC 18-510 |
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / Vides des plénums sous gaines, coffres et plafonds en plaques de plâtre selon présence | Non visibles et accessibles (absence de trappes d'accès) | Prévoir ouverture |
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / Vides des plénums difficiles d'accès dans les sanitaires | Faux-plafonds à lames bois clouées | Prévoir dépose du faux-plafond |
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / Zone sanitaires dans pièce S.45 | Non visibles et accessibles (condamnés) | Prévoir ouverture des locaux |
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / Chambre de tirage | Non visible et accessible | Prévoir le retrait des trappes béton |
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / Isolants des câbles électriques | Sous tension | Prévoir consignation électrique suivant la NFC 18-510 |
| Niveau R : Pas Perdus / Parking / Isolants des câbles électriques | Sous tension | Prévoir consignation électrique suivant la NFC 18-510 |
| Niveau R : Pas Perdus / TGI / Vides des plénums sous gaines, coffres et plafonds en plaques de plâtre selon présence | Non visibles et accessibles (absence de trappes d'accès) | Prévoir ouverture |
| Niveau R : Pas Perdus / TGI / Isolants des câbles électriques | Sous tension | Prévoir consignation électrique suivant la NFC 18-510 |
| Niveau R : Pas Perdus / TGI / Vides des plénums difficiles d'accès dans les sanitaires | Faux-plafonds à lames bois clouées et en résille métallique selon présence | Prévoir dépose du faux-plafond |
| Niveau P : Parvis / TGI / Isolants des câbles électriques | Sous tension | Prévoir consignation électrique suivant la NFC 18-510 |
| Niveau P : Parvis / TGI / Vides des plénums difficiles d'accès dans les sanitaires | Faux-plafonds à lames bois clouées | Prévoir dépose du faux-plafond |

| Volumes, ouvrages, matériaux ou produits restant à investiguer | Motifs | Investigations approfondies à réaliser par le donneur d'ordre |
|---|---|---|
| Niveau P : Parvis / TGI / Vides des plénums sous gaines, coffres et plafonds en plaques de plâtre selon présence | Non visibles et accessibles (absence de trappes d'accès) | Prévoir ouverture |
| Niveau P : Parvis / TGI / TD Commande verrières | Sous tension | Prévoir consignation électrique suivant la NFC 18-510 |
| Niveau P : Parvis / TGI / Structures en béton sur parvis | Non accessibles (grandes hauteurs) | Prévoir une nacelle |
| Niveau : 1er étage / TGI / Vides des plénums difficiles d'accès dans les sanitaires | Faux-plafonds à lames bois clouées | Prévoir dépose du faux-plafond |
| Niveau : 1er étage / TGI / Vides des plénums sous gaines, coffres et plafonds en plaques de plâtre selon présence | Non visibles et accessibles (absence de trappes d'accès) | Prévoir ouverture |
| Niveau : 1er étage / TGI / Isolants des câbles électriques | Sous tension | Prévoir consignation électrique suivant la NFC 18-510 |
| Niveau : 2ème étage / TGI / Isolants des câbles électriques | Sous tension | Prévoir consignation électrique suivant la NFC 18-510 |
| Niveau : 2ème étage / TGI / Vides des plénums difficiles d'accès dans les sanitaires | Faux-plafonds à lames bois clouées | Prévoir dépose du faux-plafond |
| Niveau : 2ème étage / TGI / Vides des plénums sous gaines, coffres et plafonds en plaques de plâtre selon présence | Non visibles et accessibles (absence de trappes d'accès) | Prévoir ouverture |
| Niveau : 3ème étage / TGI / Vides des plénums difficiles d'accès dans les sanitaires | Faux-plafonds à lames bois clouées | Prévoir dépose du faux-plafond |
| Niveau : 3ème étage / TGI / Vides des plénums sous gaines, coffres et plafonds en plaques de plâtre selon présence | Non visibles et accessibles (absence de trappes d'accès) | Prévoir ouverture |
| Niveau : 3ème étage / TGI / Isolants des câbles électriques | Sous tension | Prévoir consignation électrique suivant la NFC 18-510 |
| Niveau : 4ème étage / TGI / Isolants des câbles électriques | Sous tension | Prévoir consignation électrique suivant la NFC 18-510 |
| Niveau : 4ème étage / TGI / Vides des plénums difficiles d'accès dans les sanitaires | Faux-plafonds à lames bois clouées | Prévoir dépose du faux-plafond |
| Niveau : 4ème étage / TGI / Vides des plénums sous gaines, coffres et plafonds en plaques de plâtre selon présence | Non visibles et accessibles (absence de trappes d'accès) | Prévoir ouverture |
| Niveau : 5ème étage / TGI / Isolants des câbles électriques | Sous tension | Prévoir consignation électrique suivant la NFC 18-510 |
| Niveau : 5ème étage / TGI / Vides des plénums difficiles d'accès dans les sanitaires | Faux-plafonds à lames bois clouées | Prévoir dépose du faux-plafond |
| Niveau : 5ème étage / TGI / Vides des plénums sous gaines, coffres et plafonds en plaques de plâtre selon présence | Non visibles et accessibles (absence de trappes d'accès) | Prévoir ouverture |
| Niveau : 6ème étage / TGI / Isolations des câbles électriques | Sous tension | Prévoir consignation électrique suivant la NFC 18-510 |
| Niveau : 6ème étage / TGI / Vides des plénums difficiles d'accès dans les sanitaires | Faux-plafonds à lames bois clouées | Prévoir dépose du faux-plafond |
| Niveau : 6ème étage / TGI / Vides des plénums sous gaines, coffres et plafonds en plaques de plâtre selon présence | Non visibles et accessibles (absence de trappes d'accès) | Prévoir ouverture |
| Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe / Isolants des câbles électriques | Sous tension | Prévoir consignation électrique suivant la NFC 18-510 |
| Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe / Vides des plénums sous gaines, coffres et plafonds en plaques de plâtre selon | Non visibles et accessibles (absence de trappes d'accès) | Prévoir ouverture |

| Volumes, ouvrages, matériaux ou produits restant à investiguer | Motifs | Investigations approfondies à réaliser par le donneur d'ordre |
|---|---|---|
| présence | | |
| Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe / Clapet coupe-feu dans pièce 1 "scellés" | Zone encombrée - Matériel sensible | Prévoir de donner l'accès |
| Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe / Colle et joints de faience 15x15 blanc | Zone encombrée - Matériel sensible | Prévoir de donner l'accès |
| Niveau R+0 / RDC / Bât. Annexe / Isolants des câbles électriques (placard technique électrique) | Sous tension | Prévoir consignation électrique suivant la NFC 18-510 |
| Niveau : Pas Perdus / Bât. Annexe / Vide de plénum dans le sanitaire | Faux-plafond à lames bois clouées | Prévoir dépose du faux-plafond |
| Niveau : Pas Perdus / Bât. Annexe / Isolants des câbles électriques | Sous tension | Prévoir consignation électrique suivant la NFC 18-510 |
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Ensemble des pièces Ind.S / Sanitaires H/F dans pièce S.45 | Zone condamnée | Prévoir ouverture des locaux |
| Niveau R : Pas Perdus / TGI / R-1 / Zone ICJ / Pièce R.63 | Locaux occupés | Evacuation définitive des locaux |
| Niveau R : Pas Perdus / TGI / R-1 / Zone ICJ / Pièce R.66 | Locaux occupés | Evacuation définitive des locaux |
| Niveau R : Pas Perdus / TGI / R-1 / Zone ICJ / Pièce R.67 | Locaux occupés | Evacuation définitive des locaux |
| Niveau R : Pas Perdus / TGI / R-1 / Logement S10 - 1er étage / Complexe d'étanchéité sur les terrasses | Sondage destructif | Prévoir l'intervention d'une société d'étanchéité pour procéder aux réparations |
| Niveau P : Parvis / TGI / R+0 / Zone SA N°2 / WC Handicapé | Absence de clé - Serrure condamnée | Prévoir l'ouverture de la porte |
| Niveau P : Parvis / TGI / R+0 / Zone ICJ / Pièce P.71 | Locaux occupés | Evacuation définitive des locaux |
| Niveau : 5ème étage / TGI / R+5 / Zone locaux techniques / Local machinerie d'ascenseur Ouest | Non visible et accessible - Absence de clé pour l'échelle - Echelle trop courte | Prévoir les moyens d'accès avec les clés (OTIS) |
| Niveau : 7ème étage / TGI / R+7 / Zones locaux techniques / Local machinerie d'ascenseur Est | Non visible et accessible - Absence de clé pour l'échelle - Echelle trop courte | Prévoir les moyens d'accès avec les clés (OTIS) |

## 2.3. Obligation d'information

**Dans tous les cas, et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, il est nécessaire d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.**

## Remarque(s) complémentaire(s):

Il a été repéré des matériaux et produits de proximité contenant de l'amiante à titre indicatif et schématique "hors programme de travaux" (enveloppes de calorifugeages bitumineuses, joints type tresses de dilatation, mastics de gaines de ventilation, dalles de sol) suivant les conclusions des documents consultés.
Recommandation : Il conviendra donc à l'entreprise en charge des travaux de ne pas endommager ou de créer de vibration en fonction de la typologie des matériaux ou produits. Il en est de même pour les mastics des gaines "VMC" visibles mais non accessibles dans certains sanitaires (faux-plafonds à lames bois clouées et/ou en plaques de plâtre). Il est à noter également qu'un rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux a été produit par la société DDP EXPERT HOME pour la même opération sous le dossier 15/IMO/0180 en date du 25/03/2015. Nous avons veillé à la cohérence de l'ensemble des recherches et au recollement des résultats.

# 3. INFORMATIONS GENERALES

## 3.1. Immeuble bâti objet de la mission

**Adresse:** Tribunal de Grande Instance de Bobigny
169-173 avenue Paul Vaillant Couturier
93000 BOBIGNY

| Bâtiment | Fonction principale | Classement | Date du permis de construire ou année de construction | Année de réhabilitation ou description des modifications : |
|---|---|---|---|---|
| Tribunal de Grande Instance de Bobigny | Bureaux | ERP catégorie 1 à 4 | 1983 | non communiqué |

Le repérage porte exclusivement sur les parties de bâtiments et les locaux dont la liste est détaillée en annexe Parties d'immeubles bâti visitées

## 3.2. Intervenants

| Partie prenante | Société | Adresse | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| Commanditaire du repérage | MINISTERE DE LA JUSTICE<br>Holy RASANDY | 1 QUAI DE LA CORSE<br>75004 PARIS | 0153629154<br>0618076552<br>holy.rasandy@justice.gouv.fr |
| Propriétaire | MINISTERE DE LA JUSTICE<br>Holy RASANDY | 1 QUAI DE LA CORSE<br>75004 PARIS | 0153629154<br>0618076552<br>holy.rasandy@justice.gouv.fr |
| Pas d'accompagnateur | / | / | / |

## 3.3. Opérateur(s) de repérage

| Société | Nom | Organisme de certification | N° de certification* | Date d'obtention de la certification | Date de validité de la certification |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureau Veritas Exploitation<br>790 184 675 00755 | Didier DENAVEAUT | QUALIXPERT | C0425 | 17/08/2017 | 16/08/2022 |

## 3.4. Laboratoire(s)

| Société | N° d'accréditation Cofrac | Adresse | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| Eurofins LEM | 1-1751 | 20, rue du KochersbergCS 50047 67701 SAVERNE CEDEX 1France | +33 3 88 02 14 35 |


Copyright BUREAU VERITAS

# 4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe A de la norme NF X 46-020, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

## 4.1. Textes réglementaires

Code du travail : article R4412-97

Norme NF X 46-020 du 5 aout 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

## 4.2. Méthodologie de la mission

L'opérateur de repérage examine de façon exhaustive toutes les parties de bâtiment concernées et affectées par le programme des travaux.
Il identifie les ouvrages de la construction, puis inspecte les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante en se référant à l'annexe A de la norme NF X 46-020 qui constitue la base du repérage.

Le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante comprend au minimum une inspection visuelle des ouvrages de la construction afin de rechercher et d'identifier les différents matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante.
Cette inspection peut être suivie :

d'investigations approfondies qui peuvent être destructives,
de sondages,
de prélèvements pour déterminer par analyse, la présence effective d'amiante dans les matériaux et produits préalablement identifiés comme étant susceptibles de contenir de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Les matériaux et produits sont identifiés, localisés, et leurs caractéristiques sont renseignées.
En fonction des informations dont il dispose (documents, marquage sur les matériaux), de sa connaissance des matériaux et produits, l'opérateur de repérage peut conclure à la présence d'amiante.
En cas de doute sur la présence d'amiante (absence d'informations documentaires, produits non identifiés), il effectue un (ou des) prélèvement(s) pour analyses sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour conclure.
Les prélèvements sont effectués sur toute l'épaisseur du matériau. L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés. Il transmet au laboratoire d'analyse une fiche d'accompagnement.

Conformément aux dispositions de la norme NF X 46-020, les analyses des échantillons de ces matériaux et produits sont réalisées par un organisme accrédité.

## 4.3. Limites de la mission

Le présent repérage ne peut être utilisé que dans les limites de la présente mission et uniquement pour le périmètre et le programme des travaux prévus communiqués par le donneur d'ordre.
La présente mission n'est en aucun cas assimilable à un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux de démolition tel que défini par les articles R.1334-19 et R.1334-22 du Code de la Santé Publique, et n'est pas adaptée ni suffisante à l'évaluation du risque amiante en cas de démolition.

Dans le cadre de notre mission, seuls les ouvrages et parties d'ouvrages clairement identifiés comme concernés par les travaux prévus selon le programme et le périmètre fourni par le donneur d'ordre, font l'objet du présent repérage.
En cas de programme et/ou de périmètre de travaux imprécis, insuffisamment détaillé, non abouti ou ambigu, il revient au donneur d'ordre de vérifier que les produits et matériaux impactés par les travaux prévus ont bien fait l'objet de recherche de présence ou d'absence d'amiante.
En cas de changement, ajout ou modification du périmètre et/ou du programme de travaux, il conviendra au donneur d'ordre de faire réaliser les investigations supplémentaires nécessaires.

La recherche des matériaux pouvant contenir de l'amiante (MPCA) de l'annexe A de la norme NF X 46-020 est réalisée par recherche visuelle et investigation destructrice d'ouvrages et de parties d'ouvrages, avec prélèvements d'échantillons selon une méthode d'échantillonnage respectant en cela les prescriptions de cette norme.

Cette recherche ne peut cependant être exhaustive compte tenu de la multitude de formes que peut prendre l'amiante, le caractère aléatoire et sporadique de son ajout aux matériaux du bâtiment, notamment pour les matériaux non manufacturés mis en œuvre lors de la construction ou des travaux réalisés (enduits, colles de faïence et de carrelage, ragréages…), son inclusion dans les éléments du bâti et/ ou sa dissimulation par d'autres matériaux.

Certains MPCA de l'annexe A de la norme NF X 46-020 peuvent donc ne pas être mis en évidence par la méthode de recherche conventionnelle : détermination de zones présentant des similitudes d'ouvrage, fréquence de sondage à l'intérieur

de celles-ci conformément à la norme NF X 46-020.

Il n'est ainsi pas exclu que certains MPCA de l'annexe A de la norme NF X 46-020 puissent être mis en évidence ultérieurement lors d'autres opérations de travaux, de démolition ou de réhabilitation.

L'ancienneté des matériaux contenant de l'amiante, les diverses agressions qu'ils subissent, peuvent entraîner la dénaturation de ceux-ci et donner lieu à la libération spontanée de fibres d'amiante. Ainsi, des fibres peuvent migrer et polluer un produit ou un matériau non réputé contenir de l'amiante, se trouvant à proximité du matériau amianté. L'intervention ne prend pas en compte dans le présent repérage, cet effet de pollution éventuelle.
Les résultats antérieurs, en matière de repérage d'amiante, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes réglementaires et normatifs.

# 5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

**Dates d'intervention :** du 14/05/2018 au 07/06/2018

## 5.1. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

*Rapports de repérage amiante :*

| Références rapport de repérage | Date rapport | Auteur rapport | Objet du repérage | Principales conclusions |
|---|---|---|---|---|
| AB ADTA 050232 | 10/04/2006 | AB EXPERTISES - Monsieur DEVIC | Repérage en vue de la constitution du " DTA " | Présence de matériau ou produit contenant de l'amiante |
| 15/IMO/0180 | 12/04/2015 | DDP EXPERT HOME - Monsieur MENACER | Repérage avant travaux | Absence de matériau ou produit contenant de l'amiante |
| 2CM16-23 | 26/08/2016 | AT-DIAG SAS - Madame MOINET | Repérage avant travaux | Présence de matériau ou produit contenant de l'amiante |
| 40_PJ BOBIGNY_RPINNAX-DTA | 07/06/2017 | INNAX Energie et Environnement - Monsieur MYRTIL | Repérage en vue de la constitution du " DTA " | Présence de matériau ou produit contenant de l'amiante |

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

*Autres documents :*


Copyright BUREAU VERITAS

| Titre | Référence | Type Document |
|---|---|---|
| CPS - Dossier DCE - 2015 | PRO.05 - Indice B | Plan |
| CPS - Dossier DCE - 2015 | PRO.06 - Indice B | Plan |
| CPS - Dossier DCE - 2015 | PRO.04 - Indice B | Plan |
| CPS - Dossier DCE - 2015 | PRO.03 - Indice B | Plan |
| CPS - Dossier DCE - 2015 | PRO.02 - Indice B | Plan |
| CPS - Dossier DCE - 2015 | PRO.09 - Indice B | Plan |
| CPS - Dossier DCE - 2015 | PRO.10 - Indice B | Plan |
| CPS - Dossier DCE - 2015 | PRO.08 - Indice B | Plan |
| CPS - Dossier DCE - 2015 | PRO.07 - Indice B | Plan |
| CPS - Dossier DCE - 2015 | PRO.P1 - Indice B | Plan |
| CPS - Dossier DCE - 2015 | PRO.P2 - Indice B | Plan |
| CPS - Dossier DCE - 2015 | PRO.AN - Indice B | Plan |
| CPS - Dossier DCE - 2015 | PRO.11 - Indice B | Plan |
| CPS - Dossier DCE - 2015 | FP.01 - Indice 0 | Plan |
| CPS - Dossier DCE - 2015 | LSC.01 - Indice 0 | Plan |
| CPS - Dossier DCE - 2015 | PRO.P4 - Indice B | Plan |
| CPS - Dossier DCE - 2015 | PRO.P3 - Indice B | Plan |
| CPS - Dossier DCE - 2015 | LSC.AN - Indice 0 | Plan |
| CPS - Dossier DCE - 2015 | SHE - Indice 0 | Plan |
| CPS - Dossier DCE - 2015 | LSC.03 - Indice 0 | Plan |
| CPS - Dossier DCE -2015 | LSC.02 - Indice 0 | Plan |
| CPS - Dossier DCE - 2015 | CCTP - Indice J | Programme des travaux |
| CPS - Dossier DCE - 2015 | DPGF - Indice H | Programme des travaux |
| CPS - Dossier DCE - 2014 | ZR.01 - Indice A | Plan |
| CPS - Dossier DCE - 2015 | SYN.01 - Indice B | Plan |
| CPS - Dossier DCE - 2014 | PL.01 - Indice 0 | Plan |
| CPS - Dossier DCE - 2015 | Planning - Indice F | Programme des travaux |
| CPS - Dossier DCE - 2015 | EX.01 - Indice A | Plan |
| CPS - Dossier DCE - 2015 | EX.02 - Indice A | Plan |
| CPS - Dossier DCE - 2015 | SYN.LSC - Indice A | Plan |
| CPS - Dossier DCE - 2014 | SYN.02 - Indice A | Plan |
| CPS - Dossier DCE - 2015 | EX.05 - Indice A | Plan |
| CPS - Dossier DCE - 2015 | EX.06 - Indice A | Plan |
| CPS - Dossier DCE - 2015 | EX.04 - Indice A | Plan |
| CPS - Dossier DCE - 2015 | EX.03 - Indice A | Plan |
| CPS - Dossier DCE - 2015 | EX.09 - Indice A | Plan |
| CPS - Dossier DCE - 2015 | EX.10 - Indice A | Plan |
| CPS - Dossier DCE - 2015 | EX.08 - Indice A | Plan |
| CPS - Dossier DCE - 2015 | EX.07 - Indice A | Plan |
| CPS - Dossier DCE - 2015 | EX.P1 - Indice A | Plan |
| CPS - Dossier DCE - 2015 | EX.P2 - Indice A | Plan |
| CPS - Dossier DCE - 2015 | EX.AN - Indice A | Plan |
| CPS - Dossier DCE - 2015 | EX.11 - Indice A | Plan |
| CPS - Dossier DCE - 2015 | PRO.01 - Indice B | Plan |
| CPS - Dossier DCE - 2015 | EX.P4 - Indice 1 | Plan |
| CPS - Dossier DCE - 2015 | EX.P3 - Indice A | Plan |

### 5.2. Conditions de visite

| |
|---|
| Absence d'accompagnement par une personne préalablement désignée par le donneur d'ordre |
| Absence d'informations décrivant les produits, matériaux et protections physiques mises en place |
| Absence de communication des anciens rapports de repérage |
| Impossibilité d'accéder à certains locaux, parties de locaux, composants ou parties de composant |

**Remarque(s) complémentaire(s):**

Intervention en milieu occupé. TD-E, TD-O, CFO, CFA, VDI et coffrets électriques ondulés sous tension au jour du contrôle avec cheminements et identifications inconnus sur les plans du BET. Les cheminements des réseaux électriques enterrés sont également non identifiés. Les zones des scellés judiciaires sous la responsabilité des greffiers en chef du tribunal (zones archives) ont fait l'objet d'une visite mais aucuns prélèvements n'ont pu être réalisés dans certaines zones. Aucuns travaux ne sont prévus dans les trémies des ascenseurs, dans les gaines techniques (réseaux de fluides) et sur les installations électriques des CTA, Groupe Froid, Sous-station, machineries des ascenseurs (TD et distributions à conserver).


Copyright BUREAU VERITAS

# 6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Abréviations du tableau :

*Px* = prélèvement pour analyse n°X
*Idem Px* = produit ou matériau identique que celui ayant fait l'objet du Px (zone présentant une similitude d'ouvrage)
S = sondage en complément de l'inspection visuelle

| Localisation | Ouvrage | Matériau ou produit | Description | N° Prél. | Critère de décision | Sondage / Observation | Présence d'amiante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau GT / Sous-sol | Conduit d'eau | Conduit | , de type fonte et/ou acier et/ou cuivre et/ou PVC selon présence | / | Ne contient pas d'amiante par nature | / | NON |
| Niveau GT / Sous-sol | Mur | Enduit de lissage | ciment, gris(e), type barbotine ciment en raccord sur voile béton côté Est vers l'escalier | / | Ne contient pas d'amiante par nature | / | NON |
| Niveau GT / Sous-sol / R-4 / Galerie(s) Technique(s) | Conduit | Enveloppe de calorifugeage | bitumineux, noir(e) | / | Document consulté | Lignes fluides "Eau Glacée" selon présence - Société INNAX - Rapport N° 40_PJ BOBIGNY_RPINNAX-DTA du 07/06/2017 | OUI |
| Niveau GT / Sous-sol / R-4 / Galerie(s) Technique(s) | Mur | Fourreau | fibre-ciment, gris(e) | / | Résultat d'analyse | idem P.09 - Ensemble de fourreaux dans les voiles béton (cheminement inconnu) | OUI |
| Niveau T : Ssol / Bât. Annexe / Parkings | Conduit d'air | Calorifugeage | laine de verre, jaune, Isolation thermique des gaines de ventilation de type CLIMAVER ou similaire avec scotch aluminium | / | Ne contient pas d'amiante par nature | Selon présence dans le niveau | NON |
| Niveau T : Ssol / Bât. Annexe / Parkings | Clapet coupe-feu | Clapet coupe-feu | plâtreux, rose, Clapet coupe-feu de marque SGEI - Paroi en plaque de plâtre rose avec feuille d'aluminium | / | Résultat d'analyse | selon présence sur le niveau | NON |
| Niveau T : Ssol / Bât. Annexe / Parkings | Conduit | Enveloppe de calorifugeage | bitumineux, noir(e) | / | Document consulté | Lignes fluides "Eau Glacée" selon présence - Société INNAX - Rapport N° 40_PJ BOBIGNY_RPINNAX-DTA du 07/06/2017 | OUI |
| Niveau T : Ssol / Bât. Annexe / Parkings | Maçonnerie | Fourreau | PVC, gris(e), poutres béton en infrastructure parkings (passage des câbles électriques) | / | Ne contient pas d'amiante par nature | / | NON |
| Niveau T : Ssol / Bât. Annexe / Parkings / R-3 / Aires de stationnement | Plafond | Flocage | cotonneux, blanc(he) | / | Résultat d'analyse | DDP EXPERT HOME - Rapport N° 15/IMO/0180 - Echantillon P.90 | NON |
| Niveau T : Ssol / Bât. Annexe / Parkings / R-3 / Aires de stationnement | Plafond | Flocage | cotonneux, blanc(he), sur aire de stationnement 021 | P.02 | Résultat d'analyse | / | NON |


Copyright BUREAU VERITAS

| Localisation | Ouvrage | Matériau ou produit | Description | N° Prél. | Critère de décision | Sondage / Observation | Présence d'amiante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau T : Ssol / Bât. Annexe / Parkings / R-3 / Aires de stationnement | Conduit d'eau | Enveloppe de calorifugeage | bitumineux, noir(e), lignes fluides en contact avec le chemin de câbles sur aire de stationnement 021 | P.03 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau T : Ssol / Bât. Annexe / Parkings / R-3 / Aires de manœuvre | Plafond | Flocage | cotonneux, blanc(he), vers aire de stationnement 083 | P.01 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau T : Ssol / Bât. Annexe / Parkings / R-3 / Rampe(s) d'accès | Mur | Enduit de ragréage | ciment, gris(e), peint vert sur voile béton haut | P.05 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau T : Ssol / Bât. Annexe / Parkings / R-3 / Dégagement(s) | Mur | Enduit | beige, de calfeutrement autour de la porte de sortie de secours au droit du BAES | P.04 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 | Conduit d'eau | Calorifugeage | mousse, gris(e), de marque FREUDENBERG "ISOLIER TECHNICK" sur l'ensemble des lignes fluides en acier selon présence | / | Marquage matériau | / | NON |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 | Mur | Enduit lissé | ciment, gris(e), sur murs en parpaings ou briques selon présence | / | Ne contient pas d'amiante par nature | / | NON |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 | Plafond | Faux plafond | bois, métallique, , à lames bois dans sanitaires sur structures bois et/ou 600x600 métalliques à résille maille carrée selon présence | / | Ne contient pas d'amiante par nature | / | NON |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 | Maçonnerie | Fourreau | PVC, gris(e), poutres béton en infrastructure parkings (passage des câbles électriques) | / | Ne contient pas d'amiante par nature | / | NON |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 | Conduit d'air | Calorifugeage | laine de verre, jaune, Isolation thermique des gaines de ventilation de type CLIMAVER ou similaire avec scotch aluminium | / | Ne contient pas d'amiante par nature | Selon présence dans le niveau | NON |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 | Conduit d'eau | Conduit | , de type fonte et/ou acier et/ou cuivre et/ou PVC selon présence | / | Ne contient pas d'amiante par nature | / | NON |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 | Plafond (collé ou vissé) | Panneau collé ou vissé | gris(e), panneaux en fibres de bois enrobées de ciment gris type FIBRALITH (idem sur murs) selon présence | / | Ne contient pas d'amiante par nature | matériau ayant fait l'objet d'un prélèvement par DDP EXPERT HOME (échantillon P.04) | NON |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Aires de stationnement | Poutre | Enduit de ragréage | ciment, gris(e), au droit des fourreaux en passage de câbles | P.07 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Aires de manœuvre | Plafond | Flocage | cotonneux, blanc(he) | / | Résultat d'analyse | DDP EXPERT HOME - Rapport N° 15/IMO/0180 - Echantillon P.89 | NON |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Aires de manœuvre | Mur | Fourreau | fibre-ciment, gris(e), encastré dans voile béton en partie basse vers aire de stationnement 190 | P.09 | Résultat d'analyse | / | OUI |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Aires de manœuvre | Mur | Enduit de ragréage | ciment, gris(e), peint vert en bande verticale au droit du chemin de câbles vers aire de stationnement 190 | P.10 | Résultat d'analyse | / | NON |


Copyright BUREAU VERITAS

| Localisation | Ouvrage | Matériau ou produit | Description | N° Prél. | Critère de décision | Sondage / Observation | Présence d'amiante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Aires de manœuvre | Poutre | Enduit de ragréage | ciment, gris(e), au droit des fourreaux passage de câbles vers aire de stationnement 186 | P.11 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Aires de manœuvre | Plafond | Flocage | cotonneux, blanc(he), en dalle haute vers aire de stationnement 188 | P.12 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Rampe(s) d'accès | Plafond | Flocage | cotonneux, blanc(he), vers l'aire de stationnement 100 | P.08 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Escalier d'accès | Mur | Enduit | ciment, gris(e), peint vert sur voile béton au droit du BAES | P.13 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Escalier de secours | Mur | Enduit de ragréage | ciment, gris(e), peint vert sur voile béton haut | P.06 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Escalier d'accès S | Revêtement du mur | Peinture | gouttelette, gris(e) | P.50 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Escalier d'accès S | Revêtement de plafond | Peinture | gouttelette, gris(e) | P.51 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Escalier d'accès T | Revêtement du mur | Peinture | gouttelette, gris(e) | P.45 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Escalier d'accès T | Revêtement de plafond | Peinture | gouttelette, gris(e) | P.46 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Petit(s) escalier(s) circulaire(s) | Revêtement du mur | Peinture | gouttelette, gris(e), avec enduit beige vers sanitaires T11 | P.59 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Petit(s) escalier(s) circulaire(s) | Mur | Rebouchage | plâtreux, blanc(he), autour du câble hublot vers sanitaires T11 | P.62 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Petit(s) escalier(s) circulaire(s) | Revêtement du mur | Peinture | gouttelette, gris(e), avec enduit beige vers archives T63, côté dépôt Police | P.65 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Archives | Porte coupe feu | Joint coupe-feu | bande, beige, languette CF de recouvrement de la PCF à 2 vantaux dans archives T40 | P.30 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Archives | Porte coupe feu | Isolant intérieur porte | rigide, blanc(he), type plâtre dans l'âme de la porte CF à 2 vantaux dans archives T40 | P.31 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Archives | Porte coupe feu | Joint coupe-feu | bande, blanc(he), peint bleu sur huisserie métallique de la porte CF à 2 vantaux dans archives T40 | P.32 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Archives | Plafond | Flocage | cotonneux, blanc(he), en dalle haute dans archives T40 | P.33 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Archives | Plafond | Rebouchage | plâtreux, blanc(he), au droit du flocage en dalle haute dans archives T40 | P.34 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Archives | Clapet coupe-feu | Clapet coupe-feu | plâtreux, rose, avec carton et aluminium - CCF de marque SGEI dans archives T40 | P.35 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Archives | Clapet coupe-feu | Rebouchage clapet | ciment, gris(e), autour du CCF de marque SGEI dans archives T40 | P.36 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Archives | Mur | Calfeutrement des passages de conduits | mousse, jaune, au droit du chemin de câbles dans archives T40 | P.37 | Résultat d'analyse | / | NON |


Copyright BUREAU VERITAS

| Localisation | Ouvrage | Matériau ou produit | Description | N° Prél. | Critère de décision | Sondage / Observation | Présence d'amiante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Archives | Plafond (collé ou vissé) | Panneau collé ou vissé | composite, gris(e), peint blanc comprenant une couche supérieure grise épaisse avec du fibrastyrène sous flocage en dalle haute dans archives T40 | P.38 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Archives | Poteau | Peinture sur béton | bitumineux, noir(e), au droit du palier MC dans archives T40 | P.39 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Archives | Mur | Enduit de ragréage | ciment, gris(e), sur voile béton du palier MC dans archives T40 | P.40 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Archives | Cloison | Panneau | composite, gris(e), peint blanc comprenant une couche supérieure grise épaisse avec du fibrastyrène en doublage au dessus du voile béton dans archives T65 | P.41 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Archives | Plafond | Rebouchage | plâtreux, blanc(he), au droit du flocage en dalle haute dans archives T65 | P.42 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Archives | Cloison | Peinture | décorative, blanc(he), avec enduit blanc sur plaque de plâtre dans archives T63 | P.43 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Dégagements | Mur | Rebouchage | plâtreux, blanc(he), vers archives T63/T64 | P.44 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Dégagements | Plafond (collé ou vissé) | Panneau collé ou vissé | composite, gris(e), peint blanc comprenant une couche supérieure grise épaisse avec du fibrastyrène en doublage dans accès vers local technique T01 | P.47 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Dégagements | Mur | Rebouchage | plâtreux, blanc(he), autour du chemin de câbles vers T09/GF | P.55 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Dégagements | Mur | Enduit projeté | plâtreux, blanc(he), type Fibrith sur dégagement dépôt | P.66 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Placards techniques | Plancher | Rebouchage | plâtreux, blanc(he), autour du chemin de câbles vers archives T50 | P.48 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Placards techniques | Plancher | Rebouchage | plâtreux, blanc(he), autour du chemin de câbles vers archives T40 | P.49 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Sanitaires | Revêtement du mur | Colle de faïence | mortier, gris(e), faïence 5x5 beige en contact des cornières de rive du faux-plafond dans sanitaires T21 | P.52 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Sanitaires | Revêtement du mur | Joint de faïence | ciment, gris(e), de la faience 5x5 beige en contact des cornières de rive du faux-plafond dans sanitaires T21 | P.53 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Sanitaires | Conduit | Joint | bande, gris(e), toilée en jonction de gaine VMC | P.54 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Sanitaires | Poteau | Colle de faïence | mortier, gris(e), faïence 5x5 beige en contact des supports du faux-plafond bois dans sanitaires T11 | P.60 | Résultat d'analyse | / | NON |


Copyright BUREAU VERITAS

| Localisation | Ouvrage | Matériau ou produit | Description | N° Prél. | Critère de décision | Sondage / Observation | Présence d'amiante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Sanitaires | Poteau | Joint de faïence | ciment, gris(e), de la faïence 5x5 beige en contact des supports du faux-plafond bois dans sanitaires T11 | P.61 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Sanitaires | Plafond | Faux plafond | fibreux, blanc(he), ARMSTRONG PRIMA 600x600 dans sanitaires T21 | / | Marquage matériau | / | NON |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Ventilation T09 | Conduit | Enveloppe de calorifugeage | bitumineux, noir(e) | / | Document consulté | Lignes fluides "Eau Glacée" selon présence - Société INNAX - Rapport N° 40_PJ BOBIGNY_RPINNAX-DTA du 07/06/2017 | OUI |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Groupe froid | Conduit | Enveloppe de calorifugeage | bitumineux, noir(e) | / | Document consulté | Lignes fluides "Eau Glacée" selon présence - Société INNAX - Rapport N° 40_PJ BOBIGNY_RPINNAX-DTA du 07/06/2017 | OUI |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Zone ex. réserve cuisine | Plafond | Faux plafond | fibreux, beige, dur en 1200x600 dans pièce T17 | P.63 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Zone ex. réserve cuisine | Revêtement du mur | Colle de faïence | mortier, gris(e), faïence 15x15 blanche dans réserve cuisine T12 | P.64 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Zone ex. réserve cuisine | Plafond | Faux plafond | laine de roche, jaune, type ECOPHON ou similaire dans pièce T12 | / | Ne contient pas d'amiante par nature | / | NON |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Zone ex. réserve cuisine | Coffre horizontal | Plaque | plâtre, blanc(he), dans plénum de la pièce T12 | / | Ne contient pas d'amiante par nature | / | NON |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Autocom T15 | Panneau | Colle | blanche, , sur panneau isolant type P.57 | P.56 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Autocom T15 | Cloison | Panneau | composite, gris(e), peint blanc comprenant une couche supérieure grise épaisse avec du fibrastyrène en doublage au dessus du voile béton | P.57 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Autocom T15 | Mur | Enduit de ragréage | ciment, gris(e), en jonction entre le voile béton et les panneaux de doublage | P.58 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Autocom T15 | Plafond | Faux plafond | fibreux, blanc(he), 1200x600 | / | Marquage matériau | / | NON |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Autocom T15 | Cloison préfabriquée | Panneau de cloison | plâtre, blanc(he), revêtue PVC | / | Ne contient pas d'amiante par nature | / | NON |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Autocom T15 | Plancher | Fourreau | fibre-ciment, gris(e) | / | Résultat d'analyse | idem P.09 - Ensemble de fourreaux dans chambre de tirage (cheminement inconnu) | OUI |
| Niveau S : R-2 / RDC / Parkings | Conduit d'eau | Conduit | , de type fonte et/ou acier et/ou cuivre et/ou PVC selon présence | / | Ne contient pas d'amiante par nature | / | NON |
| Niveau S : R-2 / RDC / Parkings / R-2 | Maçonnerie | Fourreau | PVC, gris(e), poutres béton en infrastructure parkings (passage des câbles | / | Ne contient pas d'amiante par nature | / | NON |


Copyright BUREAU VERITAS

| Localisation | Ouvrage | Matériau ou produit | Description | N° Prél. | Critère de décision | Sondage / Observation | Présence d'amiante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | électriques) | | | | |
| Niveau S : R-2 / RDC / Parkings / R-2 / Aires de stationnement | Mur | Rebouchage | ciment, gris(e), peint vert autour chemin de câbles sur aire de stationnement 205 | P.19 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau S : R-2 / RDC / Parkings / R-2 / Aires de manœuvre | Mur | Enduit de ragréage | ciment, gris(e), en bande horizontale sur le voile dans zone Tour Aéro. | P.18 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau S : R-2 / RDC / Parkings / R-2 / Aires de manœuvre | Poteau | Joint de dilatation | mastic, gris(e), souple au droit du BAES sur aire de stationnement 242 | P.20 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau S : R-2 / RDC / Parkings / R-2 / Aires de manœuvre | Plafond | Flocage | cotonneux, blanc(he), en dalle haute vers aire de stationnement 286 | P.21 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau S : R-2 / RDC / Parkings / R-2 / Bureaux EIFFAGE | Revêtement de plafond | Peinture | décorative, vert(e), avec enduit blanc sur plafond béton | P.14 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau S : R-2 / RDC / Parkings / R-2 / Bureaux EIFFAGE | Revêtement de plafond | Peinture | décorative, beige, avec enduit blanc sur plafond béton | P.15 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau S : R-2 / RDC / Parkings / R-2 / Bureaux EIFFAGE | Revêtement du mur | Peinture | décorative, vert(e), avec enduit blanc sur fond doublage en plaque de plâtre | P.16 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau S : R-2 / RDC / Parkings / R-2 / Bureaux EIFFAGE | Revêtement du mur | Peinture | gouttelette, bleu(e), avec enduit blanc sur fond doublage en plaque de plâtre | P.17 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI | Conduit d'eau | Calorifugeage | mousse, gris(e), de marque FREUDENBERG "ISOLIER TECHNICK" sur l'ensemble des lignes fluides en acier selon présence | / | Marquage matériau | / | NON |
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI | Clapet coupe-feu | Clapet coupe-feu | plâtreux, rose, Clapet coupe-feu de marque SGEI - Paroi en plaque de plâtre rose avec feuille d'aluminium | / | Résultat d'analyse | Selon présence sur le niveau | NON |
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI | Gaine horizontale | Panneau collé ou vissé | plâtre, blanc(he), selon présence dans le niveau | / | Ne contient pas d'amiante par nature | / | NON |
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI | Plafond (collé ou vissé) | Panneau collé ou vissé | plâtre, , selon présence dans le niveau | / | Ne contient pas d'amiante par nature | / | NON |
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI | Plafond (collé ou vissé) | Panneau collé ou vissé | gris(e), panneaux en fibres de bois enrobées de ciment gris type FIBRALITH (idem sur murs) selon présence | / | Ne contient pas d'amiante par nature | matériau ayant fait l'objet d'un prélèvement par DDP EXPERT HOME (échantillon P.04) | NON |
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI | Conduit d'air | Calorifugeage | laine de verre, jaune, Isolation thermique des gaines de ventilation de type CLIMAVER ou similaire avec scotch aluminium | / | Ne contient pas d'amiante par nature | Selon présence dans le niveau | NON |
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI | Conduit d'eau | Conduit | , de type fonte et/ou acier et/ou cuivre et/ou PVC selon présence | / | Ne contient pas d'amiante par nature | / | NON |
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI | Mur | Enduit lissé | ciment, gris(e), sur murs en parpaings ou briques selon présence | / | Ne contient pas d'amiante par nature | / | NON |


Copyright BUREAU VERITAS

| Localisation | Ouvrage | Matériau ou produit | Description | N° Prél. | Critère de décision | Sondage / Observation | Présence d'amiante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI | Plafond | Faux plafond | bois, métallique, , à lames bois dans sanitaires sur structures bois et/ou 600x600 métalliques à résille maille carrée selon présence | / | Ne contient pas d'amiante par nature | / | NON |
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Escalier d'accès S | Revêtement de plafond | Peinture | gouttelette, beige, avec fond d'enduit en dalle haute | P.94 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Escalier d'accès S | Revêtement du mur | Peinture | gouttelette, beige, avec fond d'enduit | P.95 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Escalier d'accès T | Revêtement du mur | Peinture | gouttelette, beige, avec fond d'enduit | P.96 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Escalier d'accès T | Revêtement de plafond | Peinture | gouttelette, beige, avec fond d'enduit en dalle haute | P.97 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Escalier d'accès B | Revêtement de plafond | Peinture | gouttelette, beige, avec fond d'enduit en dalle haute | P.71 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Escalier d'accès B | Revêtement du mur | Peinture | gouttelette, beige, avec fond d'enduit sur voile béton | P.72 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Escalier d'accès C | Revêtement de plafond | Peinture | gouttelette, beige, avec fond d'enduit en dalle haute | P.73 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Escalier d'accès C | Revêtement du mur | Peinture | gouttelette, beige, avec fond d'enduit sur voile béton | P.74 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Petit(s) escalier(s) circulaire(s) | Revêtement du mur | Peinture | gouttelette, gris(e), avec fond d'enduit sur voile béton - escalier d'accès vers SA N°4 depuis Dépôt Police | P.75 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / LT 01 CTA | Conduit | Enveloppe de calorifugeage | bitumineux, noir(e) | / | Document consulté | Lignes fluides "Eau Glacée" selon présence - Société INNAX - Rapport N° 40_PJ BOBIGNY_RPINNAX-DTA du 07/06/2017 | OUI |
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / LT 01 CTA | Conduit d'air | Mastic | compact, marron | / | Document consulté | Conduits de fluides "Ventilation" selon présence - Société AT-DIAG - Rapport N° 2CM16-23 du 26/08/2016 | OUI |
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Ensemble des pièces Ind.S | Plafond | Flocage | cotonneux, blanc(he) | / | Résultat d'analyse | DDP EXPERT HOME - Rapport N° 15/IMO/0180 - Echantillon P.87 - Pièce S.45 | NON |
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Ensemble des pièces Ind.S | Revêtement du mur | Peinture | gouttelette, gris(e) | / | Résultat d'analyse | DDP EXPERT HOME - Rapport N° 15/IMO/0180 - Echantillon P.86 - Pièce S.45 | NON |
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Ensemble des pièces Ind.S | Revêtement de cloison | Peinture | décorative, gris(e), avec fond d'enduit sur paroi de doublage plâtre dans pièce S23 | P.78 | Résultat d'analyse | / | NON |


Copyright BUREAU VERITAS

| Localisation | Ouvrage | Matériau ou produit | Description | N° Prél. | Critère de décision | Sondage / Observation | Présence d'amiante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Ensemble des pièces Ind.S | Poteau | Peinture | décorative, gris(e), avec fond d'enduit sur poteau béton dans pièce S23 | P.79 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Ensemble des pièces Ind.S | Revêtement du mur | Peinture | gouttelette, gris(e), avec fond d'enduit dans pièce S24 | P.82 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Ensemble des pièces Ind.S | Revêtement de plafond | Peinture | gouttelette, gris(e), avec fond d'enduit en dalle haute dans pièce S24 | P.83 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Ensemble des pièces Ind.S | Mur | Rebouchage | plâtreux, blanc(he), au droit de la boite d'encastrement simple électrique dans pièce S43 | P.92 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Ensemble des pièces Ind.S | Revêtement du mur | Peinture | gouttelette, gris(e), avec fond d'enduit dans pièce S41 | P.98 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Ensemble des pièces Ind.S | Revêtement de plafond | Peinture | gouttelette, gris(e), avec fond d'enduit en dalle haute dans pièce S41 | P.99 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Ensemble des pièces Ind.S | Revêtement du mur | Peinture | gouttelette, blanc(he), avec fond d'enduit dans espace pièces S21/S22 | P.101 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Archives | Clapet coupe-feu | Clapet coupe-feu | fibreux, blanc(he), en partie haute du mur de marque PANOL dans local archives N°4 | P.67 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Archives | Conduit d'air | Joint | mastic, marron, sur gaine rectangulaire en jonction du CCF dans local archives N°4 | P.68 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Archives | Plafond | Flocage | cotonneux, blanc(he), en dalle haute sur jonction poutre du local archives N°4 | P.69 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Archives | Conduit | Enveloppe de calorifugeage | plâtreux, blanc(he), autour de la fonte en partie haute du local archives N°4 | P.70 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Zone ex. cuisine | Panneau sandwich | Panneau | composite, gris(e), panneau isolant de chambre froide (isothermique) type ciment peint beige avec polystyrène dans pièce S18 | P.100 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Zone ex. cuisine | Revêtement de plafond | Peinture | gouttelette, beige, avec fond d'enduit en dalle haute dans espace cuisine | P.103 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Zone ex. cuisine | Revêtement de plafond | Peinture | gouttelette, beige, avec fond d'enduit dans local poubelles | P.104 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Zone ex. cuisine | Revêtement du mur | Colle de faïence | mortier, blanc(he), faïence 20x20 blanc dans espace cuisine | P.105 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Zone ex. cuisine | Revêtement du mur | Peinture | gouttelette, beige, avec fond d'enduit dans espace cuisine | P.106 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Zone ex. cuisine | Revêtement du mur | Peinture | gouttelette, beige, avec fond d'enduit ciment sur mur en parpaings dans le bureau | P.107 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / | Plafond | Flocage | cotonneux, blanc(he) | / | Résultat d'analyse | AB EXPERTISES - DTA N° AB ADTA 050232 - | NON |


Copyright BUREAU VERITAS

| Localisation | Ouvrage | Matériau ou produit | Description | N° Prél. | Critère de décision | Sondage / Observation | Présence d'amiante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégagements | | | | | | Echantillon P.6 | |
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Dégagements | Porte coupe feu | Joint coupe-feu | mousse, jaune, en pénétration du chemin de câbles dans imposte de la porte CF de la zone machine à café vers escalier B | P.102 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Placards techniques | Plancher | Rebouchage | plâtreux, blanc(he), autour du chemin de câbles vers escalier T | P.76 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Placards techniques | Plancher | Rebouchage | mousse expensée, jaune, autour du chemin de câbles vers escalier T | P.77 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Placards techniques | Plancher | Rebouchage | plâtreux, blanc(he), autour du chemin de câbles vers escalier S | P.93 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Sanitaires | Revêtement du mur | Colle de faïence | mortier, gris(e), faïence 5x5 beige en jonction des supports du faux-plafond bois dans sanitaires hommes vers pièce S23 | P.80 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Sanitaires | Revêtement du mur | Colle de faïence | mortier, gris(e), faïence 5x5 beige en jonction des supports du faux-plafond bois dans sanitaires femmes vers pièce S23 | P.81 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / CTA assise N°2 | Mur | Enduit de ragréage | ciment, gris(e), peint gris sur voile béton | P.84 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Stockage Assise N°2 | Mur | Enduit de ragréage | ciment, gris(e), peint gris sur voile béton | P.85 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Escalier d'accès Assise N°2 | Revêtement du mur | Peinture | décorative, gris(e), avec fond d'enduit sur voile béton | P.86 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Escalier de secours Assise N°2 | Mur | Enduit projeté | plâtreux, blanc(he), type Fibrith depuis Dépôt Police | P.91 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Logement S10 - Rez-de-chaussée | Mur | Toile de verre | peint, beige, sur fond de doublage en plaque de plâtre dans séjour | P.87 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Logement S10 - Rez-de-chaussée | Revêtement de plafond | Peinture | décorative, blanc(he), avec fond d'enduit en dalle haute du séjour | P.88 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Logement S10 - Rez-de-chaussée | Revêtement de plafond | Peinture | décorative, blanc(he), avec fond d'enduit en dalle haute dans chambre 1 | P.89 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Logement S10 - Rez-de-chaussée | Revêtement du mur | Colle de faïence | mortier, blanc(he), avec joint beige sur faïence 20x10 rose au dessus du lavabo dans SDB | P.90 | Résultat d'analyse | / | NON |


Copyright BUREAU VERITAS

| Localisation | Ouvrage | Matériau ou produit | Description | N° Prél. | Critère de décision | Sondage / Observation | Présence d'amiante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau R : Pas Perdus / Parking / R-1 | Maçonnerie | Fourreau | PVC, gris(e), poutres béton en infrastructure parkings (passage des câbles électriques) | / | Ne contient pas d'amiante par nature | / | NON |
| Niveau R : Pas Perdus / Parking / R-1 | Conduit d'eau | Conduit | , de type fonte et/ou acier et/ou cuivre et/ou PVC selon présence | / | Ne contient pas d'amiante par nature | / | NON |
| Niveau R : Pas Perdus / Parking / R-1 / Aires de manœuvre | Poteau | Joint de dilatation | mastic, gris(e), souple au droit du BAES sur aire de stationnement 307 | P.23 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau R : Pas Perdus / Parking / R-1 / Aires de manœuvre | Plafond | Flocage | cotonneux, blanc(he), en dalle haute vers aire de stationnement 396 | P.26 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau R : Pas Perdus / Parking / R-1 / Aires de manœuvre | Poutre | Flocage | cotonneux, blanc(he), vers aire de stationnement 396 | P.27 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau R : Pas Perdus / Parking / R-1 / Aires de manœuvre | Poutre | Enduit de ragréage | ciment, gris(e), vers aire de stationnement 332 | P.29 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau R : Pas Perdus / Parking / R-1 / Rampe(s) d'accès | Conduit | Enveloppe de calorifugeage | bitumineux, noir(e), avec laine jaune sur lignes fluides en jonction des tubes IRL | P.22 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau R : Pas Perdus / Parking / R-1 / Escalier d'accès | Mur | Enduit de ragréage | ciment, gris(e), peint vert sur voile béton au droit du BAES | P.28 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau R : Pas Perdus / Parking / R-1 / Escalier de secours | Mur | Enduit de ragréage | ciment, gris(e), peint vert au droit du BAES sur voile béton vers aire de stationnement 306 | P.24 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau R : Pas Perdus / Parking / R-1 / Escalier de secours | Mur | Rebouchage | ciment, gris(e), peint vert au droit de l'interrupteur | P.25 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau R : Pas Perdus / TGI | Clapet coupe-feu | Clapet coupe-feu | plâtreux, rose, Clapet coupe-feu de marque SGEI - Paroi en plaque de plâtre rose avec feuille d'aluminium | / | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau R : Pas Perdus / TGI / R-1 | Mur | Revêtement | toile de verre, blanc(he) | / | Ne contient pas d'amiante par nature | Réfection des murs en toile de verre selon présence dans certaines pièces - Travaux supérieurs à 1997 | NON |
| Niveau R : Pas Perdus / TGI / R-1 | Conduit d'air | Calorifugeage | laine de verre, jaune, Isolation thermique des gaines de ventilation de type CLIMAVER ou similaire avec scotch aluminium | / | Ne contient pas d'amiante par nature | Selon présence dans le niveau | NON |
| Niveau R : Pas Perdus / TGI / R-1 | Conduit d'eau | Calorifugeage | mousse, gris(e), de marque FREUDENBERG "ISOLIER TECHNICK" sur l'ensemble des lignes fluides en acier selon présence | / | Marquage matériau | / | NON |
| Niveau R : Pas Perdus / TGI / R-1 | Conduit d'eau | Conduit | , de type fonte et/ou acier et/ou cuivre et/ou PVC selon présence | / | Ne contient pas d'amiante par nature | / | NON |
| Niveau R : Pas Perdus / TGI / R-1 | Mur | Enduit lissé | ciment, gris(e), sur murs en parpaings ou briques selon présence | / | Ne contient pas d'amiante par nature | / | NON |


Copyright BUREAU VERITAS

| Localisation | Ouvrage | Matériau ou produit | Description | N° Prél. | Critère de décision | Sondage / Observation | Présence d'amiante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau R : Pas Perdus / TGI / R-1 | Plafond | Faux plafond | bois, métallique, , à lames bois dans sanitaires sur structures bois et/ou 600x600 métalliques à résille maille carrée selon présence | / | Ne contient pas d'amiante par nature | / | NON |
| Niveau R : Pas Perdus / TGI / R-1 | Plafond (collé ou vissé) | Panneau collé ou vissé | plâtre, , selon présence dans le niveau | / | Ne contient pas d'amiante par nature | / | NON |
| Niveau R : Pas Perdus / TGI / R-1 | Gaine horizontale | Panneau collé ou vissé | plâtre, blanc(he), selon présence dans le niveau | / | Ne contient pas d'amiante par nature | / | NON |
| Niveau R : Pas Perdus / TGI / R-1 / Zone Ordre des Avocats | Revêtement du mur | Peinture | gouttelette, beige, avec fond d'enduit au droit du petit escalier circulaire | P.108 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau R : Pas Perdus / TGI / R-1 / Zone Ordre des Avocats | Poteau | Peinture | décorative, beige, avec fond d'enduit dans bureau | P.109 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau R : Pas Perdus / TGI / R-1 / Zone Ordre des Avocats | Plafond | Flocage | cotonneux, blanc(he), avec croûte blanche en dalle haute de l'espace des avocats | P.110 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau R : Pas Perdus / TGI / R-1 / Zone Ordre des Avocats | Plafond | Faux plafond | blanc(he), en plaques de plâtre 600x600 | / | Ne contient pas d'amiante par nature | / | NON |
| Niveau R : Pas Perdus / TGI / R-1 / Zone Tribunal pour Enfants | Plafond | Flocage | cotonneux, blanc(he) | / | Résultat d'analyse | DDP EXPERT HOME - Rapport N° 15/IMO/0180 - Echantillon P.62 - Pièce R.40 | NON |
| Niveau R : Pas Perdus / TGI / R-1 / Zone Tribunal pour Enfants | Plafond | Flocage | cotonneux, blanc(he) | / | Résultat d'analyse | DDP EXPERT HOME - Rapport N° 15/IMO/0180 - Echantillon P.64 - Pièce R.37 | NON |
| Niveau R : Pas Perdus / TGI / R-1 / Zone Tribunal pour Enfants | Revêtement du mur | Peinture | gouttelette, beige | / | Résultat d'analyse | DDP EXPERT HOME - Rapport N° 15/IMO/0180 - Echantillon P.63 - Pièce R.37 | NON |
| Niveau R : Pas Perdus / TGI / R-1 / Zone Tribunal pour Enfants | Revêtement du mur | Peinture | gouttelette, jaune, avec fond d'enduit sur paroi de doublage en plaque de plâtre dans pièce R30 | P.111 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau R : Pas Perdus / TGI / R-1 / Zone Tribunal pour Enfants | Poutre | Peinture | gouttelette, jaune, avec fond d'enduit sur poutre béton dans pièce R30 | P.112 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau R : Pas Perdus / TGI / R-1 / Zone Tribunal pour Enfants | Revêtement du mur | Peinture | gouttelette, beige, avec fond d'enduit sur paroi de doublage en plaque de plâtre dans pièce R42 | P.113 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau R : Pas Perdus / TGI / R-1 / Zone Tribunal pour Enfants | Revêtement de plafond | Peinture | décorative, blanc(he), avec fond d'enduit en dalle haute dans pièce R44 | P.114 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau R : Pas Perdus / TGI / R-1 / Zone Tribunal pour Enfants | Revêtement du mur | Colle de faïence | mortier, gris(e), faience 5x5 beige en jonction des support du faux-plafond bois dans sanitaires via Dépôt Police | P.122 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau R : Pas Perdus / TGI / R-1 / Zone Tribunal pour Enfants | Revêtement de plafond | Peinture | gouttelette, gris(e), avec fond d'enduit dans dégagement via Dépôt de Police | P.123 | Résultat d'analyse | / | NON |


Copyright BUREAU VERITAS

| Localisation | Ouvrage | Matériau ou produit | Description | N° Prél. | Critère de décision | Sondage / Observation | Présence d'amiante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau R : Pas Perdus / TGI / R-1 / Zone Tribunal pour Enfants | Revêtement du mur | Peinture | gouttelette, gris(e), avec fond d'enduit sur noyau interne du petit escalier circulaire via Dépôt Police | P.124 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau R : Pas Perdus / TGI / R-1 / Zone ICJ | Revêtement du mur | Peinture | gouttelette, beige, avec fond d'enduit sur paroi de doublage en plaque de plâtre dans pièce R72 | P.115 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau R : Pas Perdus / TGI / R-1 / Zone ICJ | Poutre | Peinture | gouttelette, beige, avec fond d'enduit sur poutre béton dans pièce R72 | P.116 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau R : Pas Perdus / TGI / R-1 / Zone ICJ | Revêtement de cloison | Peinture | gouttelette, beige, avec fond d'enduit dans pièce R60 | P.117 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau R : Pas Perdus / TGI / R-1 / Zone ICJ | Revêtement du mur | Peinture | décorative, blanc(he), avec fond d'enduit sur noyau externe du petit escalier circulaire via Dépôt Police | P.120 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau R : Pas Perdus / TGI / R-1 / Zone ICJ | Revêtement du mur | Peinture | gouttelette, gris(e), avec fond d'enduit sur noyau interne du petit escalier circulaire via Dépôt Police | P.121 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau R : Pas Perdus / TGI / R-1 / Zone ICJ | Revêtement du mur | Peinture | gouttelette, gris(e), avec fond d'enduit sur noyau externe du petit escalier circulaire via Dépôt Police sur Assise 1 | P.127 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau R : Pas Perdus / TGI / R-1 / Zone SAP N°3 | Revêtement du mur | Peinture | gouttelette, gris(e), avec fond d'enduit sur dégagement du petit escalier circulaire via Dépôt Police | P.119 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau R : Pas Perdus / TGI / R-1 / Zone SAP N°4 | Revêtement du mur | Peinture | gouttelette, gris(e), avec fond d'enduit sur mur du petit escalier circulaire | P.118 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau R : Pas Perdus / TGI / R-1 / Salle de médiation | Revêtement du mur | Peinture | gouttelette, beige, avec fond d'enduit | P.125 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau R : Pas Perdus / TGI / R-1 / Salle de médiation | Revêtement de plafond | Peinture | gouttelette, beige, avec fond d'enduit en dalle haute | P.126 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau P : Parvis / TGI / R+0 | Conduit d'air | Calorifugeage | laine de verre, jaune, Isolation thermique des gaines de ventilation de type CLIMAVER ou similaire avec scotch aluminium | / | Ne contient pas d'amiante par nature | Selon présence dans le niveau | NON |
| Niveau P : Parvis / TGI / R+0 | Conduit d'eau | Calorifugeage | mousse, gris(e), de marque FREUDENBERG "ISOLIER TECHNICK" sur l'ensemble des lignes fluides en acier selon présence | / | Marquage matériau | / | NON |
| Niveau P : Parvis / TGI / R+0 | Clapet coupe-feu | Clapet coupe-feu | plâtreux, rose, Clapet coupe-feu de marque SGEI - Paroi en plaque de plâtre rose avec feuille d'aluminium | / | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau P : Parvis / TGI / R+0 | Conduit d'eau | Conduit | , de type fonte et/ou acier et/ou cuivre et/ou PVC selon présence | / | Ne contient pas d'amiante par nature | / | NON |

| Localisation | Ouvrage | Matériau ou produit | Description | N° Prél. | Critère de décision | Sondage / Observation | Présence d'amiante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau P : Parvis / TGI / R+0 | Mur | Enduit lissé | ciment, gris(e), sur murs en parpaings ou briques selon présence | / | Ne contient pas d'amiante par nature | / | NON |
| Niveau P : Parvis / TGI / R+0 | Plafond | Faux plafond | bois, métallique, , à lames bois dans sanitaires sur structures bois et/ou 600x600 métalliques à résille maille carrée selon présence | / | Ne contient pas d'amiante par nature | / | NON |
| Niveau P : Parvis / TGI / R+0 | Plafond (collé ou vissé) | Panneau collé ou vissé | plâtre, , selon présence dans le niveau | / | Ne contient pas d'amiante par nature | / | NON |
| Niveau P : Parvis / TGI / R+0 | Gaine horizontale | Panneau collé ou vissé | plâtre, blanc(he), selon présence dans le niveau | / | Ne contient pas d'amiante par nature | / | NON |
| Niveau P : Parvis / TGI / R+0 | Mur | Revêtement | toile de verre, blanc(he) | / | Ne contient pas d'amiante par nature | Réfection des murs en toile de verre selon présence dans certaines pièces - Travaux supérieurs à 1997 | NON |
| Niveau P : Parvis / TGI / R+0 / Escalier d'accès A | Revêtement du mur | Peinture | gouttelette, beige, avec fond d'enduit blanc | P.145 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau P : Parvis / TGI / R+0 / Escalier d'accès A | Revêtement de plafond | Peinture | gouttelette, beige, avec fond d'enduit blanc en dalle haute | P.146 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau P : Parvis / TGI / R+0 / Escalier d'accès D | Revêtement du mur | Peinture | gouttelette, beige, avec fond d'enduit blanc | P.147 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau P : Parvis / TGI / R+0 / Escalier d'accès D | Revêtement de plafond | Peinture | gouttelette, beige, avec fond d'enduit blanc | P.148 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau P : Parvis / TGI / R+0 / Zone Infirmerie | Poteau | Peinture | décorative, beige, avec fond d'enduit dans hall d'attente | P.134 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau P : Parvis / TGI / R+0 / Zone Infirmerie | Revêtement du mur | Peinture | décorative, blanc(he), avec fond d'enduit sur paroi de doublage en plaque de plâtre | P.135 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau P : Parvis / TGI / R+0 / Zone BAJ | Revêtement du mur | Peinture | gouttelette, blanc(he), avec fond d'enduit sur paroi de doublage en plaque de plâtre dans bureau P03 | P.130 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau P : Parvis / TGI / R+0 / Zone BAJ | Plafond | Flocage | cotonneux, blanc(he), avec croûte grise en dalle haute dans dégagement | P.131 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau P : Parvis / TGI / R+0 / Zone BAJ | Poutre | Peinture | décorative, blanc(he), avec fond d'enduit dans dégagement | P.133 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau P : Parvis / TGI / R+0 / Zone des Délibérés SA N°1 et N°2 | Revêtement du mur | Peinture | gouttelette, gris(e), avec fond d'enduit sur noyau interne du petit escalier circulaire | P.129 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau P : Parvis / TGI / R+0 / Zone SA N°2 | Charpente | Peinture | décorative, bleu(e), avec fond d'enduit blanc + antirouille orange sur charpente tridimentionnelle | P.128 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau P : Parvis / TGI / R+0 / Zone Tribunal pour Enfants | Revêtement du mur | Peinture | gouttelette, beige, avec fond d'enduit dans pièce P23 | P.136 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau P : Parvis / TGI / R+0 / Zone Tribunal pour Enfants | Revêtement du mur | Peinture | gouttelette, blanc(he), avec fond d'enduit sur paroi de doublage en plaque de plâtre | P.137 | Résultat d'analyse | / | NON |


Copyright BUREAU VERITAS

| Localisation | Ouvrage | Matériau ou produit | Description | N° Prél. | Critère de décision | Sondage / Observation | Présence d'amiante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | dans pièce P30 | | | | |
| Niveau P : Parvis / TGI / R+0 / Zone Tribunal pour Enfants | Revêtement du mur | Peinture | gouttelette, blanc(he), avec fond d'enduit | P.138 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau P : Parvis / TGI / R+0 / Zone Tribunal pour Enfants | Plancher | Rebouchage | plâtreux, blanc(he), autour chemin de câbles dans local technique électrique vers escalier S | P.144 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau P : Parvis / TGI / R+0 / Assise N°1 | Charpente | Peinture | décorative, bleu(e), avec fond d'enduit blanc + antirouille orange | P.132 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau P : Parvis / TGI / R+0 / Zone ICJ | Revêtement du mur | Peinture | gouttelette, beige, avec fond d'enduit dans pièce P75 | P.149 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau P : Parvis / TGI / R+0 / Zone ICJ | Mur | Toile de verre | peint, beige, avec fond d'enduit sur paroi de doublage en plaque de plâtre dans pièce P73 | P.150 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau P : Parvis / TGI / R+0 / Zone ICJ | Revêtement du mur | Peinture | décorative, beige, avec fond d'enduit sur support plâtre | P.151 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau P : Parvis / TGI / R+0 / Zone des Délibérés SA N°5 et N°6 | Revêtement du mur | Peinture | gouttelette, gris(e), avec fond d'enduit sur noyau interne du petit escalier circulaire | P.143 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau P : Parvis / TGI / R+0 / Zone SA N°6 | Mur | Revêtement | tapisserie, beige, y compris fond sur noyau externe du petit escalier circulaire dans dégagement vers SA N°6 | P.142 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau P : Parvis / TGI / R+0 / Zone SOP | Revêtement du mur | Peinture | décorative, jaune, avec fond d'enduit blanc et ragréage gris dans salle d'ordonnance pénale | P.139 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau P : Parvis / TGI / R+0 / Zone SOP | Plafond | Flocage | cotonneux, blanc(he), dans plénum de la salle d'ordonnance pénale | P.140 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau P : Parvis / TGI / R+0 / Zone SOP | Poutre | Peinture | décorative, blanc(he), avec fond d'enduit dans dégagement vers SA N°5 | P.141 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau : 1er étage / TGI | Cloison préfabriquée | Panneau de cloison | plâtre, , panneaux des cloisons amovibles en plaques de plâtre revêtues PVC et/ou toile de verre peinte selon présence | / | Ne contient pas d'amiante par nature | Pièces 112 et 173 | NON |
| Niveau : 1er étage / TGI | Clapet coupe-feu | Clapet coupe-feu | plâtreux, rose, Clapet coupe-feu de marque SGEI - Paroi en plaque de plâtre rose avec feuille d'aluminium | / | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau : 1er étage / TGI / R+1 | Conduit d'eau | Calorifugeage | mousse, gris(e), de marque FREUDENBERG "ISOLIER TECHNICK" sur l'ensemble des lignes fluides en acier selon présence | / | Marquage matériau | / | NON |
| Niveau : 1er étage / TGI / R+1 | Conduit d'air | Calorifugeage | laine de verre, jaune, Isolation thermique des gaines de ventilation de type CLIMAVER ou similaire avec scotch aluminium | / | Ne contient pas d'amiante par nature | Selon présence dans le niveau | NON |
| Niveau : 1er étage / TGI / R+1 | Conduit d'eau | Conduit | , de type fonte et/ou acier et/ou cuivre et/ou PVC selon | / | Ne contient pas d'amiante par | / | NON |


Copyright BUREAU VERITAS

| Localisation | Ouvrage | Matériau ou produit | Description | N° Prél. | Critère de décision | Sondage / Observation | Présence d'amiante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | présence | | nature | | |
| Niveau : 1er étage / TGI / R+1 | Mur | Enduit lissé | ciment, gris(e), sur murs en parpaings ou briques selon présence | / | Ne contient pas d'amiante par nature | / | NON |
| Niveau : 1er étage / TGI / R+1 | Plafond | Faux plafond | bois, métallique, , à lames bois dans sanitaires sur structures bois et/ou 600x600 métalliques à résille maille carrée selon présence | / | Ne contient pas d'amiante par nature | / | NON |
| Niveau : 1er étage / TGI / R+1 | Plafond (collé ou vissé) | Panneau collé ou vissé | plâtre, , selon présence dans le niveau | / | Ne contient pas d'amiante par nature | / | NON |
| Niveau : 1er étage / TGI / R+1 | Gaine horizontale | Panneau collé ou vissé | plâtre, blanc(he), selon présence dans le niveau | / | Ne contient pas d'amiante par nature | / | NON |
| Niveau : 1er étage / TGI / R+1 | Mur | Revêtement | toile de verre, blanc(he) | / | Ne contient pas d'amiante par nature | Réfection des murs en toile de verre selon présence dans certaines pièces - Travaux supérieurs à 1997 | NON |
| Niveau : 1er étage / TGI / R+1 / Ensemble des pièces Ind.100 | Revêtement de sol | Dalle de sol | blanc(he), avec masse noire y compris colle noire sous plancher technique dans local serveur 130 | P.155 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau : 1er étage / TGI / R+1 / Ensemble des pièces Ind.100 | Revêtement du mur | Peinture | décorative, blanc(he), avec enduit blanc sur fond gris dans local serveur 130 | P.156 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau : 1er étage / TGI / R+1 / Ensemble des pièces Ind.100 | Revêtement du mur | Moquette | toile, gris(e), collée sur fond plaque de plâtre de doublage dans local serveur 130 | P.157 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau : 1er étage / TGI / R+1 / Ensemble des pièces Ind.100 | Revêtement de plafond | Peinture | gouttelette, beige, avec enduit blanc dans pièce 190 | P.159 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau : 1er étage / TGI / R+1 / Ensemble des pièces Ind.100 | Revêtement de cloison | Peinture | gouttelette, beige, avec bande calicot et fond d'enduit plaque de plâtre de doublage dans pièce 190 | P.160 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau : 1er étage / TGI / R+1 / Ensemble des pièces Ind.100 | Revêtement du mur | Peinture | gouttelette, beige, avec enduit blanc sur fond ciment dans pièce 190 | P.161 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau : 1er étage / TGI / R+1 / Ensemble des pièces Ind.100 | Plafond | Faux plafond | laine de verre, , 1200x600 de type "ECOPHON" ou similaire dans pièce 130 | / | Ne contient pas d'amiante par nature | / | NON |
| Niveau : 1er étage / TGI / R+1 / Ensemble des pièces Ind.100 | Plafond | Flocage | cotonneux, blanc(he) | / | Résultat d'analyse | DDP EXPERT HOME - Rapport N° 15/IMO/0180 - Echantillon P.52 - Pièce 112 | NON |
| Niveau : 1er étage / TGI / R+1 / Ensemble des pièces Ind.100 | Plafond | Flocage | cotonneux, blanc(he) | / | Résultat d'analyse | DDP EXPERT HOME - Rapport N° 15/IMO/0180 - Echantillon P.56 - Pièce 105 | NON |
| Niveau : 1er étage / TGI / R+1 / Ensemble des pièces Ind.100 | Revêtement du mur | Peinture | gouttelette, beige | / | Résultat d'analyse | DDP EXPERT HOME - Rapport N° 15/IMO/0180 - Echantillon P.51 - Pièce 112 | NON |


Copyright BUREAU VERITAS

| Localisation | Ouvrage | Matériau ou produit | Description | N° Prél. | Critère de décision | Sondage / Observation | Présence d'amiante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau : 1er étage / TGI / R+1 / Ensemble des pièces Ind.100 | Revêtement de plafond | Peinture | gouttelette, beige | / | Résultat d'analyse | DDP EXPERT HOME - Rapport N° 15/IMO/0180 - Echantillon P.50 - Pièce 115 | NON |
| Niveau : 1er étage / TGI / R+1 / Ensemble des pièces Ind.100 | Revêtement du mur | Peinture | gouttelette, beige | / | Résultat d'analyse | DDP EXPERT HOME - Rapport N° 15/IMO/0180 - Echantillon P.49 - Pièce 115 | NON |
| Niveau : 1er étage / TGI / R+1 / Ensemble des pièces Ind.100 | Revêtement du mur | Peinture | gouttelette, beige | / | Résultat d'analyse | DDP EXPERT HOME - Rapport N° 15/IMO/0180 - Echantillon P.53 - Pièce 108 | NON |
| Niveau : 1er étage / TGI / R+1 / Ensemble des pièces Ind.100 | Revêtement du mur | Peinture | gouttelette, beige | / | Résultat d'analyse | DDP EXPERT HOME - Rapport N° 15/IMO/0180 - Echantillon P.55 - Pièce 105 | NON |
| Niveau : 1er étage / TGI / R+1 / Ensemble des pièces Ind.100 | Revêtement de plafond | Peinture | gouttelette, beige | / | Résultat d'analyse | DDP EXPERT HOME - Rapport N° 15/IMO/0180 - Echantillon P.54 - Pièce 108 | NON |
| Niveau : 1er étage / TGI / R+1 / Ensemble des pièces Ind.100 | Revêtement de plafond | Peinture | gouttelette, beige | / | Résultat d'analyse | DDP EXPERT HOME - Rapport N° 15/IMO/0180 - Echantillon P.58 - Pièce 154 | NON |
| Niveau : 1er étage / TGI / R+1 / Ensemble des pièces Ind.100 | Revêtement du mur | Peinture | gouttelette, beige | / | Résultat d'analyse | DDP EXPERT HOME - Rapport N° 15/IMO/0180 - Echantillon P.57 - Pièce 154 | NON |
| Niveau : 1er étage / TGI / R+1 / Ensemble des pièces Ind.100 | Revêtement de plafond | Peinture | gouttelette, beige | / | Résultat d'analyse | DDP EXPERT HOME - Rapport N° 15/IMO/0180 - Echantillon P.60 - Pièce 155 | NON |
| Niveau : 1er étage / TGI / R+1 / Ensemble des pièces Ind.100 | Revêtement du mur | Peinture | gouttelette, beige | / | Résultat d'analyse | DDP EXPERT HOME - Rapport N° 15/IMO/0180 - Echantillon P.59 - Pièce 155 | NON |
| Niveau : 1er étage / TGI / R+1 / Placards techniques | Plancher | Rebouchage | plâtreux, blanc(he), avec laine jaune autour du chemin de câbles dans placard technique électrique vers escalier S | P.153 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau : 1er étage / TGI / R+1 / Placards techniques | Plancher | Rebouchage | plâtreux, blanc(he), autour du chemin de câbles dans placard technique électrique vers escalier T | P.154 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau : 1er étage / TGI / R+1 / Sanitaires | Gaine | Joint | fibreux, gris(e), toile grise d'étanchéité sur gaine VMC dans sanitaires vers escalier T | P.158 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau : 2ème étage / TGI / R+2 | Plafond | Joint de dilatation | mousse, gris(e), sous couvre-joint métallique (idem sols et murs) | / | Résultat d'analyse | Idem Echantillon P.180 - Zones escaliers B et C | OUI |
| Niveau : 2ème étage / TGI / R+2 | Conduit d'air | Calorifugeage | laine de verre, jaune, Isolation thermique des gaines de ventilation de type CLIMAVER ou similaire avec scotch aluminium | / | Ne contient pas d'amiante par nature | Selon présence dans le niveau | NON |


Copyright BUREAU VERITAS

| Localisation | Ouvrage | Matériau ou produit | Description | N° Prél. | Critère de décision | Sondage / Observation | Présence d'amiante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau : 2ème étage / TGI / R+2 | Conduit d'eau | Calorifugeage | mousse, gris(e), de marque FREUDENBERG "ISOLIER TECHNICK" sur l'ensemble des lignes fluides en acier selon présence | / | Marquage matériau | / | NON |
| Niveau : 2ème étage / TGI / R+2 | Clapet coupe-feu | Clapet coupe-feu | plâtreux, rose, Clapet coupe-feu de marque SGEI - Paroi en plaque de plâtre rose avec feuille d'aluminium | / | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau : 2ème étage / TGI / R+2 | Conduit d'eau | Conduit | , de type fonte et/ou acier et/ou cuivre et/ou PVC selon présence | / | Ne contient pas d'amiante par nature | / | NON |
| Niveau : 2ème étage / TGI / R+2 | Mur | Enduit lissé | ciment, gris(e), sur murs en parpaings ou briques selon présence | / | Ne contient pas d'amiante par nature | / | NON |
| Niveau : 2ème étage / TGI / R+2 | Plafond | Faux plafond | bois, métallique, , à lames bois dans sanitaires sur structures bois et/ou 600x600 métalliques à résille maille carrée selon présence | / | Ne contient pas d'amiante par nature | / | NON |
| Niveau : 2ème étage / TGI / R+2 | Plafond (collé ou vissé) | Panneau collé ou vissé | plâtre, , selon présence dans le niveau | / | Ne contient pas d'amiante par nature | / | NON |
| Niveau : 2ème étage / TGI / R+2 | Gaine horizontale | Panneau collé ou vissé | plâtre, blanc(he), selon présence dans le niveau | / | Ne contient pas d'amiante par nature | / | NON |
| Niveau : 2ème étage / TGI / R+2 | Mur | Revêtement | toile de verre, blanc(he) | / | Ne contient pas d'amiante par nature | Réfection des murs en toile de verre selon présence dans certaines pièces - Travaux supérieurs à 1997 | NON |
| Niveau : 2ème étage / TGI / R+2 / Escalier d'accès T | Revêtement du mur | Peinture | gouttelette, gris(e), avec fond d'enduit blanc | P.172 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau : 2ème étage / TGI / R+2 / Escalier d'accès T | Revêtement de plafond | Peinture | gouttelette, gris(e), avec fond d'enduit blanc | P.173 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau : 2ème étage / TGI / R+2 / Escalier d'accès C | Revêtement du mur | Peinture | gouttelette, beige, avec fond d'enduit blanc | P.164 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau : 2ème étage / TGI / R+2 / Escalier d'accès C | Revêtement de plafond | Peinture | gouttelette, beige, avec fond d'enduit blanc | P.165 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau : 2ème étage / TGI / R+2 / Escalier d'accès D | Revêtement du mur | Peinture | gouttelette, beige, avec fond d'enduit blanc | P.167 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau : 2ème étage / TGI / R+2 / Escalier d'accès D | Revêtement de plafond | Peinture | gouttelette, gris(e), avec fond d'enduit blanc | P.168 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau : 2ème étage / TGI / R+2 / Petit(s) escalier(s) circulaire(s) | Revêtement du mur | Peinture | gouttelette, gris(e), avec fond d'enduit blanc au droit de la pièce 284 | P.166 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau : 2ème étage / TGI / R+2 / Petit(s) escalier(s) circulaire(s) | Revêtement du mur | Peinture | gouttelette, gris(e), avec fond d'enduit blanc au droit de la pièce 280 | P.169 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau : 2ème étage / TGI / R+2 / Petit(s) escalier(s) circulaire(s) | Revêtement du mur | Peinture | gouttelette, gris(e), avec fond d'enduit blanc au droit de la pièce 212 | P.171 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau : 2ème étage / TGI / R+2 / Ensemble des pièces Ind.200 | Plafond | Flocage | cotonneux, blanc(he) | / | Résultat d'analyse | DDP EXPERT HOME - Rapport N° 15/IMO/0180 - Echantillon P.15 - Pièce | NON |


Copyright BUREAU VERITAS

| Localisation | Ouvrage | Matériau ou produit | Description | N° Prél. | Critère de décision | Sondage / Observation | Présence d'amiante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 242 | |
| Niveau : 2ème étage / TGI / R+2 / Ensemble des pièces Ind.200 | Plafond | Flocage | cotonneux, blanc(he) | / | Résultat d'analyse | DDP EXPERT HOME - Rapport N° 15/IMO/0180 - Echantillon P.24 - Pièce 292 | NON |
| Niveau : 2ème étage / TGI / R+2 / Ensemble des pièces Ind.200 | Plafond | Flocage | cotonneux, blanc(he) | / | Résultat d'analyse | DDP EXPERT HOME - Rapport N° 15/IMO/0180 - Echantillon P.22 - Pièce 295 | NON |
| Niveau : 2ème étage / TGI / R+2 / Ensemble des pièces Ind.200 | Plafond | Flocage | cotonneux, blanc(he) | / | Résultat d'analyse | DDP EXPERT HOME - Rapport N° 15/IMO/0180 - Echantillon P.26 - Pièce 280 | NON |
| Niveau : 2ème étage / TGI / R+2 / Ensemble des pièces Ind.200 | Plafond | Flocage | cotonneux, blanc(he) | / | Résultat d'analyse | DDP EXPERT HOME - Rapport N° 15/IMO/0180 - Echantillon P.28 - Pièce 279 | NON |
| Niveau : 2ème étage / TGI / R+2 / Ensemble des pièces Ind.200 | Revêtement du mur | Peinture | gouttelette, beige | / | Résultat d'analyse | DDP EXPERT HOME - Rapport N° 15/IMO/0180 - Echantillon P.27 - Pièce 279 | NON |
| Niveau : 2ème étage / TGI / R+2 / Ensemble des pièces Ind.200 | Revêtement de plafond | Peinture | gouttelette, beige | / | Résultat d'analyse | DDP EXPERT HOME - Rapport N° 15/IMO/0180 - Echantillon P.17 - Pièce 277 | NON |
| Niveau : 2ème étage / TGI / R+2 / Ensemble des pièces Ind.200 | Revêtement du mur | Peinture | gouttelette, beige | / | Résultat d'analyse | DDP EXPERT HOME - Rapport N° 15/IMO/0180 - Echantillon P.16 - Pièce 277 | NON |
| Niveau : 2ème étage / TGI / R+2 / Ensemble des pièces Ind.200 | Revêtement du mur | Peinture | gouttelette, beige | / | Résultat d'analyse | DDP EXPERT HOME - Rapport N° 15/IMO/0180 - Echantillon P.11 - Pièce 268 | NON |
| Niveau : 2ème étage / TGI / R+2 / Ensemble des pièces Ind.200 | Revêtement de plafond | Peinture | gouttelette, beige | / | Résultat d'analyse | DDP EXPERT HOME - Rapport N° 15/IMO/0180 - Echantillon P.1ç - Pièce 275 | NON |
| Niveau : 2ème étage / TGI / R+2 / Ensemble des pièces Ind.200 | Revêtement du mur | Peinture | gouttelette, beige | / | Résultat d'analyse | DDP EXPERT HOME - Rapport N° 15/IMO/0180 - Echantillon P.18 - Pièce 275 | NON |
| Niveau : 2ème étage / TGI / R+2 / Ensemble des pièces Ind.200 | Revêtement du mur | Peinture | décorative, gris(e) | / | Résultat d'analyse | DDP EXPERT HOME - Rapport N° 15/IMO/0180 - Echantillon P.21 - Pièce 295 | NON |
| Niveau : 2ème étage / TGI / R+2 / Ensemble des pièces Ind.200 | Revêtement du mur | Peinture | gouttelette, beige | / | Résultat d'analyse | DDP EXPERT HOME - Rapport N° 15/IMO/0180 - Echantillon P.23 - Pièce 292 | NON |
| Niveau : 2ème étage / TGI / R+2 / Ensemble des pièces Ind.200 | Revêtement du mur | Peinture | gouttelette, beige | / | Résultat d'analyse | DDP EXPERT HOME - Rapport N° 15/IMO/0180 - Echantillon P.25 - Pièce 280 | NON |
| Niveau : 2ème étage / TGI / R+2 / Dégagements et zones d'attente | Plafond | Flocage | cotonneux, blanc(he) | / | Résultat d'analyse | DDP EXPERT HOME - Rapport N° 15/IMO/0180 - Echantillon P.29 - | NON |


Copyright BUREAU VERITAS

| Localisation | Ouvrage | Matériau ou produit | Description | N° Prél. | Critère de décision | Sondage / Observation | Présence d'amiante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Dégagement vers escalier S | |
| Niveau : 2ème étage / TGI / R+2 / Dégagements et zones d'attente | Plafond | Flocage | cotonneux, blanc(he) | / | Résultat d'analyse | DDP EXPERT HOME - Rapport N° 15/IMO/0180 - Echantillon P.30 - Dégagement vers escalier T | NON |
| Niveau : 2ème étage / TGI / R+2 / Dégagements et zones d'attente | Mur | Revêtement | tapisserie, gris(e) | / | Résultat d'analyse | DDP EXPERT HOME - Rapport N° 15/IMO/0180 - Echantillon P.12 - Dégagement côté escalier T | NON |
| Niveau : 2ème étage / TGI / R+2 / Dégagements et zones d'attente | Revêtement de sol | Dalle de sol | plastique, beige, dalle de sol souple 50x50 avec colle jaune et ragréage rose dans local Baie Informatique SR02 dans zone attente de l'escalier C | P.162 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau : 2ème étage / TGI / R+2 / Dégagements et zones d'attente | Cloison | Bande calicot | plâtre, blanc(he), avec enduit et peinture blanche dans local Baie Informatique SR02 dans zone attente de l'escalier C | P.163 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau : 2ème étage / TGI / R+2 / Dégagements et zones d'attente | Cloison | Rebouchage | mousse expensée, jaune, autour chemin de câbles en pénétration dans imposte de la porte coupe-feu vers l'escalier S | P.174 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau : 2ème étage / TGI / R+2 / Placards techniques | Plancher | Rebouchage | plâtreux, blanc(he), au droit du chemin de câbles (goulotte) dans placard technique électrique TDN 10.05 face à la pièce 282 | P.170 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau : 3ème étage / TGI / R+3 | Plafond | Joint de dilatation | mousse, gris(e), sous couvre-joint métallique (idem sols et murs) | / | Résultat d'analyse | Idem Echantillon P.180 - Zones escaliers B et C | OUI |
| Niveau : 3ème étage / TGI / R+3 | Conduit d'eau | Calorifugeage | mousse, gris(e), de marque FREUDENBERG "ISOLIER TECHNICK" sur l'ensemble des lignes fluides en acier selon présence | / | Marquage matériau | / | NON |
| Niveau : 3ème étage / TGI / R+3 | Conduit d'air | Calorifugeage | laine de verre, jaune, Isolation thermique des gaines de ventilation de type CLIMAVER ou similaire avec scotch aluminium | / | Ne contient pas d'amiante par nature | Selon présence dans le niveau | NON |
| Niveau : 3ème étage / TGI / R+3 | Clapet coupe-feu | Clapet coupe-feu | plâtreux, rose, Clapet coupe-feu de marque SGEI - Paroi en plaque de plâtre rose avec feuille d'aluminium | / | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau : 3ème étage / TGI / R+3 | Conduit d'eau | Conduit | , de type fonte et/ou acier et/ou cuivre et/ou PVC selon présence | / | Ne contient pas d'amiante par nature | / | NON |
| Niveau : 3ème étage / TGI / R+3 | Mur | Enduit lissé | ciment, gris(e), sur murs en parpaings ou briques selon présence | / | Ne contient pas d'amiante par nature | / | NON |
| Niveau : 3ème étage / TGI / R+3 | Plafond | Faux plafond | bois, métallique, , à lames bois dans sanitaires sur structures | / | Ne contient pas d'amiante par | / | NON |


Copyright BUREAU VERITAS

| Localisation | Ouvrage | Matériau ou produit | Description | N° Prél. | Critère de décision | Sondage / Observation | Présence d'amiante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | bois et/ou 600x600 métalliques à résille maille carrée selon présence | | nature | | |
| Niveau : 3ème étage / TGI / R+3 | Plafond (collé ou vissé) | Panneau collé ou vissé | plâtre, , selon présence dans le niveau | / | Ne contient pas d'amiante par nature | / | NON |
| Niveau : 3ème étage / TGI / R+3 | Plafond (collé ou vissé) | Panneau collé ou vissé | gris(e), panneaux en fibres de bois enrobées de ciment gris type FIBRALITH (idem sur murs) selon présence | / | Ne contient pas d'amiante par nature | matériau ayant fait l'objet d'un prélèvement par DDP EXPERT HOME (échantillon P.04) | NON |
| Niveau : 3ème étage / TGI / R+3 | Gaine horizontale | Panneau collé ou vissé | plâtre, blanc(he), selon présence dans le niveau | / | Ne contient pas d'amiante par nature | / | NON |
| Niveau : 3ème étage / TGI / R+3 | Mur | Revêtement | toile de verre, blanc(he) | / | Ne contient pas d'amiante par nature | Réfection des murs en toile de verre selon présence dans certaines pièces - Travaux supérieurs à 1997 | NON |
| Niveau : 3ème étage / TGI / R+3 / Escalier d'accès S | Revêtement du mur | Peinture | gouttelette, gris(e), avec fond d'enduit blanc | P.176 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau : 3ème étage / TGI / R+3 / Escalier d'accès S | Revêtement de plafond | Peinture | gouttelette, gris(e), avec fond d'enduit blanc | P.177 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau : 3ème étage / TGI / R+3 / Escalier d'accès B | Revêtement du mur | Peinture | gouttelette, beige | / | Résultat d'analyse | DDP EXPERT HOME - Rapport N° 15/IMO/0180 - Echantillon P.14 | NON |
| Niveau : 3ème étage / TGI / R+3 / Escalier d'accès B | Revêtement de plafond | Peinture | gouttelette, beige, avec fond d'enduit blanc | P.175 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau : 3ème étage / TGI / R+3 / Ensemble des pièces Ind.300 | Plafond | Flocage | cotonneux, blanc(he) | / | Résultat d'analyse | DDP EXPERT HOME - Rapport N° 15/IMO/0180 - Echantillon P.32 - Pièce 388 | NON |
| Niveau : 3ème étage / TGI / R+3 / Ensemble des pièces Ind.300 | Plafond | Flocage | cotonneux, blanc(he) | / | Résultat d'analyse | DDP EXPERT HOME - Rapport N° 15/IMO/0180 - Echantillon P.38 - Pièce 341 | NON |
| Niveau : 3ème étage / TGI / R+3 / Ensemble des pièces Ind.300 | Plafond | Flocage | cotonneux, blanc(he) | / | Résultat d'analyse | DDP EXPERT HOME - Rapport N° 15/IMO/0180 - Echantillon P.40 - Pièce 314 | NON |
| Niveau : 3ème étage / TGI / R+3 / Ensemble des pièces Ind.300 | Plafond | Flocage | cotonneux, blanc(he) | / | Résultat d'analyse | DDP EXPERT HOME - Rapport N° 15/IMO/0180 - Echantillon P.42 - Pièce 312 | NON |
| Niveau : 3ème étage / TGI / R+3 / Ensemble des pièces Ind.300 | Plafond | Flocage | cotonneux, blanc(he) | / | Résultat d'analyse | DDP EXPERT HOME - Rapport N° 15/IMO/0180 - Echantillon P.46 - Pièce 332 | NON |
| Niveau : 3ème étage / TGI / R+3 / Ensemble des pièces Ind.300 | Plafond | Flocage | cotonneux, blanc(he) | / | Résultat d'analyse | DDP EXPERT HOME - Rapport N° 15/IMO/0180 - Echantillon P.44 - Pièce 320 | NON |
| Niveau : 3ème étage / TGI / R+3 / Ensemble des pièces Ind.300 | Plafond | Flocage | cotonneux, blanc(he) | / | Résultat d'analyse | DDP EXPERT HOME - Rapport N° 15/IMO/0180 - Echantillon P.36 - Pièce 353 | NON |

| Localisation | Ouvrage | Matériau ou produit | Description | N° Prél. | Critère de décision | Sondage / Observation | Présence d'amiante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau : 3ème étage / TGI / R+3 / Ensemble des pièces Ind.300 | Revêtement du mur | Peinture | gouttelette, beige | / | Résultat d'analyse | DDP EXPERT HOME - Rapport N° 15/IMO/0180 - Echantillon P.09 - Pièce 380 | NON |
| Niveau : 3ème étage / TGI / R+3 / Ensemble des pièces Ind.300 | Revêtement du mur | Peinture | gouttelette, beige | / | Résultat d'analyse | DDP EXPERT HOME - Rapport N° 15/IMO/0180 - Echantillon P.31 - Pièce 388 | NON |
| Niveau : 3ème étage / TGI / R+3 / Ensemble des pièces Ind.300 | Revêtement du mur | Peinture | gouttelette, beige | / | Résultat d'analyse | DDP EXPERT HOME - Rapport N° 15/IMO/0180 - Echantillon P.37 - Pièce 341 | NON |
| Niveau : 3ème étage / TGI / R+3 / Ensemble des pièces Ind.300 | Revêtement du mur | Peinture | gouttelette, beige | / | Résultat d'analyse | DDP EXPERT HOME - Rapport N° 15/IMO/0180 - Echantillon P.43 - Pièce 320 | NON |
| Niveau : 3ème étage / TGI / R+3 / Ensemble des pièces Ind.300 | Revêtement du mur | Peinture | gouttelette, beige | / | Résultat d'analyse | DDP EXPERT HOME - Rapport N° 15/IMO/0180 - Echantillon P.45 - Pièce 332 | NON |
| Niveau : 3ème étage / TGI / R+3 / Ensemble des pièces Ind.300 | Revêtement du mur | Peinture | gouttelette, beige | / | Résultat d'analyse | DDP EXPERT HOME - Rapport N° 15/IMO/0180 - Echantillon P.33 - Pièce 387 | NON |
| Niveau : 3ème étage / TGI / R+3 / Ensemble des pièces Ind.300 | Revêtement du mur | Peinture | gouttelette, beige | / | Résultat d'analyse | DDP EXPERT HOME - Rapport N° 15/IMO/0180 - Echantillon P.35 - Pièce 353 | NON |
| Niveau : 3ème étage / TGI / R+3 / Ensemble des pièces Ind.300 | Revêtement de plafond | Peinture | gouttelette, beige | / | Résultat d'analyse | DDP EXPERT HOME - Rapport N° 15/IMO/0180 - Echantillon P.34 - Pièce 387 | NON |
| Niveau : 3ème étage / TGI / R+3 / Ensemble des pièces Ind.300 | Mur | Revêtement | tapisserie, gris(e) | / | Résultat d'analyse | DDP EXPERT HOME - Rapport N° 15/IMO/0180 - Echantillon P.10 - Pièce 361 - Travaux de peinture en 2017 | NON |
| Niveau : 3ème étage / TGI / R+3 / Ensemble des pièces Ind.300 | Mur | Revêtement | tapisserie, gris(e) | / | Résultat d'analyse | DDP EXPERT HOME - Rapport N° 15/IMO/0180 - Echantillon P.41 - Pièce 312 | NON |
| Niveau : 3ème étage / TGI / R+3 / Ensemble des pièces Ind.300 | Mur | Revêtement | tapisserie, gris(e) | / | Résultat d'analyse | DDP EXPERT HOME - Rapport N° 15/IMO/0180 - Echantillon P.39 - Pièce 314 | NON |
| Niveau : 3ème étage / TGI / R+3 / Dégagements et zones d'attente | Plafond | Flocage | cotonneux, blanc(he) | / | Résultat d'analyse | DDP EXPERT HOME - Rapport N° 15/IMO/0180 - Echantillon P.47 - Dégagement vers escalier S | NON |
| Niveau : 3ème étage / TGI / R+3 / Dégagements et zones d'attente | Plafond | Flocage | cotonneux, blanc(he) | / | Résultat d'analyse | DDP EXPERT HOME - Rapport N° 15/IMO/0180 - Echantillon P.48 - Dégagement vers escalier T | NON |


Copyright BUREAU VERITAS

| Localisation | Ouvrage | Matériau ou produit | Description | N° Prél. | Critère de décision | Sondage / Observation | Présence d'amiante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau : 3ème étage / TGI / R+3 / Dégagements et zones d'attente | Cloison | Rebouchage | mousse expensée, jaune, au droit du chemin de câbles en pénétration dans imposte de la porte coupe-feu du dégagement vers sanitaires de l'escalier T | P.179 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau : 3ème étage / TGI / R+3 / Dégagements et zones d'attente | Plancher | Joint de dilatation | mousse, gris(e), dans zone attente de l'escalier B | P.180 | Résultat d'analyse | / | OUI |
| Niveau : 3ème étage / TGI / R+3 / Placards techniques | Plancher | Rebouchage | plâtreux, blanc(he), autour chemin de câbles dans placard technique électrique vers l'escalier S | P.178 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau : 4ème étage / TGI / R+4 | Plafond | Joint de dilatation | mousse, gris(e), sous couvre-joint métallique (idem sols et murs) | / | Résultat d'analyse | Idem Echantillon P.180 - Zones escaliers B et C | OUI |
| Niveau : 4ème étage / TGI / R+4 | Conduit d'eau | Calorifugeage | mousse, gris(e), de marque FREUDENBERG "ISOLIER TECHNICK" sur l'ensemble des lignes fluides en acier selon présence | / | Marquage matériau | / | NON |
| Niveau : 4ème étage / TGI / R+4 | Conduit d'air | Calorifugeage | laine de verre, jaune, Isolation thermique des gaines de ventilation de type CLIMAVER ou similaire avec scotch aluminium | / | Ne contient pas d'amiante par nature | Selon présence dans le niveau | NON |
| Niveau : 4ème étage / TGI / R+4 | Clapet coupe-feu | Clapet coupe-feu | plâtreux, rose, Clapet coupe-feu de marque SGEI - Paroi en plaque de plâtre rose avec feuille d'aluminium | / | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau : 4ème étage / TGI / R+4 | Conduit d'eau | Conduit | , de type fonte et/ou acier et/ou cuivre et/ou PVC selon présence | / | Ne contient pas d'amiante par nature | / | NON |
| Niveau : 4ème étage / TGI / R+4 | Mur | Enduit lissé | ciment, gris(e), sur murs en parpaings ou briques selon présence | / | Ne contient pas d'amiante par nature | / | NON |
| Niveau : 4ème étage / TGI / R+4 | Plafond | Faux plafond | bois, métallique, , à lames bois dans sanitaires sur structures bois et/ou 600x600 métalliques à résille maille carrée selon présence | / | Ne contient pas d'amiante par nature | / | NON |
| Niveau : 4ème étage / TGI / R+4 | Plafond (collé ou vissé) | Panneau collé ou vissé | gris(e), panneaux en fibres de bois enrobées de ciment gris type FIBRALITH (idem sur murs) selon présence | / | Ne contient pas d'amiante par nature | matériau ayant fait l'objet d'un prélèvement par DDP EXPERT HOME (échantillon P.04) | NON |
| Niveau : 4ème étage / TGI / R+4 | Plafond (collé ou vissé) | Panneau collé ou vissé | plâtre, , selon présence dans le niveau | / | Ne contient pas d'amiante par nature | / | NON |
| Niveau : 4ème étage / TGI / R+4 | Gaine horizontale | Panneau collé ou vissé | plâtre, blanc(he), selon présence dans le niveau | / | Ne contient pas d'amiante par nature | / | NON |
| Niveau : 4ème étage / TGI / R+4 | Mur | Revêtement | toile de verre, blanc(he) | / | Ne contient pas d'amiante par nature | Réfection des murs en toile de verre selon présence dans certaines pièces - Travaux supérieurs à 1997 | NON |


Copyright BUREAU VERITAS

| Localisation | Ouvrage | Matériau ou produit | Description | N° Prél. | Critère de décision | Sondage / Observation | Présence d'amiante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau : 4ème étage / TGI / R+4 / Ensemble des pièces Ind.400 | Plafond | Flocage | cotonneux, blanc(he) | / | Résultat d'analyse | DDP EXPERT HOME - Rapport N° 15/IMO/0180 - Echantillon P.75 - Pièce 450 | NON |
| Niveau : 4ème étage / TGI / R+4 / Ensemble des pièces Ind.400 | Plafond | Flocage | cotonneux, blanc(he) | / | Résultat d'analyse | DDP EXPERT HOME - Rapport N° 15/IMO/0180 - Echantillon P.06 - Pièce 453 | NON |
| Niveau : 4ème étage / TGI / R+4 / Ensemble des pièces Ind.400 | Plafond | Flocage | cotonneux, blanc(he) | / | Résultat d'analyse | DDP EXPERT HOME - Rapport N° 15/IMO/0180 - Echantillon P.73 - Pièce 430 | NON |
| Niveau : 4ème étage / TGI / R+4 / Ensemble des pièces Ind.400 | Revêtement du mur | Peinture | gouttelette, beige | / | Résultat d'analyse | DDP EXPERT HOME - Rapport N° 15/IMO/0180 - Echantillon P.66 - Pièce 441 | NON |
| Niveau : 4ème étage / TGI / R+4 / Ensemble des pièces Ind.400 | Revêtement de plafond | Peinture | gouttelette, beige | / | Résultat d'analyse | DDP EXPERT HOME - Rapport N° 15/IMO/0180 - Echantillon P.67 - Pièce 441 | NON |
| Niveau : 4ème étage / TGI / R+4 / Ensemble des pièces Ind.400 | Revêtement de plafond | Peinture | gouttelette, beige | / | Résultat d'analyse | DDP EXPERT HOME - Rapport N° 15/IMO/0180 - Echantillon P.69 - Pièce 421 | NON |
| Niveau : 4ème étage / TGI / R+4 / Ensemble des pièces Ind.400 | Revêtement du mur | Peinture | gouttelette, beige | / | Résultat d'analyse | DDP EXPERT HOME - Rapport N° 15/IMO/0180 - Echantillon P.68 - Pièce 421 | NON |
| Niveau : 4ème étage / TGI / R+4 / Ensemble des pièces Ind.400 | Revêtement du mur | Peinture | gouttelette, beige | / | Résultat d'analyse | DDP EXPERT HOME - Rapport N° 15/IMO/0180 - Echantillon P.72 - Pièce 430 | NON |
| Niveau : 4ème étage / TGI / R+4 / Ensemble des pièces Ind.400 | Plafond | Peinture | décorative, blanc(he) | / | Résultat d'analyse | DDP EXPERT HOME - Rapport N° 15/IMO/0180 - Echantillon P.71 - Pièce 422 | NON |
| Niveau : 4ème étage / TGI / R+4 / Ensemble des pièces Ind.400 | Revêtement du mur | Peinture | gouttelette, beige | / | Résultat d'analyse | DDP EXPERT HOME - Rapport N° 15/IMO/0180 - Echantillon P.74 - Pièce 450 - Toile de verre peinte (travaux récents) | NON |
| Niveau : 4ème étage / TGI / R+4 / Ensemble des pièces Ind.400 | Mur | Revêtement | tapisserie, gris(e) | / | Résultat d'analyse | DDP EXPERT HOME - Rapport N° 15/IMO/0180 - Echantillon P.70 - Pièce 422 | NON |
| Niveau : 4ème étage / TGI / R+4 / Dégagements et zones d'attente | Plafond | Flocage | cotonneux, blanc(he) | / | Résultat d'analyse | DDP EXPERT HOME - Rapport N° 15/IMO/0180 - Echantillon P.84 - Dégagement vers escalier S | NON |
| Niveau : 4ème étage / TGI / R+4 / Dégagements et zones d'attente | Plafond | Flocage | cotonneux, blanc(he) | / | Résultat d'analyse | DDP EXPERT HOME - Rapport N° 15/IMO/0180 - Echantillon P.85 - Dégagement vers escalier T | NON |


Copyright BUREAU VERITAS

| Localisation | Ouvrage | Matériau ou produit | Description | N° Prél. | Critère de décision | Sondage / Observation | Présence d'amiante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau : 4ème étage / TGI / R+4 / Dégagements et zones d'attente | Plafond | Flocage | cotonneux, blanc(he) | / | Résultat d'analyse | DDP EXPERT HOME - Rapport N° 15/IMO/0180 - Echantillon P.08 - Dégagement central entre S/T | NON |
| Niveau : 4ème étage / TGI / R+4 / Dégagements et zones d'attente | Equipement | Joint équipement | mousse, jaune, Mousse injectée autour du chemin de câbles dans cloison | / | Résultat d'analyse | DDP EXPERT HOME - Rapport N° 15/IMO/0180 - Echantillon P.07 - Dégagement vers escalier T | NON |
| Niveau : 5ème étage / TGI / R+5 | Plafond | Joint de dilatation | mousse, gris(e), sous couvre-joint métallique (idem sols et murs) | / | Résultat d'analyse | Idem Echantillon P.180 - Zone escalier C | OUI |
| Niveau : 5ème étage / TGI / R+5 | Conduit d'air | Calorifugeage | laine de verre, jaune, Isolation thermique des gaines de ventilation de type CLIMAVER ou similaire avec scotch aluminium | / | Ne contient pas d'amiante par nature | Selon présence dans le niveau | NON |
| Niveau : 5ème étage / TGI / R+5 | Clapet coupe-feu | Clapet coupe-feu | plâtreux, rose, Clapet coupe-feu de marque SGEI - Paroi en plaque de plâtre rose avec feuille d'aluminium | / | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau : 5ème étage / TGI / R+5 | Conduit d'eau | Conduit | , de type fonte et/ou acier et/ou cuivre et/ou PVC selon présence | / | Ne contient pas d'amiante par nature | / | NON |
| Niveau : 5ème étage / TGI / R+5 | Mur | Enduit lissé | ciment, gris(e), sur murs en parpaings ou briques selon présence | / | Ne contient pas d'amiante par nature | / | NON |
| Niveau : 5ème étage / TGI / R+5 | Plafond | Faux plafond | bois, métallique, , à lames bois dans sanitaires sur structures bois et/ou 600x600 métalliques à résille maille carrée selon présence | / | Ne contient pas d'amiante par nature | / | NON |
| Niveau : 5ème étage / TGI / R+5 | Plafond (collé ou vissé) | Panneau collé ou vissé | plâtre, , selon présence dans le niveau | / | Ne contient pas d'amiante par nature | / | NON |
| Niveau : 5ème étage / TGI / R+5 | Plafond (collé ou vissé) | Panneau collé ou vissé | gris(e), panneaux en fibres de bois enrobées de ciment gris type FIBRALITH (idem sur murs) selon présence | / | Ne contient pas d'amiante par nature | matériau ayant fait l'objet d'un prélèvement par DDP EXPERT HOME (échantillon P.04) | NON |
| Niveau : 5ème étage / TGI / R+5 | Gaine horizontale | Panneau collé ou vissé | plâtre, blanc(he), selon présence dans le niveau | / | Ne contient pas d'amiante par nature | / | NON |
| Niveau : 5ème étage / TGI / R+5 | Mur | Revêtement | toile de verre, blanc(he) | / | Ne contient pas d'amiante par nature | Réfection des murs en toile de verre selon présence dans certaines pièces - Travaux supérieurs à 1997 | NON |
| Niveau : 5ème étage / TGI / R+5 / Ensemble des pièces Ind.500 | Plafond | Flocage | cotonneux, blanc(he) | / | Résultat d'analyse | DDP EXPERT HOME - Rapport N° 15/IMO/0180 - Echantillon P.77 - Pièce 552 | NON |
| Niveau : 5ème étage / TGI / R+5 / Ensemble des pièces Ind.500 | Plafond | Flocage | cotonneux, blanc(he) | / | Résultat d'analyse | DDP EXPERT HOME - Rapport N° 15/IMO/0180 - Echantillon P.02 - Pièce 553 | NON |

| Localisation | Ouvrage | Matériau ou produit | Description | N° Prél. | Critère de décision | Sondage / Observation | Présence d'amiante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau : 5ème étage / TGI / R+5 / Ensemble des pièces Ind.500 | Plafond | Flocage | cotonneux, blanc(he) | / | Résultat d'analyse | DDP EXPERT HOME - Rapport N° 15/IMO/0180 - Echantillon P.80 - Pièce 570 | NON |
| Niveau : 5ème étage / TGI / R+5 / Ensemble des pièces Ind.500 | Revêtement du mur | Peinture | gouttelette, beige | / | Résultat d'analyse | DDP EXPERT HOME - Rapport N° 15/IMO/0180 - Echantillon P.76 - Pièce 552 - Toile de verre peinte (travaux récents) | NON |
| Niveau : 5ème étage / TGI / R+5 / Ensemble des pièces Ind.500 | Revêtement de plafond | Peinture | gouttelette, beige | / | Résultat d'analyse | DDP EXPERT HOME - Rapport N° 15/IMO/0180 - Echantillon P.79 - Pièce 551 | NON |
| Niveau : 5ème étage / TGI / R+5 / Ensemble des pièces Ind.500 | Revêtement du mur | Peinture | gouttelette, beige | / | Résultat d'analyse | DDP EXPERT HOME - Rapport N° 15/IMO/0180 - Echantillon P.78 - Pièce 551 | NON |
| Niveau : 5ème étage / TGI / R+5 / Ensemble des pièces Ind.500 | Revêtement du mur | Peinture | gouttelette, beige | / | Résultat d'analyse | DDP EXPERT HOME - Rapport N° 15/IMO/0180 - Echantillon P.81 - Pièce 570 - Toile de verre peinte (travaux récents) | NON |
| Niveau : 5ème étage / TGI / R+5 / Dégagements et zone d'attente | Plafond | Flocage | cotonneux, blanc(he) | / | Résultat d'analyse | DDP EXPERT HOME - Rapport N° 15/IMO/0180 - Echantillon P.82 - Salle d'attente vers escalier C | NON |
| Niveau : 5ème étage / TGI / R+5 / Dégagements et zone d'attente | Plafond | Flocage | cotonneux, blanc(he) | / | Résultat d'analyse | DDP EXPERT HOME - Rapport N° 15/IMO/0180 - Echantillon P.83 - Dégagement vers escalier T | NON |
| Niveau : 5ème étage / TGI / R+5 / Zone locaux techniques | Conduit | Enveloppe de calorifugeage | bitumineux, noir(e) | / | Document consulté | Lignes fluides "Eau Glacée" selon présence - Société INNAX - Rapport N° 40_PJ BOBIGNY_RPINNAX-DTA du 07/06/2017 | OUI |
| Niveau : 5ème étage / TGI / R+5 / Zone locaux techniques | Cloison | Panneau | composite, gris(e), panneau de doublage acoustique de type "Fibralith" | / | Résultat d'analyse | DDP EXPERT HOME - Rapport N° 15/IMO/0180 - Echantillon P.04 - Machinerie et Ventilation Ouest | NON |
| Niveau : 6ème étage / TGI / R+6 | Plafond | Joint de dilatation | mousse, gris(e), sous couvre-joint métallique (idem sols et murs) | / | Résultat d'analyse | Idem Echantillon P.180 - Zone escalier C | OUI |
| Niveau : 6ème étage / TGI / R+6 | Conduit d'air | Calorifugeage | laine de verre, jaune, Isolation thermique des gaines de ventilation de type CLIMAVER ou similaire avec scotch aluminium | / | Ne contient pas d'amiante par nature | Selon présence dans le niveau | NON |
| Niveau : 6ème étage / TGI / R+6 | Clapet coupe-feu | Clapet coupe-feu | plâtreux, rose, Clapet coupe-feu de marque SGEI - Paroi en plaque de plâtre rose avec feuille d'aluminium | / | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau : 6ème étage / TGI / R+6 | Conduit d'eau | Conduit | , de type fonte et/ou acier et/ou cuivre et/ou PVC selon | / | Ne contient pas d'amiante par | / | NON |

| Localisation | Ouvrage | Matériau ou produit | Description | N° Prél. | Critère de décision | Sondage / Observation | Présence d'amiante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | présence | | nature | | |
| Niveau : 6ème étage / TGI / R+6 | Mur | Enduit lissé | ciment, gris(e), sur murs en parpaings ou briques selon présence | / | Ne contient pas d'amiante par nature | / | NON |
| Niveau : 6ème étage / TGI / R+6 | Plafond | Faux plafond | bois, métallique, , à lames bois dans sanitaires sur structures bois et/ou 600x600 métalliques à résille maille carrée selon présence | / | Ne contient pas d'amiante par nature | / | NON |
| Niveau : 6ème étage / TGI / R+6 | Gaine horizontale | Panneau collé ou vissé | plâtre, blanc(he), selon présence dans le niveau | / | Ne contient pas d'amiante par nature | / | NON |
| Niveau : 6ème étage / TGI / R+6 | Mur | Revêtement | toile de verre, blanc(he) | / | Ne contient pas d'amiante par nature | Réfection des murs en toile de verre selon présence dans certaines pièces - Travaux supérieurs à 1997 | NON |
| Niveau : 6ème étage / TGI / R+6 / Escalier d'accès T | Revêtement du mur | Peinture | gouttelette, gris(e), avec fond d'enduit blanc | P.182 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau : 6ème étage / TGI / R+6 / Escalier d'accès T | Revêtement de plafond | Peinture | gouttelette, gris(e), avec fond d'enduit blanc | P.183 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau : 6ème étage / TGI / R+6 / Escalier d'accès C | Revêtement du mur | Peinture | gouttelette, beige, avec fond d'enduit blanc | P.184 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau : 6ème étage / TGI / R+6 / Escalier d'accès C | Revêtement de plafond | Peinture | gouttelette, beige, avec fond d'enduit blanc | P.185 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau : 6ème étage / TGI / R+6 / Ensemble des pièces Ind.600 | Plafond | Flocage | cotonneux, blanc(he), en dalle haute de la bibliothèque 675 | P.181 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau : 6ème étage / TGI / R+6 / Ensemble des pièces Ind.600 | Revêtement de cloison | Moquette avec sous couche | toile, vert(e), avec colle jaune sur doublage en plaque de plâtre dans la bibliothèque 675 | P.186 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau : 6ème étage / TGI / R+6 / Ensemble des pièces Ind.600 | Cloison | Panneau de cloison | , Plaques de plâtre revêtues PVC ou toiles de verre ou tapisseries murales | / | Ne contient pas d'amiante par nature | / | NON |
| Niveau : 6ème étage / TGI / R+6 / Dégagement(s) | Plafond | Flocage | cotonneux, blanc(he) | / | Résultat d'analyse | DDP EXPERT HOME - Rapport N° 15/IMO/0180 - Echantillon P.01 | NON |
| Niveau : 7ème étage / TGI | Conduit d'air | Calorifugeage | laine de verre, jaune, Isolation thermique des gaines de ventilation de type CLIMAVER ou similaire avec scotch aluminium | / | Ne contient pas d'amiante par nature | Selon présence dans le niveau | NON |
| Niveau : 7ème étage / TGI / R+7 | Clapet coupe-feu | Clapet coupe-feu | plâtreux, rose, Clapet coupe-feu de marque SGEI - Paroi en plaque de plâtre rose avec feuille d'aluminium | / | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau : 7ème étage / TGI / R+7 | Conduit d'eau | Conduit | , de type fonte et/ou acier et/ou cuivre et/ou PVC selon présence | / | Ne contient pas d'amiante par nature | / | NON |
| Niveau : 7ème étage / TGI / R+7 | Plafond (collé ou vissé) | Panneau collé ou vissé | gris(e), panneaux en fibres de bois enrobées de ciment gris type FIBRALITH (idem sur murs) selon présence | / | Ne contient pas d'amiante par nature | matériau ayant fait l'objet d'un prélèvement par DDP EXPERT HOME (échantillon P.04) | NON |
| Niveau : 7ème étage / TGI / R+7 / Zones locaux | Gaine | Joint | fibreux, gris(e), en jonction sur gaine VMC | P.187 | Résultat d'analyse | / | NON |

| Localisation | Ouvrage | Matériau ou produit | Description | N° Prél. | Critère de décision | Sondage / Observation | Présence d'amiante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| techniques | | | | | | | |
| Niveau : 7ème étage / TGI / R+7 / Zones locaux techniques | Conduit | Enveloppe de calorifugeage | bitumineux, noir(e) | / | Document consulté | Lignes fluides "Eau Glacée" selon présence - Société INNAX - Rapport N° 40_PJ BOBIGNY_RPINNAX-DTA du 07/06/2017 | OUI |
| Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe / R-1 | Conduit d'air | Calorifugeage | laine de verre, jaune, Isolation thermique des gaines de ventilation de type CLIMAVER ou similaire avec scotch aluminium | / | Ne contient pas d'amiante par nature | Selon présence dans le niveau | NON |
| Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe / R-1 | Conduit d'eau | Calorifugeage | mousse, gris(e), de marque FREUDENBERG "ISOLIER TECHNICK" sur l'ensemble des lignes fluides en acier selon présence | / | Marquage matériau | / | NON |
| Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe / R-1 | Clapet coupe-feu | Clapet coupe-feu | plâtreux, rose, Clapet coupe-feu de marque SGEI - Paroi en plaque de plâtre rose avec feuille d'aluminium | / | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe / R-1 | Conduit d'eau | Conduit | , de type fonte et/ou acier et/ou cuivre et/ou PVC selon présence | / | Ne contient pas d'amiante par nature | / | NON |
| Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe / R-1 | Mur | Enduit lissé | ciment, gris(e), sur murs en parpaings ou briques selon présence | / | Ne contient pas d'amiante par nature | / | NON |
| Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe / R-1 | Gaine horizontale | Panneau collé ou vissé | plâtre, blanc(he), selon présence dans le niveau | / | Ne contient pas d'amiante par nature | / | NON |
| Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe / R-1 / Escalier d'accès A | Revêtement du mur | Peinture | gouttelette, gris(e), avec fond d'enduit blanc | P.188 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe / R-1 / Escalier d'accès A | Revêtement de plafond | Peinture | gouttelette, gris(e), avec fond d'enduit blanc | P.189 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe / R-1 / Escalier d'accès B | Revêtement du mur | Peinture | gouttelette, gris(e), avec fond d'enduit blanc | P.202 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe / R-1 / Escalier d'accès B | Revêtement de plafond | Peinture | gouttelette, gris(e), avec fond d'enduit blanc | P.203 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe / R-1 / Escalier d'accès B | Mur | Rebouchage | plâtreux, blanc(he), au droit du boitier encastrable électrique sur dégagement de l'escalier B | P.204 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe / R-1 / LT CTA S04 | Conduit | Enveloppe de calorifugeage | bitumineux, noir(e) | / | Document consulté | Lignes fluides "Eau Glacée" selon présence - Société INNAX - Rapport N° 40_PJ BOBIGNY_RPINNAX-DTA du 07/06/2017 | OUI |
| Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe / R-1 / Archives Ind.S | Plafond | Flocage | cotonneux, blanc(he), en dalle haute des archives S02 | P.197 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe / R-1 / Archives | Plafond | Flocage | cotonneux, blanc(he), en dalle haute des archives S01 | P.198 | Résultat d'analyse | / | NON |


Copyright BUREAU VERITAS

| Localisation | Ouvrage | Matériau ou produit | Description | N° Prél. | Critère de décision | Sondage / Observation | Présence d'amiante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind.S | | | | | | | |
| Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe / R-1 / Archives Ind.S | Gaine | Joint | mastic, marron, dans archives S02 | P.199 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe / R-1 / Archives Ind.S | Cloison | Bande calicot | papier, blanc(he), avec enduit et peinture blanche sur paroi de doublage en plaque de plâtre | P.200 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe / R-1 / Archives Ind.S | Plafond | Rebouchage | plâtreux, beige, au droit du boitier encastrable électrique dans flocage en dalle haute des archives S01 | P.201 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe / R-1 / Archives Ind.S | Conduit | Enveloppe de calorifugeage | bitumineux, noir(e) | / | Document consulté | Lignes fluides "Eau Glacée" selon présence - Société INNAX - Rapport N° 40_PJ BOBIGNY_RPINNAX-DTA du 07/06/2017 | OUI |
| Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe / R-1 / Dégagements | Revêtement du mur | Moquette avec sous couche | gris(e), avec fond papier beige y compris colle jaune sur enduit blanc dans dégagement vers l'escalier A | P.190 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe / R-1 / Dégagements | Revêtement de sol | Dalle de sol | gris(e), Dalle vinyle 30x30 avec colle noire dans dégagement vers escalier A | / | Document consulté | Société INNAX - Rapport N° 40_PJ BOBIGNY_RPINNAX-DTA du 07/06/2017 | OUI |
| Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe / R-1 / Sanitaires | Clapet coupe-feu | Clapet coupe-feu | plâtreux, rose, paroi avec carton et aluminium - CCF de marque SGEI | P.191 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe / R-1 / Sanitaires | Clapet coupe-feu | Rebouchage clapet | ciment, gris(e), autour du CCF SGEI | P.192 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe / R-1 / Sanitaires | Gaine | Joint | fibreux, gris(e), en jonction de gaine VMC en sortie du CCF | P.193 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe / R-1 / Sanitaires | Gaine | Joint | mastic, beige, sur gaine VMC | P.194 | Résultat d'analyse | / | OUI |
| Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe / R-1 / Sanitaires | Gaine horizontale | Flocage | cotonneux, blanc(he) | P.195 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe / R-1 / Sanitaires | Revêtement de poteau | Colle de faïence | mortier, gris(e), faïence 5x5 beige avec joint gris | P.196 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe / R-1 / Placard technique électrique | Plancher | Fourreau | fibre-ciment, gris(e) | / | Résultat d'analyse | idem P.09 - Ensemble de fourreaux dans chambre de tirage (cheminement inconnu) | OUI |
| Niveau R+0 / RDC / Bât. Annexe / Rez-de-chaussée / Dégagement Escalier A | Revêtement du mur | Peinture | décorative, blanc(he), avec enduit blanc | P.213 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau R+0 / RDC / Bât. Annexe / Rez-de-chaussée / Dégagement Escalier A | Revêtement de sol | Dalle de sol | cassante, gris(e), moucheté bleu avec colle jaune et ragréage rose | P.214 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau : Pas Perdus / Bât. Annexe / R+1 | Conduit d'air | Calorifugeage | laine de verre, jaune, Isolation thermique des gaines de ventilation de type CLIMAVER ou similaire avec scotch aluminium | / | Ne contient pas d'amiante par nature | Selon présence dans le niveau | NON |


Copyright BUREAU VERITAS

| Localisation | Ouvrage | Matériau ou produit | Description | N° Prél. | Critère de décision | Sondage / Observation | Présence d'amiante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau : Pas Perdus / Bât. Annexe / R+1 | Conduit d'eau | Conduit | , de type fonte et/ou acier et/ou cuivre et/ou PVC selon présence | / | Ne contient pas d'amiante par nature | / | NON |
| Niveau : Pas Perdus / Bât. Annexe / R+1 | Plafond | Faux plafond | bois, métallique, , à lames bois dans sanitaires sur structures bois et/ou 600x600 métalliques à résille maille carrée selon présence | / | Ne contient pas d'amiante par nature | / | NON |
| Niveau : Pas Perdus / Bât. Annexe / R+1 / Zone SA N°1 | Plafond | Flocage | cotonneux, blanc(he), en dalle haute | P.205 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau : Pas Perdus / Bât. Annexe / R+1 / Zone SA N°1 | Mur | Revêtement | tapisserie, gris(e), avec fond beige sur enduit ciment | P.206 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau : Pas Perdus / Bât. Annexe / R+1 / Zone SA N°1 | Charpente | Peinture | décorative, bleu(e), avec enduit blanc sur antirouille orange | P.207 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau : Pas Perdus / Bât. Annexe / R+1 / Zone SA N°2 | Mur | Revêtement | tapisserie, gris(e), avec fond beige sur doublage en plaque de plâtre | P.208 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau : Pas Perdus / Bât. Annexe / R+1 / Salle des délibérés | Revêtement du mur | Peinture | décorative, beige, avec fond d'enduit blanc sur doublage en plaque de plâtre | P.211 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau : Pas Perdus / Bât. Annexe / R+1 / Zone des délibérés avec WC | Plafond | Flocage | cotonneux, blanc(he), en dalle haute | P.212 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau : Pas Perdus / Bât. Annexe / R+1 / Petit escalier | Revêtement du mur | Peinture | gouttelette, beige, avec fond d'enduit blanc | P.209 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau : Pas Perdus / Bât. Annexe / R+1 / Petit escalier | Revêtement du mur | Peinture | gouttelette, beige, moucheté noir/gris en raccord sur P.209 | P.210 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau : Terrasse / Bât. Annexe / R+3 / LT Machineries d'ascenseurs | Plancher | Rebouchage | mousse expensée, jaune, type mousse injectée y compris résine de sol grise dans local machinerie côté escalier B | P.152 | Résultat d'analyse | / | NON |
| Niveau : Terrasse / Bât. Annexe | Plafond (collé ou vissé) | Panneau collé ou vissé | gris(e), panneaux en fibres de bois enrobées de ciment gris type FIBRALITH (idem sur murs) selon présence | / | Ne contient pas d'amiante par nature | matériau ayant fait l'objet d'un prélèvement par DDP EXPERT HOME (échantillon P.04) | NON |


Copyright BUREAU VERITAS

# 7. ANNEXES

## 7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

| *Localisation* | *Commentaires* |
|---|---|
| Niveau GT / Sous-sol / R-4 / Galerie(s) Technique(s) | / |
| Niveau T : Ssol / Bât. Annexe / Parkings / R-3 / Aires de stationnement | / |
| Niveau T : Ssol / Bât. Annexe / Parkings / R-3 / Aires de manœuvre | / |
| Niveau T : Ssol / Bât. Annexe / Parkings / R-3 / Rampe(s) d'accès | / |
| Niveau T : Ssol / Bât. Annexe / Parkings / R-3 / Dégagement(s) | / |
| Niveau T : Ssol / Bât. Annexe / Parkings / R-3 / Poste de garde | / |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Aires de stationnement | / |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Aires de manœuvre | / |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Rampe(s) d'accès | / |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Escalier d'accès | / |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Escalier de secours | / |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Escalier d'accès S | / |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Escalier d'accès T | / |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Petit(s) escalier(s) circulaire(s) | / |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Escalier circulaire extérieur | / |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Archives | / |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Dégagements | / |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Placards techniques | / |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Sanitaires | / |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Ventilation T09 | / |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Groupe froid | / |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Zone ex. réserve cuisine | / |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Boite à graisse | / |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Autocom T15 | / |
| Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Local T62 | / |
| Niveau S : R-2 / RDC / Parkings / R-2 / Aires de stationnement | / |
| Niveau S : R-2 / RDC / Parkings / R-2 / Aires de manœuvre | / |
| Niveau S : R-2 / RDC / Parkings / R-2 / Rampe(s) d'accès | / |
| Niveau S : R-2 / RDC / Parkings / R-2 / Escalier d'accès | / |
| Niveau S : R-2 / RDC / Parkings / R-2 / Escalier de secours | / |
| Niveau S : R-2 / RDC / Parkings / R-2 / Local 1 | / |
| Niveau S : R-2 / RDC / Parkings / R-2 / Local 2 | / |
| Niveau S : R-2 / RDC / Parkings / R-2 / Bureaux EIFFAGE | / |
| Niveau S : R-2 / RDC / Parkings / R-2 / Poste de garde | / |
| Niveau S : R-2 / RDC / Parkings / R-2 / Débarras | / |
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Escalier d'accès S | / |


Copyright BUREAU VERITAS

| *Localisation* | *Commentaires* |
|---|---|
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Escalier d'accès T | / |
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Escalier d'accès B | / |
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Escalier d'accès C | / |
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Petit(s) escalier(s) circulaire(s) | / |
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / LT 01 CTA | / |
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Sous-station chauffage urbain | / |
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Local eau de ville | / |
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Ensemble des pièces Ind.S | Parties non visitées : Sanitaires H/F dans pièce S.45 |
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Archives | / |
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Zone ex. cuisine | / |
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Réfectoire | / |
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Dégagements | / |
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Placards techniques | / |
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Sanitaires | / |
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / CTA assise N°2 | / |
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Stockage Assise N°2 | / |
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Escalier d'accès Assise N°2 | / |
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Escalier de secours Assise N°2 | / |
| Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Logement S10 - Rez-de-chaussée | / |
| Niveau R : Pas Perdus / Parking / R-1 / Aires de stationnement | / |
| Niveau R : Pas Perdus / Parking / R-1 / Aires de manœuvre | / |
| Niveau R : Pas Perdus / Parking / R-1 / Rampe(s) d'accès | / |
| Niveau R : Pas Perdus / Parking / R-1 / Escalier d'accès | / |
| Niveau R : Pas Perdus / Parking / R-1 / Escalier de secours | / |
| Niveau R : Pas Perdus / Parking / R-1 / Local 1 | / |
| Niveau R : Pas Perdus / TGI / R-1 / Escalier d'accès S | / |
| Niveau R : Pas Perdus / TGI / R-1 / Escalier d'accès T | / |
| Niveau R : Pas Perdus / TGI / R-1 / Escalier d'accès B | / |
| Niveau R : Pas Perdus / TGI / R-1 / Escalier d'accès C | / |
| Niveau R : Pas Perdus / TGI / R-1 / Zone Ordre des Avocats | / |
| Niveau R : Pas Perdus / TGI / R-1 / Zone Tribunal pour Enfants | / |
| Niveau R : Pas Perdus / TGI / R-1 / Assise N°1 | / |
| Niveau R : Pas Perdus / TGI / R-1 / Zone ICJ | Parties non visitées : Pièce R.63 / Pièce R.66 / Pièce R.67 |
| Niveau R : Pas Perdus / TGI / R-1 / Zone SAP N°3 | / |
| Niveau R : Pas Perdus / TGI / R-1 / Zone des Délibérés SAP N°3 et N°4 | / |
| Niveau R : Pas Perdus / TGI / R-1 / Zone SAP N°4 | / |
| Niveau R : Pas Perdus / TGI / R-1 / Sanitaires publics | / |
| Niveau R : Pas Perdus / TGI / R-1 / Salle de médiation | / |
| Niveau R : Pas Perdus / TGI / R-1 / Dégagements sur Pas Perdu | / |

| *Localisation* | *Commentaires* |
|---|---|
| Niveau R : Pas Perdus / TGI / R-1 / Logement S10 - 1er étage | Terrasses : Extracteurs 50W<br>Parties non visitées : Complexe d'étanchéité sur les terrasses |
| Niveau P : Parvis / TGI / R+0 / Escalier d'accès S | / |
| Niveau P : Parvis / TGI / R+0 / Escalier d'accès T | / |
| Niveau P : Parvis / TGI / R+0 / Escalier d'accès A | / |
| Niveau P : Parvis / TGI / R+0 / Escalier d'accès B | / |
| Niveau P : Parvis / TGI / R+0 / Escalier d'accès C | / |
| Niveau P : Parvis / TGI / R+0 / Escalier d'accès D | / |
| Niveau P : Parvis / TGI / R+0 / Escalier extérieur avec passerelle | / |
| Niveau P : Parvis / TGI / R+0 / Zone Infirmerie | / |
| Niveau P : Parvis / TGI / R+0 / Zone BAJ | / |
| Niveau P : Parvis / TGI / R+0 / Zone Ordre des Avocats | / |
| Niveau P : Parvis / TGI / R+0 / Zone SA N°1 | / |
| Niveau P : Parvis / TGI / R+0 / Zone des Délibérés SA N°1 et N°2 | / |
| Niveau P : Parvis / TGI / R+0 / Zone SA N°2 | Parties non visitées : WC Handicapé |
| Niveau P : Parvis / TGI / R+0 / Zone Tribunal pour Enfants | / |
| Niveau P : Parvis / TGI / R+0 / Assise N°1 | / |
| Niveau P : Parvis / TGI / R+0 / Zone ICJ | Parties non visitées : Pièce P.71 |
| Niveau P : Parvis / TGI / R+0 / Zone SA N°5 | / |
| Niveau P : Parvis / TGI / R+0 / Zone des Délibérés SA N°5 et N°6 | / |
| Niveau P : Parvis / TGI / R+0 / Zone SA N°6 | / |
| Niveau P : Parvis / TGI / R+0 / Zone SOP | / |
| Niveau P : Parvis / TGI / R+0 / Dégagements sur Parvis | / |
| Niveau : 1er étage / TGI / R+1 / Escalier d'accès S | / |
| Niveau : 1er étage / TGI / R+1 / Escalier d'accès T | / |
| Niveau : 1er étage / TGI / R+1 / Escalier d'accès A | / |
| Niveau : 1er étage / TGI / R+1 / Escalier d'accès B | / |
| Niveau : 1er étage / TGI / R+1 / Escalier d'accès C | / |
| Niveau : 1er étage / TGI / R+1 / Escalier d'accès D | / |
| Niveau : 1er étage / TGI / R+1 / Petit(s) escalier(s) circulaire(s) | / |
| Niveau : 1er étage / TGI / R+1 / Ensemble des pièces Ind.100 | / |
| Niveau : 1er étage / TGI / R+1 / Dégagements et zones d'attente | / |
| Niveau : 1er étage / TGI / R+1 / Placards techniques | / |
| Niveau : 1er étage / TGI / R+1 / Sanitaires | / |
| Niveau : 2ème étage / TGI / R+2 / Escalier d'accès S | / |
| Niveau : 2ème étage / TGI / R+2 / Escalier d'accès T | / |
| Niveau : 2ème étage / TGI / R+2 / Escalier d'accès A | / |
| Niveau : 2ème étage / TGI / R+2 / Escalier d'accès B | / |
| Niveau : 2ème étage / TGI / R+2 / Escalier d'accès C | / |
| Niveau : 2ème étage / TGI / R+2 / Escalier d'accès D | / |
| Niveau : 2ème étage / TGI / R+2 / Petit(s) escalier(s) circulaire(s) | / |
| Niveau : 2ème étage / TGI / R+2 / Ensemble des pièces Ind.200 | / |
| Niveau : 2ème étage / TGI / R+2 / Dégagements et zones d'attente | / |
| Niveau : 2ème étage / TGI / R+2 / Placards techniques | / |

| *Localisation* | *Commentaires* |
|---|---|
| Niveau : 2ème étage / TGI / R+2 / Sanitaires | / |
| Niveau : 3ème étage / TGI / R+3 / Escalier d'accès S | / |
| Niveau : 3ème étage / TGI / R+3 / Escalier d'accès T | / |
| Niveau : 3ème étage / TGI / R+3 / Escalier d'accès B | / |
| Niveau : 3ème étage / TGI / R+3 / Escalier d'accès C | / |
| Niveau : 3ème étage / TGI / R+3 / Petit(s) escalier(s) circulaire(s) | / |
| Niveau : 3ème étage / TGI / R+3 / Ensemble des pièces Ind.300 | / |
| Niveau : 3ème étage / TGI / R+3 / Dégagements et zones d'attente | / |
| Niveau : 3ème étage / TGI / R+3 / Placards techniques | / |
| Niveau : 3ème étage / TGI / R+3 / Sanitaires | / |
| Niveau : 3ème étage / TGI / R+3 / LT Machineries d'ascenseurs | / |
| Niveau : 4ème étage / TGI / R+4 / Escalier d'accès S | / |
| Niveau : 4ème étage / TGI / R+4 / Escalier d'accès T | / |
| Niveau : 4ème étage / TGI / R+4 / Escalier d'accès B | / |
| Niveau : 4ème étage / TGI / R+4 / Escalier d'accès C | / |
| Niveau : 4ème étage / TGI / R+4 / Petit(s) escalier(s) circulaire(s) | / |
| Niveau : 4ème étage / TGI / R+4 / Ensemble des pièces Ind.400 | / |
| Niveau : 4ème étage / TGI / R+4 / Dégagements et zones d'attente | / |
| Niveau : 4ème étage / TGI / R+4 / Placards techniques | / |
| Niveau : 4ème étage / TGI / R+4 / Sanitaires | / |
| Niveau : 4ème étage / TGI / R+4 / LT Machineries d'ascenseurs | / |
| Niveau : 5ème étage / TGI / R+5 / Escalier d'accès T | / |
| Niveau : 5ème étage / TGI / R+5 / Escalier d'accès B | / |
| Niveau : 5ème étage / TGI / R+5 / Escalier d'accès C | / |
| Niveau : 5ème étage / TGI / R+5 / Petit(s) escalier(s) circulaire(s) | / |
| Niveau : 5ème étage / TGI / R+5 / Ensemble des pièces Ind.500 | / |
| Niveau : 5ème étage / TGI / R+5 / Dégagements et zone d'attente | / |
| Niveau : 5ème étage / TGI / R+5 / Placards techniques | / |
| Niveau : 5ème étage / TGI / R+5 / Sanitaires | / |
| Niveau : 5ème étage / TGI / R+5 / Zone locaux techniques | Parties non visitées : Local machinerie d'ascenseur Ouest |
| Niveau : 6ème étage / TGI / R+6 / Escalier d'accès T | / |
| Niveau : 6ème étage / TGI / R+6 / Escalier d'accès C | / |
| Niveau : 6ème étage / TGI / R+6 / Petit(s) escalier(s) circulaire(s) | / |
| Niveau : 6ème étage / TGI / R+6 / Ensemble des pièces Ind.600 | / |
| Niveau : 6ème étage / TGI / R+6 / Dégagement(s) | / |
| Niveau : 6ème étage / TGI / R+6 / Placards techniques | / |
| Niveau : 7ème étage / TGI / R+7 / Escalier d'accès C | / |
| Niveau : 7ème étage / TGI / R+7 / Zones locaux techniques | Parties non visitées : Local machinerie d'ascenseur Est |
| Niveau : 7ème étage / TGI / R+7 / Dégagement | / |
| Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe / R-1 / Escalier d'accès A | / |
| Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe / R-1 / Escalier d'accès B | / |
| Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe / R-1 / LT CTA S04 | / |
| Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe / R-1 / Archives Ind.S | / |
| Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe / R-1 / Pièce 1 (scellés) | / |

| *Localisation* | *Commentaires* |
|---|---|
| Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe / R-1 / Dégagements | / |
| Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe / R-1 / Sanitaires | / |
| Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe / R-1 / Placard technique électrique | / |
| Niveau R+0 / RDC / Bât. Annexe / Rez-de-chaussée / Escalier d'accès A | / |
| Niveau R+0 / RDC / Bât. Annexe / Rez-de-chaussée / Escalier d'accès B | / |
| Niveau R+0 / RDC / Bât. Annexe / Rez-de-chaussée / Dégagement Escalier A | / |
| Niveau R+0 / RDC / Bât. Annexe / Rez-de-chaussée / Local technique | / |
| Niveau : Pas Perdus / Bât. Annexe / R+1 / Escalier d'accès A | / |
| Niveau : Pas Perdus / Bât. Annexe / R+1 / Escalier d'accès B | / |
| Niveau : Pas Perdus / Bât. Annexe / R+1 / Zone SA N°1 | / |
| Niveau : Pas Perdus / Bât. Annexe / R+1 / Zone SA N°2 | / |
| Niveau : Pas Perdus / Bât. Annexe / R+1 / Salle des délibérés | / |
| Niveau : Pas Perdus / Bât. Annexe / R+1 / Zone des délibérés avec WC | / |
| Niveau : Pas Perdus / Bât. Annexe / R+1 / Petit escalier | / |
| Niveau : Terrasse / Bât. Annexe / R+3 / LT Machineries d'ascenseurs | / |
| Niveau : Parvis / Bât annexe / R+2 / Escalier d'accès A | / |
| Niveau : Parvis / Bât annexe / R+2 / Escalier d'accès B | / |


Copyright BUREAU VERITAS

## 7.2. Croquis de repérage



"HORS PROGRAMME DE TRAVAUX"
Matériau identifié à proximité des installations électriques

Société INNAX /Rapport N° 40_PJ
BOBIGNY_RPINNAX-DTA en date du 07/06/2017
Enveloppes bitumineuses sur conduits de fluides
Présence d'amiante sur document

Type Echantillon P.09
Fourreaux en fibres-ciment
dans voile béton
Présence d'amiante
Cheminement inconnu

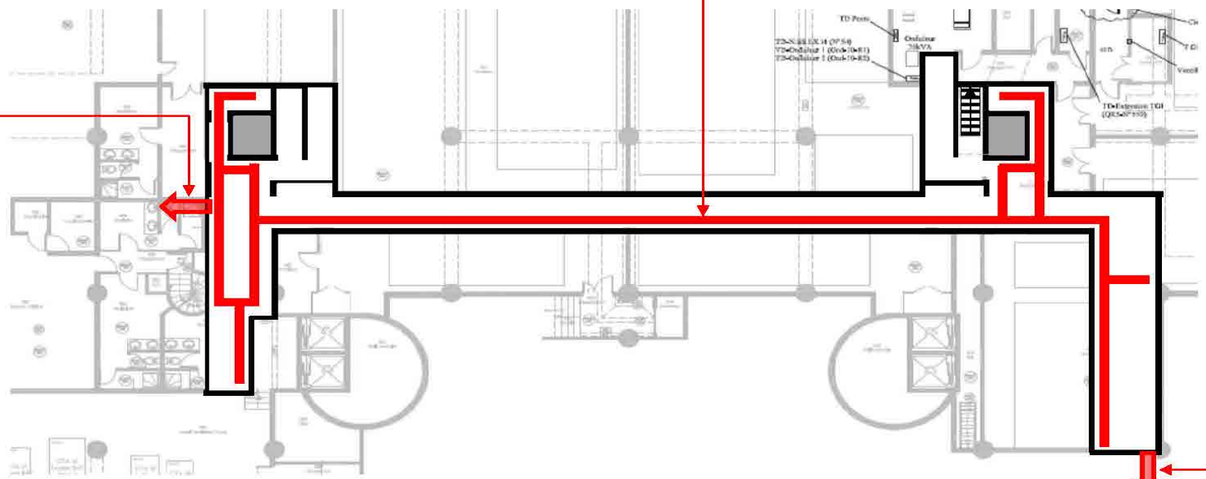

Type Echantillon P.09
Fourreaux en fibres-ciment
dans voile béton
Présence d'amiante
Cheminement inconnu

UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE
Affaire N° 7129567-1
Tribunal de Grande Instance
173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny
Planche de repérage 01 - Le 17 juillet 2018
Niveau GT / R-4 / Sous-sol / Galerie(s) Technique(s)
Matériaux ou produits contenant de l'amiante

| **Planche de repérage** (*la planche de repérage est indissociable du rapport)* | | |
|---|---|---|
| Site : Tribunal de Grande Instance de Bobigny | Adresse : 169-173 avenue Paul Vaillant Couturier 93000 BOBIGNY | Localisation : Niveau GT / Sous-sol |
| Réalisé par : Didier DENAVEAUT | N° de planche : 1 / 63 | |


Copyright BUREAU VERITAS



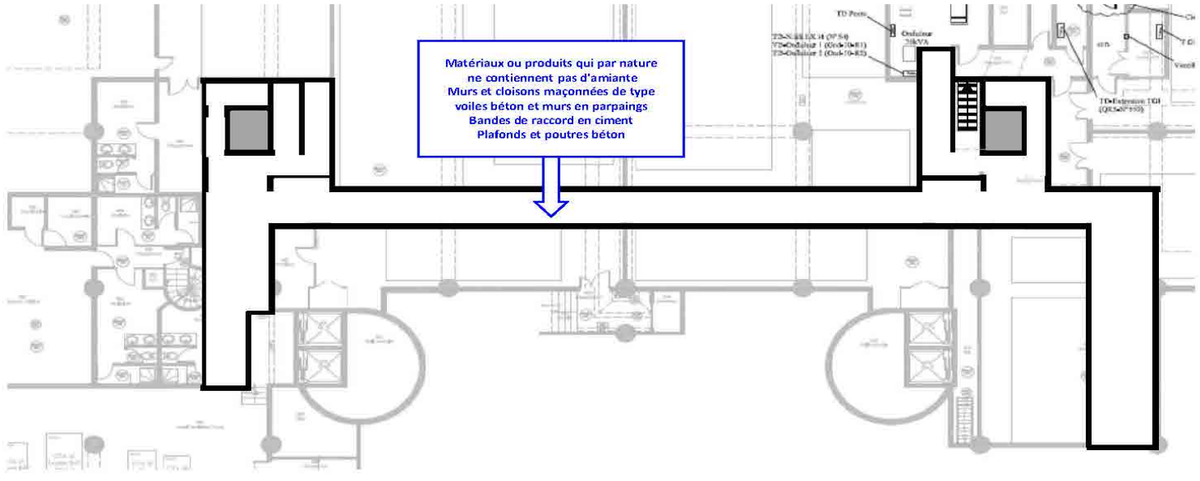


UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE
Affaire N° 7129567-1
Tribunal de Grande Instance
173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny
Planche de repérage 02 - Le 17 juillet 2018
Niveau GT / R-4 / Sous-sol / Galerie(s) Technique(s)
Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

| **Planche de repérage** (*la planche de repérage est indissociable du rapport)* | | |
|---|---|---|
| Site : Tribunal de Grande Instance de Bobigny | Adresse : 169-173 avenue Paul Vaillant Couturier 93000 BOBIGNY | Localisation : Niveau GT / Sous-sol |
| Réalisé par : Didier DENAVEAUT | N° de planche : 2 / 63 | |



| | |
|---|---|
| | Isolants des câbles électriques susceptibles de contenir de l'amiante En tension au jour du contrôle |
| | Joints entre brides et presses-étoupes des anciennes vannes susceptibles de contenir de l'amiante |
| | Zones pas accessibles (encombrées) |

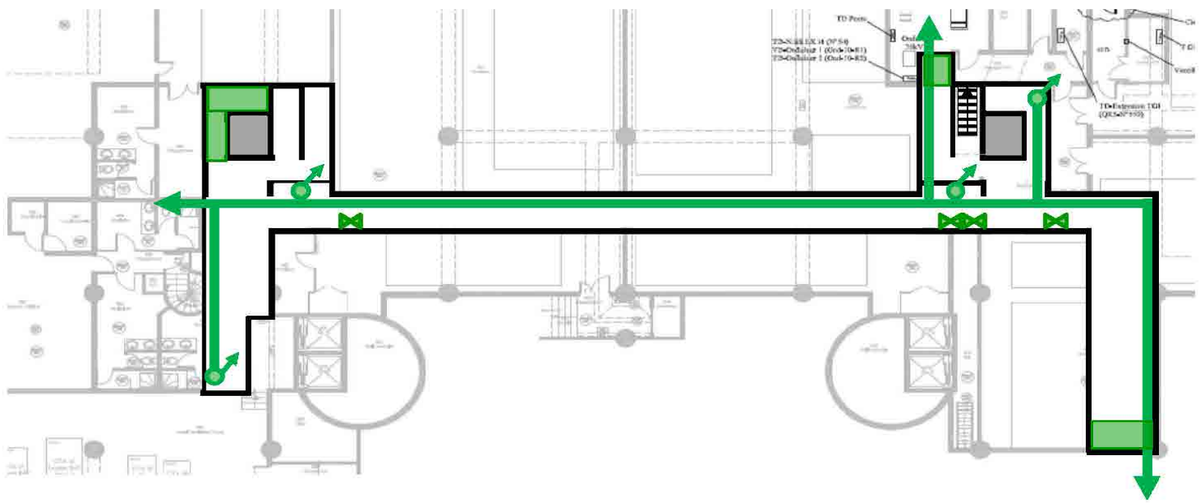

UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE
Affaire N° 7129567-1
Tribunal de Grande Instance
173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny
Planche de repérage 03 - Le 17 juillet 2018
Niveau GT / R-4 / Sous-sol / Galerie(s) Technique(s)
Locaux ou zones non visibles et accessibles - Matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante

| **Planche de repérage** (*la planche de repérage est indissociable du rapport*) | | |
|---|---|---|
| Site : Tribunal de Grande Instance de Bobigny | Adresse : 169-173 avenue Paul Vaillant Couturier 93000 BOBIGNY | Localisation : Niveau GT / Sous-sol |
| Réalisé par : Didier DENAVEAUT | N° de planche : 3 / 63 | |


Copyright BUREAU VERITAS

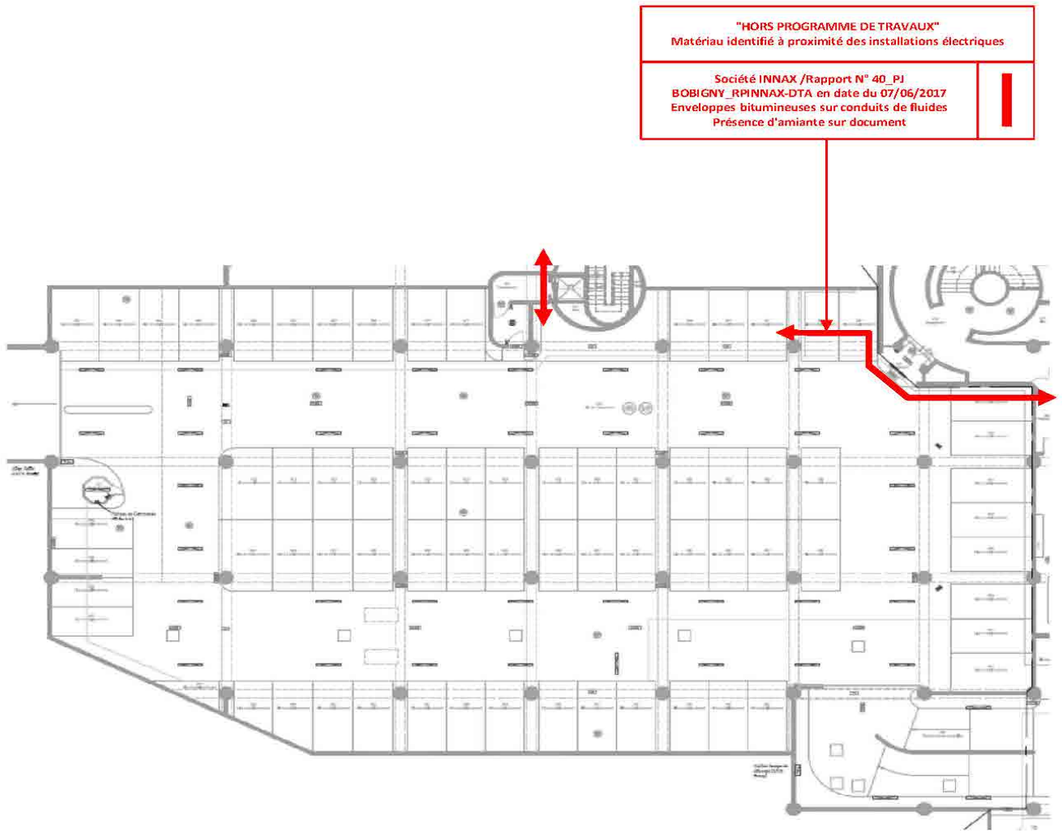


UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE
Affaire N° 7129567-1
Tribunal de Grande Instance
173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny
Planche de repérage 04 - Le 17 juillet 2018
Niveau T / R-3 / Sous-sol / Bâtiment Annexe / Parkings
Matériaux ou produits contenant de l'amiante

| **Planche de repérage** (*la planche de repérage est indissociable du rapport)* | | |
|---|---|---|
| Site : Tribunal de Grande Instance de Bobigny | Adresse : 169-173 avenue Paul Vaillant Couturier 93000 BOBIGNY | Localisation : Niveau T : Ssol / Bât. Annexe / Parkings |
| Réalisé par : Didier DENAVEAUT | N° de planche : 4 / 63 | |


Copyright BUREAU VERITAS

| | |
|---|---|
| | Flocage cotonneux en dalle(s) haute(s)<br>Absence d'amiante sur résultat(s) d'analyse(s) |
| ⊗ | Parois des clapets coupe-feu - SGEI (plâtre avec protection aluminium)<br>Absence d'amiante sur résultat(s) d'analyse(s) |

Matériaux ou produits qui par nature ne contiennent pas d'amiante
Murs et cloisons maçonnées de type voiles béton et murs en parpaings
Plafonds et poutres béton
Fourreaux PVC dans poutres béton
Conduits de fluides type fonte

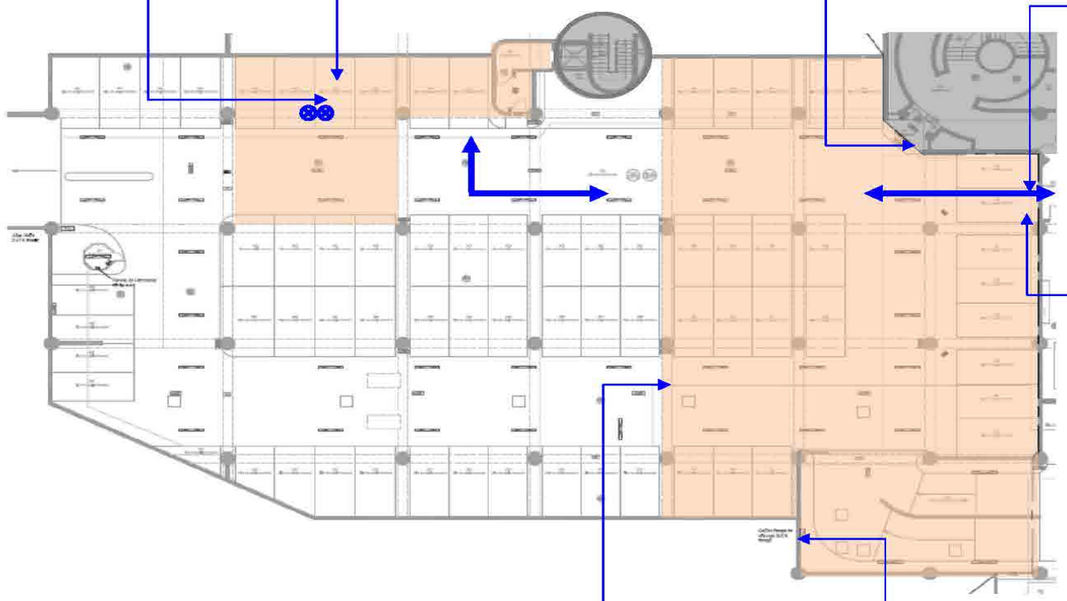


UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE
Affaire N° 7129567-1
Tribunal de Grande Instance
173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny
Planche de repérage 05 - Le 17 juillet 2018
Niveau T / R-3 / Sous-sol / Bâtiment Annexe / Parkings
Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

| **Planche de repérage** (*la planche de repérage est indissociable du rapport)* | | |
|---|---|---|
| Site : Tribunal de Grande Instance de Bobigny | Adresse : 169-173 avenue Paul Vaillant Couturier 93000 BOBIGNY | Localisation : Niveau T : Ssol / Bât. Annexe / Parkings |
| Réalisé par : Didier DENAVEAUT | N° de planche : 5 / 63 | |

Isolants des câbles électriques
susceptibles de contenir de l'amiante
En tension au jour du contrôle

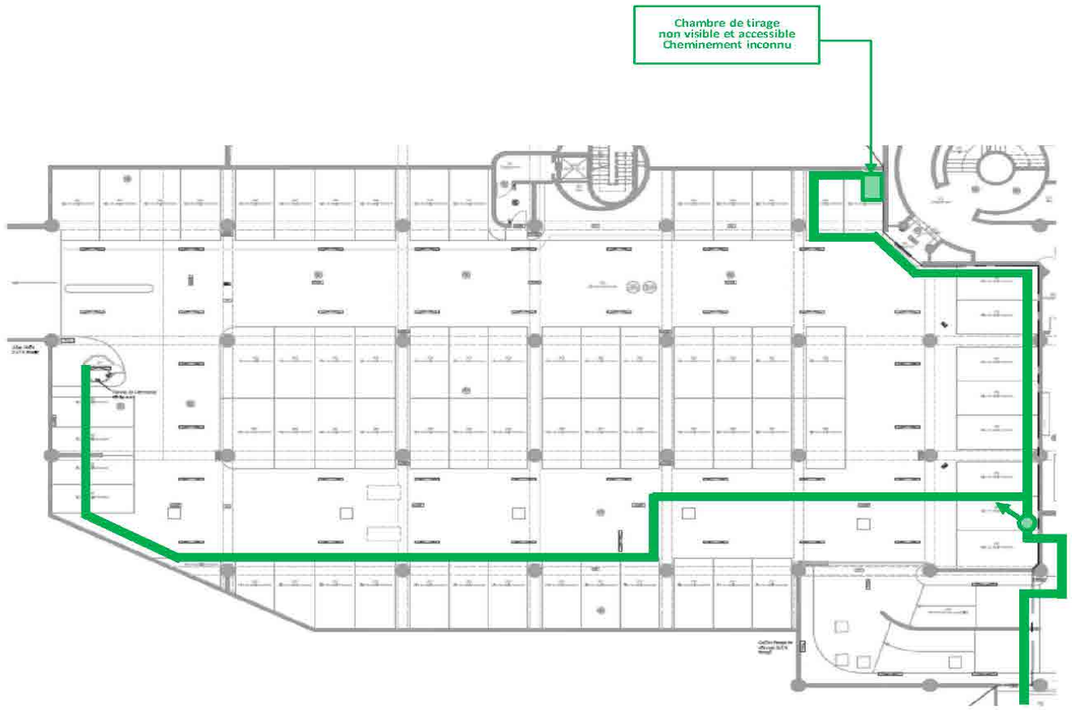


UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE
Affaire N° 7129567-1
Tribunal de Grande Instance
173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny
Planche de repérage 06 - Le 17 juillet 2018
Niveau T / R-3 / Sous-sol / Bâtiment Annexe / Parkings
Locaux ou zones non visibles et accessibles - Matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante

| **Planche de repérage** (*la planche de repérage est indissociable du rapport)* | | |
|---|---|---|
| Site : Tribunal de Grande Instance de Bobigny | Adresse : 169-173 avenue Paul Vaillant Couturier 93000 BOBIGNY | Localisation : Niveau T : Ssol / Bât. Annexe / Parkings |
| Réalisé par : Didier DENAVEAUT | N° de planche : 6 / 63 | |


Copyright BUREAU VERITAS



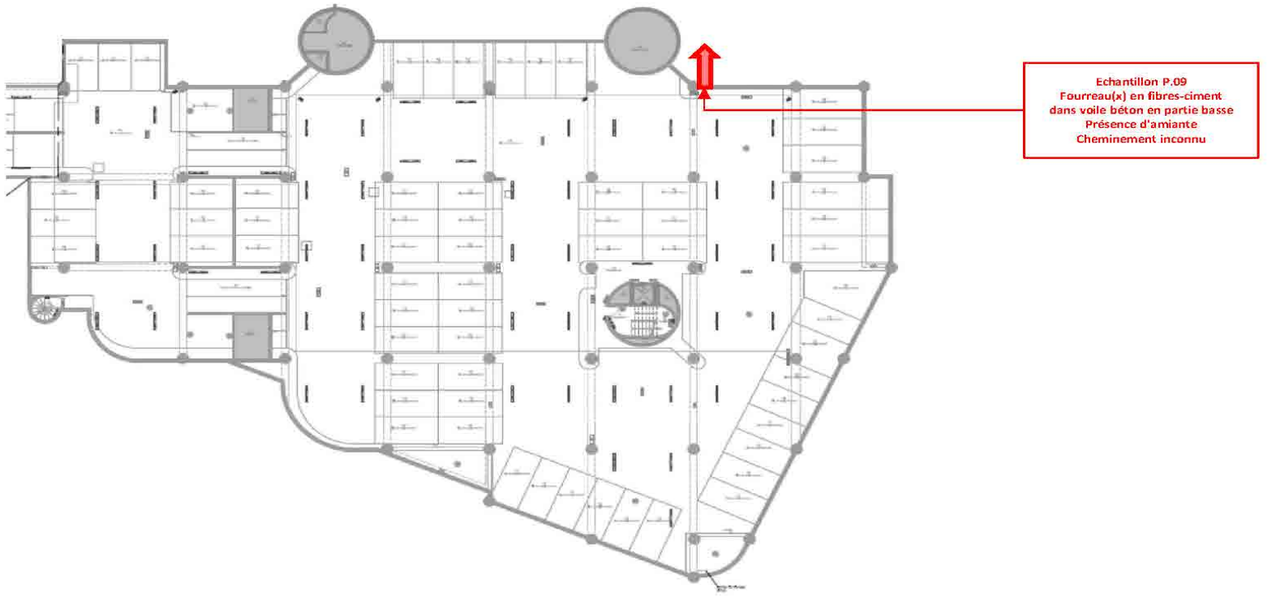


UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE
Affaire N° 7129567-1
Tribunal de Grande Instance
173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny
Planche de repérage 07 - Le 17 juillet 2018
Niveau T / R-3 / Sous-sol / TGI / Parkings
Matériaux ou produits contenant de l'amiante

| **Planche de repérage** (*la planche de repérage est indissociable du rapport)* | | |
|---|---|---|
| Site : Tribunal de Grande Instance de Bobigny | Adresse : 169-173 avenue Paul Vaillant Couturier 93000 BOBIGNY | Localisation : Niveau T : Sous-sol / TGI |
| Réalisé par : Didier DENAVEAUT | N° de planche : 7 / 63 | |



Flocage cotonneux en dalle(s) haute(s)
Absence d'amiante sur résultat(s) d'analyse(s)

Matériaux ou produits qui par nature ne contiennent pas d'amiante
Murs et cloisons maçonnées de type voiles béton et murs en parpaings
Plafonds et poutres béton
Fourreaux PVC dans poutres béton
Conduits de fluides type fonte
Joints secs de dilatation (polystyrène)

Echantillon P.08
Flocage en dalle haute
Absence d'amiante

Echantillon P.07
Enduit de ragréage au droit des fourreaux passage de câbles dans poutre
Absence d'amiante

Echantillon P.12
Flocage en dalle haute
Absence d'amiante

Echantillon P.10
Enduit de ragréage peint vert sur voile béton
Absence d'amiante

Echantillon P.06
Enduit de ragréage peint vert sur voile béton
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.89
Flocage en dalle haute
Absence d'amiante

Echantillon P.11
Enduit de ragréage au droit des fourreaux passage de câbles dans poutre
Absence d'amiante

Echantillon P.13
Enduit de ragréage peint vert sur voile béton
Absence d'amiante

UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE
Affaire N° 7129567-1
Tribunal de Grande Instance
173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny
Planche de repérage 08 - Le 17 juillet 2018
Niveau T / R-3 / Sous-sol / TGI / Parkings
Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

| **Planche de repérage** (*la planche de repérage est indissociable du rapport)* | | |
|---|---|---|
| Site : Tribunal de Grande Instance de Bobigny | Adresse : 169-173 avenue Paul Vaillant Couturier 93000 BOBIGNY | Localisation : Niveau T : Sous-sol / TGI |
| Réalisé par : Didier DENAVEAUT | N° de planche : 8 / 63 | |


Copyright BUREAU VERITAS



Isolants des câbles électriques
susceptibles de contenir de l'amiante
En tension au jour du contrôle

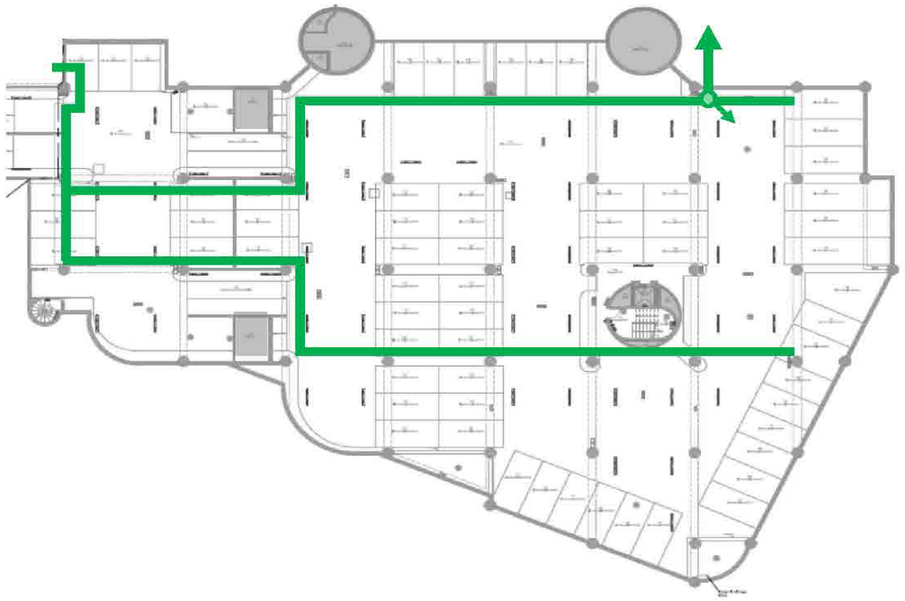

UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE
Affaire N° 7129567-1
Tribunal de Grande Instance
173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny
Planche de repérage 09 - Le 17 juillet 2018
Niveau T / R-3 / Sous-sol / TGI / Parkings
Locaux ou zones non visibles et accessibles - Matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante

| **Planche de repérage** (*la planche de repérage est indissociable du rapport)* | | |
|---|---|---|
| Site : Tribunal de Grande Instance de Bobigny | Adresse : 169-173 avenue Paul Vaillant Couturier 93000 BOBIGNY | Localisation : Niveau T : Sous-sol / TGI |
| Réalisé par : Didier DENAVEAUT | N° de planche : 9 / 63 | |


Copyright BUREAU VERITAS



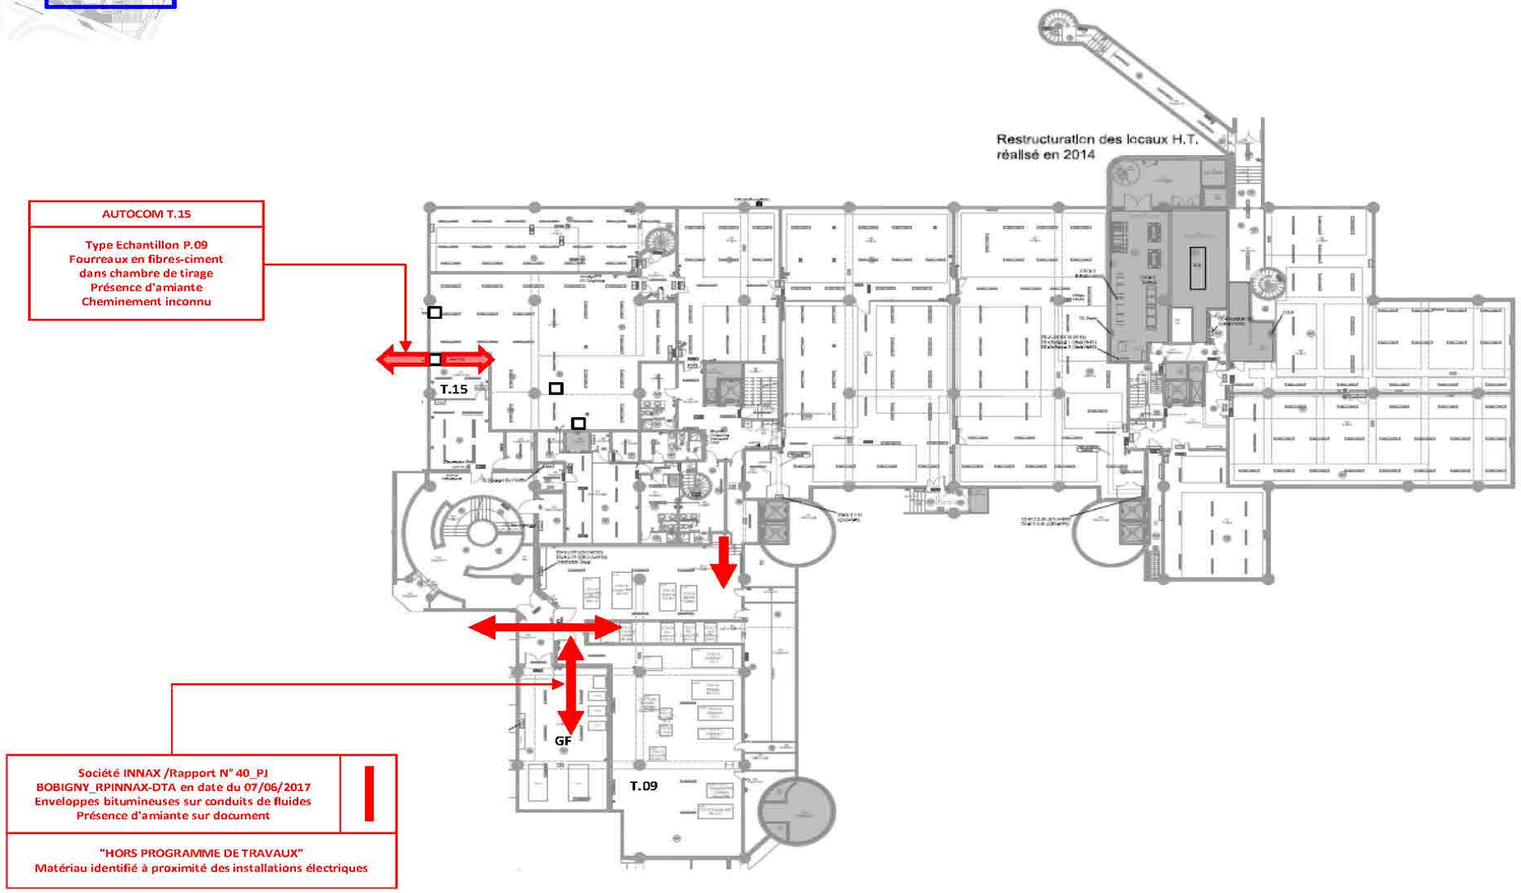


UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE
Affaire N° 7129567-1
Tribunal de Grande Instance
173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny
Planche de repérage 10 - Le 17 juillet 2018
Niveau T / R-3 / Sous-sol / TGI
Matériaux ou produits contenant de l'amiante

| **Planche de repérage** (*la planche de repérage est indissociable du rapport)* | | |
|---|---|---|
| Site : Tribunal de Grande Instance de Bobigny | Adresse : 169-173 avenue Paul Vaillant Couturier 93000 BOBIGNY | Localisation : Niveau T : Sous-sol / TGI |
| Réalisé par : Didier DENAVEAUT | N° de planche : 10 / 63 | |



| | |
|---|---|
| | Flocage cotonneux en dalle(s) haute(s)<br>Absence d'amiante sur résultat(s) d'analyse(s) |
| | Panneaux isolants sur murs et plafonds type "Fibralith" avec couche grise<br>Absence d'amiante sur résultat(s) d'analyse(s) |
| | Panneaux isolants sur murs et plafonds type "Fibralith"<br>Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante |
| | Portes coupe-feu DEF (joints, âmes de portes coupe-feu)<br>Absence d'amiante sur résultat(s) d'analyse(s) |
| | Parois des clapets coupe-feu - SGEI (plâtre avec protection aluminium)<br>Absence d'amiante sur résultat(s) d'analyse(s) |
| | Faiences 5x5 avec colles et joints<br>Absence d'amiante sur résultat(s) d'analyse(s) |
| | Faux-plafonds 1200x600 fibreux blanc<br>Absence d'amiante sur résultat(s) d'analyse(s) |
| | Faiences 15x15 avec colles et joints<br>Absence d'amiante sur résultat(s) d'analyse(s) |

ESCALIER D'ACCES "S"

Echantillon P.50
Revêtement de mur
Peinture gouttelettes gris

Echantillon P.51
Revêtement de plafond
Peinture gouttelettes gris
Absence d'amiante

Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
Faux-plafond 600x600 type "ECOPHON"
Gaine plâtre dans plénum

Echantillon P.49
Placard technique électrique
Rebouchage plâtreux autour chemin de câbles - Plancher
Absence d'amiante

Faux-plafond 600x600 ARMSTRONG PRIMA
Absence d'amiante sur marquage

Echantillon P.52
Colle de faience 5x5
Absence d'amiante

Echantillon P.53
Joint de faience 5x5
Absence d'amiante

Echantillon P.54
Bande toilée grise sur gaine VMC
Absence d'amiante

Echantillon P.64
Faience 15x15 blanc avec colle grise
Absence d'amiante

Echantillon P.63 (T.17)
Faux-plafond 1200x600 dur fibreux blanc
Absence d'amiante

Echantillon P.56
Colle du panneau composite"
Absence d'amiante

Echantillon P.57
Panneau composite isolant type "Fibrastyrène"
Absence d'amiante

Echantillon P.58
Enduit de ragréage entre le voile et le panneau
Absence d'amiante

Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
Plancher technique sur vérins

Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
Cloison en plaques de plâtre revetue PVC, isolant laine

Faux-plafond 1200x600
Absence d'amiante sur marquage

Echantillon P.55
Rebouchage plâtre autour chemin de câbles
Absence d'amiante

Echantillon P.60
Colle de faience 5x5
Absence d'amiante

Echantillon P.61
Joint de faience 5x5
Absence d'amiante

Echantillon P.34
Rebouchage plâtreux dans le flocage
Absence d'amiante

Echantillon P.37
Mousse injectée au droit du chemin de câbles
Absence d'amiante

Echantillon P.38
Panneau composite isolant type "Fibrastyrène" sous flocage
Absence d'amiante

Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
Faux-plafond métallique

Echantillon P.66
Enduit projeté blanc type "FIBRITH"
Absence d'amiante

Echantillon P.65
Revêtement de mur
Peinture gouttelettes gris
Absence d'amiante

ESCALIER D'ACCES "T"

Echantillon P.45
Revêtement de mur
Peinture gouttelettes gris
Absence d'amiante

Echantillon P.46
Revêtement de plafond
Peinture gouttelettes gris

Restructuration des locaux H.T. réalisé en 2014

T.15 T.21 T.20 T.11 T.10 T.12 T.40 T.50 T.63 T.64 T.65 GF T.09

Echantillon P.43
Peinture décorative avec enduit blanc
Absence d'amiante

Echantillon P.48
Placard technique électrique
Rebouchage plâtreux autour chemin de câbles - Plancher
Absence d'amiante

Echantillon P.44
Rebouchage plâtreux dans mur (Dgt)
Absence d'amiante

Echantillon P.41
Panneau composite isolant type "Fibrastyrène"
Absence d'amiante

Echantillon P.42
Rebouchage plâtreux dans le flocage
Absence d'amiante

Echantillon P.39
Peinture bitumineuse sur poteau béton (idem voile)
Absence d'amiante

Echantillon P.40
Enduit de ragréage sur voile béton
Absence d'amiante

Echantillon P.47
Panneau composite isolant type "Fibrastyrène"
Absence d'amiante

Echantillon P.33
Flocage en dalle haute
Absence d'amiante

Echantillon P.59
Revêtement de mur
Peinture gouttelettes gris
Absence d'amiante

Echantillon P.62
Rebouchage plâtre au droit du câble hublot
Absence d'amiante

Echantillon P.30
Joint coupe-feu type languette de recouvrement de la porte coupe-feu à 2 vantaux
Absence d'amiante

Echantillon P.31
Ame isolante de la porte coupe-feu à 2 vantaux
Absence d'amiante

Echantillon P.32
Joint coupe-feu type bande sur huisserie métallique de la porte coupe-feu à 2 vantaux
Absence d'amiante

Echantillon P.35
Paroi de clapet coupe-feu de marque SGEI
Absence d'amiante

Echantillon P.36
Rebouchage autour du clapet coupe-feu
Absence d'amiante

Matériaux ou produits qui par nature ne contiennent pas d'amiante selon présence
Murs et cloisons maçonnées de type voiles béton et murs en parpaings/briques avec ou sans enduits ciment de dressage et carreaux de plâtre
Plafonds et poutres béton
Conduits de fluides type fonte, cuivre, acier, PVC
Calorifugeages type tube isolant préfendu en mousse polyéthylène noir ou gris sur conduits de fluides
Calorifuges sur conduits de fluides (matelas laine/alu) avec étanchéités en scotch alu et CLIMAVER
Faux-plafonds à lames bois et plaques de plâtre dans sanitaires
Panneaux d'impostes sur portes d'accès et coupe-feu

UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE
Affaire N° 7129567-1
Tribunal de Grande Instance
173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny
Planche de repérage 11 - Le 17 juillet 2018
Niveau T / R-3 / Sous-sol / TGI
Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

| **Planche de repérage** (*la planche de repérage est indissociable du rapport*) | | |
|---|---|---|
| Site : Tribunal de Grande Instance de Bobigny | Adresse : 169-173 avenue Paul Vaillant Couturier 93000 BOBIGNY | Localisation : Niveau T : Sous-sol / TGI |
| Réalisé par : Didier DENAVEAUT | N° de planche : 11 / 63 | |


Copyright BUREAU VERITAS



| | |
|---|---|
| | Isolants des câbles électriques susceptibles de contenir de l'amiante En tension au jour du contrôle |
| | Vides des plénums difficiles d'accès Faux-plafonds bois cloués |
| | Vide sous plancher technique difficile d'accès - Dalles bridées |
| | Chambres de tirage non visibles et accessibles - Trappes béton |

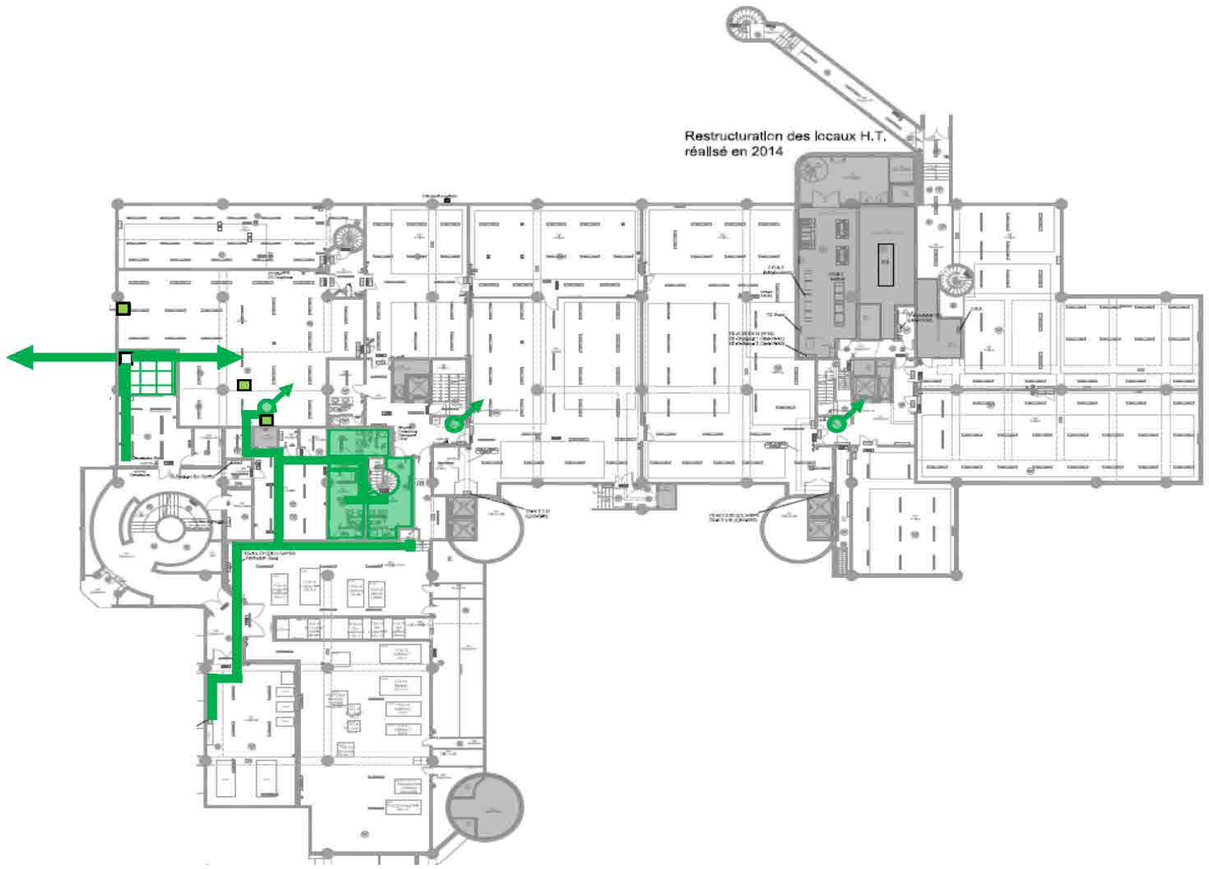


UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE
Affaire N° 7129567-1
Tribunal de Grande Instance
173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny
Planche de repérage 12 - Le 17 juillet 2018
Niveau T / R-3 / Sous-sol / TGI
Locaux ou zones non visibles et accessibles - Matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante

| **Planche de repérage** (*la planche de repérage est indissociable du rapport)* | | |
|---|---|---|
| Site : Tribunal de Grande Instance de Bobigny | Adresse : 169-173 avenue Paul Vaillant Couturier 93000 BOBIGNY | Localisation : Niveau T : Sous-sol / TGI |
| Réalisé par : Didier DENAVEAUT | N° de planche : 12 / 63 | |


Copyright BUREAU VERITAS



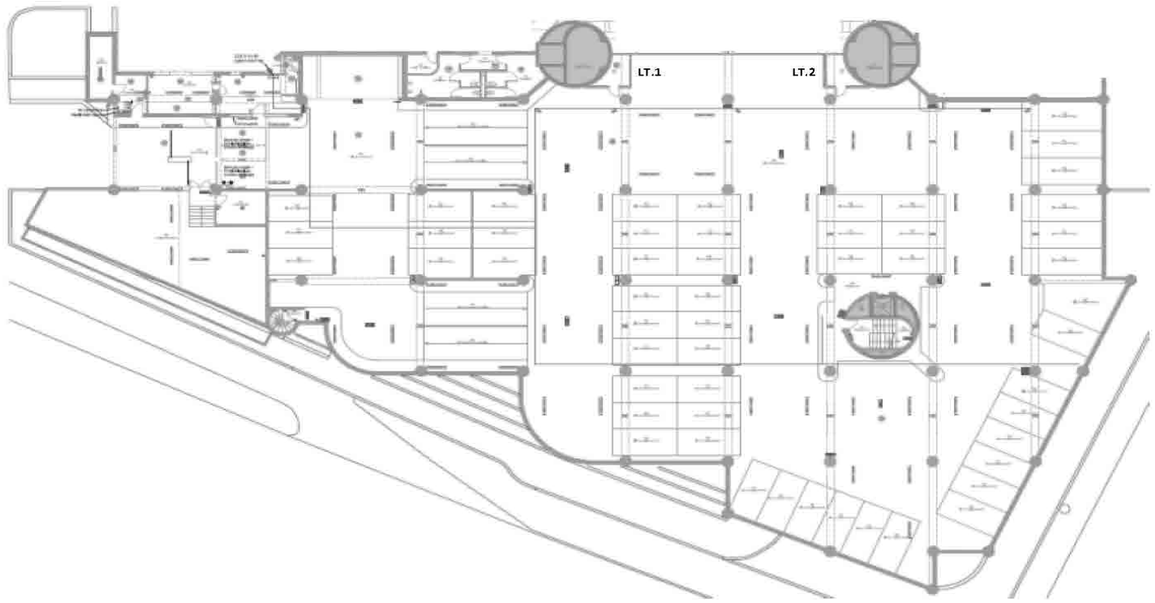


UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE
Affaire N° 7129567-1
Tribunal de Grande Instance
173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny
Planche de repérage 13 - Le 17 juillet 2018
Niveau S / R-2 / Rez-de-chaussée / Parkings
Matériaux ou produits contenant de l'amiante

| **Planche de repérage** (*la planche de repérage est indissociable du rapport*) | | |
|---|---|---|
| Site : Tribunal de Grande Instance de Bobigny | Adresse : 169-173 avenue Paul Vaillant Couturier 93000 BOBIGNY | Localisation : Niveau S : R-2 / RDC / Parkings |
| Réalisé par : Didier DENAVEAUT | N° de planche : 13 / 63 | |


Copyright BUREAU VERITAS



Flocage cotonneux en dalle(s) haute(s)
Absence d'amiante sur résultat(s) d'analyse(s)

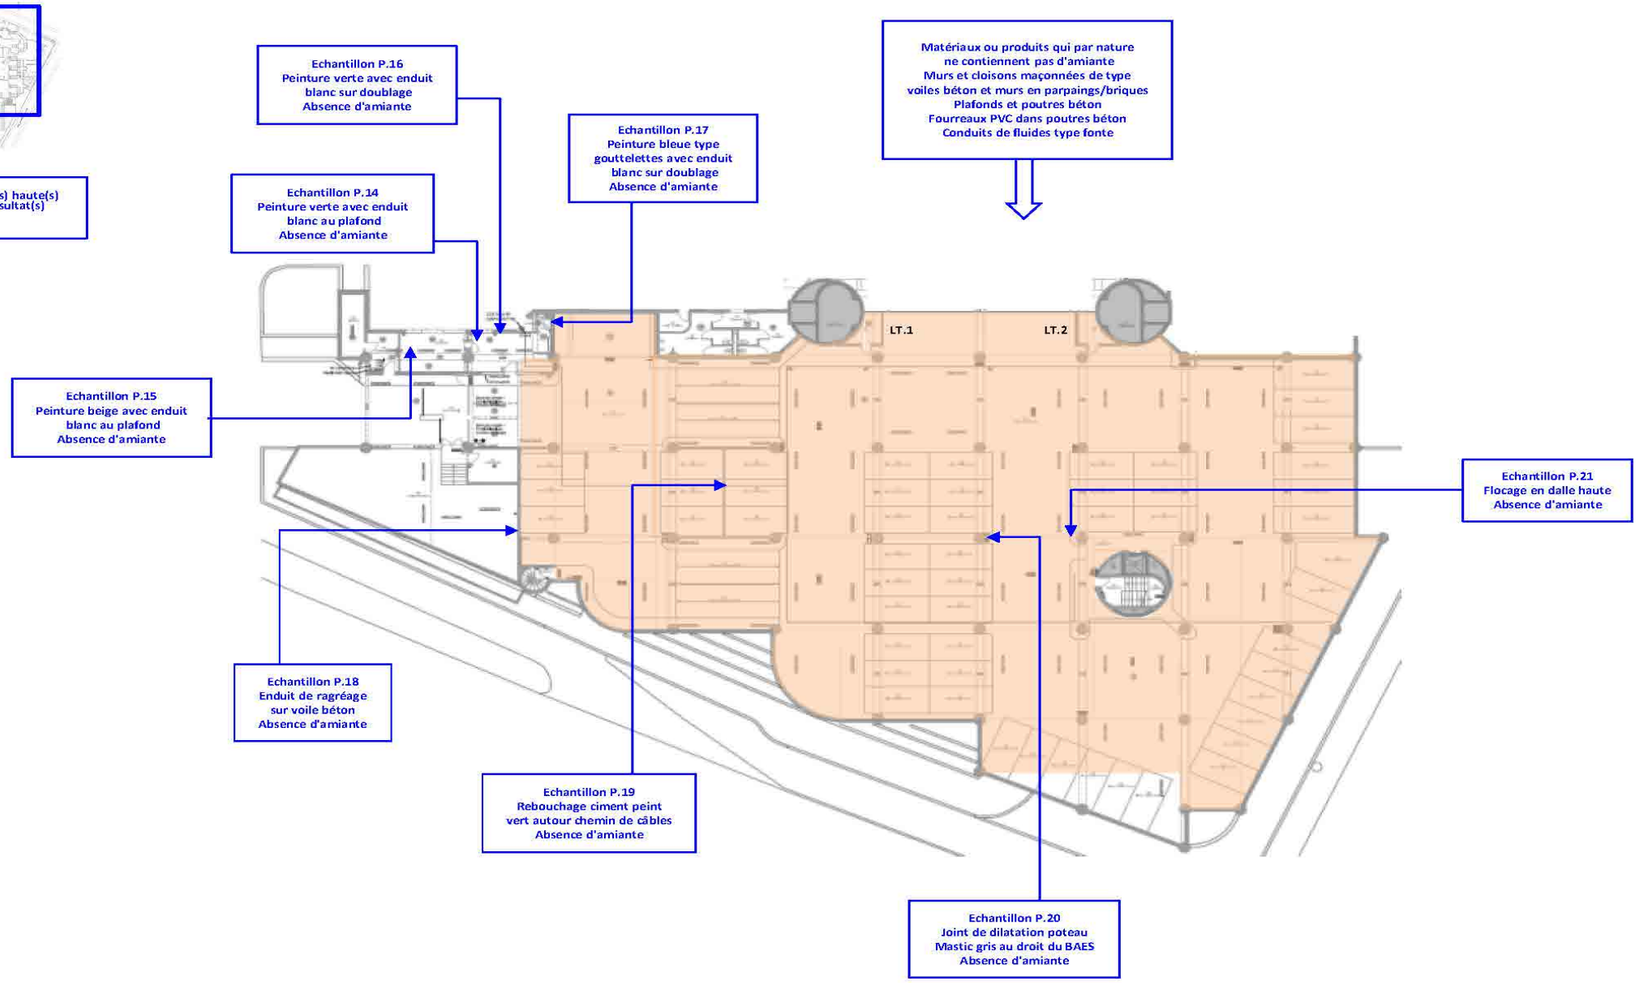


UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE
Affaire N° 7129567-1
Tribunal de Grande Instance
173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny
Planche de repérage 14 - Le 17 juillet 2018
Niveau S / R-2 / Rez-de-chaussée / Parkings
Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

| **Planche de repérage** (*la planche de repérage est indissociable du rapport)* | | |
|---|---|---|
| Site : Tribunal de Grande Instance de Bobigny | Adresse : 169-173 avenue Paul Vaillant Couturier 93000 BOBIGNY | Localisation : Niveau S : R-2 / RDC / Parkings |
| Réalisé par : Didier DENAVEAUT | N° de planche : 14 / 63 | |


Copyright BUREAU VERITAS



Isolants des câbles électriques
susceptibles de contenir de l'amiante
En tension au jour du contrôle

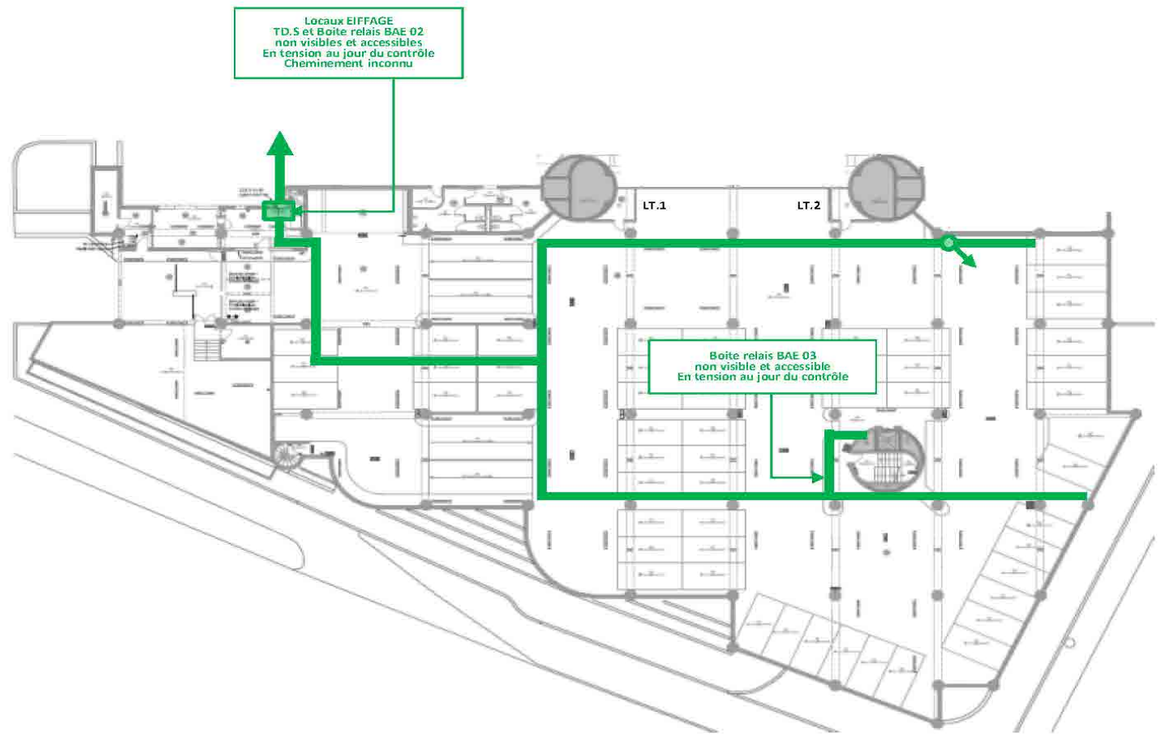


UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE
Affaire N° 7129567-1
Tribunal de Grande Instance
173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny
Planche de repérage 15 - Le 17 juillet 2018
Niveau S / R-2 / Rez-de-chaussée / Parkings
Locaux ou zones non visibles et accessibles - Matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante

| **Planche de repérage** (*la planche de repérage est indissociable du rapport)* | | |
|---|---|---|
| Site : Tribunal de Grande Instance de Bobigny | Adresse : 169-173 avenue Paul Vaillant Couturier 93000 BOBIGNY | Localisation : Niveau S : R-2 / RDC / Parkings |
| Réalisé par : Didier DENAVEAUT | N° de planche : 15 / 63 | |


Copyright BUREAU VERITAS



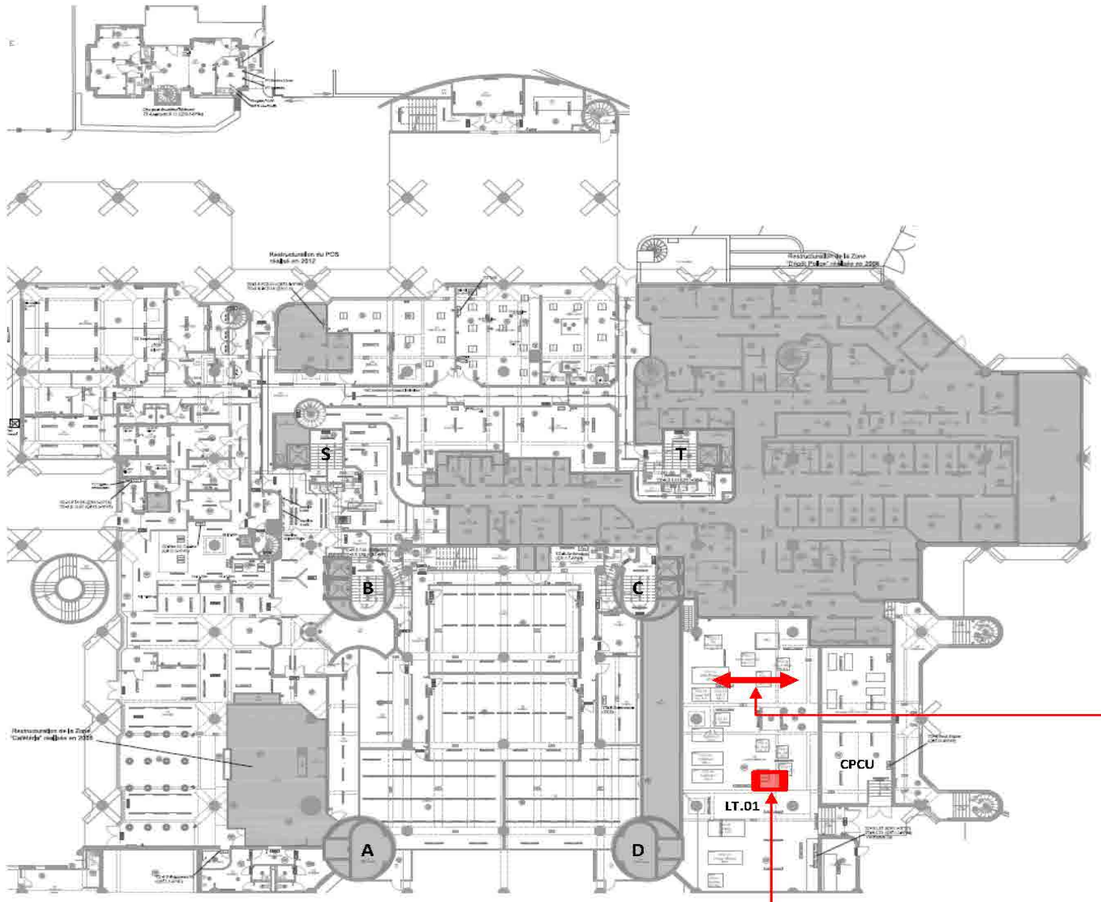


Société INNAX /Rapport N° 40_PI
BOBIGNY_RPINNAX-DTA en date du 07/06/2017
Enveloppes bitumineuses sur conduits de fluides
Présence d'amiante sur document

"HORS PROGRAMME DE TRAVAUX"
Matériau identifié à proximité des installations électriques

Société AT-DIAG SAS /Rapport N° 2CM16-23 en date du 26/08/2016
Mastic marron sur conduit de fluide (gaine de ventilation)
Présence d'amiante sur document

"HORS PROGRAMME DE TRAVAUX"
Matériau identifié à proximité des installations électriques

UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE
Affaire N° 7129567-1
Tribunal de Grande Instance
173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny
Planche de repérage 16 - Le 17 juillet 2018
Niveau S / R-2 / Rez-de-chaussée / TGI
Matériaux ou produits contenant de l'amiante

| **Planche de repérage** (*la planche de repérage est indissociable du rapport)* | | |
|---|---|---|
| Site : Tribunal de Grande Instance de Bobigny | Adresse : 169-173 avenue Paul Vaillant Couturier 93000 BOBIGNY | Localisation : Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI |
| Réalisé par : Didier DENAVEAUT | N° de planche : 16 / 63 | |

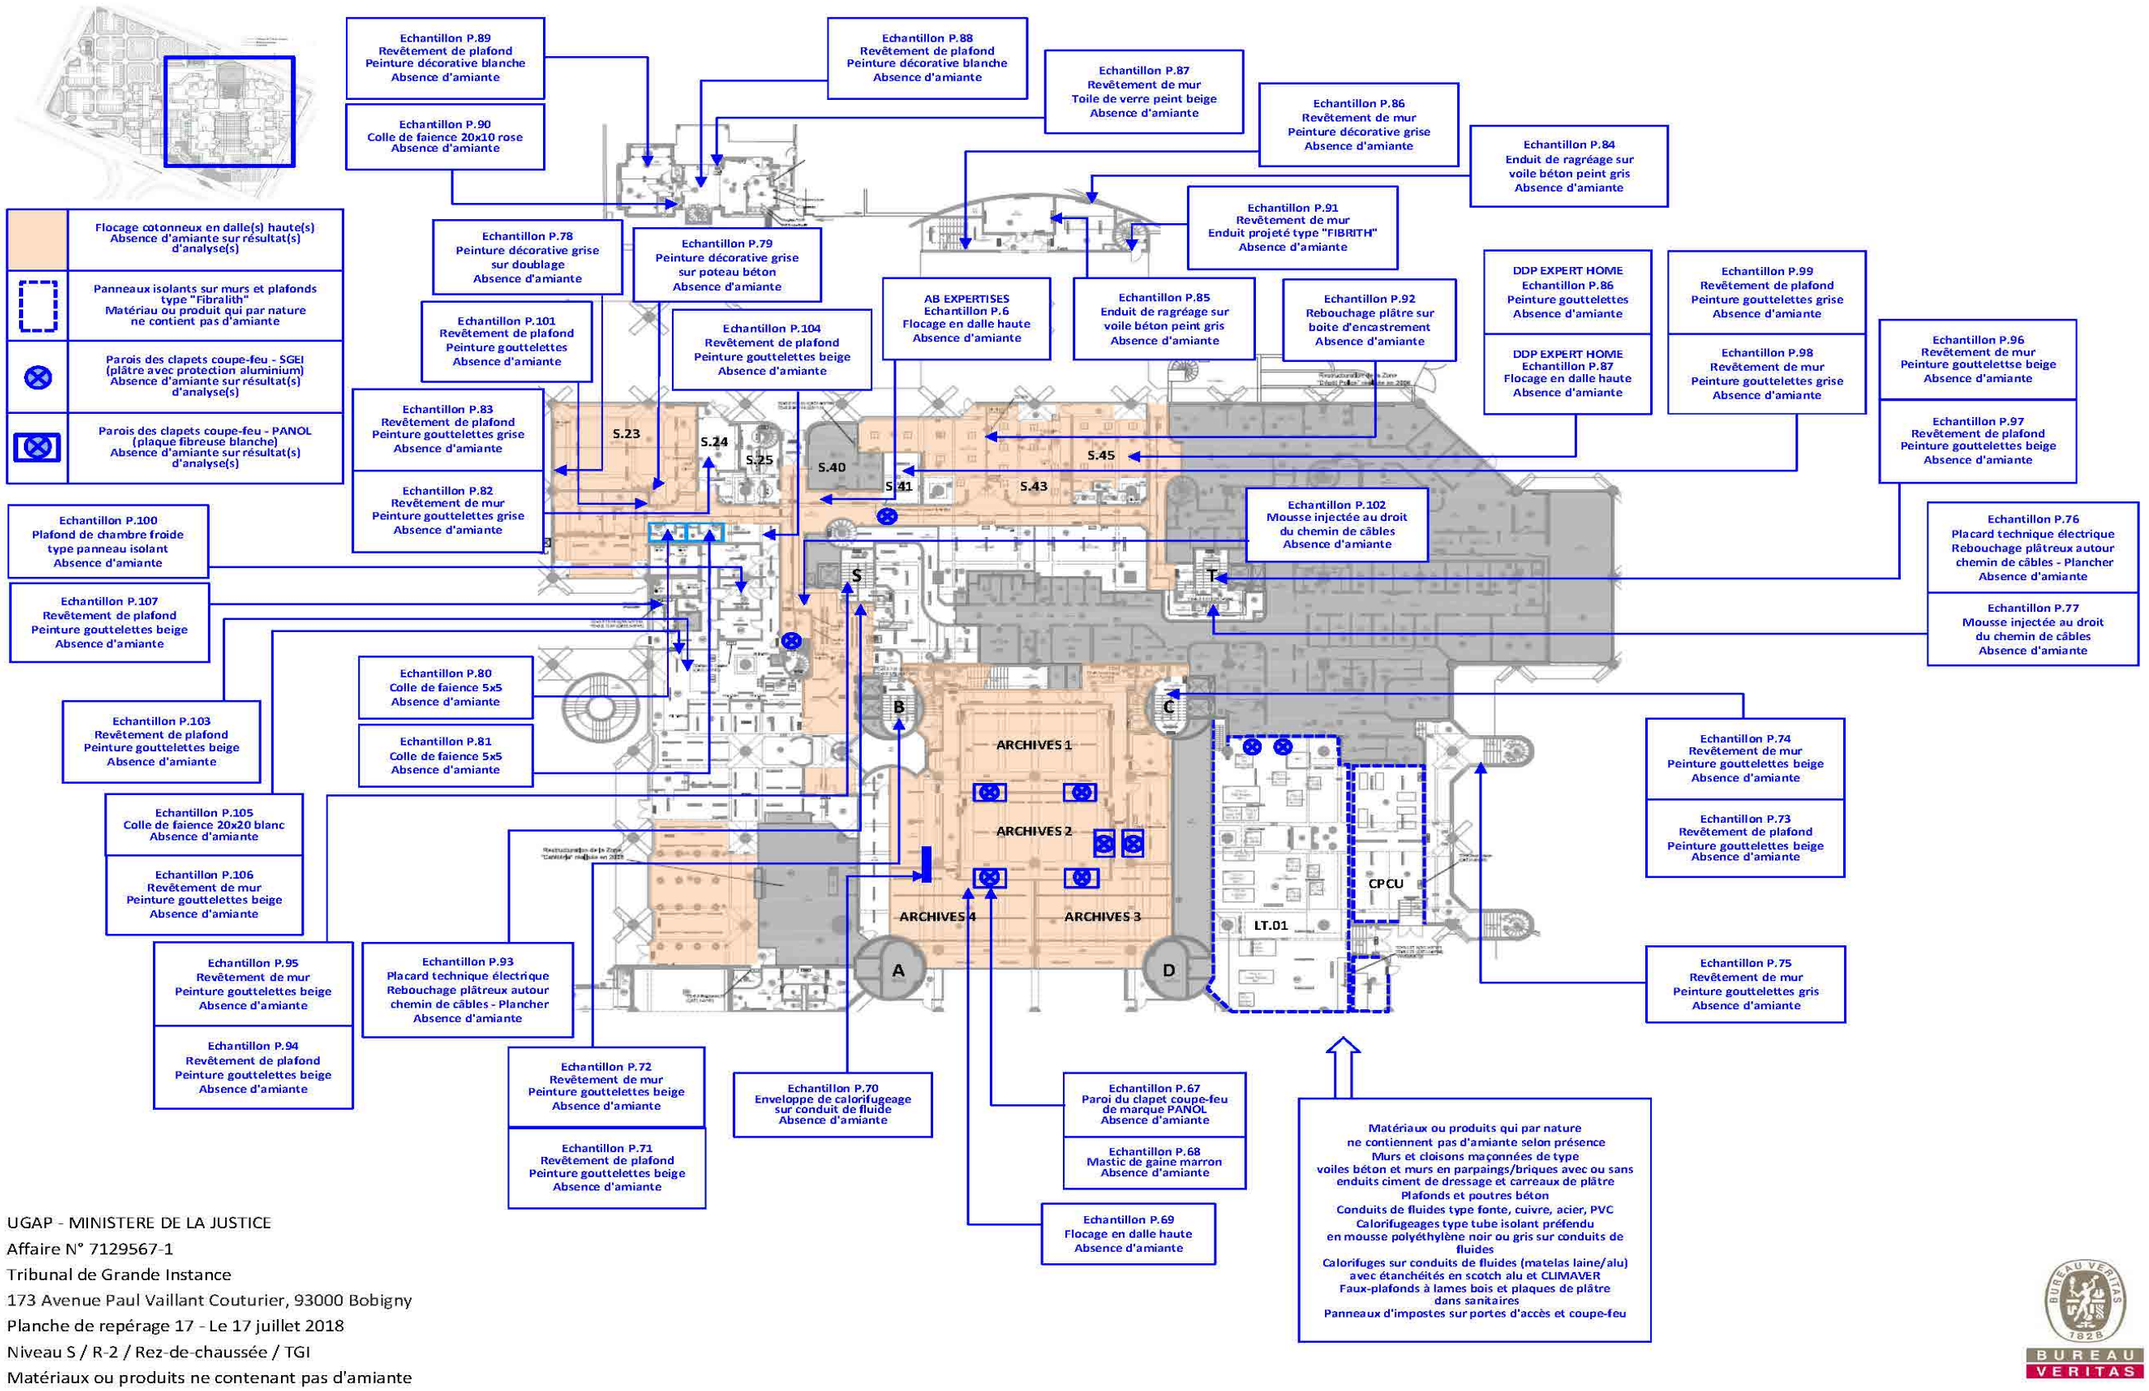


UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE
Affaire N° 7129567-1
Tribunal de Grande Instance
173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny
Planche de repérage 17 - Le 17 juillet 2018
Niveau S / R-2 / Rez-de-chaussée / TGI
Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

| **Planche de repérage** (*la planche de repérage est indissociable du rapport*) | | |
|---|---|---|
| Site : Tribunal de Grande Instance de Bobigny | Adresse : 169-173 avenue Paul Vaillant Couturier 93000 BOBIGNY | Localisation : Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI |
| Réalisé par : Didier DENAVEAUT | N° de planche : 17 / 63 | |


Copyright BUREAU VERITAS



| | |
|---|---|
| | Isolants des câbles électriques susceptibles de contenir de l'amiante En tension au jour du contrôle |
| | Vides des plénums difficiles d'accès Faux-plafonds bois cloués |
| | Vides des plénums sous gaines, coffres et plafonds plâtre non visibles et accessibles |
| | Locaux non visibles et accessibles |
| | Chambre de tirage non visible et accessible - Trappes béton |

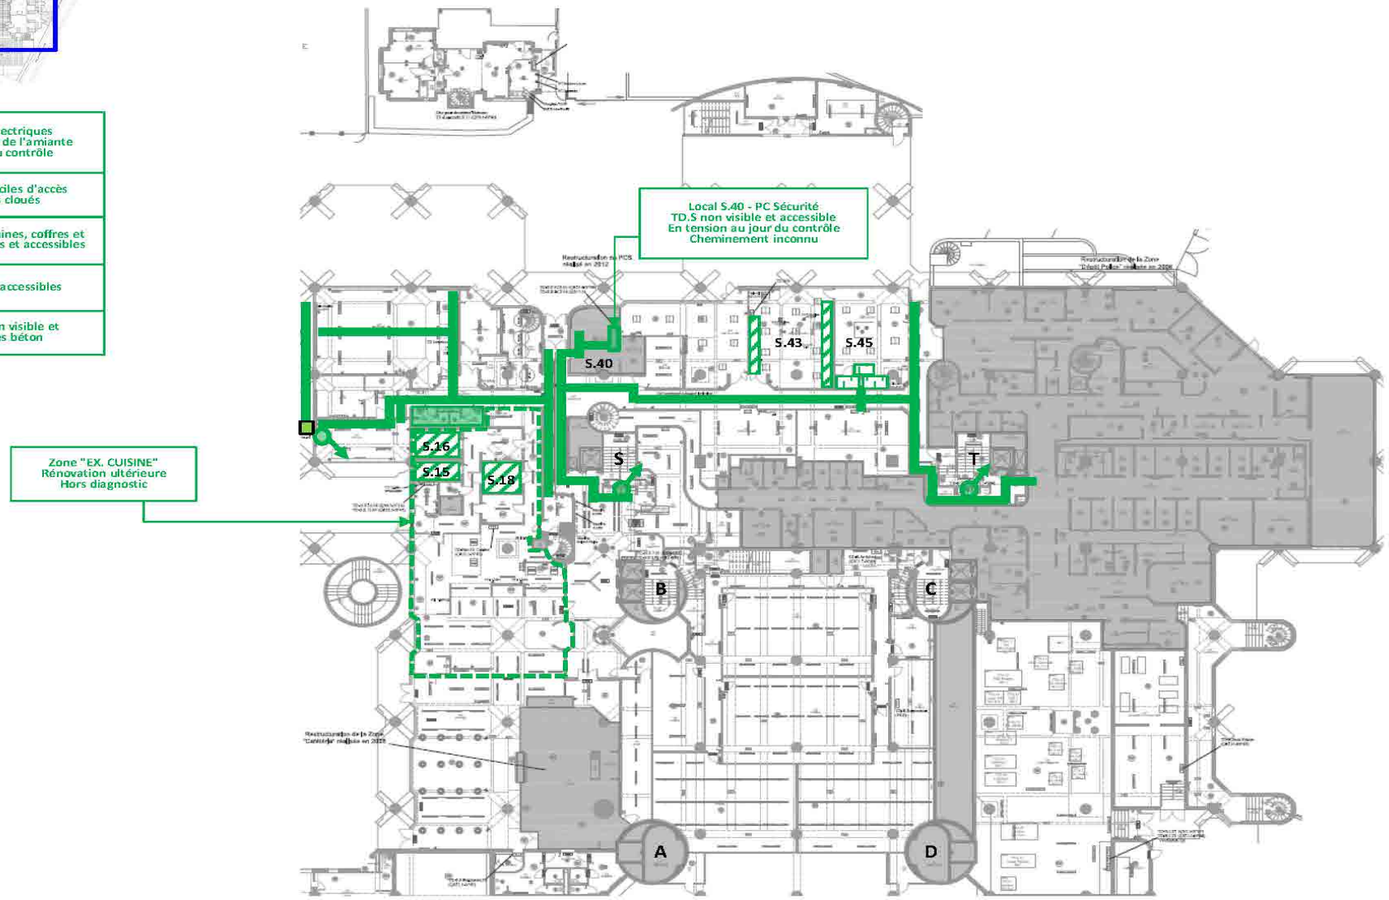


UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE
Affaire N° 7129567-1
Tribunal de Grande Instance
173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny
Planche de repérage 18 - Le 17 juillet 2018
Niveau S / R-2 / Rez-de-chaussée / TGI
Locaux ou zones non visibles et accessibles - Matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante

| **Planche de repérage** (*la planche de repérage est indissociable du rapport)* | | |
|---|---|---|
| Site : Tribunal de Grande Instance de Bobigny | Adresse : 169-173 avenue Paul Vaillant Couturier 93000 BOBIGNY | Localisation : Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI |
| Réalisé par : Didier DENAVEAUT | N° de planche : 18 / 63 | |



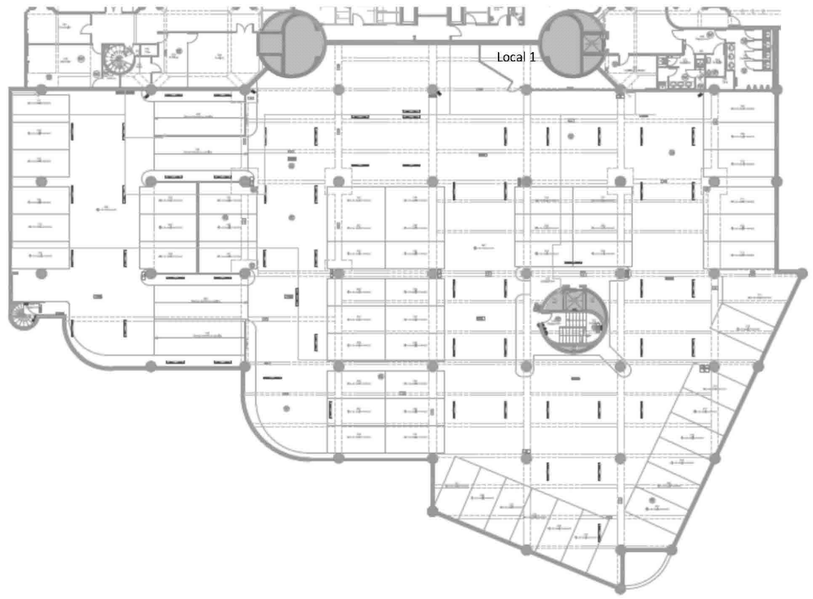


UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE
Affaire N° 7129567-1
Tribunal de Grande Instance
173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny
Planche de repérage 19 - Le 17 juillet 2018
Niveau R / R-1 / Pas Perdus / Parkings
Matériaux ou produits contenant de l'amiante

| **Planche de repérage** (*la planche de repérage est indissociable du rapport)* | | |
|---|---|---|
| Site : Tribunal de Grande Instance de Bobigny | Adresse : 169-173 avenue Paul Vaillant Couturier 93000 BOBIGNY | Localisation : Niveau R : Pas Perdus / Parking |
| Réalisé par : Didier DENAVEAUT | N° de planche : 19 / 63 | |


Copyright BUREAU VERITAS



Flocage cotonneux en dalle(s) haute(s)
Absence d'amiante sur résultat(s) d'analyse(s)

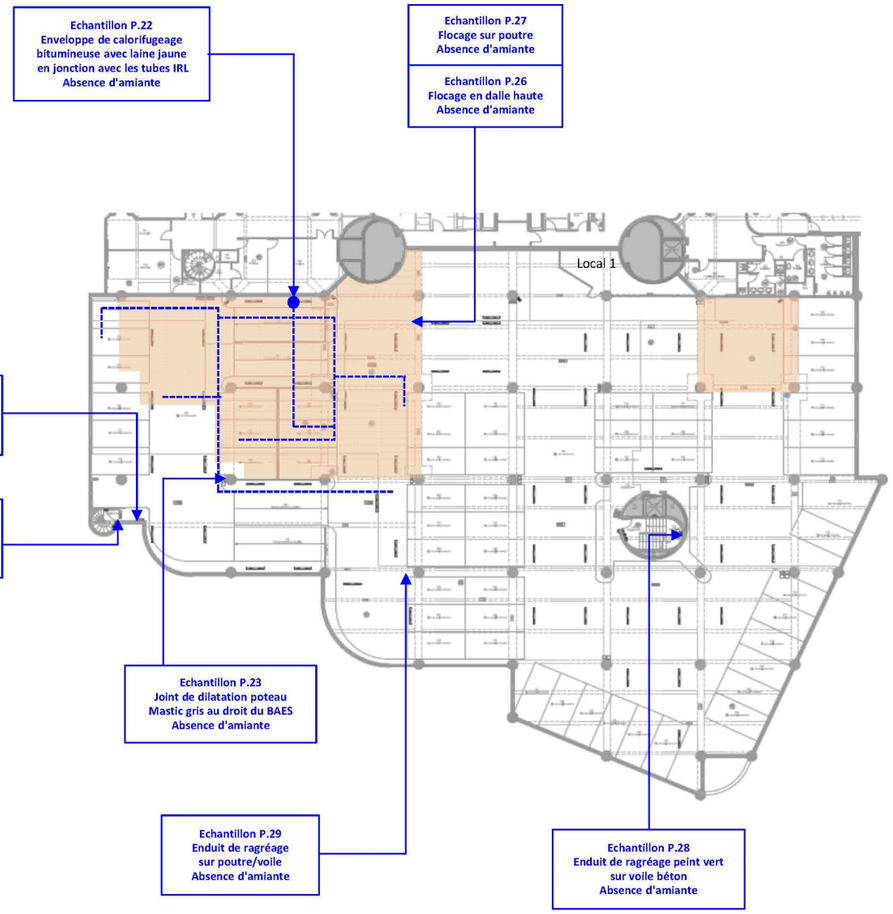


Echantillon P.22
Enveloppe de calorifugeage bitumineuse avec laine jaune en jonction avec les tubes IRL
Absence d'amiante

Echantillon P.27
Flocage sur poutre
Absence d'amiante

Echantillon P.26
Flocage en dalle haute
Absence d'amiante

Echantillon P.24
Enduit de ragréage peint vert sur voile béton
Absence d'amiante

Echantillon P.25
Rebouchage peint vert au droit de l'interrupteur
Absence d'amiante

Echantillon P.23
Joint de dilatation poteau
Mastic gris au droit du BAES
Absence d'amiante

Echantillon P.29
Enduit de ragréage sur poutre/voile
Absence d'amiante

Echantillon P.28
Enduit de ragréage peint vert sur voile béton
Absence d'amiante

Matériaux ou produits qui par nature ne contiennent pas d'amiante
Murs et cloisons maçonnées de type voiles béton et murs en parpaings/briques
Plafonds et poutres béton
Fourreaux PVC dans poutres béton
Conduits de fluides type fonte
Calorifugeages type tube isolant préfendu en mousse polyéthylène sur conduits de fluides

UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE
Affaire N° 7129567-1
Tribunal de Grande Instance
173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny
Planche de repérage 20 - Le 17 juillet 2018
Niveau R / R-1 / Pas Perdus / Parkings
Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

| **Planche de repérage** (*la planche de repérage est indissociable du rapport)* | | |
|---|---|---|
| Site : Tribunal de Grande Instance de Bobigny | Adresse : 169-173 avenue Paul Vaillant Couturier 93000 BOBIGNY | Localisation : Niveau R : Pas Perdus / Parking |
| Réalisé par : Didier DENAVEAUT | N° de planche : 20 / 63 | |



Isolants des câbles électriques
susceptibles de contenir de l'amiante
En tension au jour du contrôle

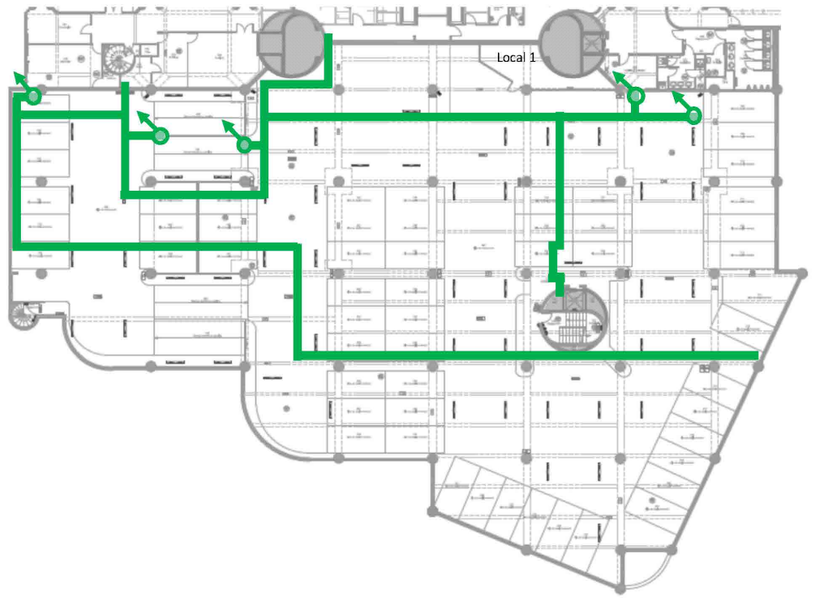


UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE
Affaire N° 7129567-1
Tribunal de Grande Instance
173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny
Planche de repérage 21 - Le 17 juillet 2018
Niveau R / R-1 / Pas Perdus / Parkings
Locaux ou zones non visibles et accessibles - Matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante

| **Planche de repérage** (*la planche de repérage est indissociable du rapport)* | | |
|---|---|---|
| Site : Tribunal de Grande Instance de Bobigny | Adresse : 169-173 avenue Paul Vaillant Couturier 93000 BOBIGNY | Localisation : Niveau R : Pas Perdus / Parking |
| Réalisé par : Didier DENAVEAUT | N° de planche : 21 / 63 | |



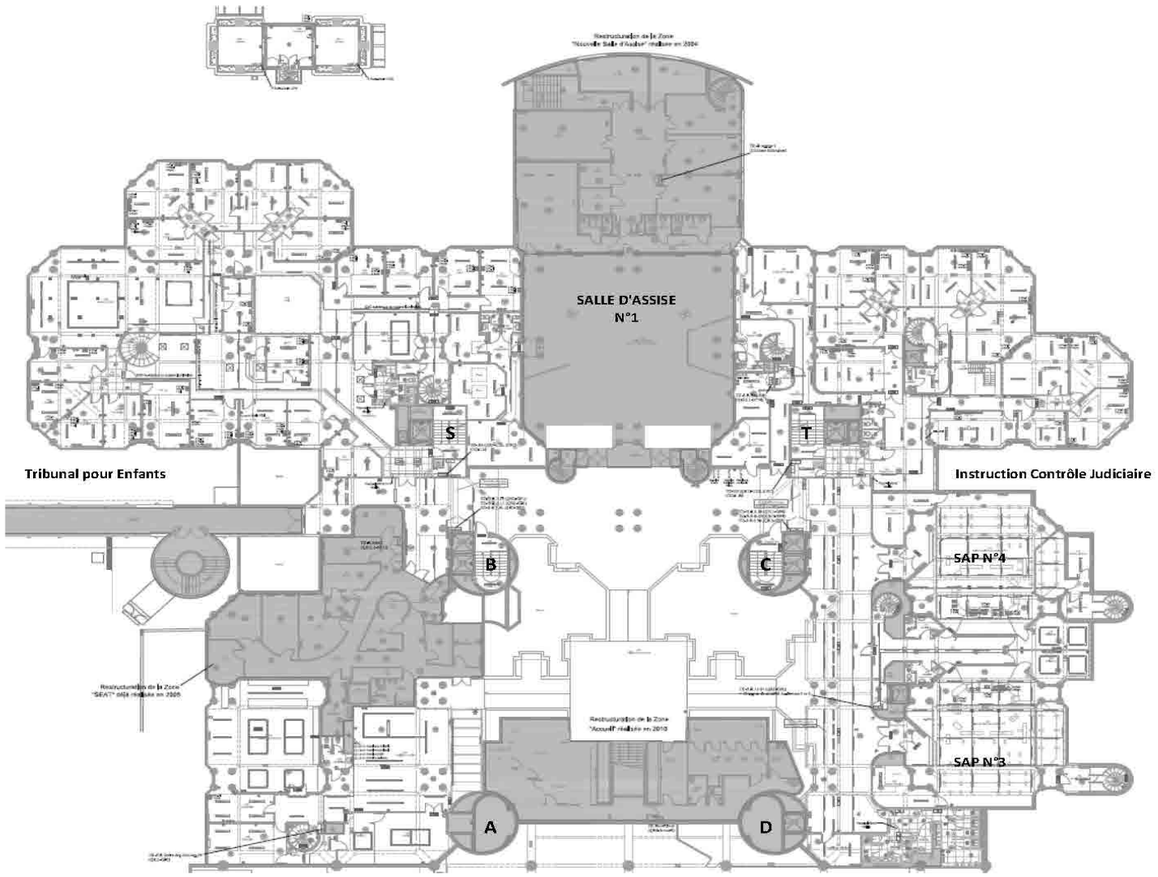


UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE
Affaire N° 7129567-1
Tribunal de Grande Instance
173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny
Planche de repérage 22 - Le 17 juillet 2018
Niveau R / R-1 / Pas Perdus / TGI
Matériaux ou produits contenant de l'amiante

| **Planche de repérage** (*la planche de repérage est indissociable du rapport)* | | |
|---|---|---|
| Site : Tribunal de Grande Instance de Bobigny | Adresse : 169-173 avenue Paul Vaillant Couturier 93000 BOBIGNY | Localisation : Niveau R : Pas Perdus / TGI |
| Réalisé par : Didier DENAVEAUT | N° de planche : 22 / 63 | |



| | |
|---|---|
| | Flocage cotonneux en dalle(s) haute(s)<br>Absence d'amiante sur résultat(s) d'analyse(s) |
| ⊗ | Parois des clapets coupe-feu - SGEI (plâtre avec protection aluminium)<br>Absence d'amiante sur résultat(s) d'analyse(s) |
| ▯ | Faux-plafonds 600x600 métalliques à résille maille carrée<br>Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante |

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.61
Peinture gouttelettes beige
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.62
Flocage en dalle haute
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.63
Peinture gouttelettes beige
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.64
Flocage en dalle haute
Absence d'amiante

Echantillon P.111
Revêtement de mur
Peinture gouttelettes beige
Absence d'amiante

Echantillon P.112
Revêtement de plafond
Peinture gouttelettes beige
Absence d'amiante

Echantillon P.113
Revêtement de mur
Peinture gouttelettes beige
Absence d'amiante

Echantillon P.123
Revêtement de plafond
Peinture gouttelettes gris
Absence d'amiante

Echantillon P.121
Revêtement de mur
Peinture gouttelettes gris
Absence d'amiante

Echantillon P.127
Revêtement de mur
Peinture gouttelettes gris
Absence d'amiante

Echantillon P.120
Revêtement de mur
Peinture décorative blanche
Absence d'amiante

Echantillon P.114
Revêtement de plafond
Peinture décorative blanche
Absence d'amiante

Echantillon P.115
Revêtement de mur
Peinture gouttelettes beige
Absence d'amiante

Echantillon P.116
Revêtement de plafond
Peinture gouttelettes beige
Absence d'amiante

Echantillon P.117
Revêtement de mur
Peinture gouttelettes beige
Absence d'amiante

Echantillon P.122
Colle de faience 5x5
Absence d'amiante

Echantillon P.124
Revêtement de mur
Peinture gouttelettes gris
Absence d'amiante

Echantillon P.118
Revêtement de mur
Peinture gouttelettes beige
Absence d'amiante

Echantillon P.109
Revêtement de mur
Peinture décorative beige
Absence d'amiante

Echantillon P.119
Revêtement de mur
Peinture gouttelettes beige
Absence d'amiante

Matériau ou produit qui par nature
ne contient pas d'amiante
Faux-plafond plâtre 600x600

Echantillon P.108
Revêtement de mur
Peinture gouttelettes beige
Absence d'amiante

Echantillon P.125
Revêtement de mur
Peinture gouttelettes beige
Absence d'amiante

Echantillon P.126
Revêtement de plafond
Peinture gouttelettes beige
Absence d'amiante

Echantillon P.110
Flocage en dalle haute
Absence d'amiante

Matériaux ou produits qui par nature
ne contiennent pas d'amiante selon présence
Murs et cloisons maçonnées de type
voiles béton et murs en parpaings/briques avec ou sans
enduits ciment de dressage et carreaux de plâtre
Plafonds et poutres béton
Conduits de fluides type fonte, cuivre, acier, PVC
Calorifugeages type tube isolant préfendu
en mousse polyéthylène noir ou gris sur conduits de fluides
Calorifuges sur conduits de fluides (matelas laine/alu)
avec étanchéités en scotch alu et CLIMAVER
Faux-plafonds à lames bois et plaques de plâtre dans sanitaires
Panneaux d'impostes sur portes d'accès et coupe-feu
Tissus muraux et toiles de verre peintes

R.37
R.30
R.42
R.44
R.40
SALLE D'ASSISE
R.60
R.72
S
T
B
C
A
D
SAP N°4
SAP N°3
Tribunal pour Enfants
Instruction Contrôle Judiciaire
Ordre des Avocats

UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE
Affaire N° 7129567-1
Tribunal de Grande Instance
173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny
Planche de repérage 23 - Le 17 juillet 2018
Niveau R / R-1 / Pas Perdus / TGI
Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

| **Planche de repérage** (*la planche de repérage est indissociable du rapport)* | | |
|---|---|---|
| Site : Tribunal de Grande Instance de Bobigny | Adresse : 169-173 avenue Paul Vaillant Couturier 93000 BOBIGNY | Localisation : Niveau R : Pas Perdus / TGI |
| Réalisé par : Didier DENAVEAUT | N° de planche : 23 / 63 | |



| | |
|---|---|
| | Isolants des câbles électriques susceptibles de contenir de l'amiante En tension au jour du contrôle |
| | Vides des plénums difficiles d'accès Faux-plafonds bois cloués et type résille métallique |
| | Vides des plénums sous gaines, coffres et plafonds plâtre non visibles et accessibles |
| | Locaux non visibles et accessibles |

Terrasses : Complexe d'étanchéité susceptible de contenir de l'amiante A vérifier en cas de travaux au droit des extracteurs 50W

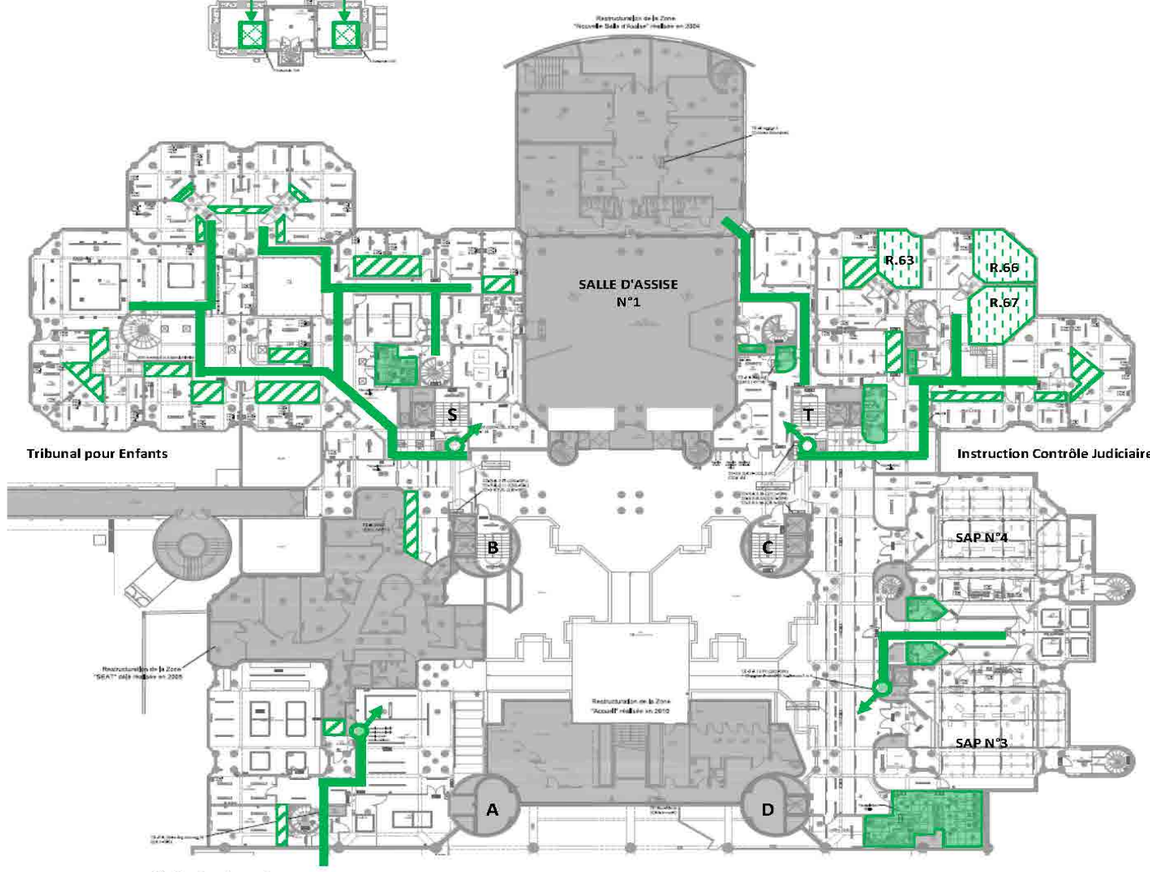


UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE
Affaire N° 7129567-1
Tribunal de Grande Instance
173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny
Planche de repérage 24 - Le 17 juillet 2018
Niveau R / R-1 / Pas Perdus / TGI
Locaux ou zones non visibles et accessibles - Matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante

| **Planche de repérage** (*la planche de repérage est indissociable du rapport)* | | |
|---|---|---|
| Site : Tribunal de Grande Instance de Bobigny | Adresse : 169-173 avenue Paul Vaillant Couturier 93000 BOBIGNY | Localisation : Niveau R : Pas Perdus / TGI |
| Réalisé par : Didier DENAVEAUT | N° de planche : 24 / 63 | |



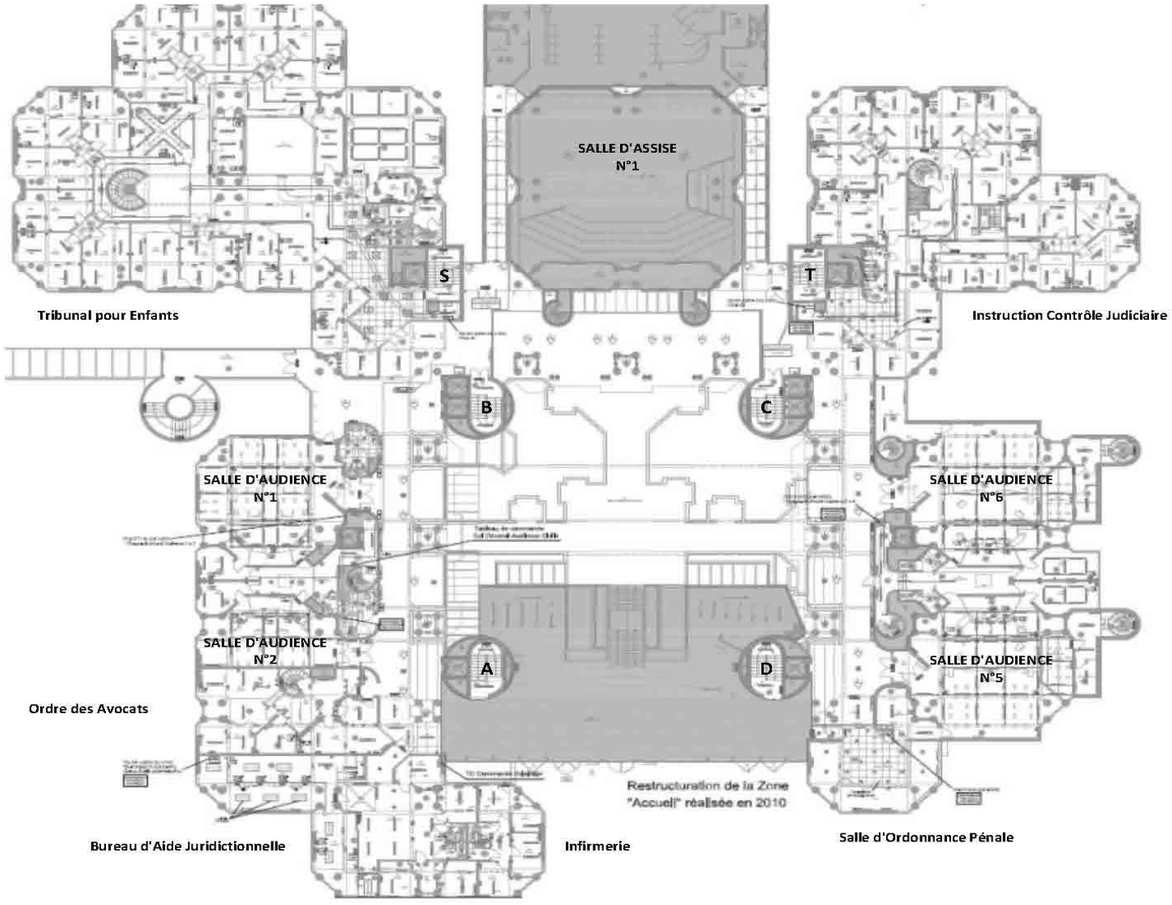


UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE
Affaire N° 7129567-1
Tribunal de Grande Instance
173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny
Planche de repérage 25 - Le 17 juillet 2018
Niveau P / R+0 / Parvis / TGI
Matériaux ou produits contenant de l'amiante

| **Planche de repérage** (*la planche de repérage est indissociable du rapport)* | | |
|---|---|---|
| Site : Tribunal de Grande Instance de Bobigny | Adresse : 169-173 avenue Paul Vaillant Couturier 93000 BOBIGNY | Localisation : Niveau P : Parvis / TGI |
| Réalisé par : Didier DENAVEAUT | N° de planche : 25 / 63 | |

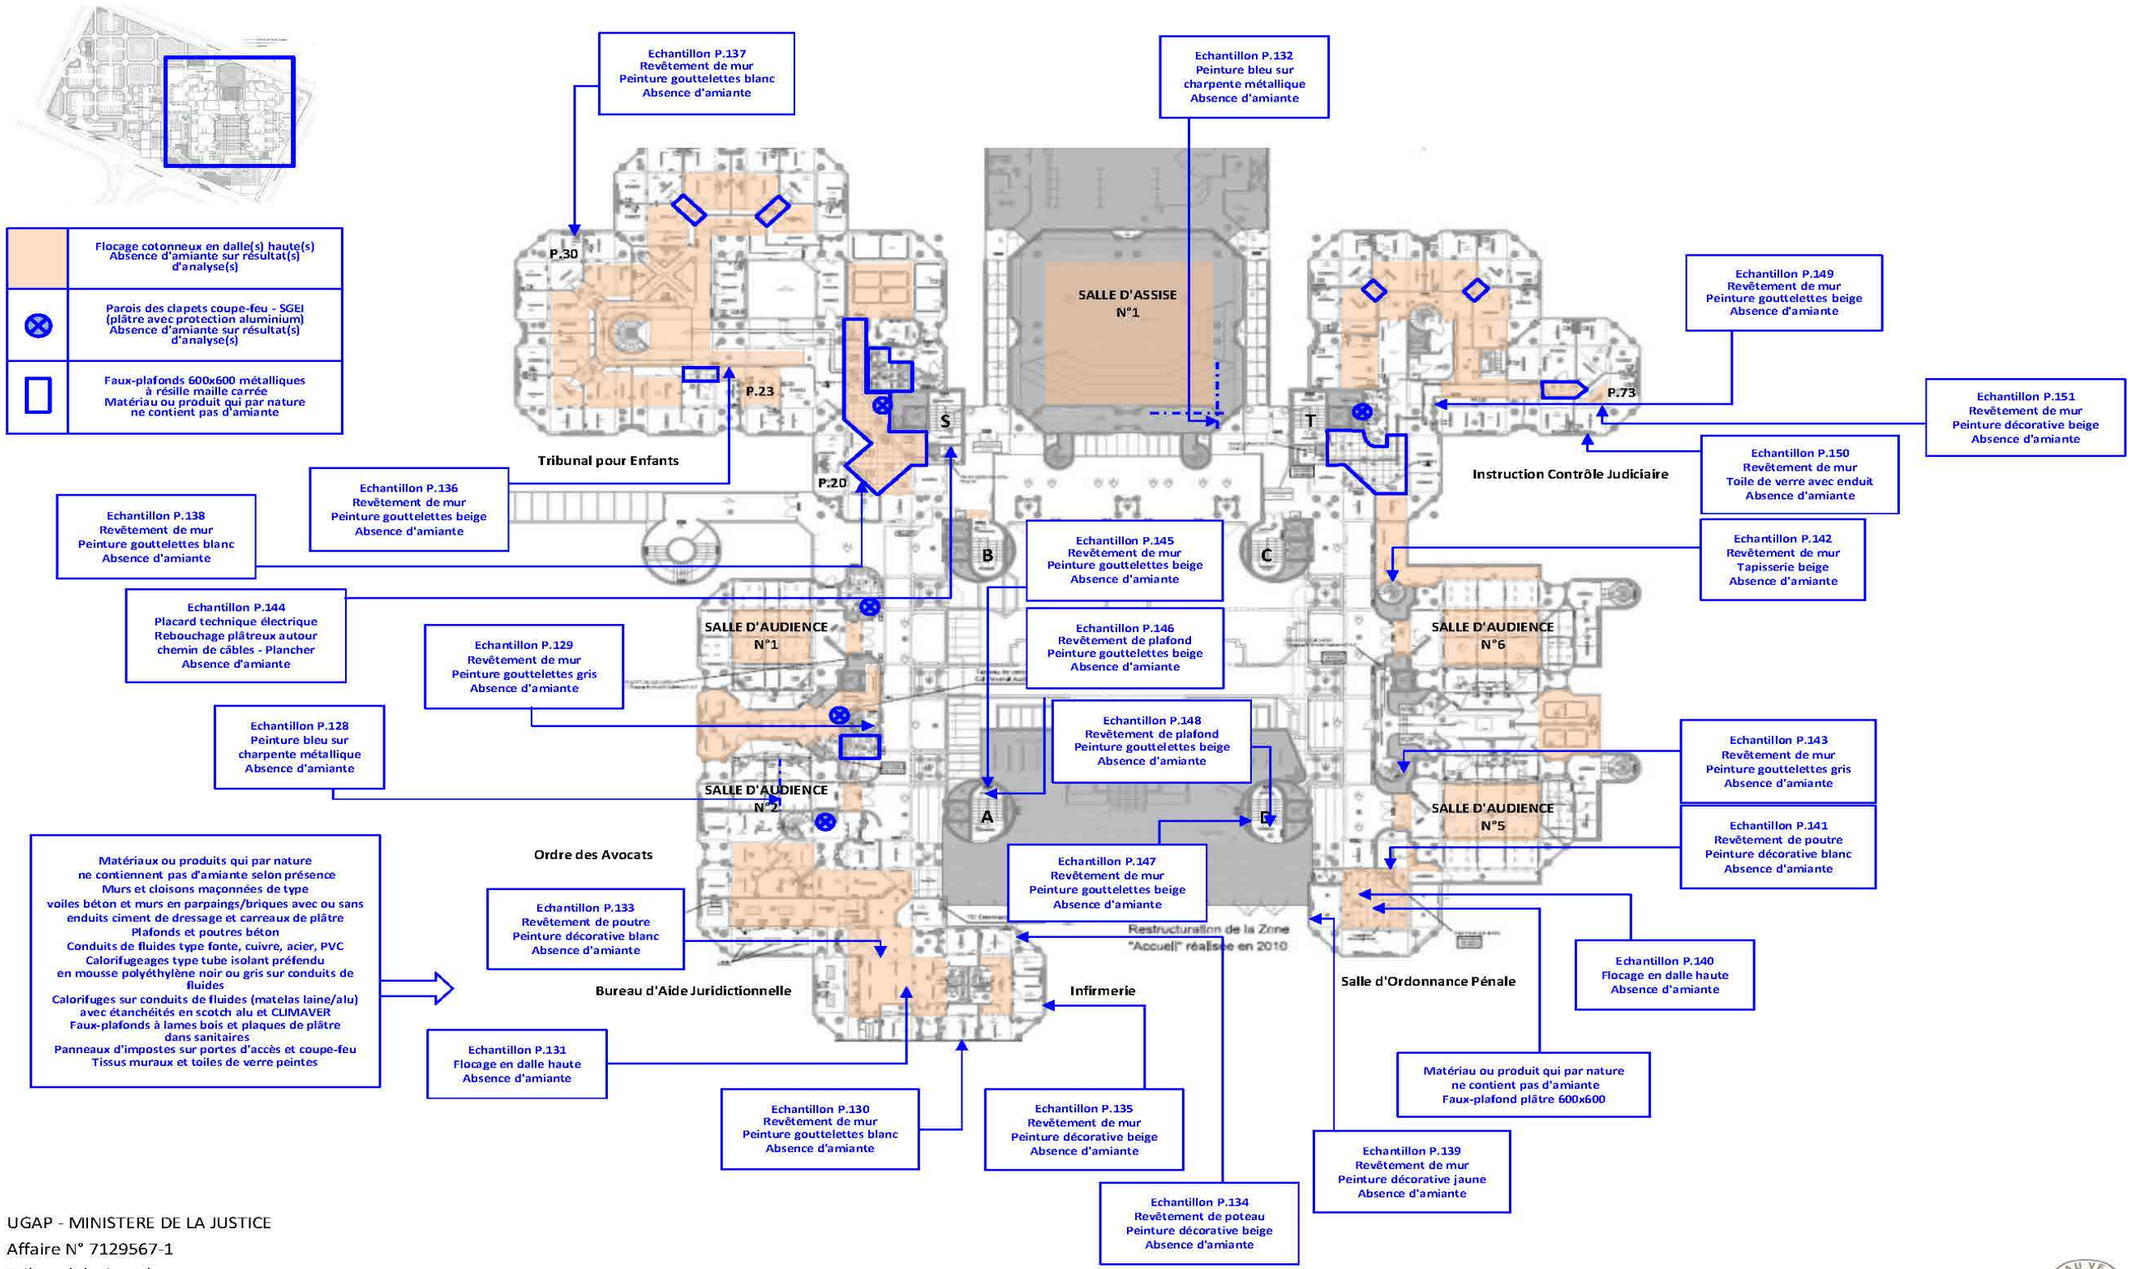


UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE
Affaire N° 7129567-1
Tribunal de Grande Instance
173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny
Planche de repérage 26 - Le 17 juillet 2018
Niveau P / R+0 / Parvis / TGI
Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

| **Planche de repérage** (*la planche de repérage est indissociable du rapport)* | | |
|---|---|---|
| Site : Tribunal de Grande Instance de Bobigny | Adresse : 169-173 avenue Paul Vaillant Couturier 93000 BOBIGNY | Localisation : Niveau P : Parvis / TGI |
| Réalisé par : Didier DENAVEAUT | N° de planche : 26 / 63 | |


Copyright BUREAU VERITAS



| | |
|---|---|
| | Isolants des câbles électriques susceptibles de contenir de l'amiante En tension au jour du contrôle |
| | Vides des plénums difficiles d'accès Faux-plafonds bois cloués et type |
| | Vides des plénums sous gaines, coffres et plafonds plâtre non visibles et accessibles |
| | Locaux non visibles et accessibles |
| | Structures en béton non accessibles |

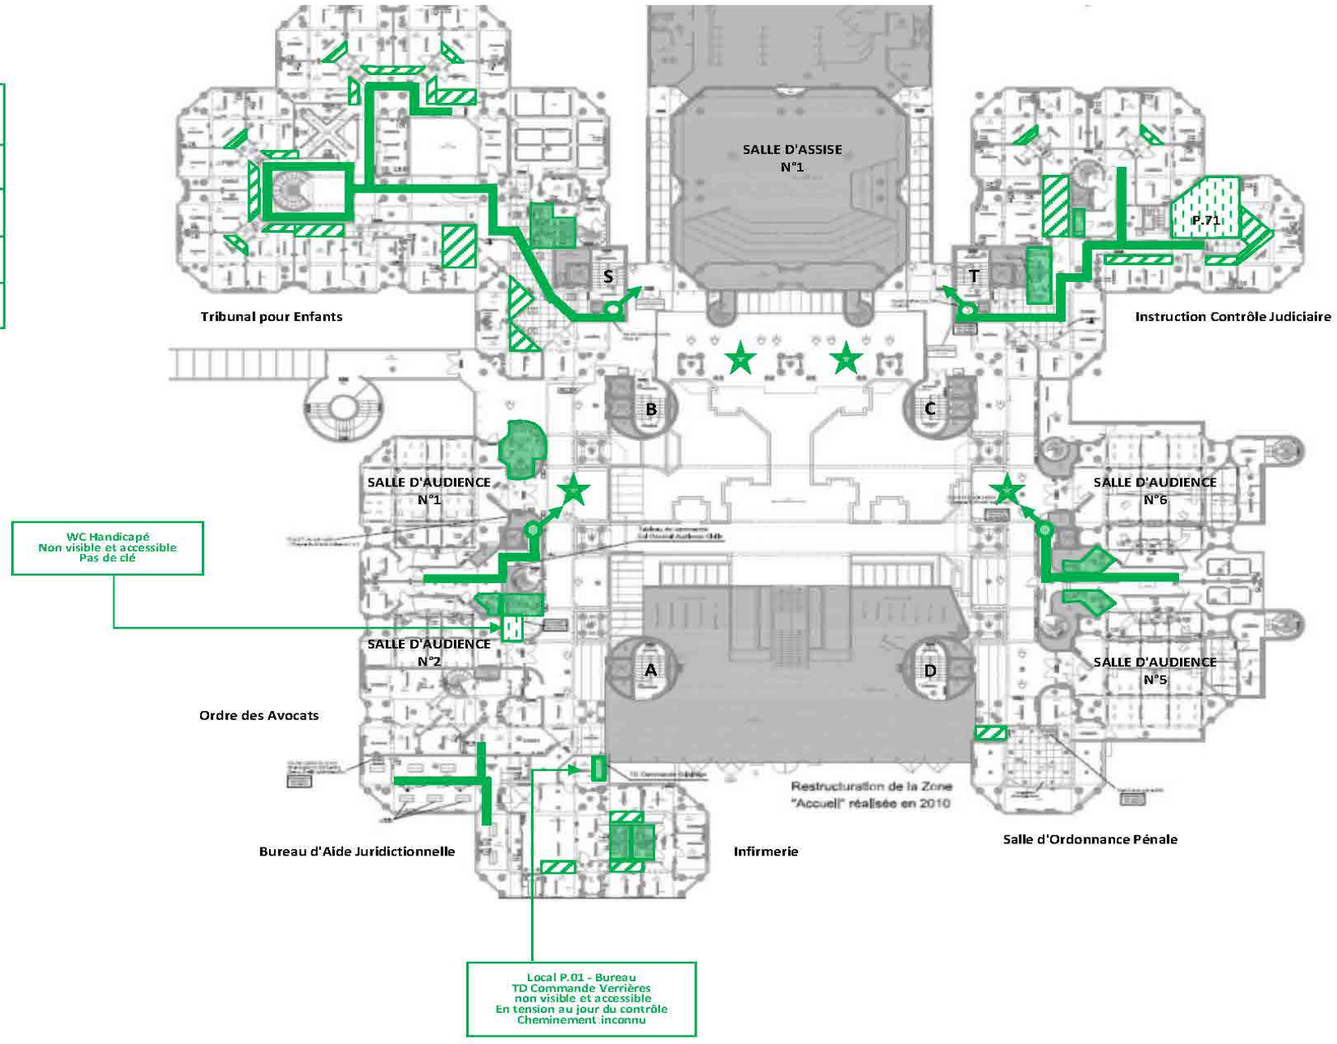


UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE
Affaire N° 7129567-1
Tribunal de Grande Instance
173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny
Planche de repérage 27 - Le 17 juillet 2018
Niveau P / R+0 / Parvis / TGI
Locaux ou zones non visibles et accessibles - Matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante

| **Planche de repérage** (*la planche de repérage est indissociable du rapport)* | | |
|---|---|---|
| Site : Tribunal de Grande Instance de Bobigny | Adresse : 169-173 avenue Paul Vaillant Couturier 93000 BOBIGNY | Localisation : Niveau P : Parvis / TGI |
| Réalisé par : Didier DENAVEAUT | N° de planche : 27 / 63 | |



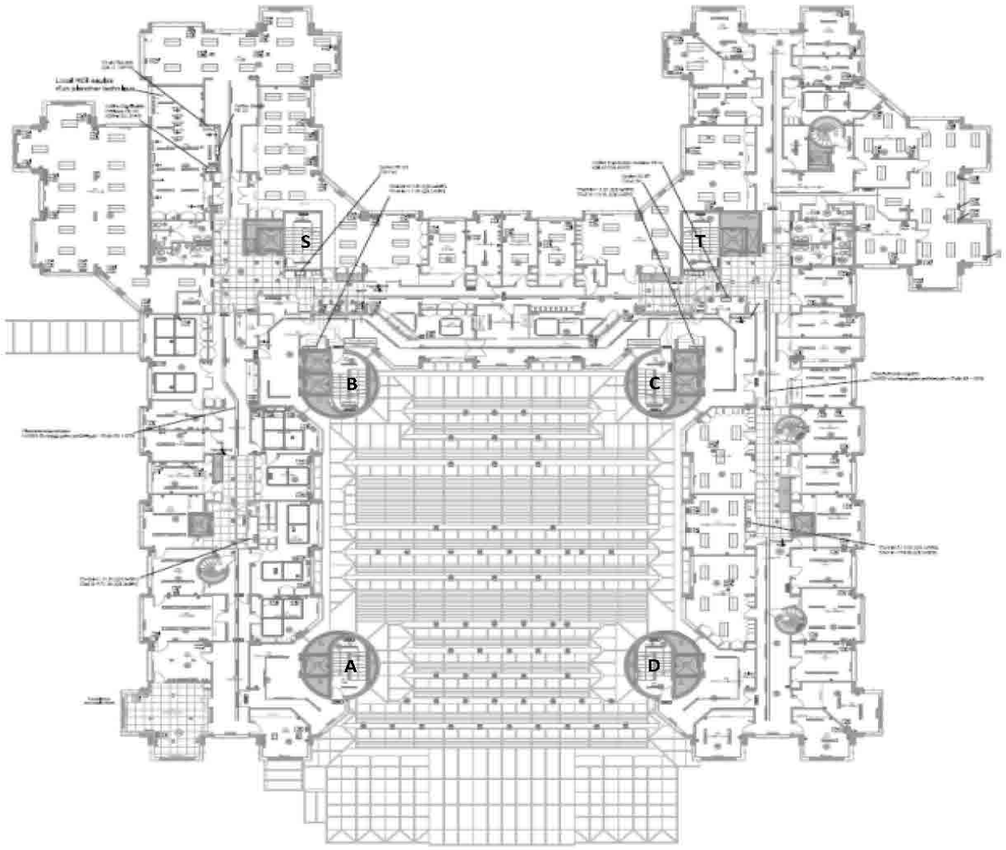


UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE
Affaire N° 7129567-1
Tribunal de Grande Instance
173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny
Planche de repérage 28 - Le 17 juillet 2018
Niveau R+1 / 1er étage / TGI
Matériaux ou produits contenant de l'amiante

| **Planche de repérage** (*la planche de repérage est indissociable du rapport)* | | |
|---|---|---|
| Site : Tribunal de Grande Instance de Bobigny | Adresse : 169-173 avenue Paul Vaillant Couturier 93000 BOBIGNY | Localisation : Niveau : 1er étage / TGI |
| Réalisé par : Didier DENAVEAUT | N° de planche : 28 / 63 | |


Copyright BUREAU VERITAS



| | |
|---|---|
| | Flocage cotonneux en dalle(s) haute(s)<br>Absence d'amiante sur résultat(s) d'analyse(s) |
| ⊗ | Parois des clapets coupe-feu - SGEI (plâtre avec protection aluminium)<br>Absence d'amiante sur résultat(s) d'analyse(s) |
| ▯ | Faux-plafonds 600x600 métalliques à résille maille carrée<br>Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante |

Echantillon P.156
Revêtement de mur
Peinture décorative blanche
Absence d'amiante

Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
Plancher technique GAMMA

Echantillon P.155
Dalle de sol blanche avec colle noire et ragréage rose sous plancher technique
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.57
Revêtement de mur
Peinture gouttelettes beige
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.58
Revêtement de plafond
Peinture gouttelettes beige
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.59
Revêtement de mur
Peinture gouttelettes beige
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.60
Revêtement de plafond
Peinture gouttelettes beige
Absence d'amiante

Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
Faux-plafond 1200x600
type ECOPHON

Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
Cloison amovible avec parements en plaques de plâtre revêtues de toile de verre peinte

Echantillon P.157
Revêtement de mur
Tissu mural bleu
Absence d'amiante

Echantillon P.158
Joint de type toile fibreuse grise sur gaine VMC
Absence d'amiante

Echantillon P.153
Placard technique électrique
Rebouchage plâtreux autour chemin de câbles - Plancher
Absence d'amiante

Echantillon P.154
Placard technique électrique
Rebouchage plâtreux autour chemin de câbles - Plancher
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.49
Revêtement de mur
Peinture gouttelettes beige
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.50
Revêtement de plafond
Peinture gouttelettes beige
Absence d'amiante

Matériaux ou produits qui par nature ne contiennent pas d'amiante selon présence
Murs et cloisons maçonnées de type voiles béton et murs en parpaings/briques avec ou sans enduits ciment de dressage et carreaux de plâtre
Plafonds et poutres béton
Conduits de fluides type fonte, cuivre, acier, PVC
Calorifugeages type tube isolant préfendu en mousse polyéthylène noir ou gris sur conduits de fluides
Calorifuges sur conduits de fluides (matelas laine/alu) avec étanchéités en scotch alu et CLIMAVER
Faux-plafonds à lames bois dans sanitaires
Panneaux d'impostes sur portes d'accès et coupe-feu
Tissus muraux et toiles de verre peintes
Cloisons sèches et amovibles en plaques de plâtre

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.55
Revêtement de mur
Peinture gouttelettes beige
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.56
Flocage en dalle haute
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.51
Revêtement de mur
Peinture gouttelettes beige
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.52
Flocage en dalle haute
Absence d'amiante

Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
Cloison amovible avec parements en plaques de plâtre revêtues PVC

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.53
Revêtement de mur
Peinture gouttelettes beige
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.54
Revêtement de plafond
Peinture gouttelettes beige
Absence d'amiante

Echantillon P.160
Revêtement de cloison
Peinture gouttelettes beige
Absence d'amiante

Echantillon P.159
Revêtement de plafond
Peinture gouttelettes beige
Absence d'amiante

Echantillon P.161
Revêtement de mur
Peinture gouttelettes beige
Absence d'amiante

UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE
Affaire N° 7129567-1
Tribunal de Grande Instance
173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny
Planche de repérage 29 - Le 17 juillet 2018
Niveau R+1 / 1er étage / TGI
Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

| **Planche de repérage** (*la planche de repérage est indissociable du rapport)* | | |
|---|---|---|
| Site : Tribunal de Grande Instance de Bobigny | Adresse : 169-173 avenue Paul Vaillant Couturier 93000 BOBIGNY | Localisation : Niveau : 1er étage / TGI |
| Réalisé par : Didier DENAVEAUT | N° de planche : 29 / 63 | |



| | |
|---|---|
| | Isolants des câbles électriques susceptibles de contenir de l'amiante En tension au jour du contrôle |
| | Vides des plénums difficiles d'accès Faux-plafonds bois doués |
| | Vides des plénums sous gaines, coffres et plafonds plâtre non visibles et accessibles |
| | Locaux non visibles et accessibles |

| En complément des autres câbles électriques à contrôler : |
|---|
| Placard Technique Electrique Ancien câble tissé rouge susceptible de contenir de l'amiante En tension au jour du contrôle Cheminement inconnu |

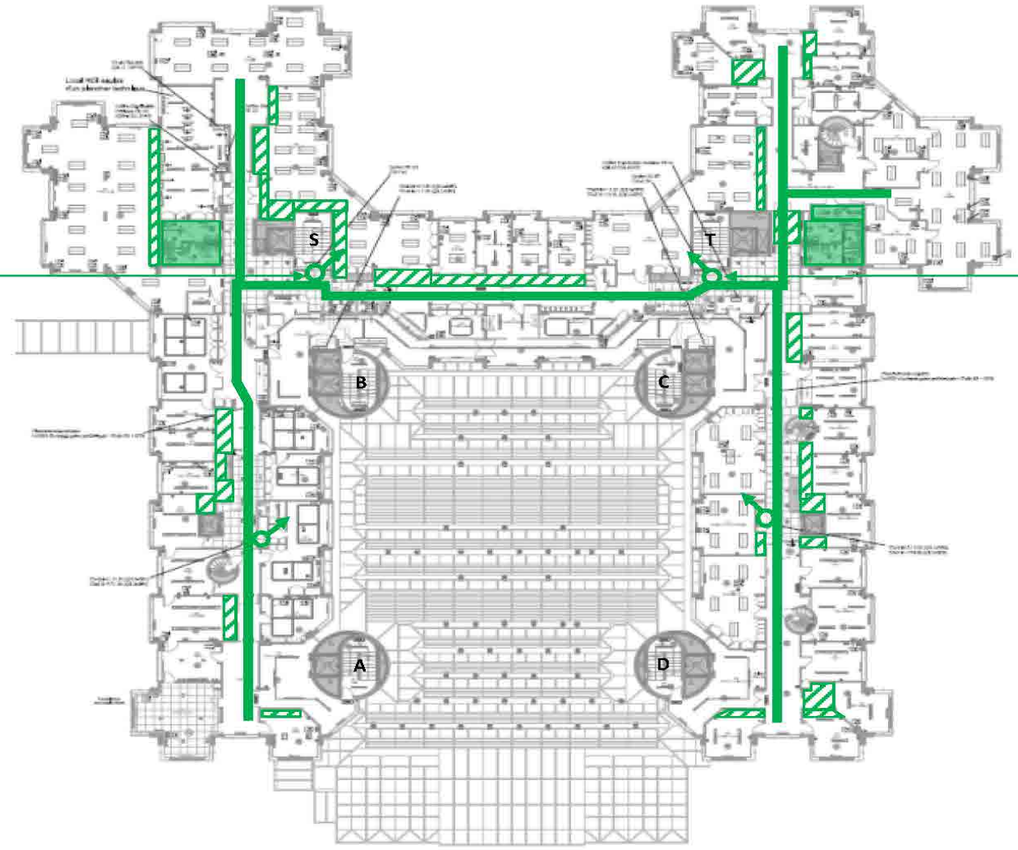


| En complément des autres câbles électriques à contrôler : |
|---|
| Placard Technique Electrique Ancien câble tissé rouge susceptible de contenir de l'amiante En tension au jour du contrôle Cheminement inconnu |

UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE
Affaire N° 7129567-1
Tribunal de Grande Instance
173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny
Planche de repérage 30 - Le 17 juillet 2018
Niveau R+1 / 1er étage / TGI
Locaux ou zones non visibles et accessibles - Matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante

| **Planche de repérage** (*la planche de repérage est indissociable du rapport)* | | |
|---|---|---|
| Site : Tribunal de Grande Instance de Bobigny | Adresse : 169-173 avenue Paul Vaillant Couturier 93000 BOBIGNY | Localisation : Niveau : 1er étage / TGI |
| Réalisé par : Didier DENAVEAUT | N° de planche : 30 / 63 | |


Copyright BUREAU VERITAS



| | |
|---|---|
| | Joint type tresse de dilatation en mousse grise sous couvre joint métallique<br>Présence d'amiante sur résultat(s) d'analyse(s) |
| "HORS PROGRAMME DE TRAVAUX"<br>Matériau identifié à proximité des installations électriques<br>(sols, murs et plafonds sous couvre-joints métalliques) | |

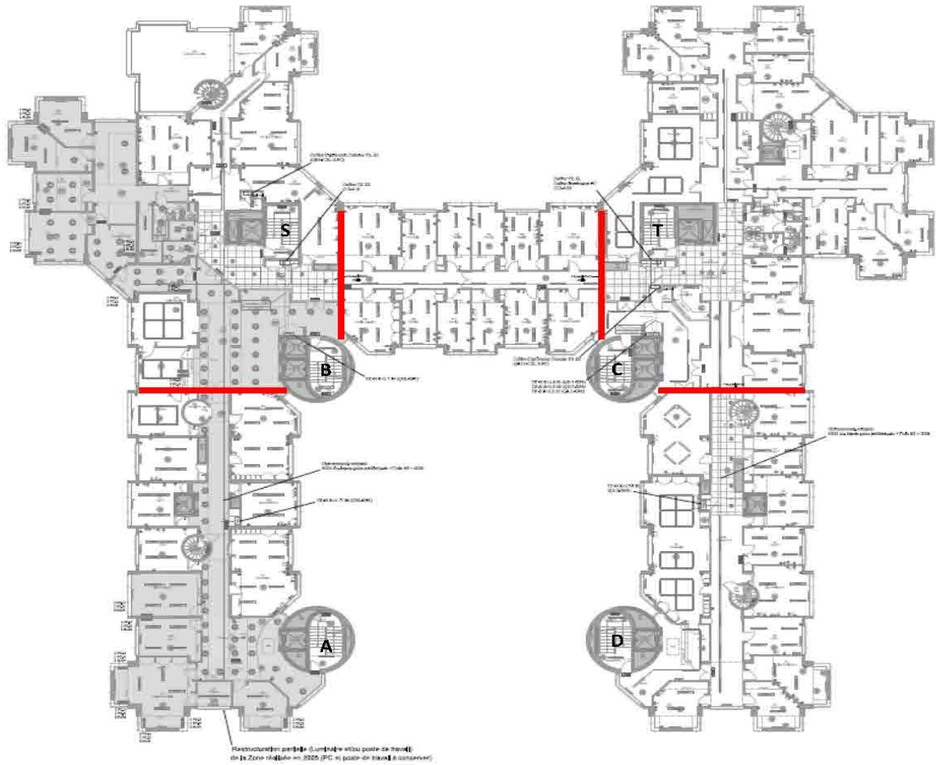


UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE
Affaire N° 7129567-1
Tribunal de Grande Instance
173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny
Planche de repérage 31 - Le 17 juillet 2018
Niveau R+2 / 2ème étage / TGI
Matériaux ou produits contenant de l'amiante

| **Planche de repérage** (*la planche de repérage est indissociable du rapport)* | | |
|---|---|---|
| Site : Tribunal de Grande Instance de Bobigny | Adresse : 169-173 avenue Paul Vaillant Couturier 93000 BOBIGNY | Localisation : Niveau : 2ème étage / TGI |
| Réalisé par : Didier DENAVEAUT | N° de planche : 31 / 63 | |


Copyright BUREAU VERITAS



| | |
|---|---|
| | Flocage cotonneux en dalle(s) haute(s)<br>Absence d'amiante sur résultat(s) d'analyse(s) |
| ⊗ | Parois des clapets coupe-feu - SGEI (plâtre avec protection aluminium)<br>Absence d'amiante sur résultat(s) d'analyse(s) |
| ▯ | Faux-plafonds 600x600 métalliques à résille maille carrée<br>Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante |

Echantillon P.174
Rebouchage en mousse injectée jaune autour du chemin de câbles en pénétration dans imposte
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.15
Flocage en dalle haute
Absence d'amiante

Echantillon P.172
Revêtement de mur
Peinture gouttelettes gris
Absence d'amiante

Echantillon P.173
Revêtement de plafond
Peinture gouttelettes gris
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.12
Revêtement de mur
Tissu mural gris
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.11
Revêtement de mur
Peinture gouttelettes beige
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.18
Revêtement de mur
Peinture gouttelettes beige
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.19
Revêtement de plafond
Peinture gouttelettes beige
Absence d'amiante

Echantillon P.162
Revêtement de sol
Dalle de sol beige avec colle et ragréage rose
Absence d'amiante

Echantillon P.163
Peinture sur doison avec bande calicot
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.30
Flocage en dalle haute
Absence d'amiante

Echantillon P.164
Revêtement de mur
Peinture gouttelettes beige
Absence d'amiante

Echantillon P.165
Revêtement de plafond
Peinture gouttelettes beige
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.16
Revêtement de mur
Peinture gouttelettes beige
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.17
Revêtement de plafond
Peinture gouttelettes beige
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.29
Flocage en dalle haute
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.21
Revêtement de mur
Peinture décorative gris
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.22
Flocage en dalle haute
Absence d'amiante

Echantillon P.169
Revêtement de mur
Peinture gouttelettes gris
Absence d'amiante

Echantillon P.171
Revêtement de mur
Peinture gouttelettes gris
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.25
Revêtement de mur
Peinture gouttelettes beige
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.26
Flocage en dalle haute
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.27
Revêtement de mur
Peinture gouttelettes beige
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.28
Flocage en dalle haute
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.23
Revêtement de mur
Peinture gouttelettes beige
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.24
Flocage en dalle haute
Absence d'amiante

Echantillon P.168
Revêtement de plafond
Peinture gouttelettes beige
Absence d'amiante

Echantillon P.166
Revêtement de mur
Peinture gouttelettes gris
Absence d'amiante

Echantillon P.170
Placard technique électrique
Rebouchage plâtreux autour chemin de câbles - Plancher
Absence d'amiante

Matériaux ou produits qui par nature ne contiennent pas d'amiante selon présence
Murs et cloisons maçonnées de type voiles béton et murs en parpaings/briques avec ou sans enduits ciment de dressage et carreaux de plâtre
Plafonds et poutres béton
Conduits de fluides type fonte, cuivre, acier, PVC
Calorifugeages type tube isolant préfendu en mousse polyéthylène noir ou gris sur conduits de fluides
Calorifuges sur conduits de fluides (matelas laine/alu) avec étanchéités en scotch alu et CLIMAVER
Faux-plafonds à lames bois dans sanitaires
Panneaux d'impostes sur portes d'accès et coupe-feu
Tissus muraux et toiles de verre peintes
Cloisons sèches et amovibles en plaques de plâtre

Echantillon P.167
Revêtement de mur
Peinture gouttelettes beige
Absence d'amiante

UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE
Affaire N° 7129567-1
Tribunal de Grande Instance
173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny
Planche de repérage 32 - Le 17 juillet 2018
Niveau R+2 / 2ème étage / TGI
Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

| **Planche de repérage** (*la planche de repérage est indissociable du rapport*) | | |
|---|---|---|
| Site : Tribunal de Grande Instance de Bobigny | Adresse : 169-173 avenue Paul Vaillant Couturier 93000 BOBIGNY | Localisation : Niveau : 2ème étage / TGI |
| Réalisé par : Didier DENAVEAUT | N° de planche : 32 / 63 | |



| | |
|---|---|
| | Isolants des câbles électriques susceptibles de contenir de l'amiante En tension au jour du contrôle |
| | Vides des plénums difficiles d'accès Faux-plafonds bois doués |
| | Vides des plénums sous gaines, coffres et plafonds plâtre non visibles et accessibles |
| | Locaux non visibles et accessibles |

Placard Technique Electrique
Ancien câble tissé rouge susceptible de contenir de l'amiante
En tension au jour du contrôle
Boucle entre le TD Ouest et le TD Est au droit du chemin de câbles

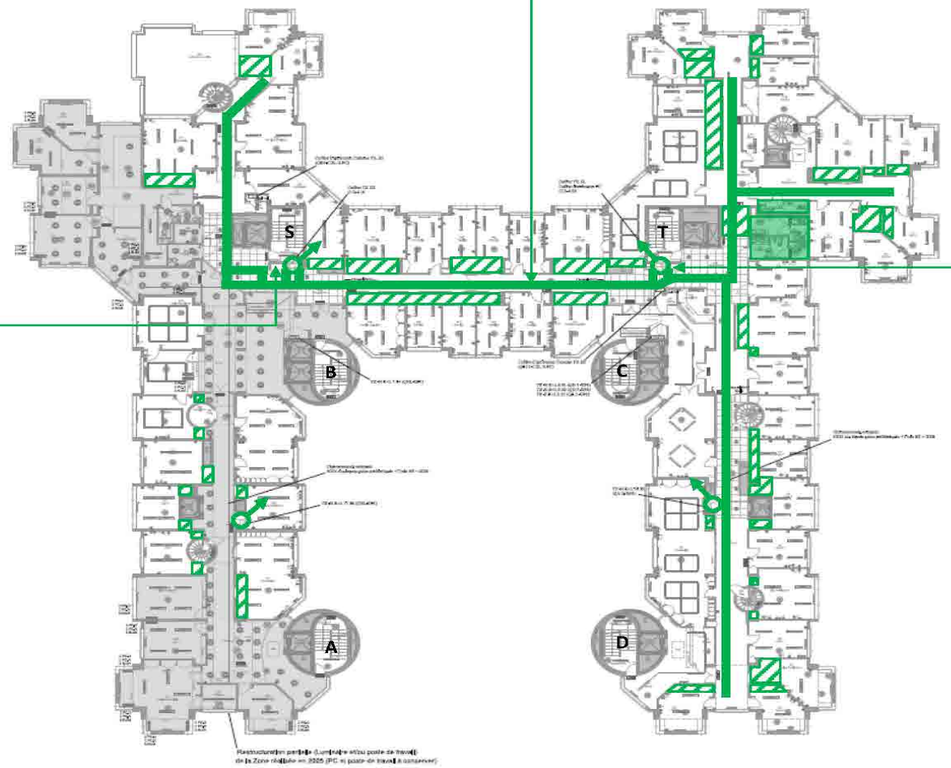


En complément des autres câbles électriques à contrôler :

Placard Technique Electrique
Ancien câble tissé rouge susceptible de contenir de l'amiante
En tension au jour du contrôle
Cheminement inconnu

En complément des autres câbles électriques à contrôler :

Placard Technique Electrique
Ancien câble tissé rouge susceptible de contenir de l'amiante
En tension au jour du contrôle
Cheminement inconnu

UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE
Affaire N° 7129567-1
Tribunal de Grande Instance
173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny
Planche de repérage 33 - Le 17 juillet 2018
Niveau R+2 / 2ème étage / TGI
Locaux ou zones non visibles et accessibles - Matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante

| **Planche de repérage** (*la planche de repérage est indissociable du rapport)* | | |
|---|---|---|
| Site : Tribunal de Grande Instance de Bobigny | Adresse : 169-173 avenue Paul Vaillant Couturier 93000 BOBIGNY | Localisation : Niveau : 2ème étage / TGI |
| Réalisé par : Didier DENAVEAUT | N° de planche : 33 / 63 | |



| | |
|---|---|
| | Joint type tresse de dilatation en mousse grise sous couvre joint métallique<br>Présence d'amiante sur résultat(s) d'analyse(s) |
| "HORS PROGRAMME DE TRAVAUX"<br>Matériau identifié à proximité des installations électriques<br>(sols, murs et plafonds sous couvre-joints métalliques) | |

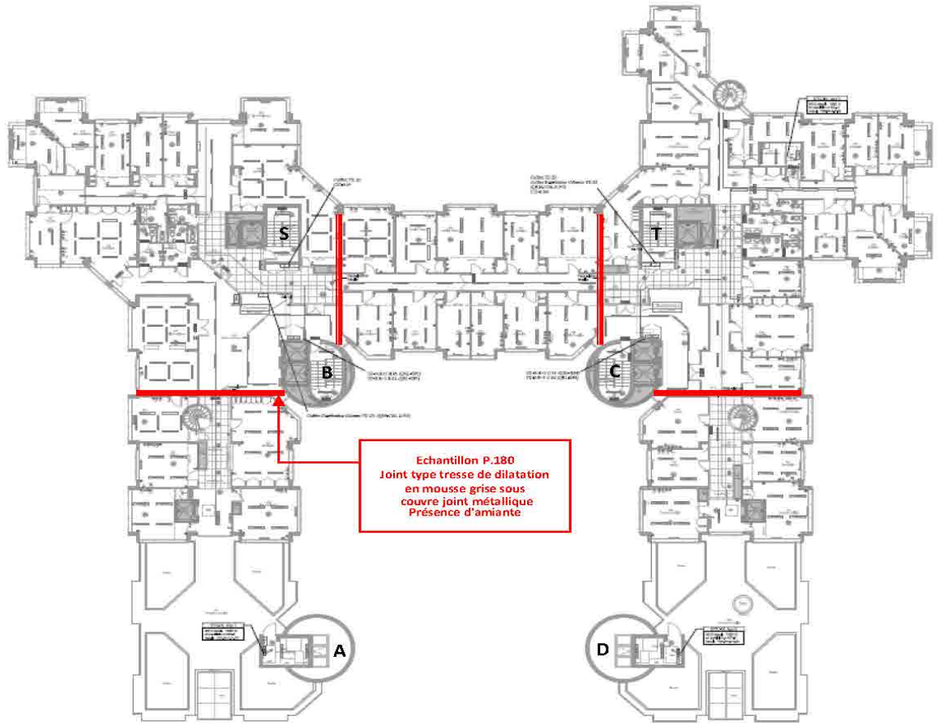


UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE
Affaire N° 7129567-1
Tribunal de Grande Instance
173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny
Planche de repérage 34 - Le 17 juillet 2018
Niveau R+3 / 3ème étage / TGI
Matériaux ou produits contenant de l'amiante

| **Planche de repérage** (*la planche de repérage est indissociable du rapport)* | | |
|---|---|---|
| Site : Tribunal de Grande Instance de Bobigny | Adresse : 169-173 avenue Paul Vaillant Couturier 93000 BOBIGNY | Localisation : Niveau : 3ème étage / TGI |
| Réalisé par : Didier DENAVEAUT | N° de planche : 34 / 63 | |



| | |
|---|---|
| | Flocage cotonneux en dalle(s) haute(s)<br>Absence d'amiante sur résultat(s) d'analyse(s) |
| ⊗ | Parois des clapets coupe-feu - SGEI (plâtre avec protection aluminium)<br>Absence d'amiante sur résultat(s) d'analyse(s) |
| ▯ | Faux-plafonds 600x600 métalliques à résille maille carrée<br>Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante |
| ▯ | Panneaux isolants sur murs et plafonds type "Fibralith"<br>Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante |

Matériaux ou produits qui par nature ne contiennent pas d'amiante selon présence
Murs et cloisons maçonnées de type voiles béton et murs en parpaings/briques avec ou sans enduits ciment de dressage et carreaux de plâtre
Plafonds et poutres béton
Conduits de fluides type fonte, cuivre, acier, PVC
Calorifugeages type tube isolant préfendu en mousse polyéthylène noir ou gris sur conduits de fluides
Calorifuges sur conduits de fluides (matelas laine/alu) avec étanchéités en scotch alu et CLIMAVER
Faux-plafonds à lames bois dans sanitaires
Panneaux d'impostes sur portes d'accès et coupe-feu
Tissus muraux et toiles de verre peintes
Cloisons sèches et amovibles en plaques de plâtre

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.43
Revêtement de mur
Peinture gouttelettes beige
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.44
Flocage en dalle haute
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.45
Revêtement de mur
Peinture gouttelettes beige
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.46
Flocage en dalle haute
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.37
Revêtement de mur
Peinture gouttelettes beige
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.38
Flocage en dalle haute
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.35
Revêtement de mur
Peinture gouttelettes beige
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.36
Flocage en dalle haute
Absence d'amiante

Travaux de peinture en "2017"

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.10
Revêtement de mur
Tissu mural gris
Absence d'amiante

Echantillon P.176
Revêtement de mur
Peinture gouttelettes gris
Absence d'amiante

Echantillon P.177
Revêtement de plafond
Peinture gouttelettes gris
Absence d'amiante

Echantillon P.178
Placard technique électrique
Rebouchage plâtreux autour chemin de câbles - Plancher
Absence d'amiante

Echantillon P.179
Rebouchage en mousse injectée jaune autour du chemin de câbles en pénétration dans imposte
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.09
Revêtement de mur
Peinture gouttelettes beige
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.48
Flocage en dalle haute
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.39
Revêtement de mur
Tissu mural gris
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.40
Flocage en dalle haute
Absence d'amiante

Echantillon P.175
Revêtement de plafond
Peinture gouttelettes beige
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.14
Revêtement de mur
Peinture gouttelettes beige
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.31
Revêtement de mur
Peinture gouttelettes beige
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.32
Flocage en dalle haute
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.33
Revêtement de mur
Peinture gouttelettes beige
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.34
Revêtement de plafond
Peinture gouttelettes beige
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.41
Revêtement de mur
Tissu mural gris
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.42
Revêtement de plafond
Peinture décorative blanche
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.47
Flocage en dalle haute
Absence d'amiante

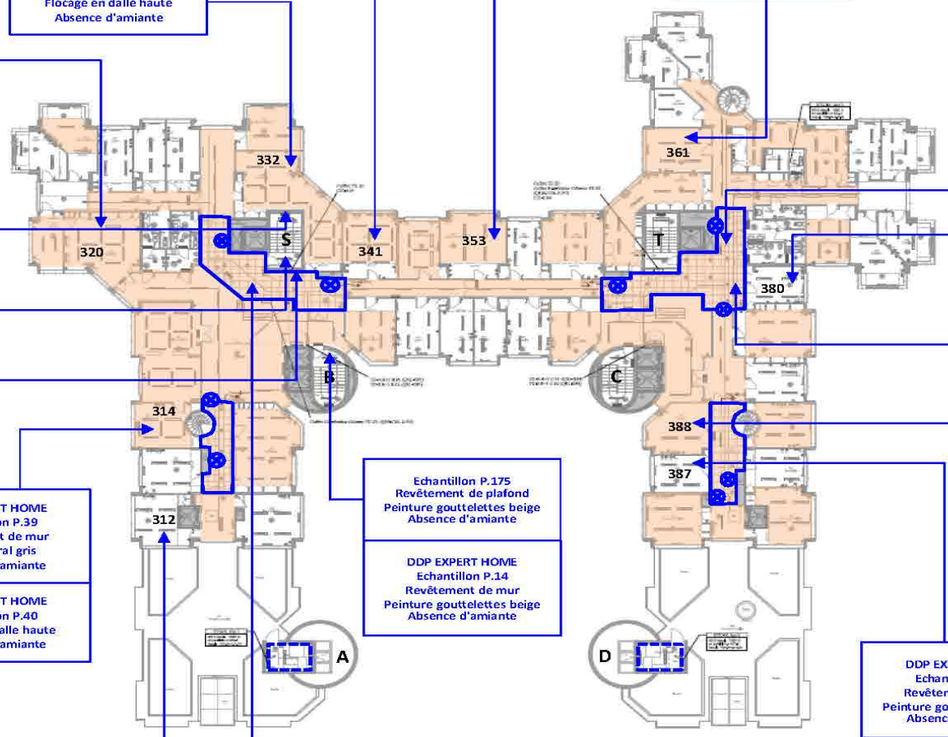


UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE
Affaire N° 7129567-1
Tribunal de Grande Instance
173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny
Planche de repérage 35 - Le 17 juillet 2018
Niveau R+3 / 3ème étage / TGI
Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

| **Planche de repérage** (*la planche de repérage est indissociable du rapport)* | | |
|---|---|---|
| Site : Tribunal de Grande Instance de Bobigny | Adresse : 169-173 avenue Paul Vaillant Couturier 93000 BOBIGNY | Localisation : Niveau : 3ème étage / TGI |
| Réalisé par : Didier DENAVEAUT | N° de planche : 35 / 63 | |



| | |
|---|---|
| | Isolants des câbles électriques susceptibles de contenir de l'amiante En tension au jour du contrôle |
| | Vides des plénums difficiles d'accès Faux-plafonds bois doués |
| | Vides des plénums sous gaines, coffres et plafonds plâtre non visibles et accessibles |
| | Locaux non visibles et accessibles |

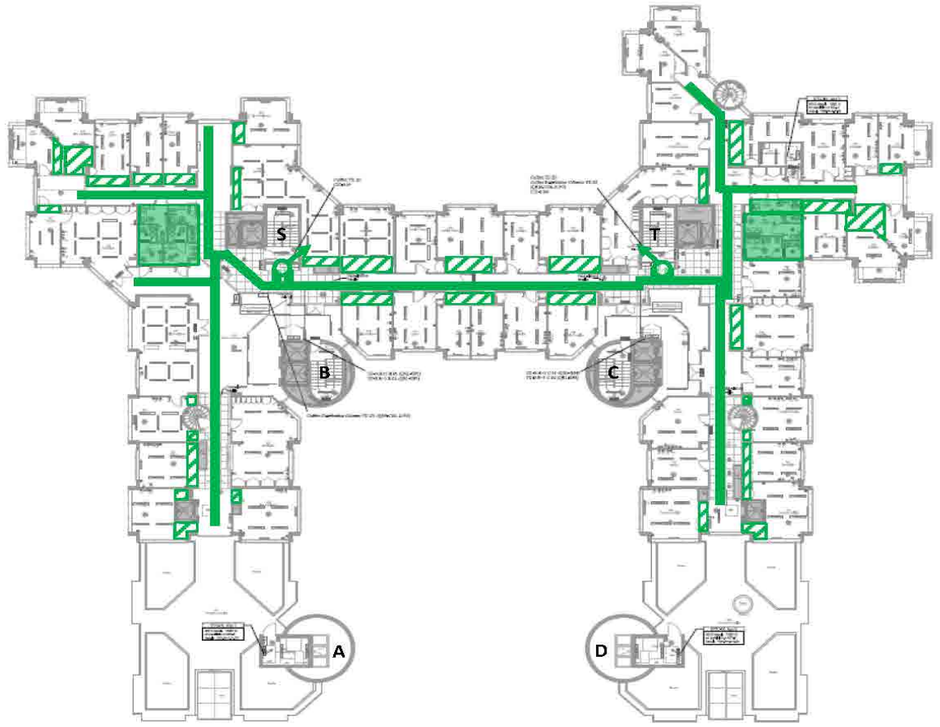


UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE
Affaire N° 7129567-1
Tribunal de Grande Instance
173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny
Planche de repérage 36 - Le 17 juillet 2018
Niveau R+3 / 3ème étage / TGI
Locaux ou zones non visibles et accessibles - Matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante

| **Planche de repérage** (*la planche de repérage est indissociable du rapport)* | | |
|---|---|---|
| Site : Tribunal de Grande Instance de Bobigny | Adresse : 169-173 avenue Paul Vaillant Couturier 93000 BOBIGNY | Localisation : Niveau : 3ème étage / TGI |
| Réalisé par : Didier DENAVEAUT | N° de planche : 36 / 63 | |


Copyright BUREAU VERITAS



| | |
|---|---|
| | Joint type tresse de dilatation en mousse grise sous couvre joint métallique<br>Présence d'amiante sur résultat(s) d'analyse(s) |
| "HORS PROGRAMME DE TRAVAUX"<br>Matériau identifié à proximité des installations électriques<br>(sols, murs et plafonds sous couvre-joints métalliques) | |

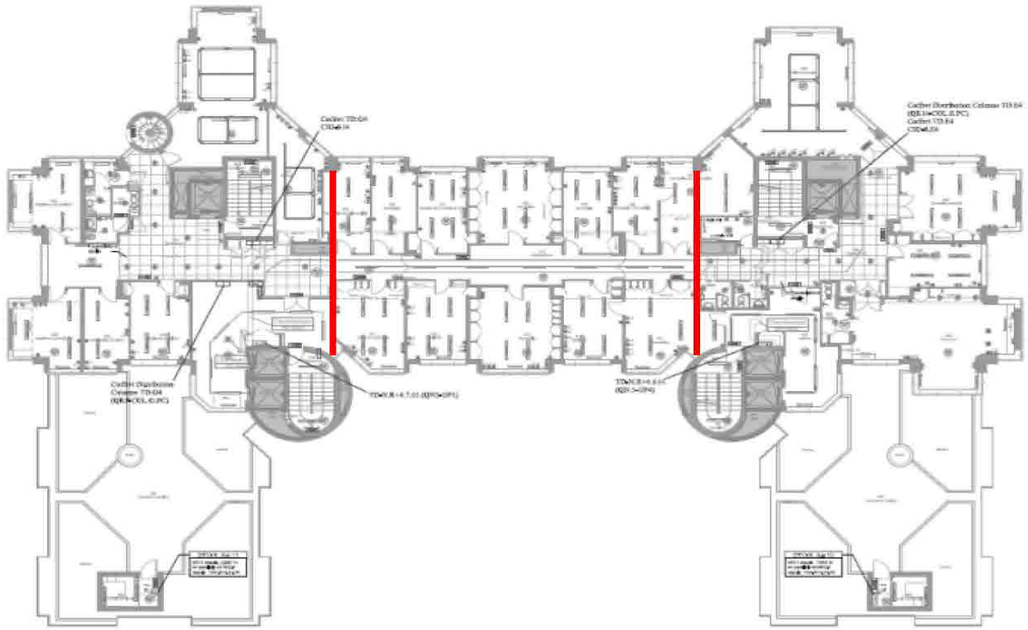

UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE
Affaire N° 7129567-1
Tribunal de Grande Instance
173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny
Planche de repérage 37 - Le 17 juillet 2018
Niveau R+4 / 4ème étage / TGI
Matériaux ou produits contenant de l'amiante

| **Planche de repérage** (*la planche de repérage est indissociable du rapport*) | | |
|---|---|---|
| Site : Tribunal de Grande Instance de Bobigny | Adresse : 169-173 avenue Paul Vaillant Couturier 93000 BOBIGNY | Localisation : Niveau : 4ème étage / TGI |
| Réalisé par : Didier DENAVEAUT | N° de planche : 37 / 63 | |


Copyright BUREAU VERITAS



| | |
|---|---|
| | Flocage cotonneux en dalle(s) haute(s)<br>Absence d'amiante sur résultat(s) d'analyse(s) |
| ⊗ | Parois des clapets coupe-feu - SGEI (plâtre avec protection aluminium)<br>Absence d'amiante sur résultat(s) d'analyse(s) |
| □ | Faux-plafonds 600x600 métalliques à résille maille carrée<br>Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante |
| ▭ | Panneaux isolants sur murs et plafonds type "Fibralith"<br>Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante |

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.72
Revêtement de mur
Peinture gouttelettes beige
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.73
Flocage en dalle haute
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.66
Revêtement de mur
Peinture gouttelettes beige
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.67
Revêtement de plafond
Peinture gouttelettes beige
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.06
Flocage en dalle haute
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.84
Flocage en dalle haute
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.08
Flocage en dalle haute
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.85
Flocage en dalle haute
Absence d'amiante

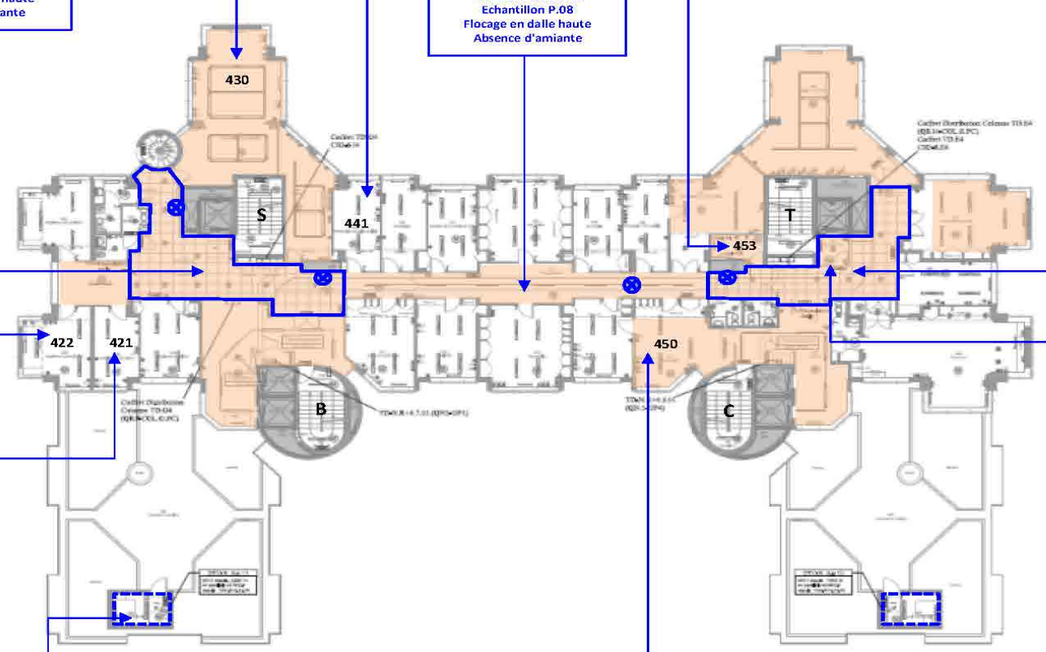


DDP EXPERT HOME
Echantillon P.70
Revêtement de mur
Tissu mural gris
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.71
Revêtement de plafond
Peinture décorative blanche
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.68
Revêtement de mur
Peinture gouttelettes beige
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.69
Revêtement de plafond
Peinture gouttelettes beige
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.07
Mousse injectée autour
chemin de câbles dans cloison
Absence d'amiante

Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
Gaines à parois plâtre

Matériaux ou produits qui par nature ne contiennent pas d'amiante selon présence
Murs et cloisons maçonnées de type voiles béton et murs en parpaings/briques avec ou sans enduits ciment de dressage et carreaux de plâtre
Plafonds et poutres béton
Conduits de fluides type fonte, cuivre, acier, PVC
Calorifugeages type tube isolant préfendu en mousse polyéthylène noir ou gris sur conduits de fluides
Calorifuges sur conduits de fluides (matelas laine/alu) avec étanchéités en scotch alu et CLIMAVER
Faux-plafonds à lames bois dans sanitaires
Panneaux d'impostes sur portes d'accès et coupe-feu
Tissus muraux et toiles de verre peintes
Cloisons sèches et amovibles en plaques de plâtre

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.74
Revêtement de mur
Peinture gouttelettes beige
Absence d'amiante

DDP EXPERT HOME
Echantillon P.75
Flocage en dalle haute
Absence d'amiante

Murs : Toile de verre peinte
Travaux récents

UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE
Affaire N° 7129567-1
Tribunal de Grande Instance
173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny
Planche de repérage 38 - Le 17 juillet 2018
Niveau R+4 / 4ème étage / TGI
Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

| **Planche de repérage** (*la planche de repérage est indissociable du rapport)* | | |
|---|---|---|
| Site : Tribunal de Grande Instance de Bobigny | Adresse : 169-173 avenue Paul Vaillant Couturier 93000 BOBIGNY | Localisation : Niveau : 4ème étage / TGI |
| Réalisé par : Didier DENAVEAUT | N° de planche : 38 / 63 | |



| | |
|---|---|
| | Isolants des câbles électriques susceptibles de contenir de l'amiante En tension au jour du contrôle |
| | Vides des plénums difficiles d'accès Faux-plafonds bois cloués |
| | Vides des plénums sous gaines, coffres et plafonds plâtre non visibles et accessibles |
| | Locaux non visibles et accessibles |

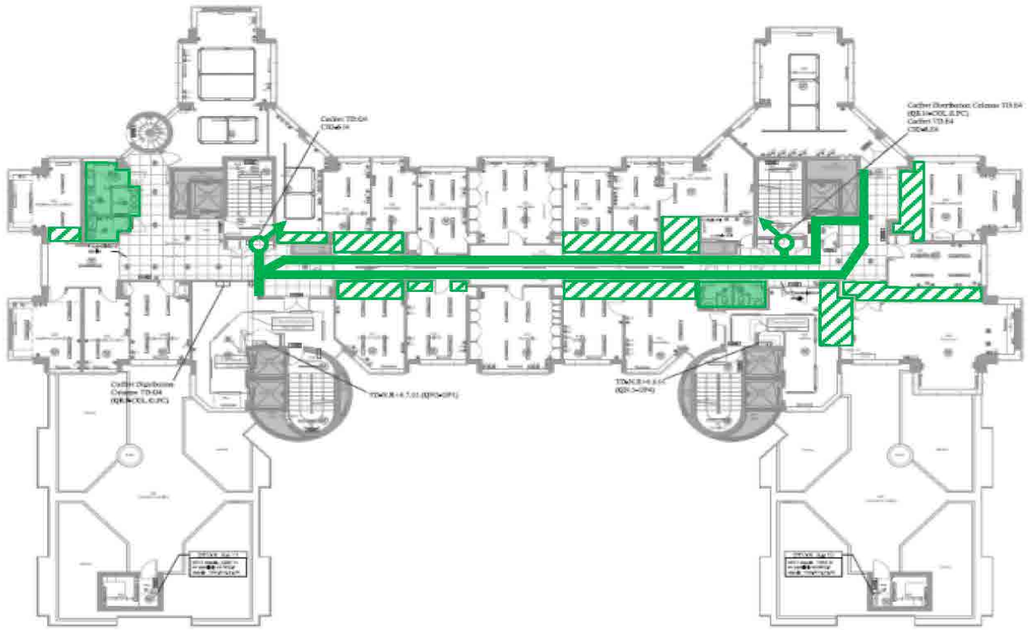

UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE
Affaire N° 7129567-1
Tribunal de Grande Instance
173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny
Planche de repérage 39 - Le 17 juillet 2018
Niveau R+4 / 4ème étage / TGI
Locaux ou zones non visibles et accessibles - Matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante

| **Planche de repérage** (*la planche de repérage est indissociable du rapport*) | | |
|---|---|---|
| Site : Tribunal de Grande Instance de Bobigny | Adresse : 169-173 avenue Paul Vaillant Couturier 93000 BOBIGNY | Localisation : Niveau : 4ème étage / TGI |
| Réalisé par : Didier DENAVEAUT | N° de planche : 39 / 63 | |


Copyright BUREAU VERITAS



| | |
|---|---|
| | Joint type tresse de dilatation en mousse grise sous couvre joint métallique<br>Présence d'amiante sur résultat(s) d'analyse(s) |
| "HORS PROGRAMME DE TRAVAUX"<br>Matériau identifié à proximité des installations électriques<br>(sols, murs et plafonds sous couvre-joints métalliques) | |

| | |
|---|---|
| Société INNAX /Rapport N° 40_PJ<br>BOBIGNY_RPINNAX-DTA en date du 07/06/2017<br>Enveloppes bitumineuses sur conduits de fluides<br>Présence d'amiante sur document | |
| "HORS PROGRAMME DE TRAVAUX"<br>Matériau identifié à proximité des installations électriques | |

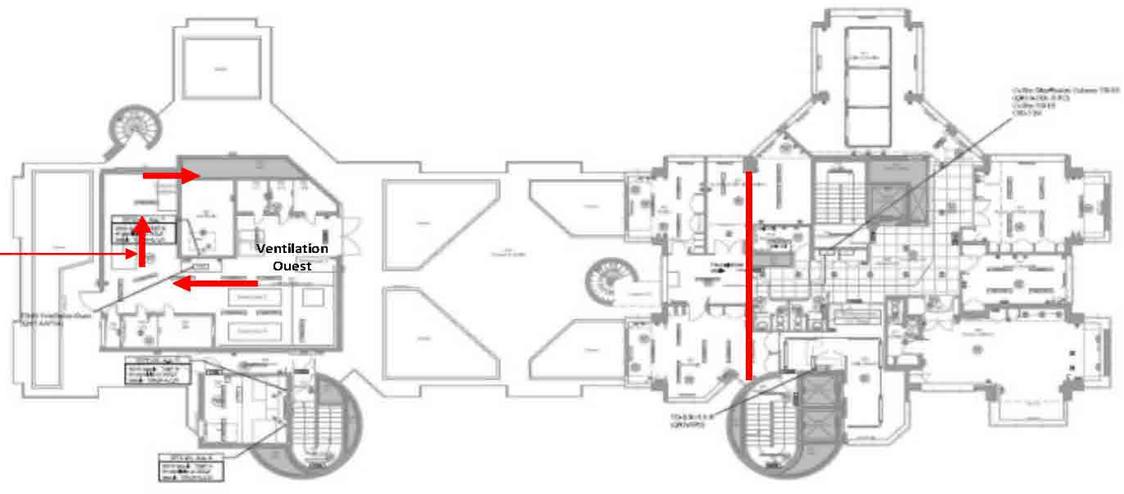


UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE
Affaire N° 7129567-1
Tribunal de Grande Instance
173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny
Planche de repérage 40 - Le 17 juillet 2018
Niveau R+5 / 5ème étage / TGI
Matériaux ou produits contenant de l'amiante

| **Planche de repérage** (*la planche de repérage est indissociable du rapport*) | | |
|---|---|---|
| Site : Tribunal de Grande Instance de Bobigny | Adresse : 169-173 avenue Paul Vaillant Couturier 93000 BOBIGNY | Localisation : Niveau : 5ème étage / TGI |
| Réalisé par : Didier DENAVEAUT | N° de planche : 40 / 63 | |


Copyright BUREAU VERITAS



| | |
|---|---|
| | Flocage cotonneux en dalle(s) haute(s)<br>Absence d'amiante sur résultat(s) d'analyse(s) |
| ⊗ | Parois des clapets coupe-feu - SGEI (plâtre avec protection aluminium)<br>Absence d'amiante sur résultat(s) d'analyse(s) |
| ▯ | Faux-plafonds 600x600 métalliques à résille maille carrée<br>Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante |
| ▯ | Panneaux isolants sur murs et plafonds type "Fibralith"<br>Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante<br>Confirmation par DDP EXPERT HOME |

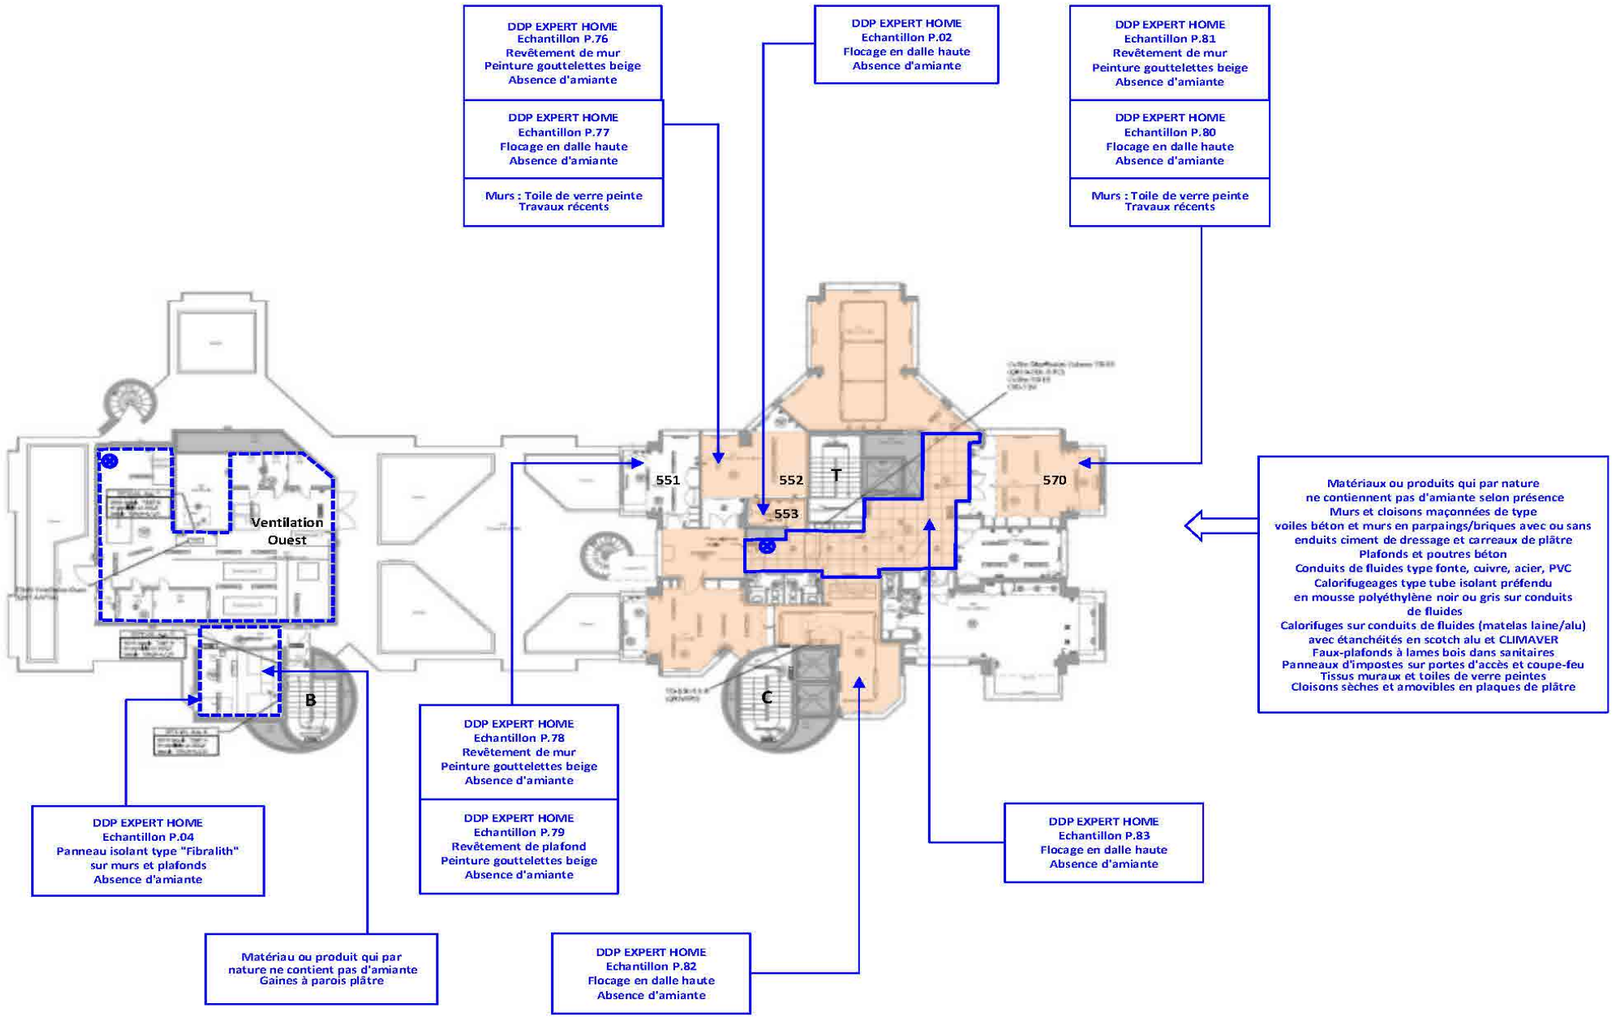


UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE
Affaire N° 7129567-1
Tribunal de Grande Instance
173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny
Planche de repérage 41 - Le 17 juillet 2018
Niveau R+5 / 5ème étage / TGI
Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

| **Planche de repérage** (*la planche de repérage est indissociable du rapport)* | | |
|---|---|---|
| Site : Tribunal de Grande Instance de Bobigny | Adresse : 169-173 avenue Paul Vaillant Couturier 93000 BOBIGNY | Localisation : Niveau : 5ème étage / TGI |
| Réalisé par : Didier DENAVEAUT | N° de planche : 41 / 63 | |



| | |
|---|---|
| | Isolants des câbles électriques susceptibles de contenir de l'amiante En tension au jour du contrôle |
| | Vides des plénums difficiles d'accès Faux-plafonds bois cloués |
| | Vides des plénums sous gaines, coffres et plafonds plâtre non visibles et accessibles |
| | Locaux non visibles et accessibles |

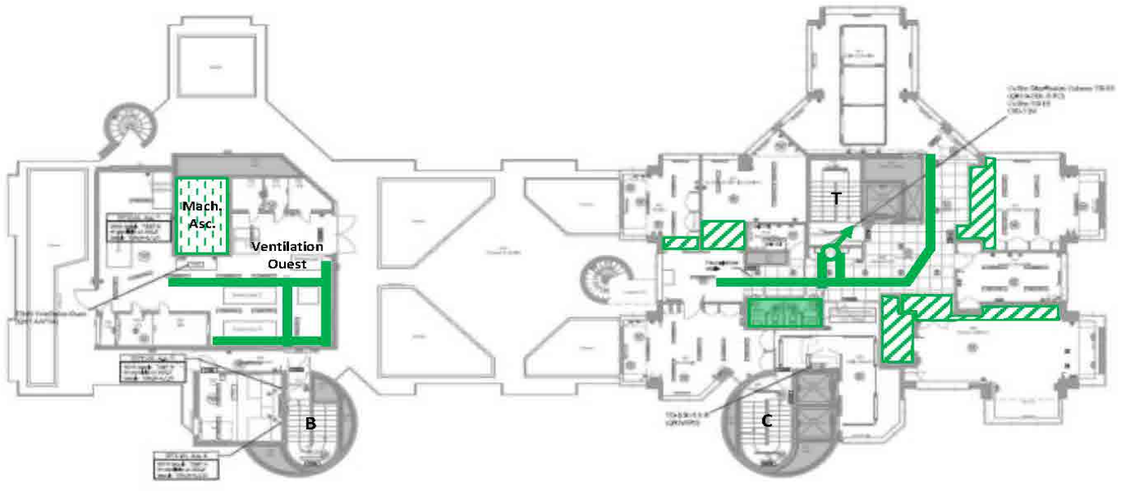


UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE
Affaire N° 7129567-1
Tribunal de Grande Instance
173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny
Planche de repérage 42 - Le 17 juillet 2018
Niveau R+5 / 5ème étage / TGI
Locaux ou zones non visibles et accessibles - Matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante

| **Planche de repérage** (*la planche de repérage est indissociable du rapport*) | | |
|---|---|---|
| Site : Tribunal de Grande Instance de Bobigny | Adresse : 169-173 avenue Paul Vaillant Couturier 93000 BOBIGNY | Localisation : Niveau : 5ème étage / TGI |
| Réalisé par : Didier DENAVEAUT | N° de planche : 42 / 63 | |


Copyright BUREAU VERITAS



| | |
|---|---|
| | Joint type tresse de dilatation en mousse grise sous couvre joint métallique<br>Présence d'amiante sur résultat(s) d'analyse(s) |
| | "HORS PROGRAMME DE TRAVAUX"<br>Matériau identifié à proximité des installations électriques<br>(sols, murs et plafonds sous couvre-joints métalliques) |

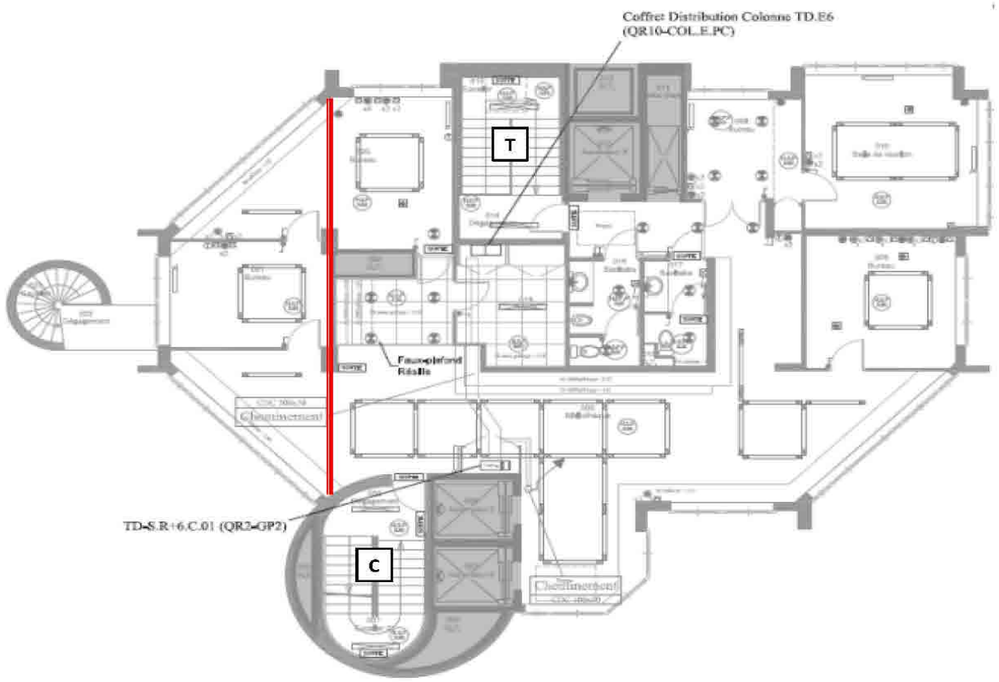


UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE
Affaire N° 7129567-1
Tribunal de Grande Instance
173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny
Planche de repérage 43 - Le 17 juillet 2018
Niveau R+6 / 6ème étage / TGI
Matériaux ou produits contenant de l'amiante

| **Planche de repérage** (*la planche de repérage est indissociable du rapport)* | | |
|---|---|---|
| Site : Tribunal de Grande Instance de Bobigny | Adresse : 169-173 avenue Paul Vaillant Couturier 93000 BOBIGNY | Localisation : Niveau : 6ème étage / TGI |
| Réalisé par : Didier DENAVEAUT | N° de planche : 43 / 63 | |



| | |
|---|---|
| | Flocage cotonneux en dalle(s) haute(s)<br>Absence d'amiante sur résultat(s) d'analyse(s) |
| ⊗ | Parois des clapets coupe-feu - SGEI (plâtre avec protection aluminium)<br>Absence d'amiante sur résultat(s) d'analyse(s) |
| ▯ | Faux-plafonds 600x600 métalliques à résille maille carrée<br>Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante |
| ▯ | Panneaux isolants sur murs et plafonds type "Fibralith"<br>Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante<br>Confirmation par DDP EXPERT HOME |

Matériaux ou produits qui par nature ne contiennent pas d'amiante selon présence
Murs et cloisons maçonnées de type voiles béton et murs en parpaings/briques avec ou sans enduits ciment de dressage et carreaux de plâtre
Plafonds et poutres béton
Conduits de fluides type fonte, cuivre, acier, PVC
Calorifugeages type tube isolant préfendu en mousse polyéthylène noir ou gris sur conduits de fluides
Calorifuges sur conduits de fluides (matelas laine/alu) avec étanchéités en scotch alu et CLIMAVER
Faux-plafonds à lames bois dans sanitaires
Panneaux d'impostes sur portes d'accès et coupe-feu
Tissus muraux et toiles de verre peintes
Cloisons sèches et amovibles en plaques de plâtre

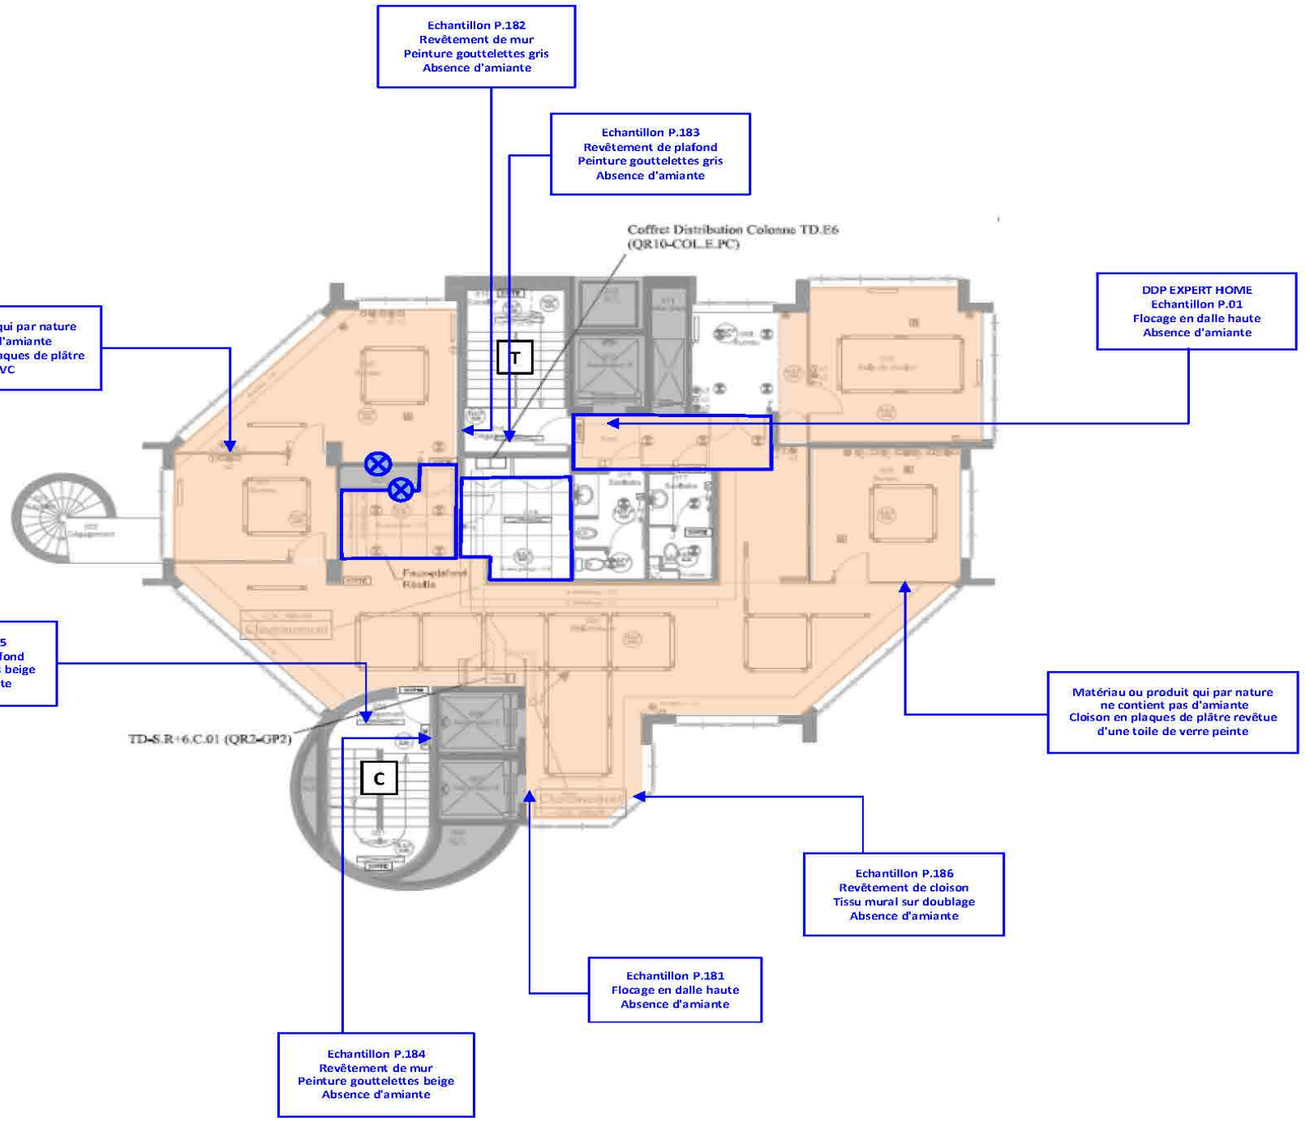


UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE
Affaire N° 7129567-1
Tribunal de Grande Instance
173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny
Planche de repérage 44 - Le 17 juillet 2018
Niveau R+6 / 6ème étage / TGI
Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

| **Planche de repérage** (*la planche de repérage est indissociable du rapport)* | | |
|---|---|---|
| Site : Tribunal de Grande Instance de Bobigny | Adresse : 169-173 avenue Paul Vaillant Couturier 93000 BOBIGNY | Localisation : Niveau : 6ème étage / TGI |
| Réalisé par : Didier DENAVEAUT | N° de planche : 44 / 63 | |



| | |
|---|---|
| | Isolants des câbles électriques susceptibles de contenir de l'amiante En tension au jour du contrôle |
| | Vides des plénums difficiles d'accès Faux-plafonds bois doués |
| | Vides des plénums sous gaines, coffres et plafonds plâtre non visibles et accessibles |
| | Locaux non visibles et accessibles |

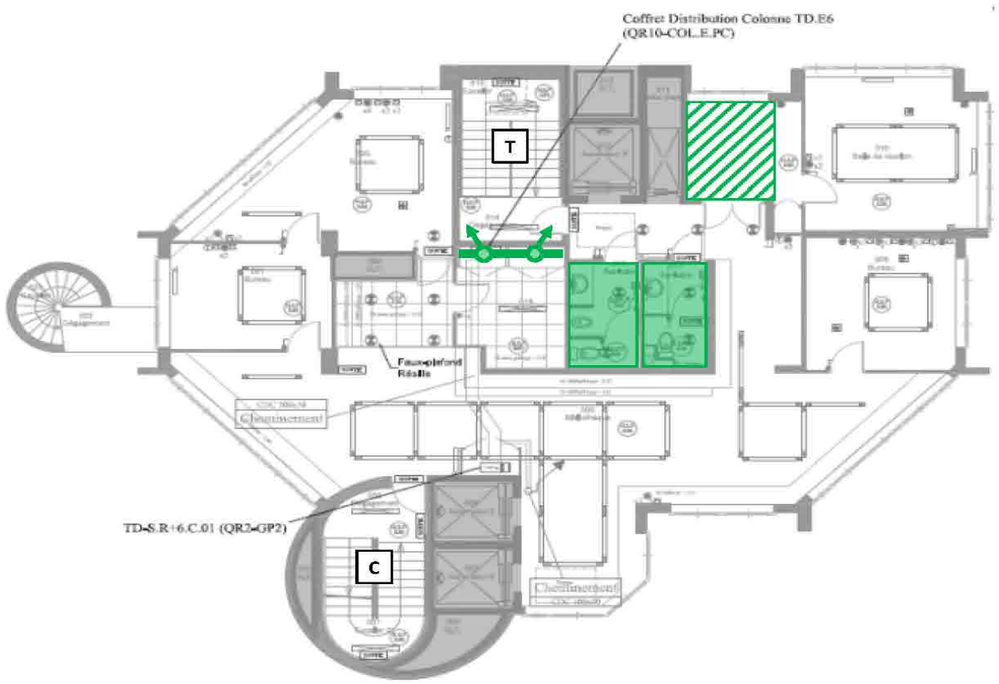


UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE
Affaire N° 7129567-1
Tribunal de Grande Instance
173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny
Planche de repérage 45 - Le 17 juillet 2018
Niveau R+6 / 6ème étage / TGI
Locaux ou zones non visibles et accessibles - Matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante

| **Planche de repérage** (*la planche de repérage est indissociable du rapport)* | | |
|---|---|---|
| Site : Tribunal de Grande Instance de Bobigny | Adresse : 169-173 avenue Paul Vaillant Couturier 93000 BOBIGNY | Localisation : Niveau : 6ème étage / TGI |
| Réalisé par : Didier DENAVEAUT | N° de planche : 45 / 63 | |


Copyright BUREAU VERITAS



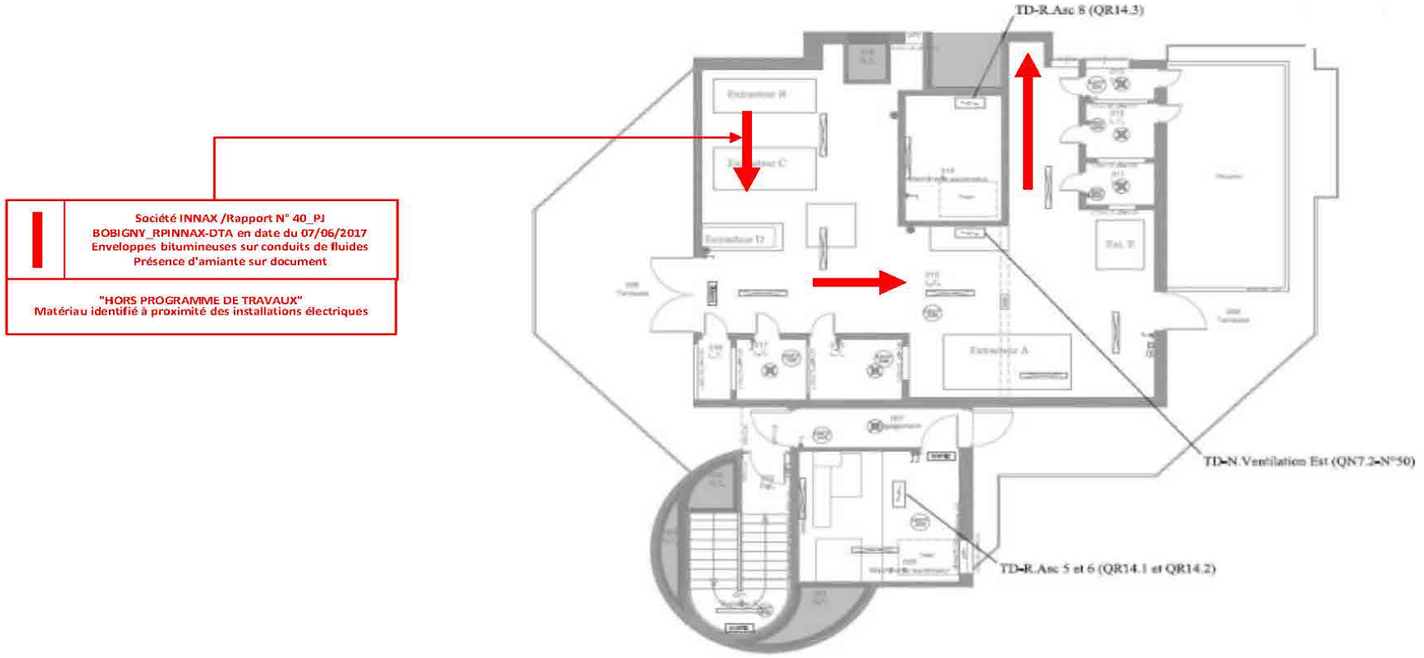


UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE
Affaire N° 7129567-1
Tribunal de Grande Instance
173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny
Planche de repérage 46 - Le 17 juillet 2018
Niveau R+7 / 7ème étage / TGI
Matériaux ou produits contenant de l'amiante

| **Planche de repérage** (*la planche de repérage est indissociable du rapport)* | | |
|---|---|---|
| Site : Tribunal de Grande Instance de Bobigny | Adresse : 169-173 avenue Paul Vaillant Couturier 93000 BOBIGNY | Localisation : Niveau : 7ème étage / TGI |
| Réalisé par : Didier DENAVEAUT | N° de planche : 46 / 63 | |



| | |
|---|---|
| | Flocage cotonneux en dalle(s) haute(s)<br>Absence d'amiante sur résultat(s) d'analyse(s) |
| ⊗ | Parois des clapets coupe-feu - SGEI (plâtre avec protection aluminium)<br>Absence d'amiante sur résultat(s) d'analyse(s) |
| ▯ | Faux-plafonds 600x600 métalliques à résille maille carrée<br>Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante |
| ▯ | Panneaux isolants sur murs et plafonds type "Fibralith"<br>Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante<br>Confirmation par DDP EXPERT HOME |

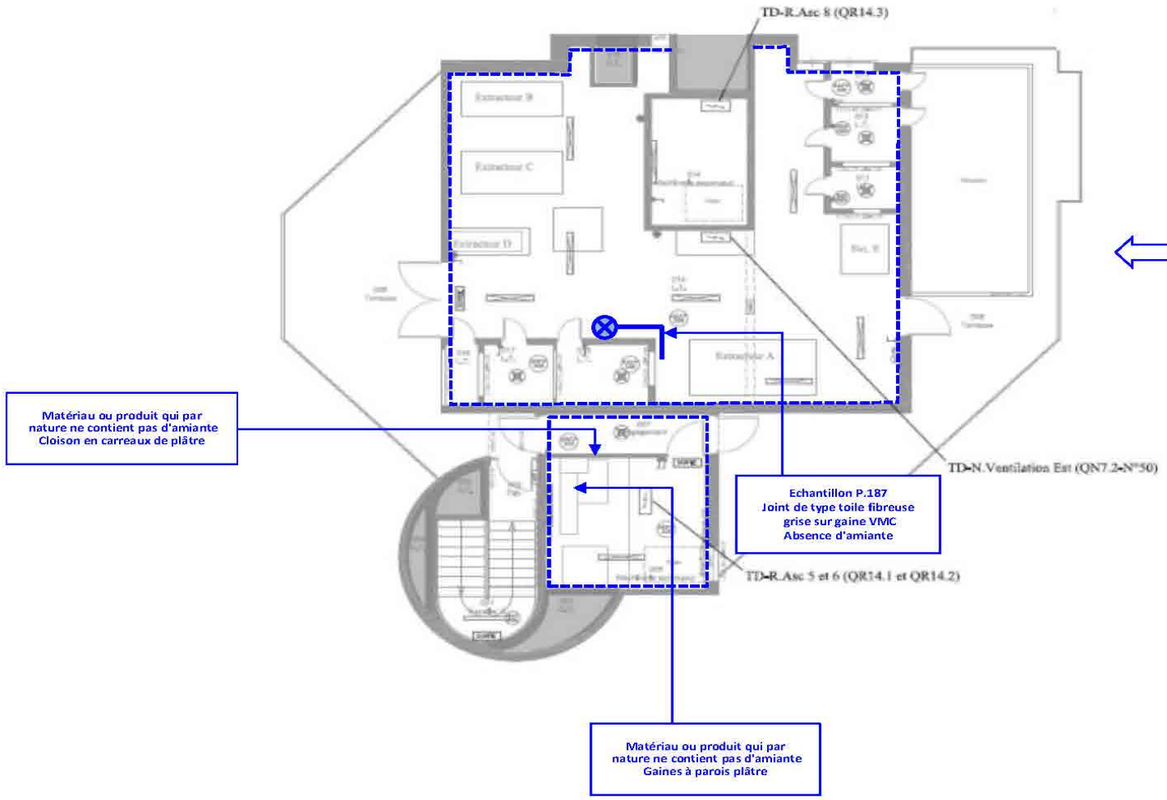


Matériaux ou produits qui par nature
ne contiennent pas d'amiante selon présence
Murs de type voile béton
Conduits de fluides type fonte
Calorifuges sur conduits de fluides (matelas laine/alu)
avec étanchéités en scotch alu et CLIMAVER

Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
Cloison en carreaux de plâtre

Echantillon P.187
Joint de type toile fibreuse grise sur gaine VMC
Absence d'amiante

Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
Gaines à parois plâtre

UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE
Affaire N° 7129567-1
Tribunal de Grande Instance
173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny
Planche de repérage 47 - Le 17 juillet 2018
Niveau R+7 / 7ème étage / TGI
Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

| **Planche de repérage** (*la planche de repérage est indissociable du rapport*) | | |
|---|---|---|
| Site : Tribunal de Grande Instance de Bobigny | Adresse : 169-173 avenue Paul Vaillant Couturier 93000 BOBIGNY | Localisation : Niveau : 7ème étage / TGI |
| Réalisé par : Didier DENAVEAUT | N° de planche : 47 / 63 | |


Copyright BUREAU VERITAS



| | |
|---|---|
| | Isolants des câbles électriques susceptibles de contenir de l'amiante En tension au jour du contrôle |
| | Vides des plénums difficiles d'accès Faux-plafonds bois cloués |
| | Vides des plénums sous gaines, coffres et plafonds plâtre non visibles et accessibles |
| | Locaux non visibles et accessibles |

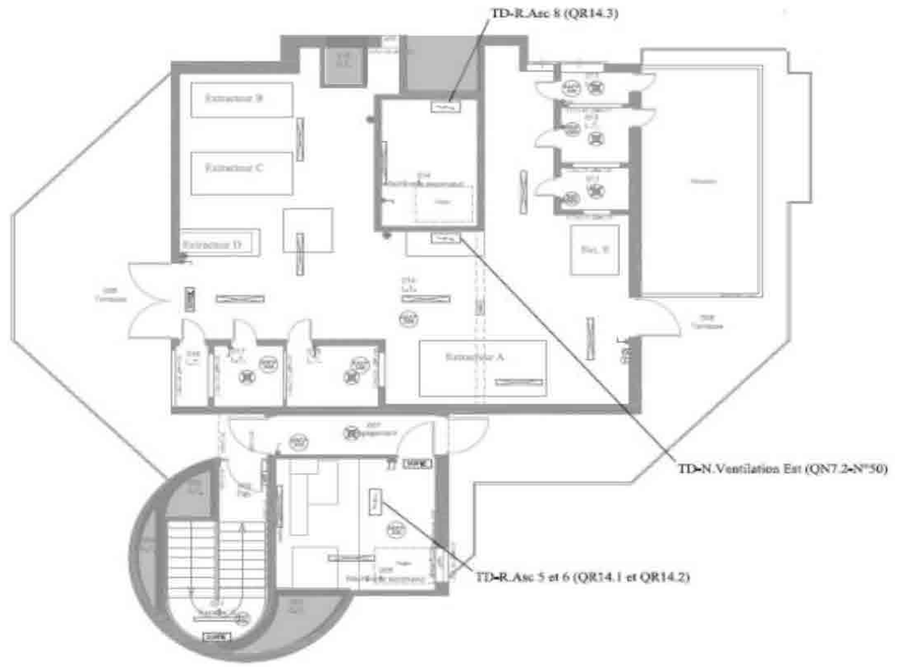


UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE
Affaire N° 7129567-1
Tribunal de Grande Instance
173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny
Planche de repérage 48 - Le 17 juillet 2018
Niveau R+7 / 7ème étage / TGI
Locaux ou zones non visibles et accessibles - Matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante

| **Planche de repérage** (*la planche de repérage est indissociable du rapport)* | | |
|---|---|---|
| Site : Tribunal de Grande Instance de Bobigny | Adresse : 169-173 avenue Paul Vaillant Couturier 93000 BOBIGNY | Localisation : Niveau : 7ème étage / TGI |
| Réalisé par : Didier DENAVEAUT | N° de planche : 48 / 63 | |


Copyright BUREAU VERITAS



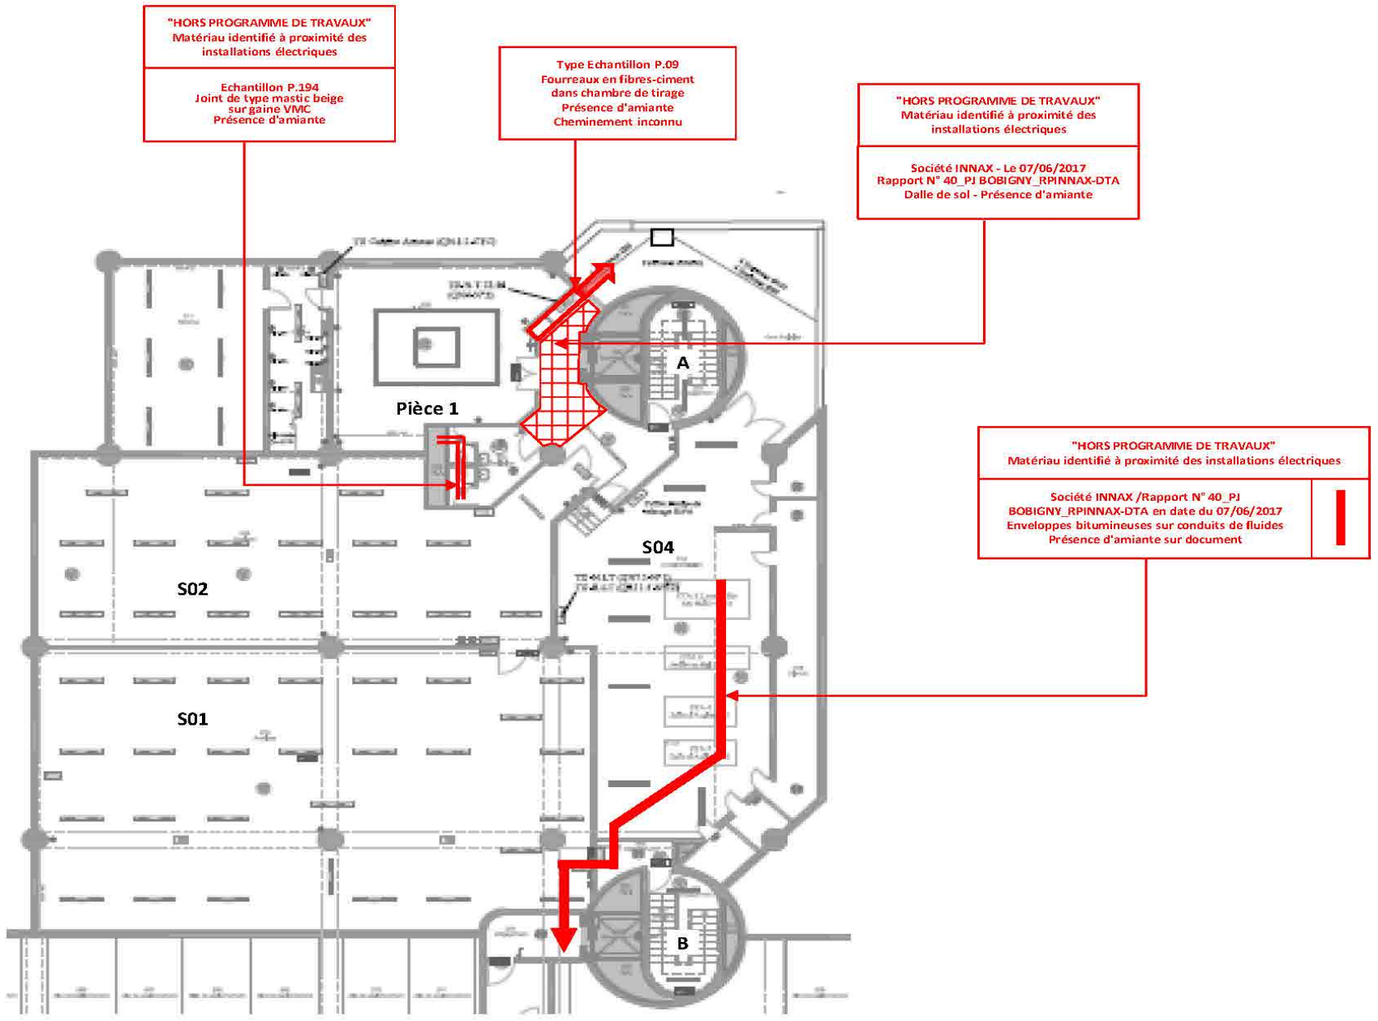


UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE
Affaire N° 7129567-1
Tribunal de Grande Instance
173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny
Planche de repérage 49 - Le 17 juillet 2018
Niveau R-1 / Sous-sol / Bâtiment Annexe
Matériaux ou produits contenant de l'amiante

| **Planche de repérage** (*la planche de repérage est indissociable du rapport)* | | |
|---|---|---|
| Site : Tribunal de Grande Instance de Bobigny | Adresse : 169-173 avenue Paul Vaillant Couturier 93000 BOBIGNY | Localisation : Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe |
| Réalisé par : Didier DENAVEAUT | N° de planche : 49 / 63 | |


Copyright BUREAU VERITAS

| | |
|---|---|
| | Flocage cotonneux en dalle(s) haute(s)<br>Absence d'amiante sur résultat(s) d'analyse(s) |
| ⊗ | Parois des clapets coupe-feu - SGEI (plâtre avec protection aluminium)<br>Absence d'amiante sur résultat(s) d'analyse(s) |
| ▯ | Faux-plafonds 600x600 métalliques à résille maille carrée<br>Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante |
| ▯ | Panneaux isolants sur murs et plafonds type "Fibralith"<br>Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante<br>Confirmation par DDP EXPERT HOME |

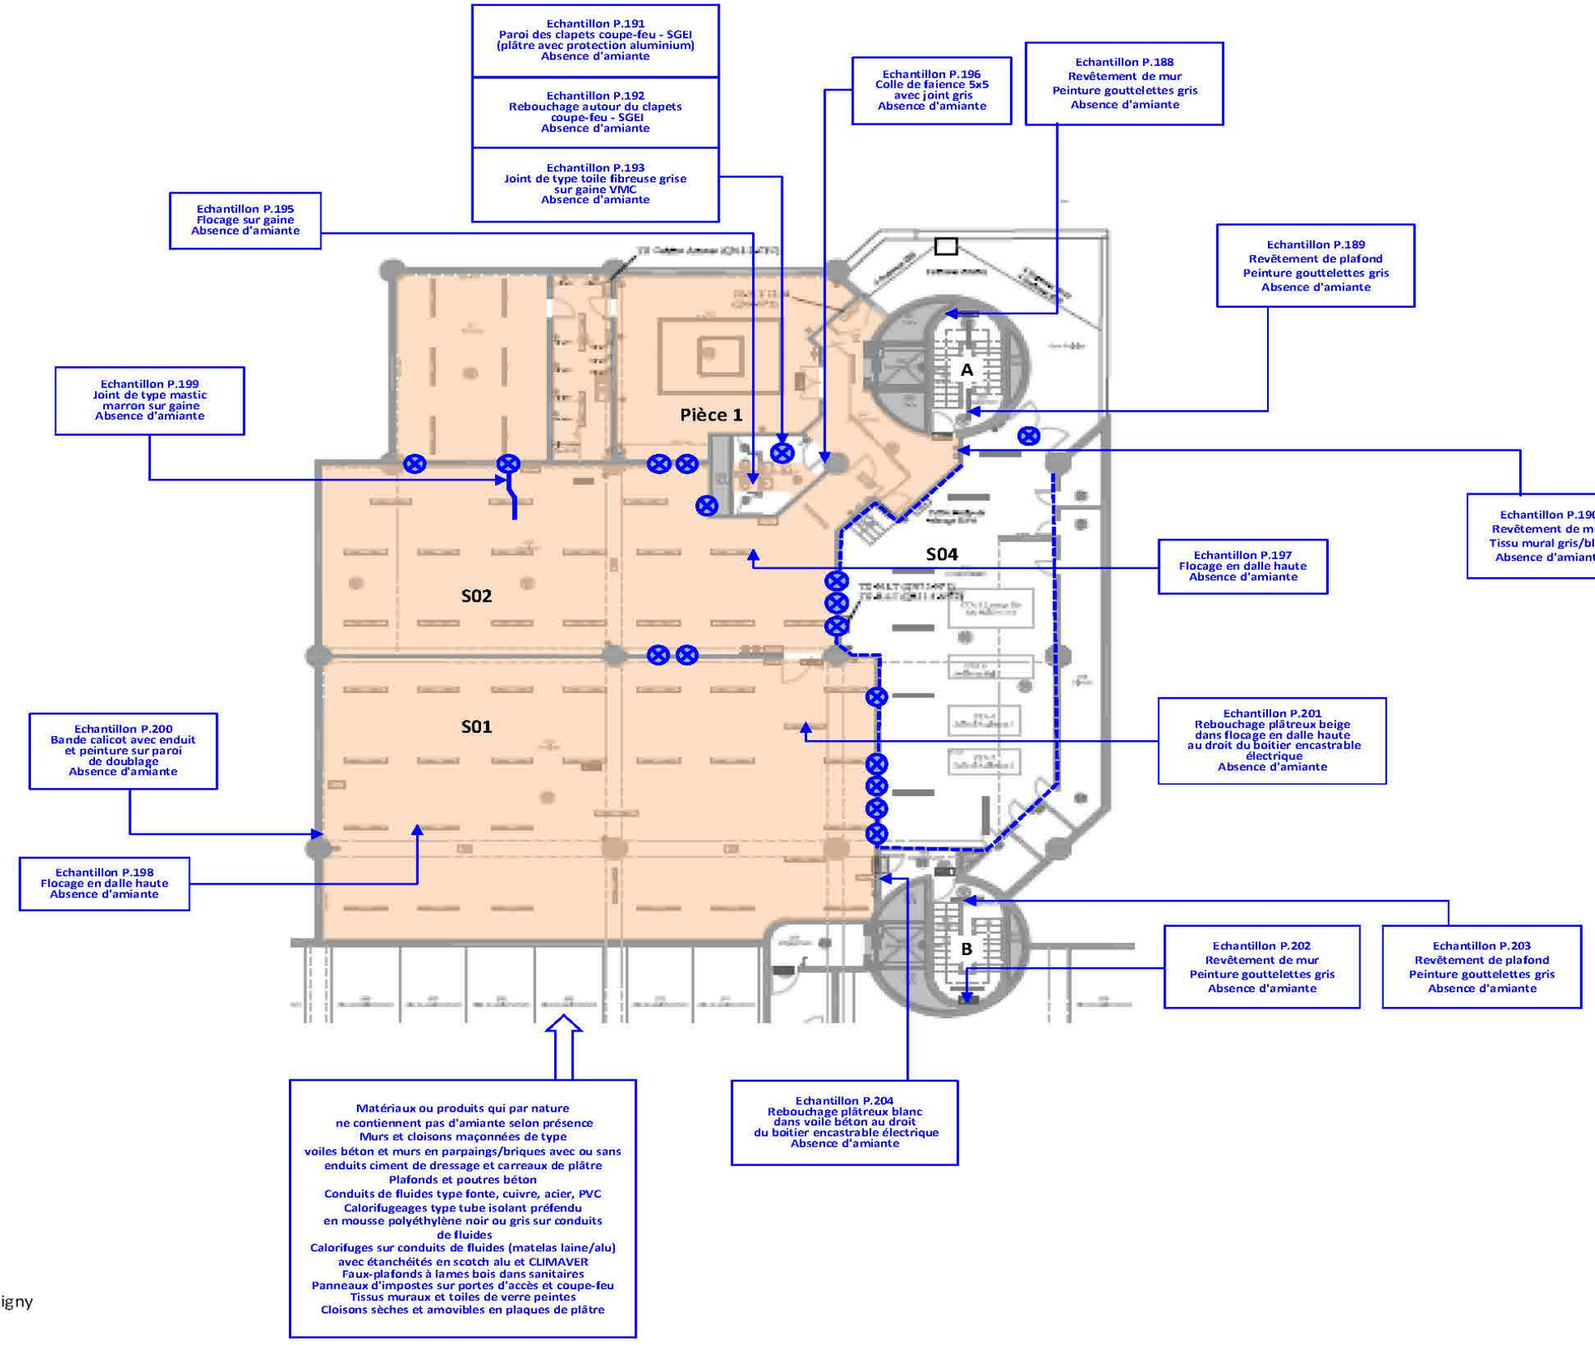


Echantillon P.191
Paroi des clapets coupe-feu - SGEI (plâtre avec protection aluminium)
Absence d'amiante

Echantillon P.192
Rebouchage autour du clapets coupe-feu - SGEI
Absence d'amiante

Echantillon P.193
Joint de type toile fibreuse grise sur gaine VMC
Absence d'amiante

Echantillon P.195
Flocage sur gaine
Absence d'amiante

Echantillon P.196
Colle de faience 5x5 avec joint gris
Absence d'amiante

Echantillon P.188
Revêtement de mur
Peinture gouttelettes gris
Absence d'amiante

Echantillon P.189
Revêtement de plafond
Peinture gouttelettes gris
Absence d'amiante

Echantillon P.199
Joint de type mastic marron sur gaine
Absence d'amiante

Echantillon P.190
Revêtement de mur
Tissu mural gris/bleu
Absence d'amiante

Echantillon P.197
Flocage en dalle haute
Absence d'amiante

Echantillon P.200
Bande calicot avec enduit et peinture sur paroi de doublage
Absence d'amiante

Echantillon P.201
Rebouchage plâtreux beige dans flocage en dalle haute au droit du boitier encastrable électrique
Absence d'amiante

Echantillon P.198
Flocage en dalle haute
Absence d'amiante

Echantillon P.202
Revêtement de mur
Peinture gouttelettes gris
Absence d'amiante

Echantillon P.203
Revêtement de plafond
Peinture gouttelettes gris
Absence d'amiante

Matériaux ou produits qui par nature ne contiennent pas d'amiante selon présence
Murs et cloisons maçonnées de type voiles béton et murs en parpaings/briques avec ou sans enduits ciment de dressage et carreaux de plâtre
Plafonds et poutres béton
Conduits de fluides type fonte, cuivre, acier, PVC
Calorifugeages type tube isolant préfendu en mousse polyéthylène noir ou gris sur conduits de fluides
Calorifuges sur conduits de fluides (matelas laine/alu) avec étanchéités en scotch alu et CLIMAVER
Faux-plafonds à lames bois dans sanitaires
Panneaux d'impostes sur portes d'accès et coupe-feu
Tissus muraux et toiles de verre peintes
Cloisons sèches et amovibles en plaques de plâtre

Echantillon P.204
Rebouchage plâtreux blanc dans voile béton au droit du boitier encastrable électrique
Absence d'amiante

UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE
Affaire N° 7129567-1
Tribunal de Grande Instance
173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny
Planche de repérage 50 - Le 17 juillet 2018
Niveau R-1 / Sous-sol / Bâtiment Annexe
Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

| **Planche de repérage** (*la planche de repérage est indissociable du rapport*) | | |
|---|---|---|
| Site : Tribunal de Grande Instance de Bobigny | Adresse : 169-173 avenue Paul Vaillant Couturier 93000 BOBIGNY | Localisation : Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe |
| Réalisé par : Didier DENAVEAUT | N° de planche : 50 / 63 | |



| | |
|---|---|
| | Isolants des câbles électriques susceptibles de contenir de l'amiante En tension au jour du contrôle |
| | Vides des plénums difficiles d'accès Faux-plafonds bois cloués |
| | Vides des plénums sous gaines, coffres et plafonds plâtre non visibles et accessibles |
| | Locaux non visibles et accessibles |

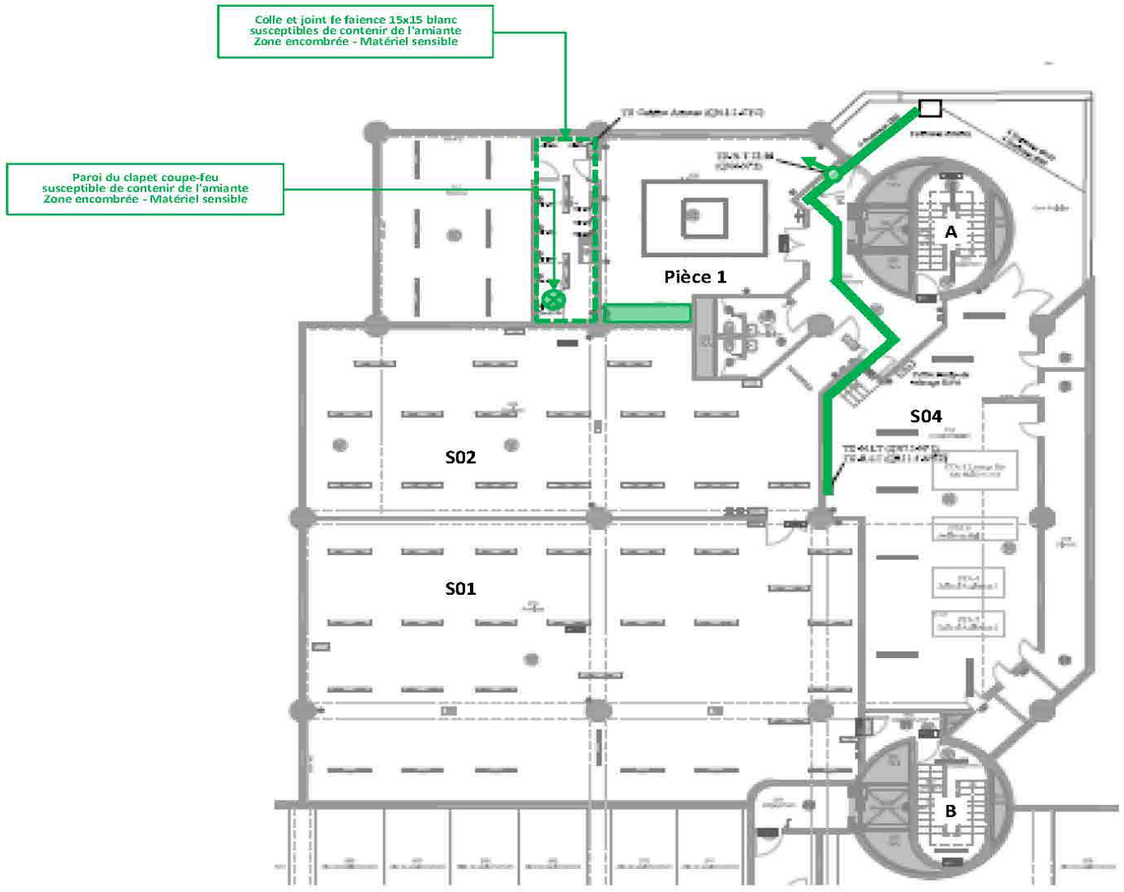


UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE
Affaire N° 7129567-1
Tribunal de Grande Instance
173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny
Planche de repérage 51 - Le 17 juillet 2018
Niveau R-1 / Sous-sol / Bâtiment Annexe
Locaux ou zones non visibles et accessibles - Matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante

| **Planche de repérage** (*la planche de repérage est indissociable du rapport)* | | |
|---|---|---|
| Site : Tribunal de Grande Instance de Bobigny | Adresse : 169-173 avenue Paul Vaillant Couturier 93000 BOBIGNY | Localisation : Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe |
| Réalisé par : Didier DENAVEAUT | N° de planche : 51 / 63 | |



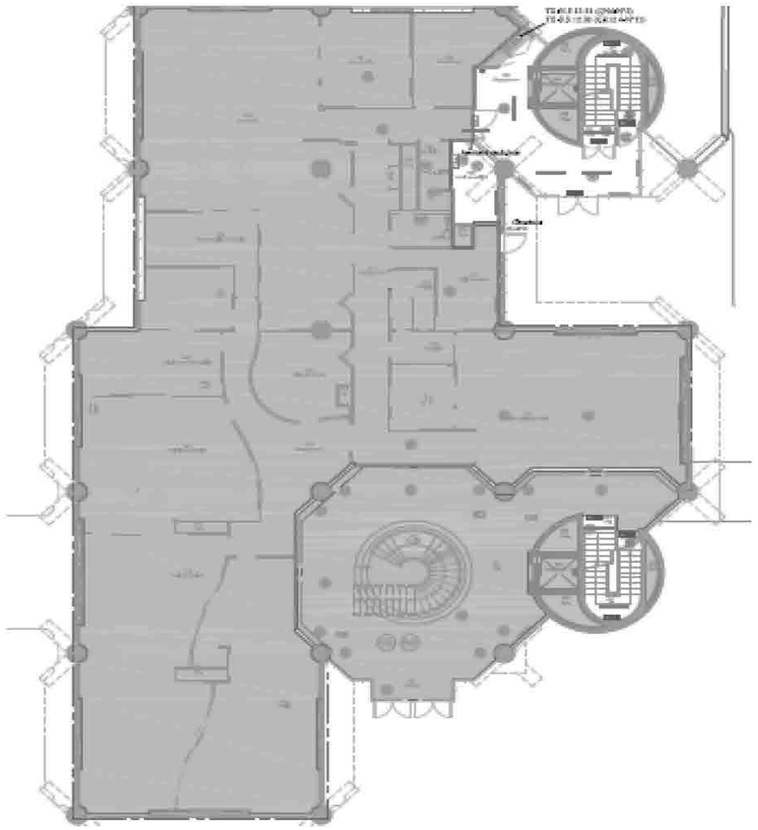

UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE
Affaire N° 7129567-1
Tribunal de Grande Instance
173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny
Planche de repérage 52 - Le 17 juillet 2018
Niveau R+0 / Rez-de-chaussée / Bâtiment Annexe
Matériaux ou produits contenant de l'amiante

| **Planche de repérage** (*la planche de repérage est indissociable du rapport)* | | |
|---|---|---|
| Site : Tribunal de Grande Instance de Bobigny | Adresse : 169-173 avenue Paul Vaillant Couturier 93000 BOBIGNY | Localisation : Niveau R+0 / RDC / Bât. Annexe |
| Réalisé par : Didier DENAVEAUT | N° de planche : 52 / 63 | |



| | |
|---|---|
| | Flocage cotonneux en dalle(s) haute(s)<br>Absence d'amiante sur résultat(s) d'analyse(s) |
| ⊗ | Parois des clapets coupe-feu - SGEI (plâtre avec protection aluminium)<br>Absence d'amiante sur résultat(s) d'analyse(s) |
| ▯ | Faux-plafonds 600x600 métalliques à résille maille carrée<br>Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante |
| ▯ | Panneaux isolants sur murs et plafonds type "Fibralith"<br>Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante<br>Confirmation par DDP EXPERT HOME |

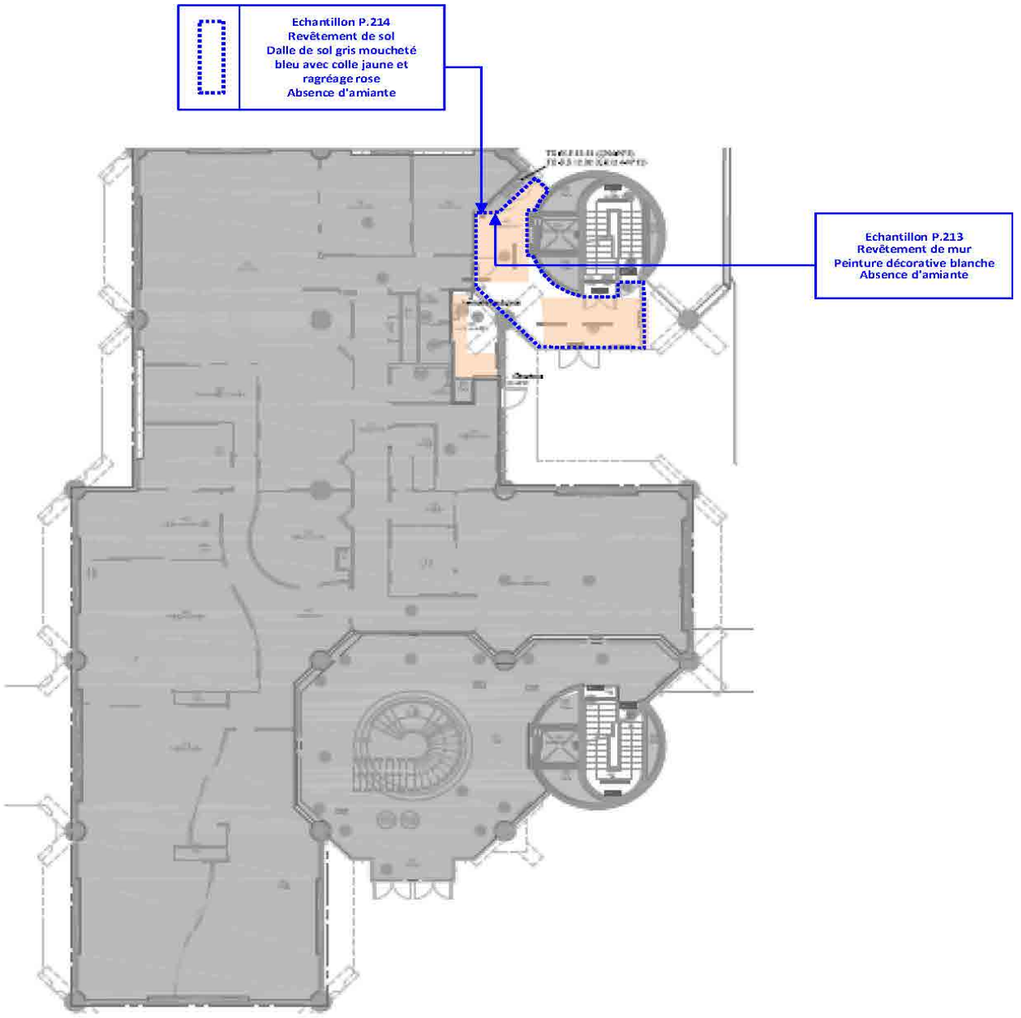


UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE
Affaire N° 7129567-1
Tribunal de Grande Instance
173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny
Planche de repérage 53 - Le 17 juillet 2018
Niveau R+0 / Rez-de-chaussée / Bâtiment Annexe
Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

| **Planche de repérage** (*la planche de repérage est indissociable du rapport)* | | |
|---|---|---|
| Site : Tribunal de Grande Instance de Bobigny | Adresse : 169-173 avenue Paul Vaillant Couturier 93000 BOBIGNY | Localisation : Niveau R+0 / RDC / Bât. Annexe |
| Réalisé par : Didier DENAVEAUT | N° de planche : 53 / 63 | |



| | |
|---|---|
| | Isolants des câbles électriques susceptibles de contenir de l'amiante En tension au jour du contrôle |
| | Vides des plénums difficiles d'accès Faux-plafonds bois cloués |
| | Vides des plénums sous gaines, coffres et plafonds plâtre non visibles et accessibles |
| | Locaux non visibles et accessibles |

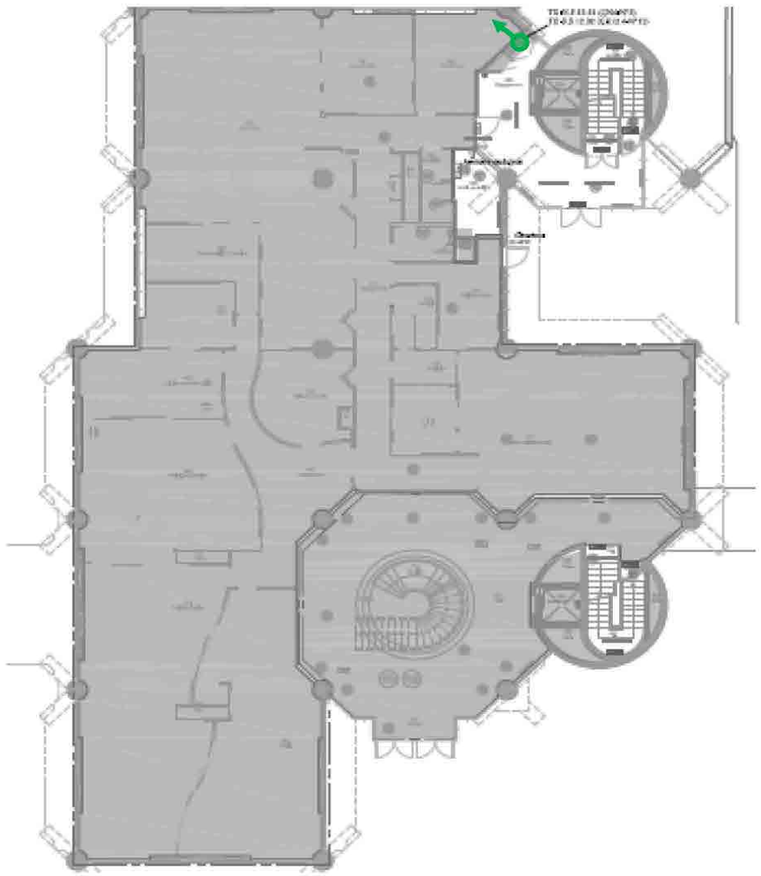

UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE
Affaire N° 7129567-1
Tribunal de Grande Instance
173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny
Planche de repérage 54 - Le 17 juillet 2018
Niveau R+0 / Rez-de-chaussée / Bâtiment Annexe
Locaux ou zones non visibles et accessibles - Matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante

| **Planche de repérage** (*la planche de repérage est indissociable du rapport)* | | |
|---|---|---|
| Site : Tribunal de Grande Instance de Bobigny | Adresse : 169-173 avenue Paul Vaillant Couturier 93000 BOBIGNY | Localisation : Niveau R+0 / RDC / Bât. Annexe |
| Réalisé par : Didier DENAVEAUT | N° de planche : 54 / 63 | |


Copyright BUREAU VERITAS



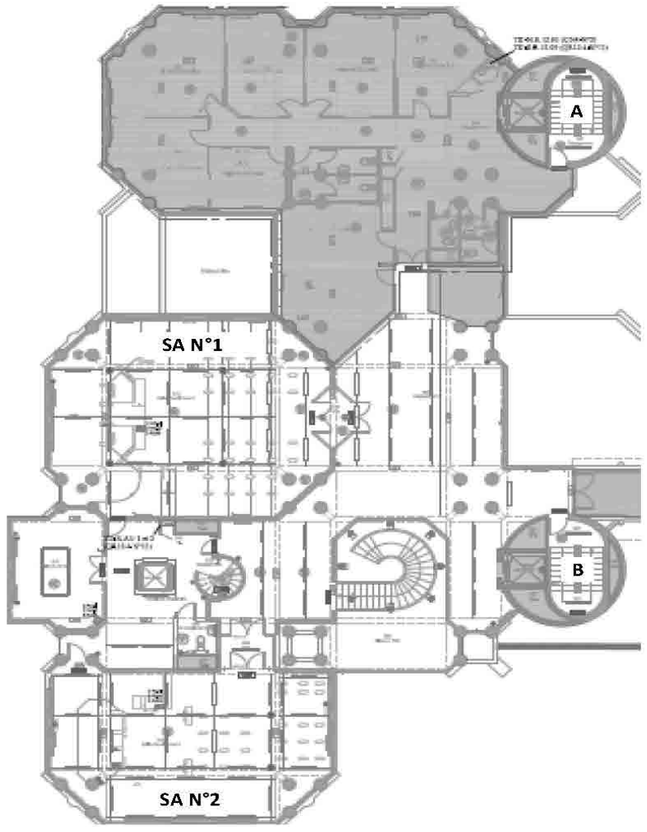


UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE
Affaire N° 7129567-1
Tribunal de Grande Instance
173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny
Planche de repérage 55 - Le 17 juillet 2018
Niveau R+1 / 1er étage / Pas Perdus / Bâtiment Annexe
Matériaux ou produits contenant de l'amiante

| **Planche de repérage** (*la planche de repérage est indissociable du rapport)* | | |
|---|---|---|
| Site : Tribunal de Grande Instance de Bobigny | Adresse : 169-173 avenue Paul Vaillant Couturier 93000 BOBIGNY | Localisation : Niveau : Pas Perdus / Bât. Annexe |
| Réalisé par : Didier DENAVEAUT | N° de planche : 55 / 63 | |

| | |
|---|---|
| | Flocage cotonneux en dalle(s) haute(s)<br>Absence d'amiante sur résultat(s) d'analyse(s) |
| ⊗ | Parois des clapets coupe-feu - SGEI (plâtre avec protection aluminium)<br>Absence d'amiante sur résultat(s) d'analyse(s) |
| ▯ | Faux-plafonds 600x600 métalliques à résille maille carrée<br>Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante |
| ▯ | Panneaux isolants sur murs et plafonds type "Fibralith"<br>Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante<br>Confirmation par DDP EXPERT HOME |

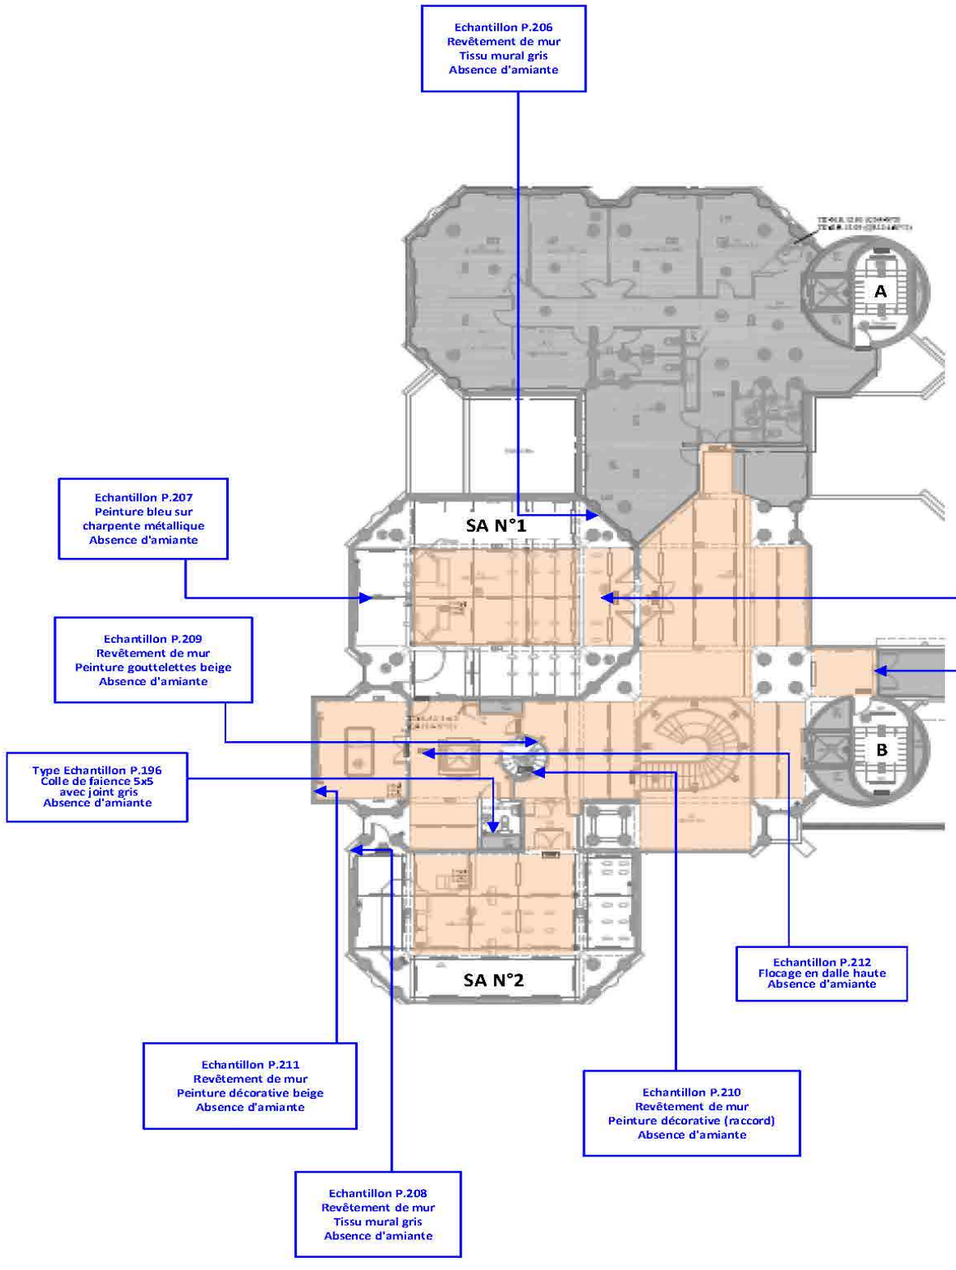


Echantillon P.206
Revêtement de mur
Tissu mural gris
Absence d'amiante

Echantillon P.207
Peinture bleu sur charpente métallique
Absence d'amiante

Echantillon P.205
Flocage en dalle haute
Absence d'amiante

Echantillon P.209
Revêtement de mur
Peinture gouttelettes beige
Absence d'amiante

Type Echantillon P.196
Colle de faience 5x5 avec joint gris
Absence d'amiante

Matériau ou produit qui par nature
ne contient pas d'amiante
Bloc porte coupe-feu MALERBA "2013"

Echantillon P.212
Flocage en dalle haute
Absence d'amiante

Echantillon P.211
Revêtement de mur
Peinture décorative beige
Absence d'amiante

Echantillon P.210
Revêtement de mur
Peinture décorative (raccord)
Absence d'amiante

Echantillon P.208
Revêtement de mur
Tissu mural gris
Absence d'amiante

Matériaux ou produits qui par nature
ne contiennent pas d'amiante selon présence
Murs et cloisons maçonnées de type
voiles béton et murs en parpaings/briques avec ou sans enduits ciment de dressage et carreaux de plâtre
Plafonds et poutres béton
Conduits de fluides type fonte, cuivre, acier, PVC
Calorifugeages type tube isolant préfendu en mousse polyéthylène noir ou gris sur conduits de fluides
Calorifuges sur conduits de fluides (matelas laine/alu) avec étanchéités en scotch alu et CLIMAVER
Faux-plafonds à lames bois dans sanitaires
Panneaux d'impostes sur portes d'accès et coupe-feu
Tissus muraux et toiles de verre peintes
Cloisons sèches et amovibles en plaques de plâtre

UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE
Affaire N° 7129567-1
Tribunal de Grande Instance
173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny
Planche de repérage 56 - Le 17 juillet 2018
Niveau R+1 / 1er étage / Pas Perdus / Bâtiment Annexe
Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

| **Planche de repérage** (*la planche de repérage est indissociable du rapport*) | | |
|---|---|---|
| Site : Tribunal de Grande Instance de Bobigny | Adresse : 169-173 avenue Paul Vaillant Couturier 93000 BOBIGNY | Localisation : Niveau : Pas Perdus / Bât. Annexe |
| Réalisé par : Didier DENAVEAUT | N° de planche : 56 / 63 | |


Copyright BUREAU VERITAS



| | |
|---|---|
| | Isolants des câbles électriques susceptibles de contenir de l'amiante En tension au jour du contrôle |
| | Vides des plénums difficiles d'accès Faux-plafonds bois cloués |
| | Vides des plénums sous gaines, coffres et plafonds plâtre non visibles et accessibles |
| | Locaux non visibles et accessibles |

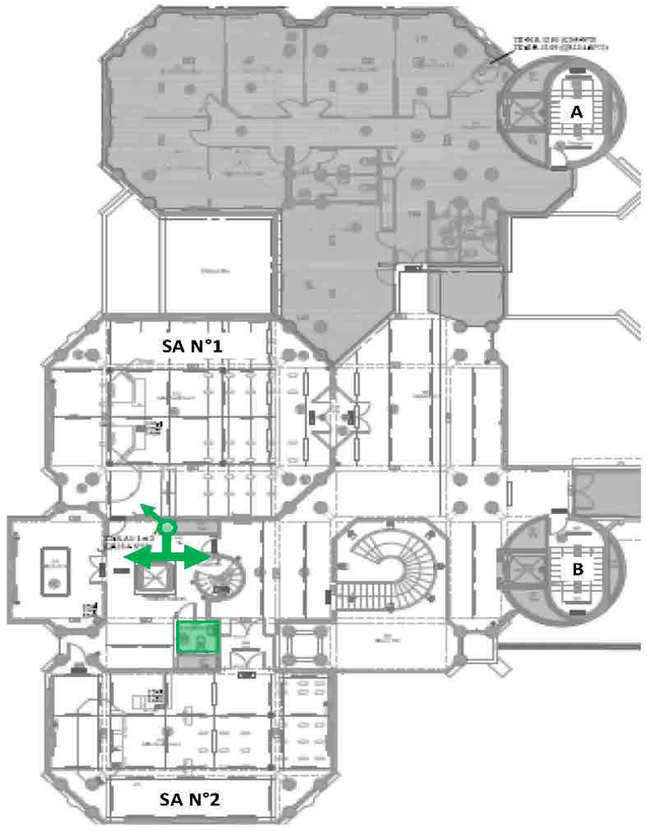


UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE
Affaire N° 7129567-1
Tribunal de Grande Instance
173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny
Planche de repérage 57 - Le 17 juillet 2018
Niveau R+1 / 1er étage / Pas Perdus / Bâtiment Annexe
Locaux ou zones non visibles et accessibles - Matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante

| **Planche de repérage** (*la planche de repérage est indissociable du rapport)* | | |
|---|---|---|
| Site : Tribunal de Grande Instance de Bobigny | Adresse : 169-173 avenue Paul Vaillant Couturier 93000 BOBIGNY | Localisation : Niveau : Pas Perdus / Bât. Annexe |
| Réalisé par : Didier DENAVEAUT | N° de planche : 57 / 63 | |


Copyright BUREAU VERITAS



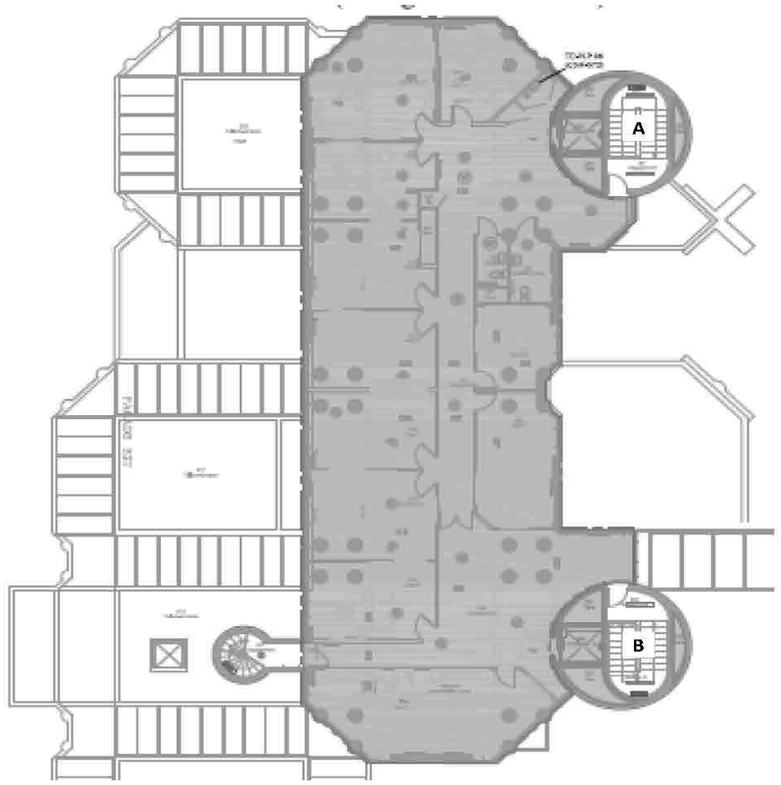


UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE
Affaire N° 7129567-1
Tribunal de Grande Instance
173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny
Planche de repérage 58 - Le 17 juillet 2018
Niveau R+2 / 2ème étage / Parvis / Bâtiment Annexe
Matériaux ou produits contenant de l'amiante

| **Planche de repérage** (*la planche de repérage est indissociable du rapport)* | | |
|---|---|---|
| Site : Tribunal de Grande Instance de Bobigny | Adresse : 169-173 avenue Paul Vaillant Couturier 93000 BOBIGNY | Localisation : Niveau : Parvis / Bât annexe |
| Réalisé par : Didier DENAVEAUT | N° de planche : 58 / 63 | |


Copyright BUREAU VERITAS

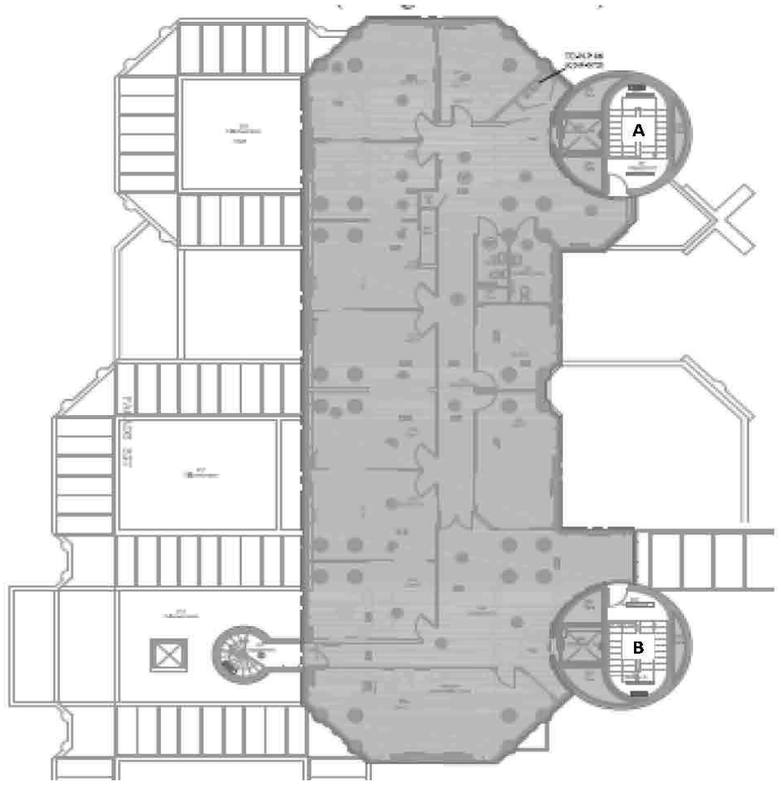


UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE
Affaire N° 7129567-1
Tribunal de Grande Instance
173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny
Planche de repérage 59 - Le 17 juillet 2018
Niveau R+2 / 2ème étage / Parvis / Bâtiment Annexe
Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

| **Planche de repérage** (*la planche de repérage est indissociable du rapport)* | | |
|---|---|---|
| Site : Tribunal de Grande Instance de Bobigny | Adresse : 169-173 avenue Paul Vaillant Couturier 93000 BOBIGNY | Localisation : Niveau : Parvis / Bât annexe |
| Réalisé par : Didier DENAVEAUT | N° de planche : 59 / 63 | |


Copyright BUREAU VERITAS



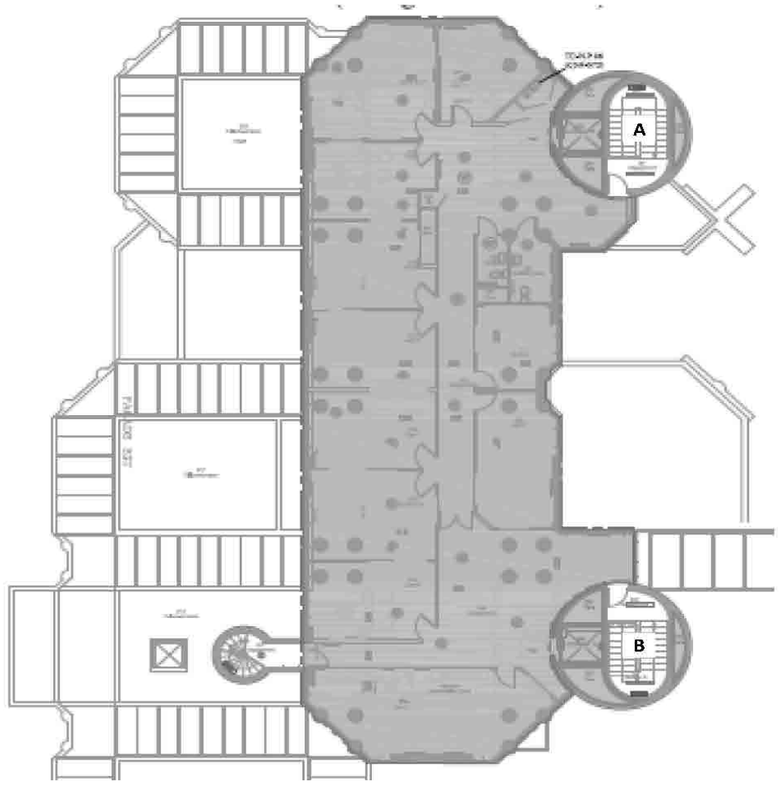


UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE
Affaire N° 7129567-1
Tribunal de Grande Instance
173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny
Planche de repérage 60 - Le 17 juillet 2018
Niveau R+2 / 2ème étage / Parvis / Bâtiment Annexe
Locaux ou zones non visibles et accessibles - Matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante

| **Planche de repérage** (*la planche de repérage est indissociable du rapport)* | | |
|---|---|---|
| Site : Tribunal de Grande Instance de Bobigny | Adresse : 169-173 avenue Paul Vaillant Couturier 93000 BOBIGNY | Localisation : Niveau : Parvis / Bât annexe |
| Réalisé par : Didier DENAVEAUT | N° de planche : 60 / 63 | |


Copyright BUREAU VERITAS



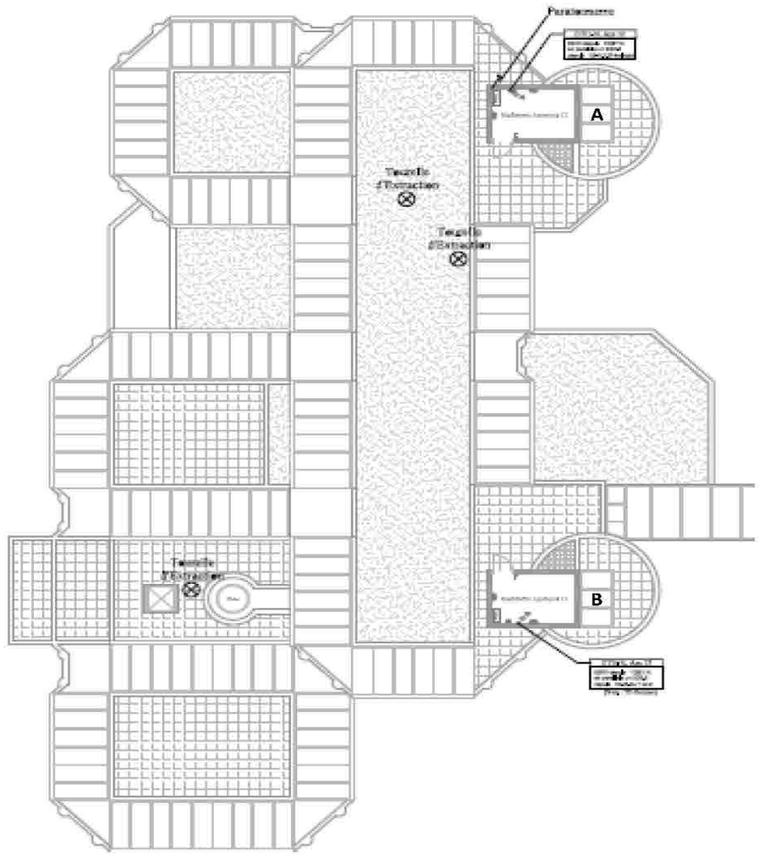


UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE
Affaire N° 7129567-1
Tribunal de Grande Instance
173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny
Planche de repérage 61 - Le 17 juillet 2018
Niveau R+3 / 3ème étage / Terrasse / Bâtiment Annexe
Matériaux ou produits contenant de l'amiante

| **Planche de repérage** (*la planche de repérage est indissociable du rapport)* | | |
|---|---|---|
| Site : Tribunal de Grande Instance de Bobigny | Adresse : 169-173 avenue Paul Vaillant Couturier 93000 BOBIGNY | Localisation : Niveau : Terrasse / Bât. Annexe |
| Réalisé par : Didier DENAVEAUT | N° de planche : 61 / 63 | |


Copyright BUREAU VERITAS



| | |
|---|---|
| | Flocage cotonneux en dalle(s) haute(s)<br>Absence d'amiante sur résultat(s) d'analyse(s) |
| ⊗ | Parois des clapets coupe-feu - SGEI (plâtre avec protection aluminium)<br>Absence d'amiante sur résultat(s) d'analyse(s) |
| ▯ | Faux-plafonds 600x600 métalliques à résille maille carrée<br>Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante |
| ⬚ | Panneaux isolants sur murs et plafonds type "Fibralith"<br>Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante<br>Confirmation par DDP EXPERT HOME |

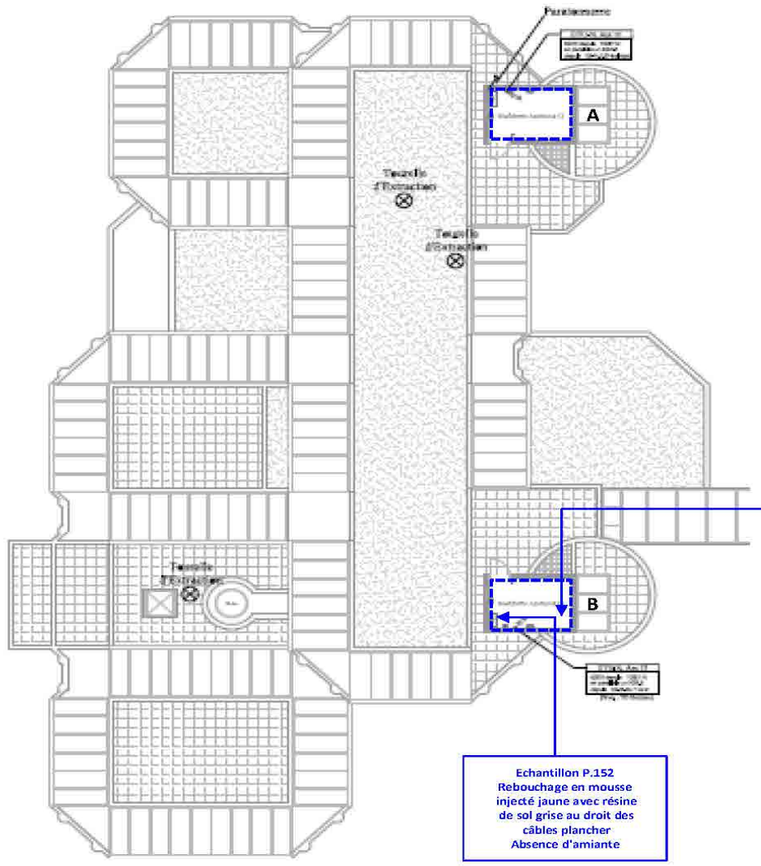


UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE
Affaire N° 7129567-1
Tribunal de Grande Instance
173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny
Planche de repérage 62 - Le 17 juillet 2018
Niveau R+3 / 3ème étage / Terrasse / Bâtiment Annexe
Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

| **Planche de repérage** (*la planche de repérage est indissociable du rapport)* | | |
|---|---|---|
| Site : Tribunal de Grande Instance de Bobigny | Adresse : 169-173 avenue Paul Vaillant Couturier 93000 BOBIGNY | Localisation : Niveau : Terrasse / Bât. Annexe |
| Réalisé par : Didier DENAVEAUT | N° de planche : 62 / 63 | |



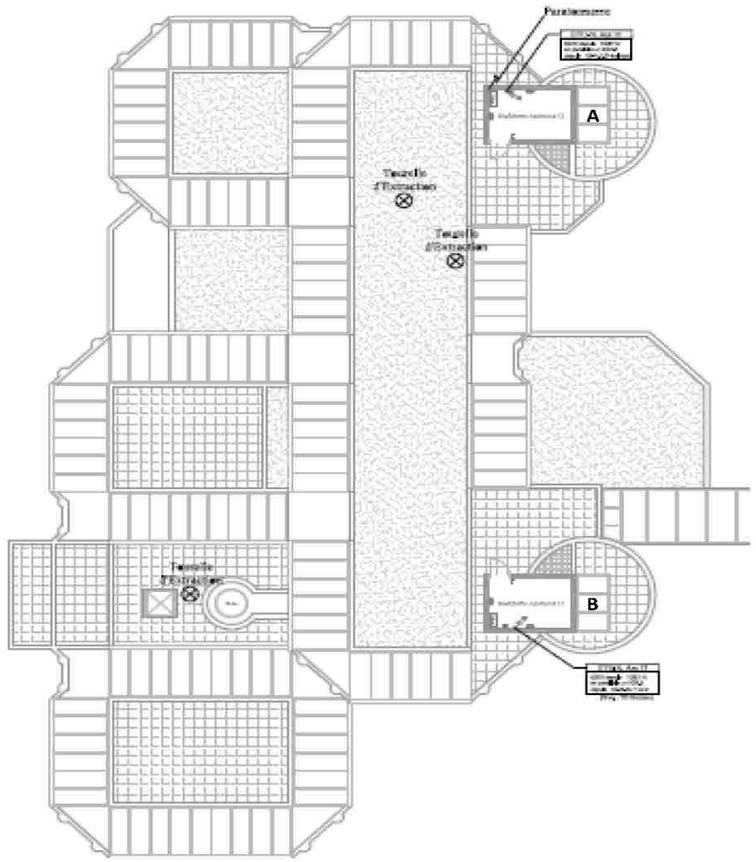


UGAP - MINISTERE DE LA JUSTICE
Affaire N° 7129567-1
Tribunal de Grande Instance
173 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny
Planche de repérage 63 - Le 17 juillet 2018
Niveau R+3 / 3ème étage / Terrasse / Bâtiment Annexe
Locaux ou zones non visibles et accessibles - Matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante

| **Planche de repérage** (*la planche de repérage est indissociable du rapport)* | | |
|---|---|---|
| Site : Tribunal de Grande Instance de Bobigny | Adresse : 169-173 avenue Paul Vaillant Couturier 93000 BOBIGNY | Localisation : Niveau : Terrasse / Bât. Annexe |
| Réalisé par : Didier DENAVEAUT | N° de planche : 63 / 63 | |


Copyright BUREAU VERITAS

## 7.3. Photos

Prélèvement - P.01 : Niveau T : Ssol / Bât. Annexe / Parkings / R-3 / Aires de manœuvre - Flocage- (Absence d'amiante)

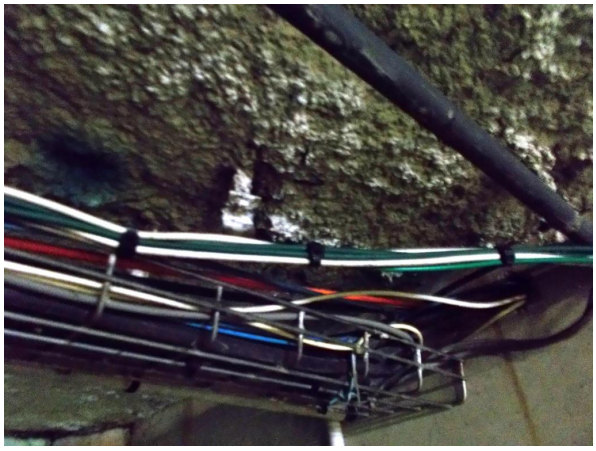

Prélèvement - P.02 : Niveau T : Ssol / Bât. Annexe / Parkings / R-3 / Aires de stationnement - Flocage- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.03 : Niveau T : Ssol / Bât. Annexe / Parkings / R-3 / Aires de stationnement - Enveloppe de calorifugeage- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.04 : Niveau T : Ssol / Bât. Annexe / Parkings / R-3 / Dégagement(s) - Enduit- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.05 : Niveau T : Ssol / Bât. Annexe / Parkings / R-3 / Rampe(s) d'accès - Enduit de ragréage- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.06 : Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Escalier de secours - Enduit de ragréage- (Absence d'amiante)


Copyright BUREAU VERITAS

Prélèvement - P.07 : Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Aires de stationnement - Enduit de ragréage- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.08 : Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Rampe(s) d'accès - Flocage- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.09 : Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Aires de manœuvre - Fourreau- (Présence d'amiante)

Prélèvement - P.10 : Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Aires de manœuvre - Enduit de ragréage- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.11 : Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Aires de manœuvre - Enduit de ragréage- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.12 : Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Aires de manœuvre - Flocage- (Absence d'amiante)


Copyright BUREAU VERITAS

Prélèvement - P.13 : Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Escalier d'accès - Enduit- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.14 : Niveau S : R-2 / RDC / Parkings / R-2 / Bureaux EIFFAGE - Peinture- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.15 : Niveau S : R-2 / RDC / Parkings / R-2 / Bureaux EIFFAGE - Peinture- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.16 : Niveau S : R-2 / RDC / Parkings / R-2 / Bureaux EIFFAGE - Peinture- (Absence d'amiante)

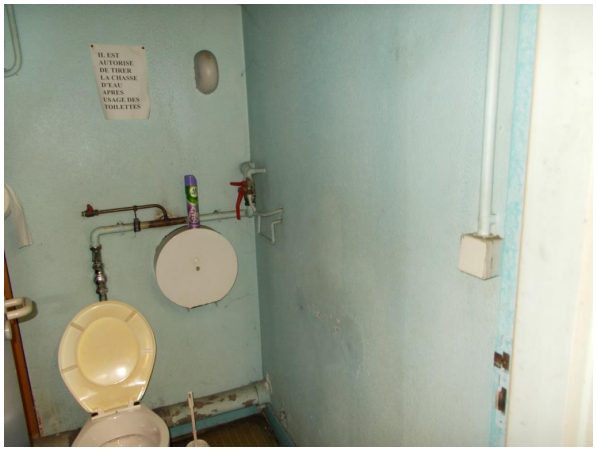


Prélèvement - P.17 : Niveau S : R-2 / RDC / Parkings / R-2 / Bureaux EIFFAGE - Peinture- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.18 : Niveau S : R-2 / RDC / Parkings / R-2 / Aires de manœuvre - Enduit de ragréage- (Absence d'amiante)


Copyright BUREAU VERITAS

Prélèvement - P.19 : Niveau S : R-2 / RDC / Parkings / R-2 / Aires de stationnement - Rebouchage- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.20 : Niveau S : R-2 / RDC / Parkings / R-2 / Aires de manœuvre - Joint de dilatation- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.21 : Niveau S : R-2 / RDC / Parkings / R-2 / Aires de manœuvre - Flocage- (Absence d'amiante)

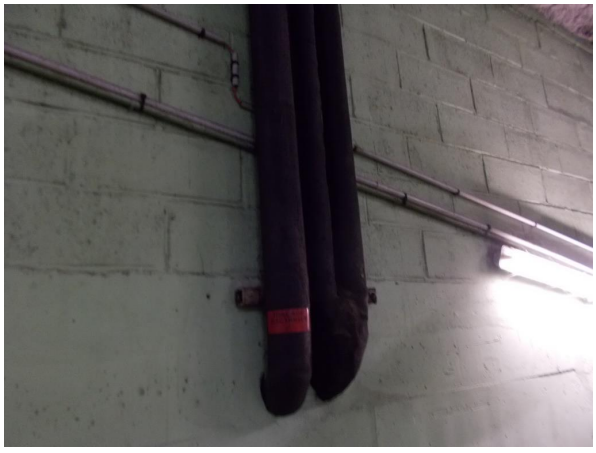

Prélèvement - P.22 : Niveau R : Pas Perdus / Parking / R-1 / Rampe(s) d'accès - Enveloppe de calorifugeage- (Absence d'amiante)

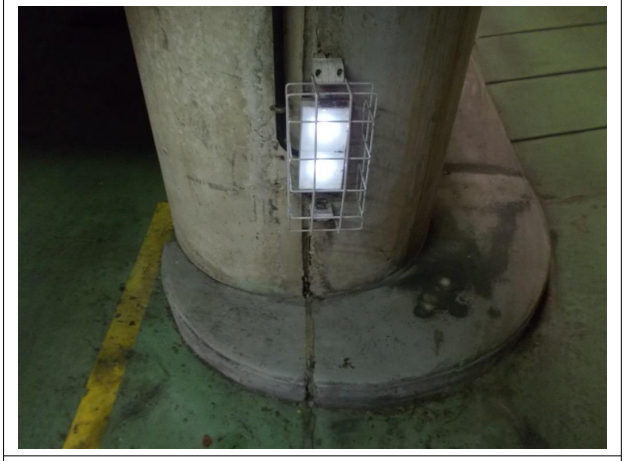

Prélèvement - P.23 : Niveau R : Pas Perdus / Parking / R-1 / Aires de manœuvre - Joint de dilatation- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.24 : Niveau R : Pas Perdus / Parking / R-1 / Escalier de secours - Enduit de ragréage- (Absence d'amiante)


Copyright BUREAU VERITAS

Prélèvement - P.25 : Niveau R : Pas Perdus / Parking / R-1 / Escalier de secours - Rebouchage- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.26 : Niveau R : Pas Perdus / Parking / R-1 / Aires de manœuvre - Flocage- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.27 : Niveau R : Pas Perdus / Parking / R-1 / Aires de manœuvre - Flocage- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.28 : Niveau R : Pas Perdus / Parking / R-1 / Escalier d'accès - Enduit de ragréage- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.29 : Niveau R : Pas Perdus / Parking / R-1 / Aires de manœuvre - Enduit de ragréage- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.30 : Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Archives - Joint coupe-feu- (Absence d'amiante)


Copyright BUREAU VERITAS

Prélèvement - P.31 : Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Archives - Isolant intérieur porte- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.32 : Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Archives - Joint coupe-feu- (Absence d'amiante)

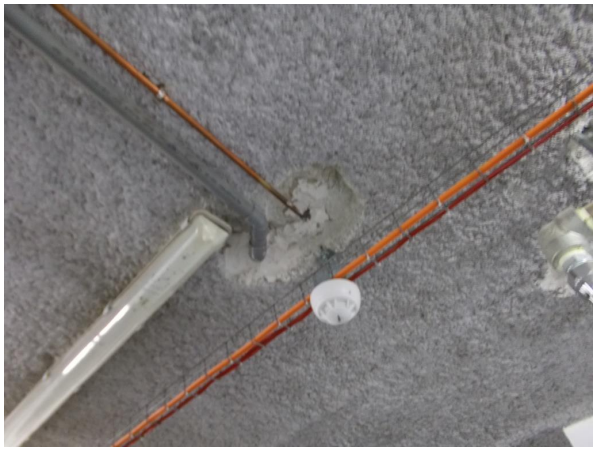

Prélèvement - P.33 : Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Archives - Flocage- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.34 : Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Archives - Rebouchage- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.35 : Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Archives - Clapet coupe-feu- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.36 : Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Archives - Rebouchage clapet- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.37 : Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Archives - Calfeutrement des passages de conduits- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.38 : Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Archives - Panneau collé ou vissé- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.39 : Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Archives - Peinture sur béton- (Absence d'amiante)

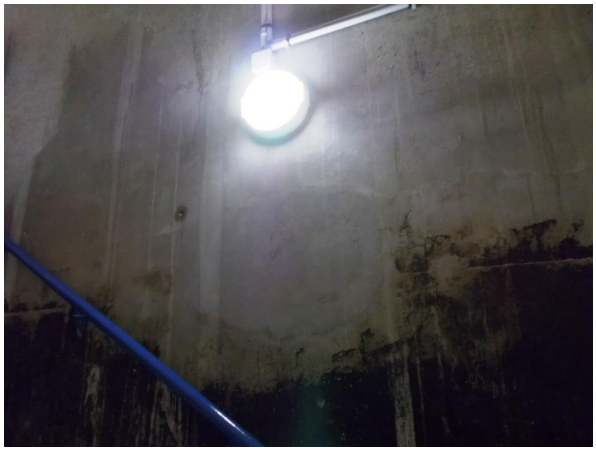

Prélèvement - P.40 : Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Archives - Enduit de ragréage- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.41 : Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Archives - Panneau- (Absence d'amiante)

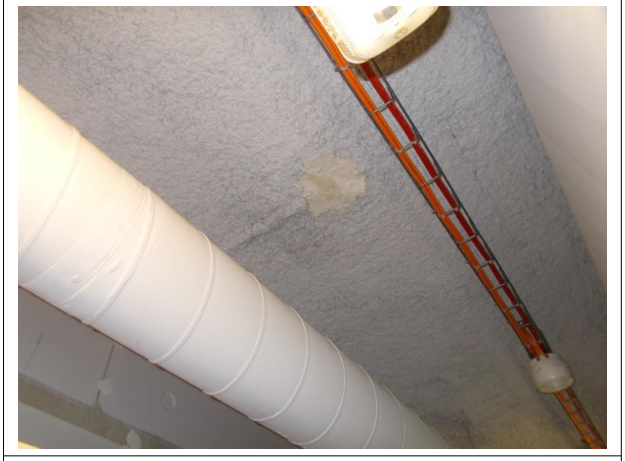

Prélèvement - P.42 : Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Archives - Rebouchage- (Absence d'amiante)


Copyright BUREAU VERITAS

Prélèvement - P.43 : Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Archives - Peinture- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.44 : Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Dégagements - Rebouchage- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.45 : Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Escalier d'accès T - Peinture- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.46 : Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Escalier d'accès T - Peinture- (Absence d'amiante)

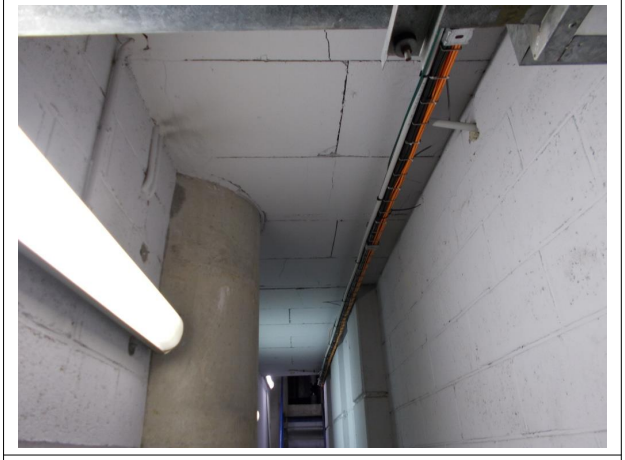

Prélèvement - P.47 : Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Dégagements - Panneau collé ou vissé- (Absence d'amiante)

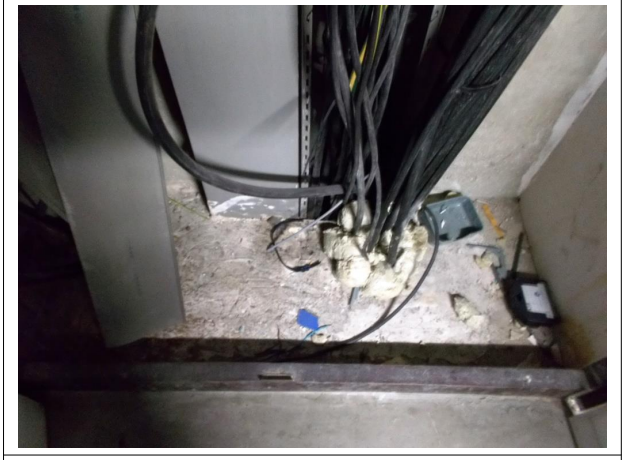

Prélèvement - P.48 : Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Placards techniques - Rebouchage- (Absence d'amiante)


Copyright BUREAU VERITAS

Prélèvement - P.49 : Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Placards techniques - Rebouchage- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.50 : Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Escalier d'accès S - Peinture- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.51 : Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Escalier d'accès S - Peinture- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.52 : Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Sanitaires - Colle de faïence- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.53 : Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Sanitaires - Joint de faïence- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.54 : Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Sanitaires - Joint- (Absence d'amiante)


Copyright BUREAU VERITAS

Prélèvement - P.55 : Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Dégagements - Rebouchage- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.56 : Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Autocom T15 - Colle- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.57 : Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Autocom T15 - Panneau- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.58 : Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Autocom T15 - Enduit de ragréage- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.59 : Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Petit(s) escalier(s) circulaire(s) - Peinture- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.60 : Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Sanitaires - Colle de faïence- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.61 : Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Sanitaires - Joint de faïence- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.62 : Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Petit(s) escalier(s) circulaire(s) - Rebouchage- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.63 : Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Zone ex. réserve cuisine - Faux plafond- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.64 : Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Zone ex. réserve cuisine - Colle de faïence- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.65 : Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Petit(s) escalier(s) circulaire(s) - Peinture- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.66 : Niveau T : Sous-sol / TGI / R-3 / Dégagements - Enduit projeté- (Absence d'amiante)


Copyright BUREAU VERITAS

Prélèvement - P.67 : Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Archives - Clapet coupe-feu- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.68 : Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Archives - Joint- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.69 : Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Archives - Flocage- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.70 : Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Archives - Enveloppe de calorifugeage- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.71 : Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Escalier d'accès B - Peinture- (Absence d'amiante)

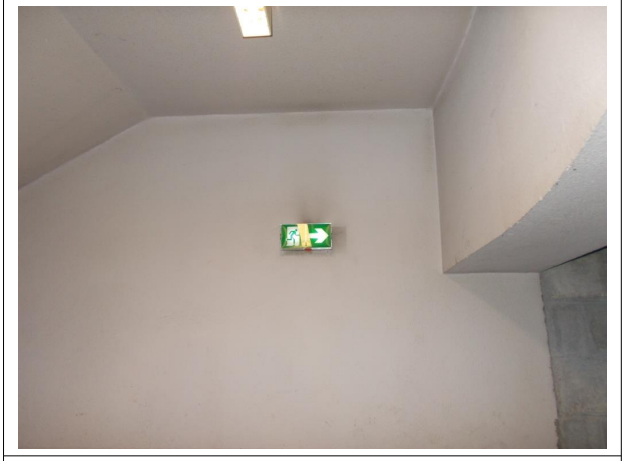

Prélèvement - P.72 : Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Escalier d'accès B - Peinture- (Absence d'amiante)


Copyright BUREAU VERITAS

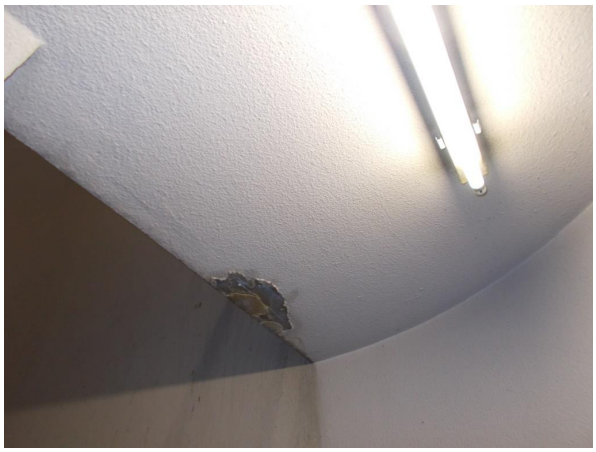

Prélèvement - P.73 : Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Escalier d'accès C - Peinture- (Absence d'amiante)

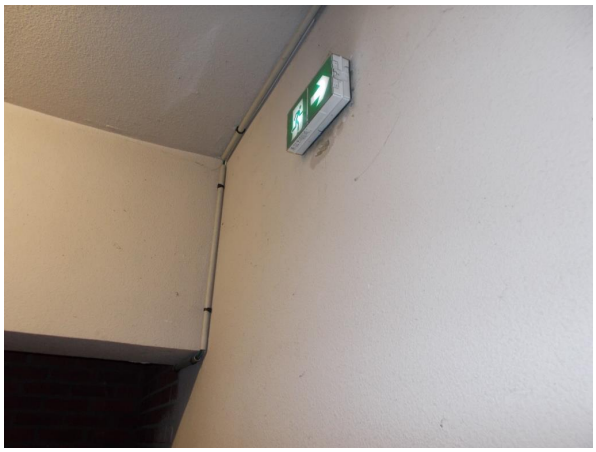

Prélèvement - P.74 : Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Escalier d'accès C - Peinture- (Absence d'amiante)

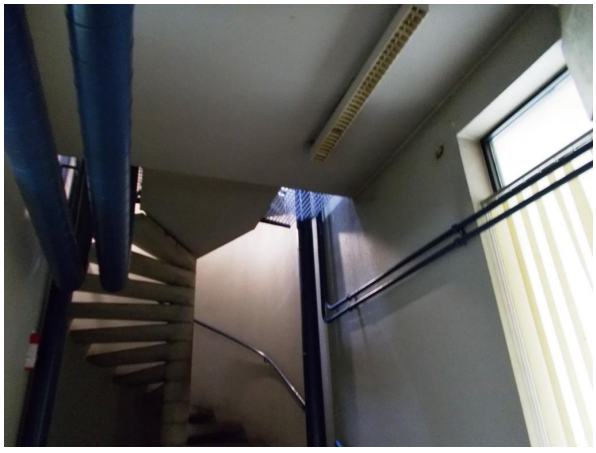

Prélèvement - P.75 : Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Petit(s) escalier(s) circulaire(s) - Peinture- (Absence d'amiante)

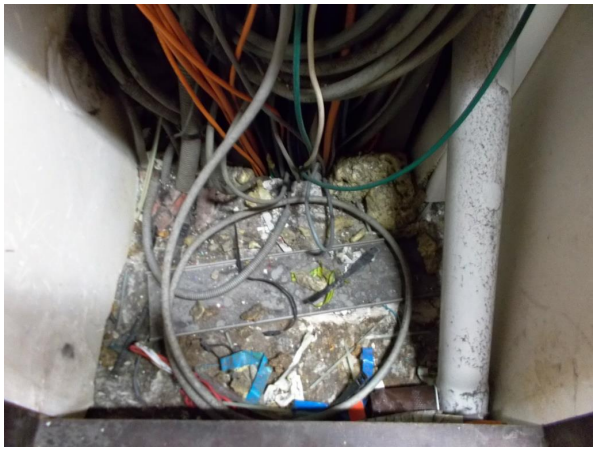

Prélèvement - P.76 : Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Placards techniques - Rebouchage- (Absence d'amiante)

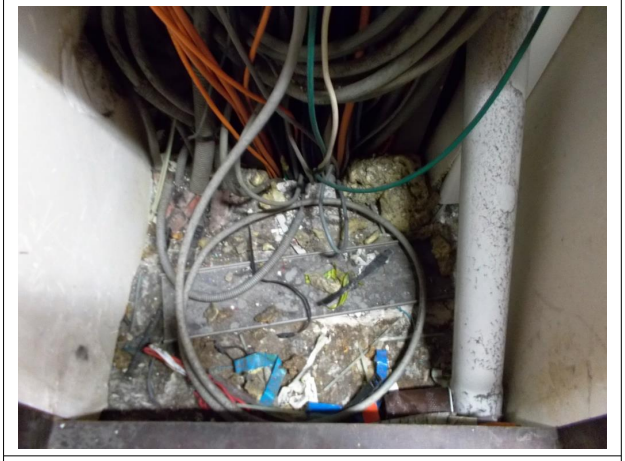

Prélèvement - P.77 : Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Placards techniques - Rebouchage- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.78 : Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Ensemble des pièces Ind.S - Peinture- (Absence d'amiante)


Copyright BUREAU VERITAS

Prélèvement - P.79 : Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Ensemble des pièces Ind.S - Peinture- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.80 : Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Sanitaires - Colle de faïence- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.81 : Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Sanitaires - Colle de faïence- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.82 : Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Ensemble des pièces Ind.S - Peinture- (Absence d'amiante)

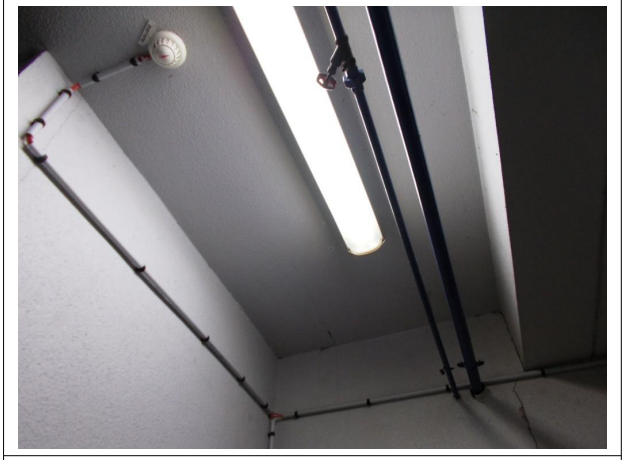

Prélèvement - P.83 : Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Ensemble des pièces Ind.S - Peinture- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.84 : Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / CTA assise N°2 - Enduit de ragréage- (Absence d'amiante)


Copyright BUREAU VERITAS

Prélèvement - P.85 : Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Stockage Assise N°2 - Enduit de ragréage- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.86 : Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Escalier d'accès Assise N°2 - Peinture- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.87 : Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Logement S10 - Rez-de-chaussée - Toile de verre- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.88 : Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Logement S10 - Rez-de-chaussée - Peinture- (Absence d'amiante)

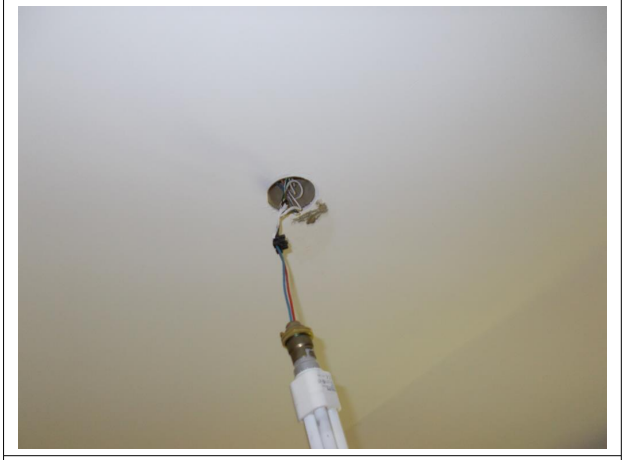

Prélèvement - P.89 : Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Logement S10 - Rez-de-chaussée - Peinture- (Absence d'amiante)

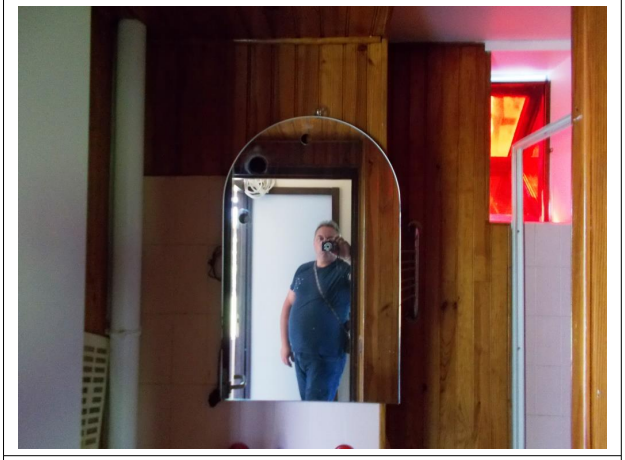

Prélèvement - P.90 : Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Logement S10 - Rez-de-chaussée - Colle de faïence- (Absence d'amiante)


Copyright BUREAU VERITAS

Prélèvement - P.91 : Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Escalier de secours Assise N°2 - Enduit projeté- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.92 : Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Ensemble des pièces Ind.S - Rebouchage- (Absence d'amiante)

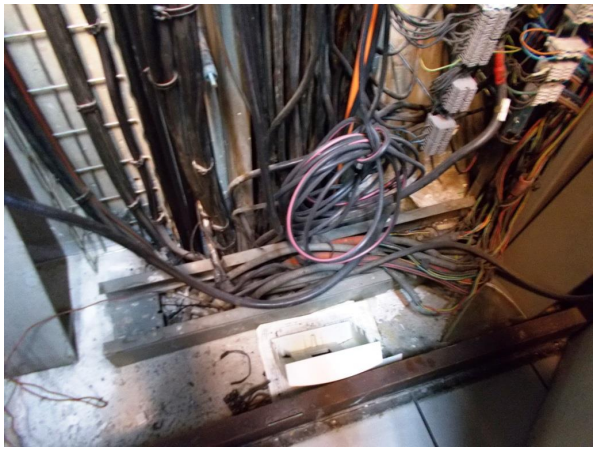

Prélèvement - P.93 : Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Placards techniques - Rebouchage- (Absence d'amiante)

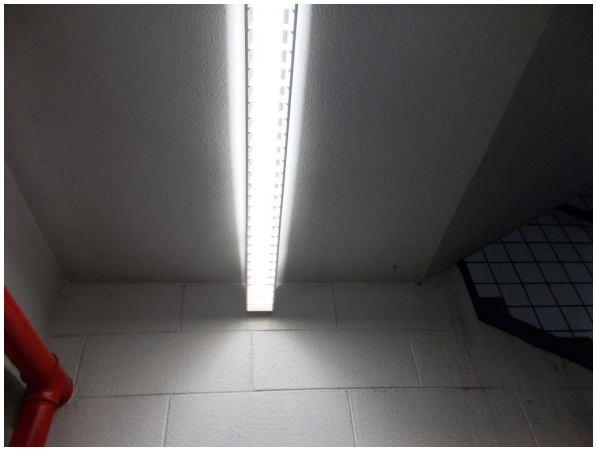

Prélèvement - P.94 : Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Escalier d'accès S - Peinture- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.95 : Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Escalier d'accès S - Peinture- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.96 : Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Escalier d'accès T - Peinture- (Absence d'amiante)


Copyright BUREAU VERITAS

Prélèvement - P.97 : Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Escalier d'accès T - Peinture- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.98 : Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Ensemble des pièces Ind.S - Peinture- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.99 : Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Ensemble des pièces Ind.S - Peinture- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.100 : Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Zone ex. cuisine - Panneau- (Absence d'amiante)

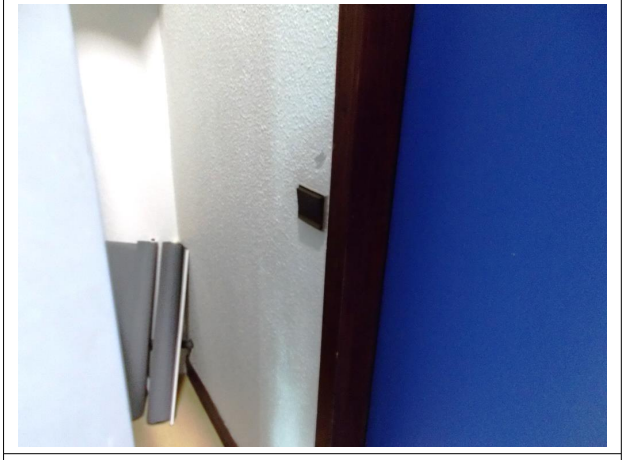

Prélèvement - P.101 : Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Ensemble des pièces Ind.S - Peinture- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.102 : Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Dégagements - Joint coupe-feu- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.103 : Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Zone ex. cuisine - Peinture- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.104 : Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Zone ex. cuisine - Peinture- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.105 : Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Zone ex. cuisine - Colle de faïence- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.106 : Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Zone ex. cuisine - Peinture- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.107 : Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI / R-2 / Zone ex. cuisine - Peinture- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.108 : Niveau R : Pas Perdus / TGI / R-1 / Zone Ordre des Avocats - Peinture- (Absence d'amiante)


Copyright BUREAU VERITAS

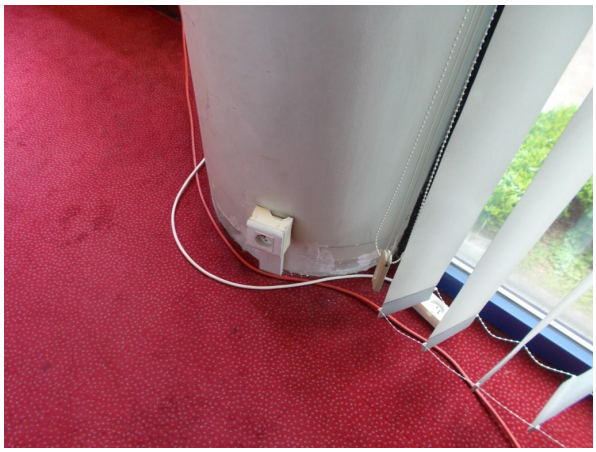

Prélèvement - P.109 : Niveau R : Pas Perdus / TGI / R-1 / Zone Ordre des Avocats - Peinture- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.110 : Niveau R : Pas Perdus / TGI / R-1 / Zone Ordre des Avocats - Flocage- (Absence d'amiante)

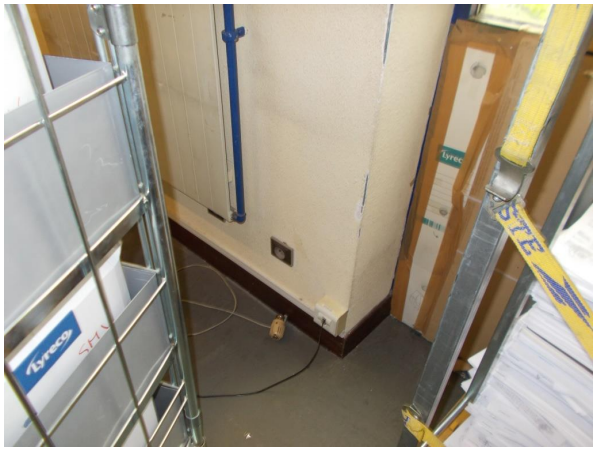

Prélèvement - P.111 : Niveau R : Pas Perdus / TGI / R-1 / Zone Tribunal pour Enfants - Peinture- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.112 : Niveau R : Pas Perdus / TGI / R-1 / Zone Tribunal pour Enfants - Peinture- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.113 : Niveau R : Pas Perdus / TGI / R-1 / Zone Tribunal pour Enfants - Peinture- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.114 : Niveau R : Pas Perdus / TGI / R-1 / Zone Tribunal pour Enfants - Peinture- (Absence d'amiante)


Copyright BUREAU VERITAS

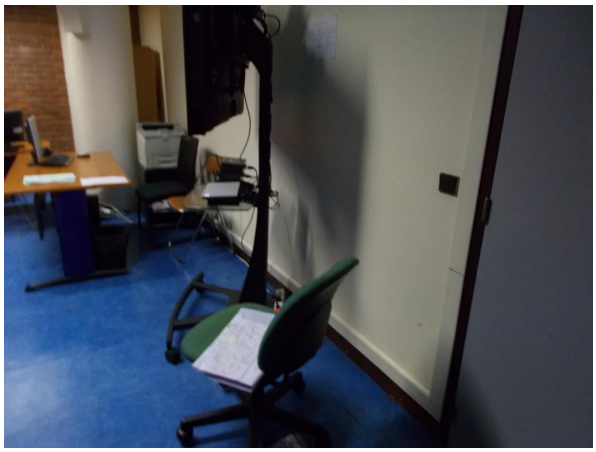

Prélèvement - P.117 : Niveau R : Pas Perdus / TGI / R-1 / Zone ICJ - Peinture- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.118 : Niveau R : Pas Perdus / TGI / R-1 / Zone SAP N°4 - Peinture- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.119 : Niveau R : Pas Perdus / TGI / R-1 / Zone SAP N°3 - Peinture- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.120 : Niveau R : Pas Perdus / TGI / R-1 / Zone ICJ - Peinture- (Absence d'amiante)

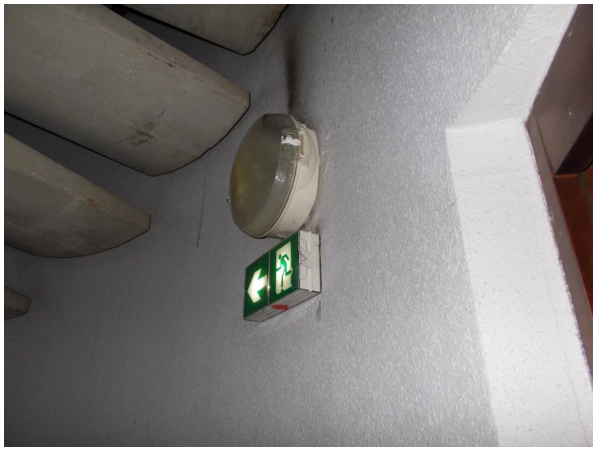

Prélèvement - P.121 : Niveau R : Pas Perdus / TGI / R-1 / Zone ICJ - Peinture- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.122 : Niveau R : Pas Perdus / TGI / R-1 / Zone Tribunal pour Enfants - Colle de faïence- (Absence d'amiante)


Copyright BUREAU VERITAS

Prélèvement - P.123 : Niveau R : Pas Perdus / TGI / R-1 / Zone Tribunal pour Enfants - Peinture- (Absence d'amiante)

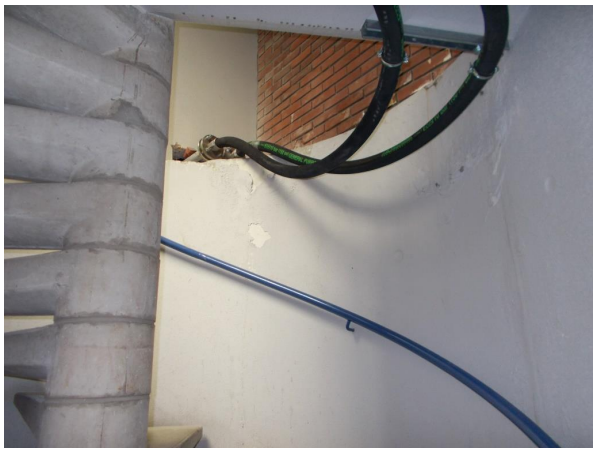

Prélèvement - P.124 : Niveau R : Pas Perdus / TGI / R-1 / Zone Tribunal pour Enfants - Peinture- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.125 : Niveau R : Pas Perdus / TGI / R-1 / Salle de médiation - Peinture- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.126 : Niveau R : Pas Perdus / TGI / R-1 / Salle de médiation - Peinture- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.127 : Niveau R : Pas Perdus / TGI / R-1 / Zone ICJ - Peinture- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.128 : Niveau P : Parvis / TGI / R+0 / Zone SA N°2 - Peinture- (Absence d'amiante)


Copyright BUREAU VERITAS

Prélèvement - P.129 : Niveau P : Parvis / TGI / R+0 / Zone des Délibérés SA N°1 et N°2 - Peinture- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.131 : Niveau P : Parvis / TGI / R+0 / Zone BAJ - Flocage- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.132 : Niveau P : Parvis / TGI / R+0 / Assise N°1 - Peinture- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.133 : Niveau P : Parvis / TGI / R+0 / Zone BAJ - Peinture- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.134 : Niveau P : Parvis / TGI / R+0 / Zone Infirmerie - Peinture- (Absence d'amiante)

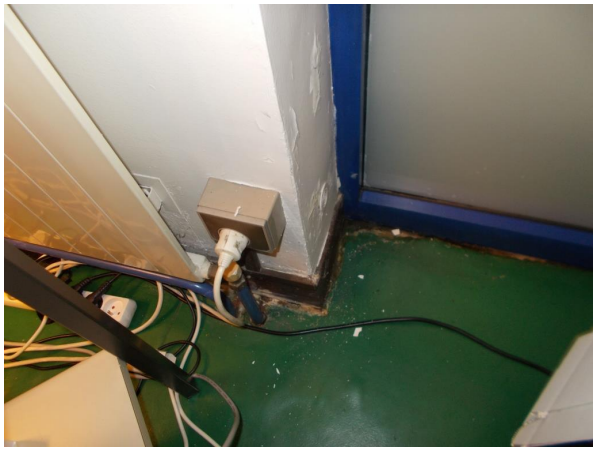

Prélèvement - P.135 : Niveau P : Parvis / TGI / R+0 / Zone Infirmerie - Peinture- (Absence d'amiante)


Copyright BUREAU VERITAS

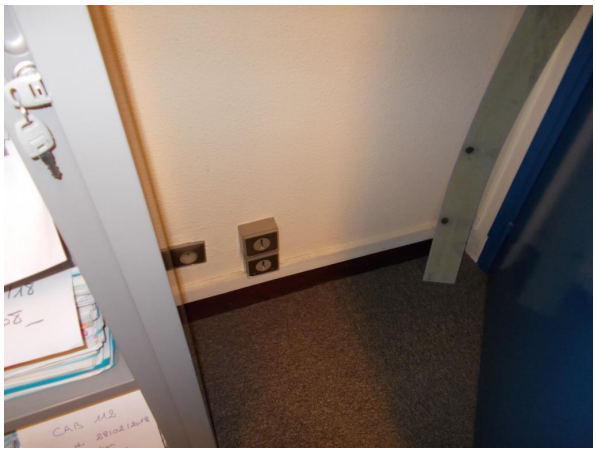

Prélèvement - P.136 : Niveau P : Parvis / TGI / R+0 / Zone Tribunal pour Enfants - Peinture- (Absence d'amiante)

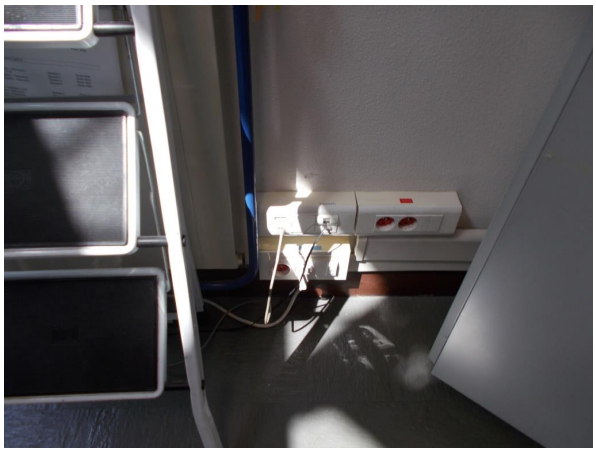

Prélèvement - P.137 : Niveau P : Parvis / TGI / R+0 / Zone Tribunal pour Enfants - Peinture- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.138 : Niveau P : Parvis / TGI / R+0 / Zone Tribunal pour Enfants - Peinture- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.139 : Niveau P : Parvis / TGI / R+0 / Zone SOP - Peinture- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.140 : Niveau P : Parvis / TGI / R+0 / Zone SOP - Flocage- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.141 : Niveau P : Parvis / TGI / R+0 / Zone SOP - Peinture- (Absence d'amiante)


Copyright BUREAU VERITAS

Prélèvement - P.142 : Niveau P : Parvis / TGI / R+0 / Zone SA N°6 - Revêtement- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.143 : Niveau P : Parvis / TGI / R+0 / Zone des Délibérés SA N°5 et N°6 - Peinture- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.144 : Niveau P : Parvis / TGI / R+0 / Zone Tribunal pour Enfants - Rebouchage- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.145 : Niveau P : Parvis / TGI / R+0 / Escalier d'accès A - Peinture- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.146 : Niveau P : Parvis / TGI / R+0 / Escalier d'accès A - Peinture- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.147 : Niveau P : Parvis / TGI / R+0 / Escalier d'accès D - Peinture- (Absence d'amiante)


Copyright BUREAU VERITAS

Prélèvement - P.148 : Niveau P : Parvis / TGI / R+0 / Escalier d'accès D - Peinture- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.149 : Niveau P : Parvis / TGI / R+0 / Zone ICJ - Peinture- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.150 : Niveau P : Parvis / TGI / R+0 / Zone ICJ - Toile de verre- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.151 : Niveau P : Parvis / TGI / R+0 / Zone ICJ - Peinture- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.152 : Niveau : Terrasse / Bât. Annexe / R+3 / LT Machineries d'ascenseurs - Rebouchage- (Absence d'amiante)

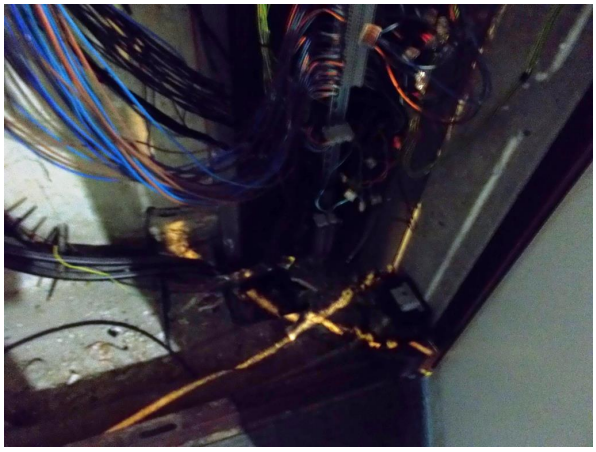

Prélèvement - P.153 : Niveau : 1er étage / TGI / R+1 / Placards techniques - Rebouchage- (Absence d'amiante)


Copyright BUREAU VERITAS

Prélèvement - P.154 : Niveau : 1er étage / TGI / R+1 / Placards techniques - Rebouchage- (Absence d'amiante)

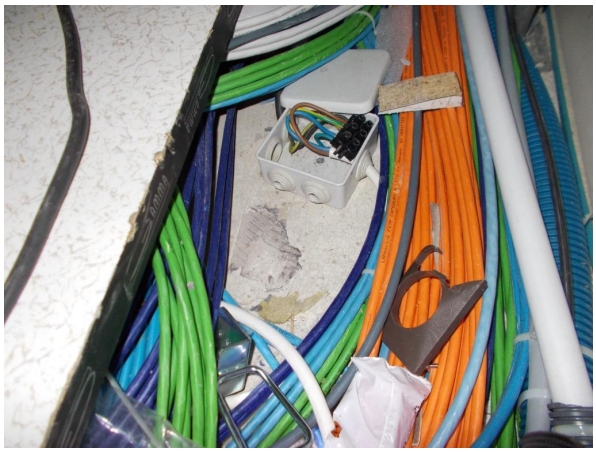

Prélèvement - P.155 : Niveau : 1er étage / TGI / R+1 / Ensemble des pièces Ind.100 - Dalle de sol- (Absence d'amiante)

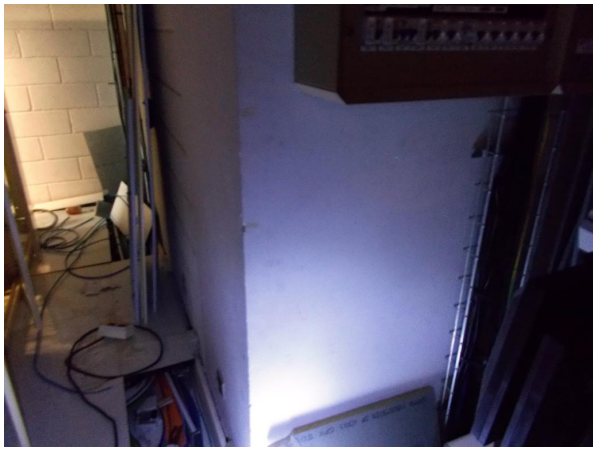

Prélèvement - P.156 : Niveau : 1er étage / TGI / R+1 / Ensemble des pièces Ind.100 - Peinture- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.157 : Niveau : 1er étage / TGI / R+1 / Ensemble des pièces Ind.100 - Moquette- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.158 : Niveau : 1er étage / TGI / R+1 / Sanitaires - Joint- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.159 : Niveau : 1er étage / TGI / R+1 / Ensemble des pièces Ind.100 - Peinture- (Absence d'amiante)


Copyright BUREAU VERITAS

Prélèvement - P.160 : Niveau : 1er étage / TGI / R+1 / Ensemble des pièces Ind.100 - Peinture- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.161 : Niveau : 1er étage / TGI / R+1 / Ensemble des pièces Ind.100 - Peinture- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.162 : Niveau : 2ème étage / TGI / R+2 / Dégagements et zones d'attente - Dalle de sol- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.163 : Niveau : 2ème étage / TGI / R+2 / Dégagements et zones d'attente - Bande calicot- (Absence d'amiante)

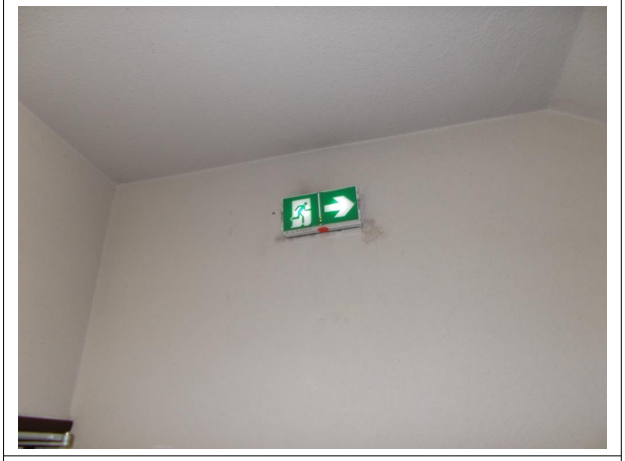

Prélèvement - P.164 : Niveau : 2ème étage / TGI / R+2 / Escalier d'accès C - Peinture- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.165 : Niveau : 2ème étage / TGI / R+2 / Escalier d'accès C - Peinture- (Absence d'amiante)


Copyright BUREAU VERITAS

Prélèvement - P.166 : Niveau : 2ème étage / TGI / R+2 / Petit(s) escalier(s) circulaire(s) - Peinture- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.167 : Niveau : 2ème étage / TGI / R+2 / Escalier d'accès D - Peinture- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.168 : Niveau : 2ème étage / TGI / R+2 / Escalier d'accès D - Peinture- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.169 : Niveau : 2ème étage / TGI / R+2 / Petit(s) escalier(s) circulaire(s) - Peinture- (Absence d'amiante)

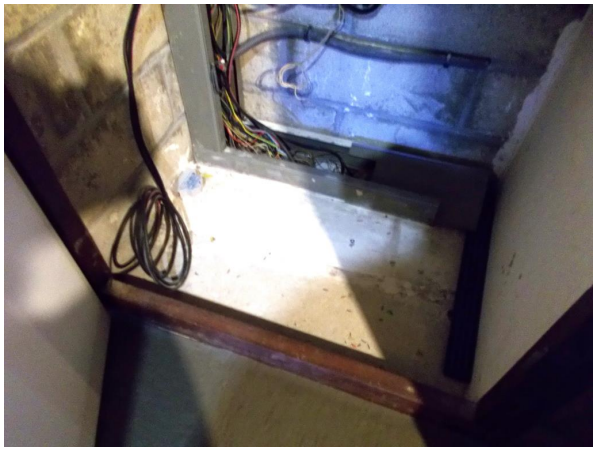

Prélèvement - P.170 : Niveau : 2ème étage / TGI / R+2 / Placards techniques - Rebouchage- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.171 : Niveau : 2ème étage / TGI / R+2 / Petit(s) escalier(s) circulaire(s) - Peinture- (Absence d'amiante)


Copyright BUREAU VERITAS

Prélèvement - P.172 : Niveau : 2ème étage / TGI / R+2 / Escalier d'accès T - Peinture- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.173 : Niveau : 2ème étage / TGI / R+2 / Escalier d'accès T - Peinture- (Absence d'amiante)

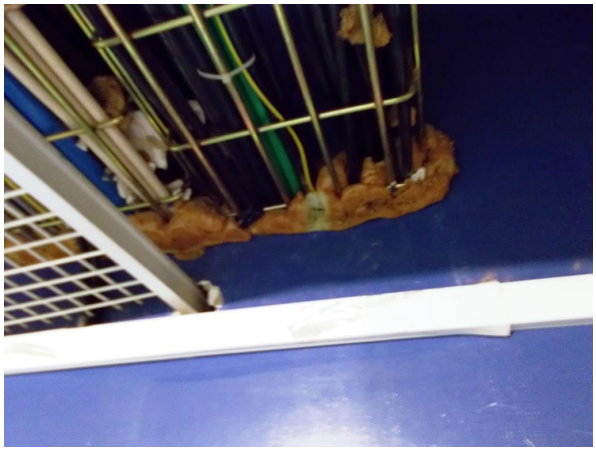

Prélèvement - P.174 : Niveau : 2ème étage / TGI / R+2 / Dégagements et zones d'attente - Rebouchage- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.175 : Niveau : 3ème étage / TGI / R+3 / Escalier d'accès B - Peinture- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.176 : Niveau : 3ème étage / TGI / R+3 / Escalier d'accès S - Peinture- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.177 : Niveau : 3ème étage / TGI / R+3 / Escalier d'accès S - Peinture- (Absence d'amiante)


Copyright BUREAU VERITAS

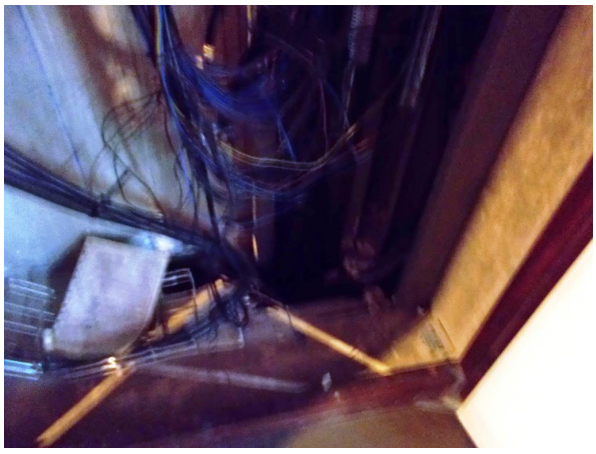

Prélèvement - P.178 : Niveau : 3ème étage / TGI / R+3 / Placards techniques - Rebouchage- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.179 : Niveau : 3ème étage / TGI / R+3 / Dégagements et zones d'attente - Rebouchage- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.180 : Niveau : 3ème étage / TGI / R+3 / Dégagements et zones d'attente - Joint de dilatation- (Présence d'amiante)

Prélèvement - P.180 : Niveau : 3ème étage / TGI / R+3 / Dégagements et zones d'attente - Joint de dilatation- (Présence d'amiante)

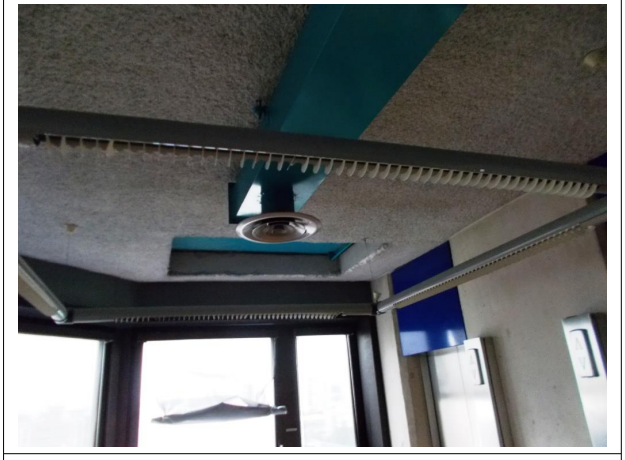

Prélèvement - P.181 : Niveau : 6ème étage / TGI / R+6 / Ensemble des pièces Ind.600 - Flocage- (Absence d'amiante)

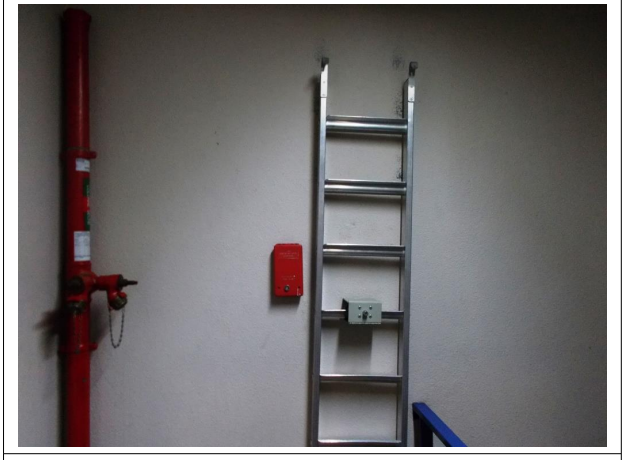

Prélèvement - P.182 : Niveau : 6ème étage / TGI / R+6 / Escalier d'accès T - Peinture- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.183 : Niveau : 6ème étage / TGI / R+6 / Escalier d'accès T - Peinture- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.184 : Niveau : 6ème étage / TGI / R+6 / Escalier d'accès C - Peinture- (Absence d'amiante)

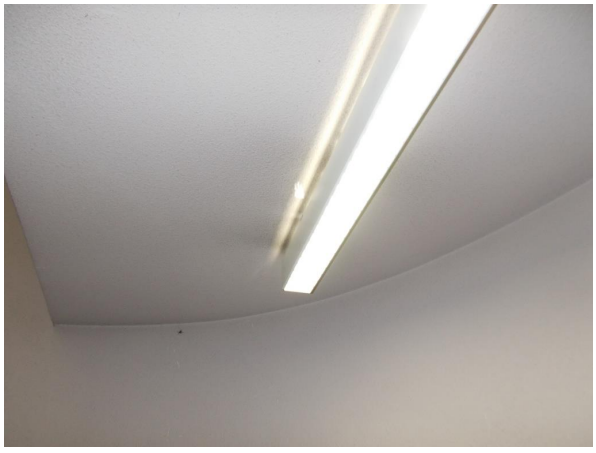

Prélèvement - P.185 : Niveau : 6ème étage / TGI / R+6 / Escalier d'accès C - Peinture- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.186 : Niveau : 6ème étage / TGI / R+6 / Ensemble des pièces Ind.600 - Moquette avec sous couche- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.187 : Niveau : 7ème étage / TGI / R+7 / Zones locaux techniques - Joint- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.188 : Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe / R-1 / Escalier d'accès A - Peinture- (Absence d'amiante)


Copyright BUREAU VERITAS

Prélèvement - P.189 : Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe / R-1 / Escalier d'accès A - Peinture- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.190 : Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe / R-1 / Dégagements - Moquette avec sous couche- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.191 : Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe / R-1 / Sanitaires - Clapet coupe-feu- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.192 : Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe / R-1 / Sanitaires - Rebouchage clapet- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.193 : Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe / R-1 / Sanitaires - Joint- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.194 : Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe / R-1 / Sanitaires - Joint- (Présence d'amiante)

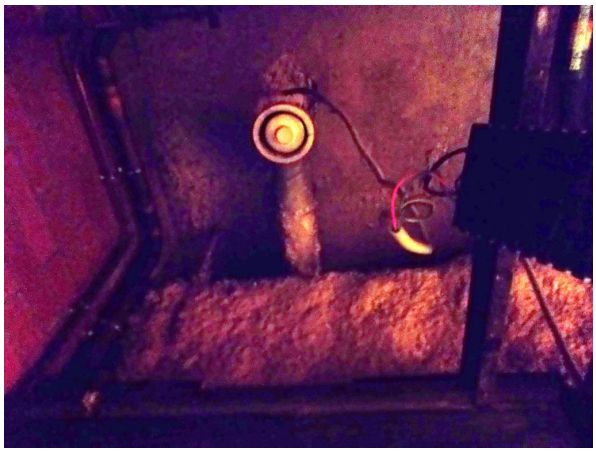

Prélèvement - P.195 : Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe / R-1 / Sanitaires - Flocage- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.196 : Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe / R-1 / Sanitaires - Colle de faïence- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.197 : Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe / R-1 / Archives Ind.S - Flocage- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.198 : Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe / R-1 / Archives Ind.S - Flocage- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.199 : Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe / R-1 / Archives Ind.S - Joint- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.200 : Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe / R-1 / Archives Ind.S - Bande calicot- (Absence d'amiante)


Copyright BUREAU VERITAS

Prélèvement - P.201 : Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe / R-1 / Archives Ind.S - Rebouchage- (Absence d'amiante)

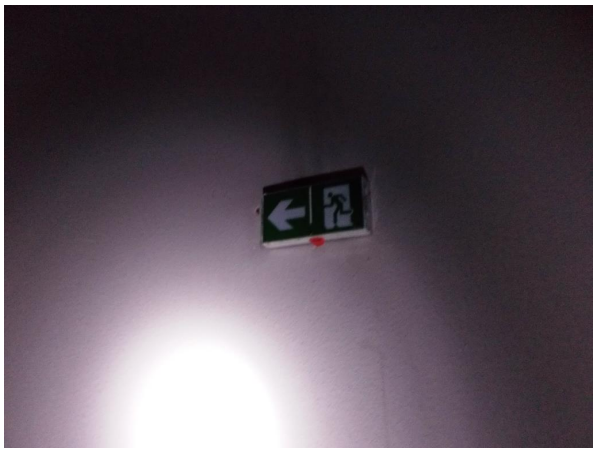

Prélèvement - P.202 : Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe / R-1 / Escalier d'accès B - Peinture- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.203 : Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe / R-1 / Escalier d'accès B - Peinture- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.204 : Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe / R-1 / Escalier d'accès B - Rebouchage- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.205 : Niveau : Pas Perdus / Bât. Annexe / R+1 / Zone SA N°1 - Flocage- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.206 : Niveau : Pas Perdus / Bât. Annexe / R+1 / Zone SA N°1 - Revêtement- (Absence d'amiante)


Copyright BUREAU VERITAS

Prélèvement - P.207 : Niveau : Pas Perdus / Bât. Annexe / R+1 / Zone SA N°1 - Peinture- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.208 : Niveau : Pas Perdus / Bât. Annexe / R+1 / Zone SA N°2 - Revêtement- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.209 : Niveau : Pas Perdus / Bât. Annexe / R+1 / Petit escalier - Peinture- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.210 : Niveau : Pas Perdus / Bât. Annexe / R+1 / Petit escalier - Peinture- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.211 : Niveau : Pas Perdus / Bât. Annexe / R+1 / Salle des délibérés - Peinture- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.212 : Niveau : Pas Perdus / Bât. Annexe / R+1 / Zone des délibérés avec WC - Flocage- (Absence d'amiante)


Copyright BUREAU VERITAS

Prélèvement - P.213 : Niveau R+0 / RDC / Bât. Annexe / Rez-de-chaussée / Dégagement Escalier A - Peinture- (Absence d'amiante)

Prélèvement - P.214 : Niveau R+0 / RDC / Bât. Annexe / Rez-de-chaussée / Dégagement Escalier A - Dalle de sol- (Absence d'amiante)


Copyright BUREAU VERITAS

Rapport AM-RTV
Copyright BUREAU VERITAS

MSIG
Europe

## ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous, soussignés **MSIG Insurance Europe AG,** Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire – 75009 PARIS – certifions par la présente que la Société :

**BUREAU VERITAS SERVICES France SAS**
8 Cours du Triangle 92800 Puteaux

a souscrit auprès de notre Compagnie, pour le compte de sa filiale :

**Bureau Veritas Exploitation SAS**
8 Cours du Triangle 92800 Puteaux

un contrat d'assurance de **RESPONSABILITE CIVILE** portant le numéro F210.16.0414.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la **RESPONSABILITE CIVILE** pouvant incomber à l'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre de ses activités de diagnostic amiante tels que :

- Diagnostic réglementaire avant travaux ou démolition
- Assistance technique pour travaux de traitement de l'amiante
- Repérage amiante (intégration au DTA ou DT parties privatives)
- Repérage amiante avant/après travaux ou démolition
- Réalisation ou mise à jour du dossier amiante
- Examen visuel après travaux de désamiantage
- Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans l'air des immeubles bâtis
- Prélèvement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension
- Analyse d'échantillons prélevés par l'Assuré
- Mesures d'exposition à l'amiante des travailleurs à leurs postes de travail
- Vérification périodique de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante dans les bâtiments
- Diagnostic amiante réglementaire de transaction
- Diagnostic amiante sur équipements industriels
- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments (décret 2011-610 du31 mars 2011) : concernant cette dernière mission il est précisé que les garanties s'appliquent y compris lorsque la mission porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets amiantés

Mais également analyses et/ou prélèvements d'échantillons, missions de recherche d'amiante, conseil en performance énergétique et/ou toutes missions connexes d'assistance technique et/ou de conseil découlant des missions de diagnostics ci-dessus et y compris les estimations financières liées aux propositions de solutions techniques formulées par l'Assuré.

MONTANTS DE GARANTIES

**RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION :**

Tous dommages confondus (dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non), **par sinistre** ..... **1 000 000 EUR**

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne

MSIG
Europe

**RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE PENDANT ET/OU APRES PRESTATION :**

Tous dommages confondus (dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non), **par année d'assurance**..... **1 000 000 EUR**

**La présente attestation valable du 01/01/2018 au 31/12/2018 à minuit, est délivrée, sous réserve du paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la Compagnie au-delà des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se réfère.**

**Paris, le 2 janvier 2018**

**MSIG Insurance Europe AG**
65, rue de la Victoire - 75009 Paris
Tél : 01 40 67 42 42 - Fax : 01 40 67 12 34
RCS Paris 753143882 APE 6512Z

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne

## 7.5. Certificat de compétence

La certification QUALIXPERT des diagnostiqueurs

**Certificat N° C0425**

**Monsieur Didier DENAVEAUT**

**Certifié dans le cadre du processus de certification PR04 consultable sur www.qualixpert.com conformément à l'ordonnance 2005-655 titre III du 8 juin 2005 et au décret 2006-1114 du 05 septembre 2006.**

cofrac CERTIFICATION DE PERSONNES ACCREDITATION N° 4-0094 PORTEE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR

**dans le(s) domaine(s) suivant(s) :**

| | | |
|---|---|---|
| **Amiante avec mention** | **Certificat valable**<br>**Du 17/08/2017**<br>**au 16/08/2022** | Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification. |

**Date d'établissement le jeudi 17 août 2017**

**Marjorie ALBERT**
**Directrice Administrative**

Pio



LCC 17, rue Borrel - 81100 CASTRES
Tél. 05 63 73 08 13 - Fax 05 63 73 32 87 - www.qualixpert.com
sarl au capital de 8000 euros - APE 7120B - RCS Castres SIRET 493 037 832 00018

F09 Certification de compétence version K-140415

## 7.6. Rapports d’essais de laboratoire

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
**Monsieur Didier DENAVEAUT**
10 Chaussée Jules César
Immeuble "Le Louisiane" - Zi Des Beaux Soleils
95526 CERGY PONTOISE CEDEX

**Numéro de dossier : 18A022722**
**Référence de dossier : 1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2**

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 18A022722-001 - Référence *BV3EC1511 Réf. plan : P.01 Niveau T : Sous-sol / Bât. Annexe/ R-3/ Aires de manœuvre/Plafond - Flocage - (cotonneux/blanc(he)/vers aire de stationnement 083)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-002 - Référence *BV3EC1512 Réf. plan : P.02 Niveau T : Sous-sol / Bât. Annexe/ R-3/ Aires de stationnement/Plafond - Flocage - (cotonneux/blanc(he)/sur aire de stationnement 021)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-003 - Référence *BV3EC1513 Réf. plan : P.03 Niveau T : Sous-sol / Bât. Annexe/ R-3/ Aires de stationnement/Conduit d'eau - Enveloppe de calorifugeage - (bitumineux/noir(e)/lignes fluides en contact avec le chemin de câbles sur aire de stationnement 021)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-004 - Référence *BV3EC1514 Réf. plan : P.04 Niveau T : Sous-sol / Bât. Annexe/ R-3/ Dégagement(s)/Mur - Enduit - (beige/de calfeutrement autour de la porte de sortie de secours au droit du BAES)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-005 - Référence *BV3EC1515 Réf. plan : P.05 Niveau T : Sous-sol / Bât. Annexe/ R-3/ Rampe(s) d'accès/Mur - Enduit de ragréage - (ciment/gris(e)/peint vert sur voile béton haut)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-006 - Référence *BV3EC1516 Réf. plan : P.06 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Escalier de secours/Mur - Enduit de ragréage - (ciment/gris(e)/peint vert sur voile béton haut)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-007 - Référence *BV3EC1517 Réf. plan : P.07 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Aires de stationnement/Poutre - Enduit de ragréage - (ciment/gris(e)/au droit des fourreaux en passage de câbles)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-008 - Référence *BV3EC1518 Réf. plan : P.08 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Rampe(s) d'accès/Plafond - Flocage - (cotonneux/blanc(he)/vers l'aire de stationnement 100)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-009 - Référence *BV3EC1519 Réf. plan : P.09 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Aires de manœuvre/Mur - Fourreau - (fibre-ciment/gris(e)/encastré dans voile béton en partie basse vers aire de stationnement 190)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-010 - Référence *BV3EC1520 Réf. plan : P.10 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Aires de manœuvre/Mur - Enduit de ragréage - (ciment/gris(e)/peint vert en bande verticale au droit du chemin de câbles vers aire de stationnement 190)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-011 - Référence *BV3EC1521 Réf. plan : P.11 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Aires de manœuvre/Poutre - Enduit de ragréage - (ciment/gris(e)/au droit des fourreaux passage de câbles vers aire de stationnement 186)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-012 - Référence *BV3EC1522 Réf. plan : P.12 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Aires de manœuvre/Plafond - Flocage - (cotonneux/blanc(he)/en dalle haute vers aire de stationnement 188)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-013 - Référence *BV3EC1523 Réf. plan : P.13 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Escalier d'accès/Mur - Enduit - (ciment/gris(e)/peint vert sur voile béton au droit du BAES)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-014 - Référence *BV3EC1524 Réf. plan : P.14 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée/ R-2/ Bureaux EIFFAGE/Revêtement de plafond - Peinture - (décorative/vert(e)/avec enduit blanc sur plafond béton)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-015 - Référence *BV3EC1525 Réf. plan : P.15 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée/ R-2/ Bureaux EIFFAGE/Revêtement de plafond - Peinture - (décorative/beige/avec enduit blanc sur plafond béton)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-016 - Référence *BV3EC1526 Réf. plan : P.16 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée/ R-2/ Bureaux EIFFAGE/Revêtement du mur - Peinture - (décorative/vert(e)/avec enduit blanc sur fond doublage en plaque de plâtre)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-017 - Référence *BV3EC1527 Réf. plan : P.17 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée/ R-2/ Bureaux EIFFAGE/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/bleu(e)/avec enduit blanc sur fond doublage en plaque de plâtre)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-018 - Référence *BV3EC1528 Réf. plan : P.18 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée/ R-2/ Aires de manœuvre/Mur - Enduit de ragréage - (ciment/gris(e)/en bande horizontale sur le voile dans zone Tour Aéro.)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-019 - Référence *BV3EC1529 Réf. plan : P.19 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée/ R-2/ Aires de stationnement/Mur - Rebouchage - (ciment/gris(e)/peint vert autour chemin de câbles sur aire de stationnement 205)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-020 - Référence *BV3EC1530 Réf. plan : P.20 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée/ R-2/ Aires de manœuvre/Poteau - Joint de dilatation - (mastic/gris(e)/souple au droit du BAES sur aire de stationnement 242)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-021 - Référence *BV3EC1531 Réf. plan : P.21 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée/ R-2/ Aires de manœuvre/Plafond - Flocage - (cotonneux/blanc(he)/en dalle haute vers aire de stationnement 286)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-022 - Référence *BV3EC1532 Réf. plan : P.22 Niveau R : Pas Perdus/ R-1/ Rampe(s) d'accès/Conduit - Enveloppe de calorifugeage - (bitumineux/noir(e)/avec laine jaune sur lignes fluides en jonction des tubes IRL)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-023 - Référence *BV3EC1533 Réf. plan : P.23 Niveau R : Pas Perdus/ R-1/ Aires de manœuvre/Poteau - Joint de dilatation - (mastic/gris(e)/souple au droit du BAES sur aire de stationnement 307)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-024 - Référence *BV3EC1534 Réf. plan : P.24 Niveau R : Pas Perdus/ R-1/ Escalier de secours/Mur - Enduit de ragréage - (ciment/gris(e)/peint vert au droit du BAES sur voile béton vers aire de stationnement 306)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-025 - Référence *BV3EC1535 Réf. plan : P.25 Niveau R : Pas Perdus/ R-1/ Escalier de secours/Mur - Rebouchage - (ciment/gris(e)/peint vert au droit de l'interrupteur)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-026 - Référence *BV3EC1536 Réf. plan : P.26 Niveau R : Pas Perdus/ R-1/ Aires de manœuvre/Plafond - Flocage - (cotonneux/blanc(he)/en dalle haute vers aire de stationnement 396)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-027 - Référence *BV3EC1537 Réf. plan : P.27 Niveau R : Pas Perdus/ R-1/ Aires de manœuvre/Poutre - Flocage - (cotonneux/blanc(he)/vers aire de stationnement 396)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-028 - Référence *BV3EC1538 Réf. plan : P.28 Niveau R : Pas Perdus/ R-1/ Escalier d'accès/Mur - Enduit de ragréage - (ciment/gris(e)/peint vert sur voile béton au droit du BAES)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-029 - Référence *BV3EC1539 Réf. plan : P.29 Niveau R : Pas Perdus/ R-1/ Aires de manœuvre/Poutre - Enduit de ragréage - (ciment/gris(e)/vers aire de stationnement 332)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-030 - Référence *BV3EC1540 Réf. plan : P.30 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Archives/Porte coupe feu - Joint coupe-feu - (bande/beige/languette CF de recouvrement de la PCF à 2 vantaux dans archives T40)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-031 - Référence *BV3EC1541 Réf. plan : P.31 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Archives/Porte coupe feu - Isolant intérieur porte - (rigide/blanc(he)/type plâtre dans l'âme de la porte CF à 2 vantaux dans archives T40)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-032 - Référence *BV3EC1542 Réf. plan : P.32 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Archives/Porte coupe feu - Joint coupe-feu - (bande/blanc(he)/peint bleu sur huisserie métallique de la porte CF à 2 vantaux dans archives T40)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-033 - Référence *BV3EC1543 Réf. plan : P.33 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Archives/Plafond - Flocage - (cotonneux/blanc(he)/en dalle haute dans archives T40)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-034 - Référence *BV3EC1544 Réf. plan : P.34 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Archives/Plafond - Rebouchage - (plâtreux/blanc(he)/au droit du flocage en dalle haute dans archives T40)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-035 - Référence *BV3EC1545 Réf. plan : P.35 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Archives/Clapet coupe-feu - Clapet coupe-feu - (plâtreux/rose/avec carton et aluminium - CCF de marque SGEI dans archives T40)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-036 - Référence *BV3EC1546 Réf. plan : P.36 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Archives/Clapet coupe-feu - Rebouchage clapet - (ciment/gris(e)/autour du CCF de marque SGEI dans archives T40)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-037 - Référence *BV3EC1547 Réf. plan : P.37 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Archives/Mur - Calfeutrement des passages de conduits - (mousse/jaune/au droit du chemin de câbles dans archives T40)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-038 - Référence *BV3EC1548 Réf. plan : P.38 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Archives/Plafond (collé ou vissé) - Panneau collé ou vissé - (composite/gris(e)/peint blanc comprenant une couche supérieure grise épaisse avec du fibrastyrène sous flocage en dalle haute dans archives T40)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-039 - Référence *BV3EC1549 Réf. plan : P.39 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Archives/Poteau - Peinture sur béton - (bitumineux/noir(e)/au droit du palier MC dans archives T40)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-040 - Référence *BV3EC1550 Réf. plan : P.40 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Archives/Mur - Enduit de ragréage - (ciment/gris(e)/sur voile béton du palier MC dans archives T40)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-041 - Référence *BV3EC1551 Réf. plan : P.41 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Archives/Cloison - Panneau - (composite/gris(e)/peint blanc comprenant une couche supérieure grise épaisse avec du fibrastyrène en doublage au dessus du voile béton dans archives T65)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-042 - Référence *BV3EC1552 Réf. plan : P.42 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Archives/Plafond - Rebouchage - (plâtreux/blanc(he)/au droit du flocage en dalle haute dans archives T65)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-043 - Référence *BV3EC1553 Réf. plan : P.43 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Archives/Cloison - Peinture - (décorative/blanc(he)/avec enduit blanc sur plaque de plâtre dans archives T63)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-044 - Référence *BV3EC1554 Réf. plan : P.44 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Dégagements/Mur - Rebouchage - (plâtreux/blanc(he)/vers archives T63/T64)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-045 - Référence *BV3EC1555 Réf. plan : P.45 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Escalier d'accès T/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-046 - Référence *BV3EC1556 Réf. plan : P.46 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Escalier d'accès T/Revêtement de plafond - Peinture - (gouttelette/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-047 - Référence *BV3EC1557 Réf. plan : P.47 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Dégagements/Plafond (collé ou vissé) - Panneau collé ou vissé - (composite/gris(e)/peint blanc comprenant une couche supérieure grise épaisse avec du fibrastyrène en doublage dans accès vers local technique T01)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-048 - Référence *BV3EC1558 Réf. plan : P.48 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Placards techniques/Plancher - Rebouchage - (plâtreux/blanc(he)/autour du chemin de câbles vers archives T50)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-049 - Référence *BV3EC1559 Réf. plan : P.49 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Placards techniques/Plancher - Rebouchage - (plâtreux/blanc(he)/autour du chemin de câbles vers archives T40)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-050 - Référence *BV3EC1560 Réf. plan : P.50 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Escalier d'accès S/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-051 - Référence *BV3EC1561 Réf. plan : P.51 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Escalier d'accès S/Revêtement de plafond - Peinture - (gouttelette/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-052 - Référence *BV3EC1562 Réf. plan : P.52 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Sanitaires/Revêtement du mur - Colle de faïence - (mortier/gris(e)/faïence 5x5 beige en contact des cornières de rive du faux-plafond dans sanitaires T21)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-053 - Référence *BV3EC1563 Réf. plan : P.53 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Sanitaires/Revêtement du mur - Joint de faïence - (ciment/gris(e)/de la faience 5x5 beige en contact des cornières de rive du faux-plafond dans sanitaires T21)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-054 - Référence *BV3EC1564 Réf. plan : P.54 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Sanitaires/Conduit - Joint - (bande/gris(e)/toilée en jonction de gaine VMC)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-055 - Référence *BV3EC1565 Réf. plan : P.55 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Dégagements/Mur - Rebouchage - (plâtreux/blanc(he)/autour du chemin de câbles vers T09/GF)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-056 - Référence *BV3EC1566 Réf. plan : P.56 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Autocom T15/Panneau - Colle - (blanche/sur panneau isolant type P.57)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-057 - Référence *BV3EC1567 Réf. plan : P.57 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Autocom T15/Cloison - Panneau - (composite/gris(e)/peint blanc comprenant une couche supérieure grise épaisse avec du fibrastyrène en doublage au dessus du voile béton)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-058 - Référence *BV3EC1568 Réf. plan : P.58 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Autocom T15/Mur - Enduit de ragréage - (ciment/gris(e)/en jonction entre le voile béton et les panneaux de doublage)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-059 - Référence *BV3EC1569 Réf. plan : P.59 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Petit(s) escalier(s) circulaire(s)/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/gris(e)/avec enduit beige vers sanitaires T11)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-060 - Référence *BV3EC1570 Réf. plan : P.60 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Sanitaires/Poteau - Colle de faïence - (mortier/gris(e)/faïence 5x5 beige en contact des supports du faux-plafond bois dans sanitaires T11)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-061 - Référence *BV3EC1571 Réf. plan : P.61 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Sanitaires/Poteau - Joint de faïence - (ciment/gris(e)/de la faïence 5x5 beige en contact des supports du faux-plafond bois dans sanitaires T11)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-062 - Référence *BV3EC1572 Réf. plan : P.62 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Petit(s) escalier(s) circulaire(s)/Mur - Rebouchage - (plâtreux/blanc(he)/autour du câble hublot vers sanitaires T11)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-063 - Référence *BV3EC1573 Réf. plan : P.63 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Zone ex. réserve cuisine/Plafond - Faux plafond - (fibreux/beige/dur en 1200x600 dans pièce T17)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-064 - Référence *BV3EC1574 Réf. plan : P.64 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Zone ex. réserve cuisine/Revêtement du mur - Colle de faïence - (mortier/gris(e)/faïence 15x15 blanche dans réserve cuisine T12)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-065 - Référence *BV3EC1575 Réf. plan : P.65 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Petit(s) escalier(s) circulaire(s)/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/gris(e)/avec enduit beige vers archives T63, côté dépôt Police)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-066 - Référence *BV3EC1576 Réf. plan : P.66 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Dégagements/Mur - Enduit projeté - (plâtreux/blanc(he)/type Fibrith sur dégagement dépôt)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-067 - Référence *BV3EC1577 Réf. plan : P.67 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI/ R-2/ Archives/Clapet coupe-feu - Clapet coupe-feu - (fibreux/blanc(he)/en partie haute du mur de marque PANOL dans local archives N°4)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-068 - Référence *BV3EC1578 Réf. plan : P.68 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI/ R-2/ Archives/Conduit d'air - Joint - (mastic/marron/sur gaine rectangulaire en jonction du CCF dans local archives N°4)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-069 - Référence *BV3EC1579 Réf. plan : P.69 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI/ R-2/ Archives/Plafond - Flocage - (cotonneux/blanc(he)/en dalle haute sur jonction poutre du local archives N°4)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-070 - Référence *BV3EC1580 Réf. plan : P.70 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI/ R-2/ Archives/Conduit - Enveloppe de calorifugeage - (plâtreux/blanc(he)/autour de la fonte en partie haute du local archives N°4)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-071 - Référence *BV3EC1581 Réf. plan : P.71 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI/ R-2/ Escalier d'accès B/Revêtement de plafond - Peinture - (gouttelette/beige/avec fond d'enduit en dalle haute)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-072 - Référence *BV3EC1582 Réf. plan : P.72 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI/ R-2/ Escalier d'accès B/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/beige/avec fond d'enduit sur voile béton)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-073 - Référence *BV3EC1583 Réf. plan : P.73 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI/ R-2/ Escalier d'accès C/Revêtement de plafond - Peinture - (gouttelette/beige/avec fond d'enduit en dalle haute)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-074 - Référence *BV3EC1584 Réf. plan : P.74 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI/ R-2/ Escalier d'accès C/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/beige/avec fond d'enduit sur voile béton)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-075 - Référence *BV3EC1585 Réf. plan : P.75 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI/ R-2/ Petit(s) escalier(s) circulaire(s)/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/gris(e)/avec fond d'enduit sur voile béton - escalier d'accès vers SA N°4 depuis Dépôt Police)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-076 - Référence *BV3EC1586 Réf. plan : P.76 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI/ R-2/ Placards techniques/Plancher - Rebouchage - (plâtreux/blanc(he)/autour du chemin de câbles vers escalier T)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-077 - Référence *BV3EC1587 Réf. plan : P.77 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI/ R-2/ Placards techniques/Plancher - Rebouchage - (mousse expensée/jaune/autour du chemin de câbles vers escalier T)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-078 - Référence *BV3EC1588 Réf. plan : P.78 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI/ R-2/ Ensemble des pièces Ind.S/Revêtement de cloison - Peinture - (décorative/gris(e)/avec fond d'enduit sur paroi de doublage plâtre dans pièce S23)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-079 - Référence *BV3EC1589 Réf. plan : P.79 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI/ R-2/ Ensemble des pièces Ind.S/Poteau - Peinture - (décorative/gris(e)/avec fond d'enduit sur poteau béton dans pièce S23)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-080 - Référence *BV3EC1590 Réf. plan : P.80 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI/ R-2/ Sanitaires/Revêtement du mur - Colle de faïence - (mortier/gris(e)/faïence 5x5 beige en jonction des supports du faux-plafond bois dans sanitaires hommes vers pièce S23)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-081 - Référence *BV3EC1591 Réf. plan : P.81 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI/ R-2/ Sanitaires/Revêtement du mur - Colle de faïence - (mortier/gris(e)/faïence 5x5 beige en jonction des supports du faux-plafond bois dans sanitaires femmes vers pièce S23)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-082 - Référence *BV3EC1592 Réf. plan : P.82 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI/ R-2/ Ensemble des pièces Ind.S/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/gris(e)/avec fond d'enduit dans pièce S24)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-083 - Référence *BV3EC1593 Réf. plan : P.83 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI/ R-2/ Ensemble des pièces Ind.S/Revêtement de plafond - Peinture - (gouttelette/gris(e)/avec fond d'enduit en dalle haute dans pièce S24)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-084 - Référence *BV3EC1594 Réf. plan : P.84 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI/ R-2/ CTA assise N°2/Mur - Enduit de ragréage - (ciment/gris(e)/peint gris sur voile béton)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-085 - Référence *BV3EC1595 Réf. plan : P.85 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI/ R-2/ Stockage Assise N°2/Mur - Enduit de ragréage - (ciment/gris(e)/peint gris sur voile béton)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-086 - Référence *BV3EC1596 Réf. plan : P.86 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI/ R-2/ Escalier d'accès Assise N°2/Revêtement du mur - Peinture - (décorative/gris(e)/avec fond d'enduit sur voile béton)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-087 - Référence *BV3EC1597 Réf. plan : P.87 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI/ R-2/ Logement S10 - Rez-de-chaussée/Mur - Toile de verre - (peint/beige/sur fond de doublage en plaque de plâtre dans séjour)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-088 - Référence *BV3EC1598 Réf. plan : P.88 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI/ R-2/ Logement S10 - Rez-de-chaussée/Revêtement de plafond - Peinture - (décorative/blanc(he)/avec fond d'enduit en dalle haute du séjour)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-089 - Référence *BV3EC1599 Réf. plan : P.89 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI/ R-2/ Logement S10 - Rez-de-chaussée/Revêtement de plafond - Peinture - (décorative/blanc(he)/avec fond d'enduit en dalle haute dans chambre 1)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-090 - Référence *BV3EC1600 Réf. plan : P.90 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI/ R-2/ Logement S10 - Rez-de-chaussée/Revêtement du mur - Colle de faïence - (mortier/blanc(he)/avec joint beige sur faïence 20x10 rose au dessus du lavabo dans SDB)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-091 - Référence *BV3EC1601 Réf. plan : P.91 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI/ R-2/ Escalier de secours Assise N°2/Mur - Enduit projeté - (plâtreux/blanc(he)/type Fibrith depuis Dépôt Police)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-092 - Référence *BV3EC1602 Réf. plan : P.92 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI/ R-2/ Ensemble des pièces Ind.S/Mur - Rebouchage - (plâtreux/blanc(he)/au droit de la boite d'encastrement simple électrique dans pièce S43)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-093 - Référence *BV3EC1603 Réf. plan : P.93 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI/ R-2/ Placards techniques/Plancher - Rebouchage - (plâtreux/blanc(he)/autour du chemin de câbles vers escalier S)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-094 - Référence *BV3EC1604 Réf. plan : P.94 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI/ R-2/ Escalier d'accès S/Revêtement de plafond - Peinture - (gouttelette/beige/avec fond d'enduit en dalle haute)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-095 - Référence *BV3EC1605 Réf. plan : P.95 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI/ R-2/ Escalier d'accès S/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/beige/avec fond d'enduit)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-096 - Référence *BV3EC1606 Réf. plan : P.96 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI/ R-2/ Escalier d'accès T/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/beige/avec fond d'enduit)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-097 - Référence *BV3EC1607 Réf. plan : P.97 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI/ R-2/ Escalier d'accès T/Revêtement de plafond - Peinture - (gouttelette/beige/avec fond d'enduit en dalle haute)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-098 - Référence *BV3EC1608 Réf. plan : P.98 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI/ R-2/ Ensemble des pièces Ind.S/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/gris(e)/avec fond d'enduit dans pièce S41)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-099 - Référence *BV3EC1609 Réf. plan : P.99 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI/ R-2/ Ensemble des pièces Ind.S/Revêtement de plafond - Peinture - (gouttelette/gris(e)/avec fond d'enduit en dalle haute dans pièce S41)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-100 - Référence *BV3EC1610 Réf. plan : P.100 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI/ R-2/ Zone ex. cuisine/Panneau sandwich - Panneau - (composite/gris(e)/panneau isolant de chambre froide (isothermique) type ciment peint beige avec polystyrène dans pièce S18)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-101 - Référence *BV3EC1611 Réf. plan : P.101 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI/ R-2/ Ensemble des pièces Ind.S/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/blanc(he)/avec fond d'enduit dans espace pièces S21/S22)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-102 - Référence *BV3EC1612 Réf. plan : P.102 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI/ R-2/ Dégagements/Porte coupe feu - Joint coupe-feu - (mousse/jaune/en pénétration du chemin de câbles dans imposte de la porte CF de la zone machine à café vers escalier B)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-103 - Référence *BV3EC1613 Réf. plan : P.103 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI/ R-2/ Zone ex. cuisine/Revêtement de plafond - Peinture - (gouttelette/beige/avec fond d'enduit en dalle haute dans espace cuisine)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-104 - Référence *BV3EC1614 Réf. plan : P.104 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI/ R-2/ Zone ex. cuisine/Revêtement de plafond - Peinture - (gouttelette/beige/avec fond d'enduit dans local poubelles)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-105 - Référence *BV3EC1615 Réf. plan : P.105 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI/ R-2/ Zone ex. cuisine/Revêtement du mur - Colle de faïence - (mortier/blanc(he)/faïence 20x20 blanc dans espace cuisine)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-106 - Référence *BV3EC1616 Réf. plan : P.106 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI/ R-2/ Zone ex. cuisine/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/beige/avec fond d'enduit dans espace cuisine)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-107 - Référence *BV3EC1617 Réf. plan : P.107 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI/ R-2/ Zone ex. cuisine/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/beige/avec fond d'enduit ciment sur mur en parpaings dans le bureau)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-108 - Référence *BV3EC1618 Réf. plan : P.108 Niveau R : Pas Perdus / TGI/ R-1/ Zone Ordre des Avocats/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/beige/avec fond d'enduit au droit du petit escalier circulaire)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-109 - Référence *BV3EC1619 Réf. plan : P.109 Niveau R : Pas Perdus / TGI/ R-1/ Zone Ordre des Avocats/Poteau - Peinture - (décorative/beige/avec fond d'enduit dans bureau)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-110 - Référence *BV3EC1620 Réf. plan : P.110 Niveau R : Pas Perdus / TGI/ R-1/ Zone Ordre des Avocats/Plafond - Flocage - (cotonneux/blanc(he)/avec croûte blanche en dalle haute de l'espace des avocats)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-111 - Référence *BV3EC1621 Réf. plan : P.111 Niveau R : Pas Perdus / TGI/ R-1/ Zone Tribunal pour Enfants/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/jaune/avec fond d'enduit sur paroi de doublage en plaque de plâtre dans pièce R30)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-112 - Référence *BV3EC1622 Réf. plan : P.112 Niveau R : Pas Perdus / TGI/ R-1/ Zone Tribunal pour Enfants/Poutre - Peinture - (gouttelette/jaune/avec fond d'enduit sur poutre béton dans pièce R30)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-113 - Référence *BV3EC1623 Réf. plan : P.113 Niveau R : Pas Perdus / TGI/ R-1/ Zone Tribunal pour Enfants/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/beige/avec fond d'enduit sur paroi de doublage en plaque de plâtre dans pièce R42)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-114 - Référence *BV3EC1624 Réf. plan : P.114 Niveau R : Pas Perdus / TGI/ R-1/ Zone Tribunal pour Enfants/Revêtement de plafond - Peinture - (décorative/blanc(he)/avec fond d'enduit en dalle haute dans pièce R44)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-115 - Référence *BV3EC1625 Réf. plan : P.115 Niveau R : Pas Perdus / TGI/ R-1/ Zone ICJ/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/beige/avec fond d'enduit sur paroi de doublage en plaque de plâtre dans pièce R72)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-116 - Référence *BV3EC1626 Réf. plan : P.116 Niveau R : Pas Perdus / TGI/ R-1/ Zone ICJ/Poutre - Peinture - (gouttelette/beige/avec fond d'enduit sur poutre béton dans pièce R72)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-117 - Référence *BV3EC1627 Réf. plan : P.117 Niveau R : Pas Perdus / TGI/ R-1/ Zone ICJ/Revêtement de cloison - Peinture - (gouttelette/beige/avec fond d'enduit dans pièce R60)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-118 - Référence *BV3EC1628 Réf. plan : P.118 Niveau R : Pas Perdus / TGI/ R-1/ Zone SAP N°4/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/gris(e)/avec fond d'enduit sur mur du petit escalier circulaire)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-119 - Référence *BV3EC1629 Réf. plan : P.119 Niveau R : Pas Perdus / TGI/ R-1/ Zone SAP N°3/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/gris(e)/avec fond d'enduit sur dégagement du petit escalier circulaire via Dépôt Police)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-120 - Référence *BV3EC1630 Réf. plan : P.120 Niveau R : Pas Perdus / TGI/ R-1/ Zone ICJ/Revêtement du mur - Peinture - (décorative/blanc(he)/avec fond d'enduit sur noyau externe du petit escalier circulaire via Dépôt Police)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-121 - Référence *BV3EC1631 Réf. plan : P.121 Niveau R : Pas Perdus / TGI/ R-1/ Zone ICJ/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/gris(e)/avec fond d'enduit sur noyau interne du petit escalier circulaire via Dépôt Police)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-122 - Référence *BV3EC1632 Réf. plan : P.122 Niveau R : Pas Perdus / TGI/ R-1/ Zone Tribunal pour Enfants/Revêtement du mur - Colle de faïence - (mortier/gris(e)/faience 5x5 beige en jonction des support du faux-plafond bois dans sanitaires via Dépôt Police)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-123 - Référence *BV3EC1633 Réf. plan : P.123 Niveau R : Pas Perdus / TGI/ R-1/ Zone Tribunal pour Enfants/Revêtement de plafond - Peinture - (gouttelette/gris(e)/avec fond d'enduit dans dégagement via Dépôt de Police)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-124 - Référence *BV3EC1634 Réf. plan : P.124 Niveau R : Pas Perdus / TGI/ R-1/ Zone Tribunal pour Enfants/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/gris(e)/avec fond d'enduit sur noyau interne du petit escalier circulaire via Dépôt Police)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-125 - Référence *BV3EC1635 Réf. plan : P.125 Niveau R : Pas Perdus / TGI/ R-1/ Salle de médiation/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/beige/avec fond d'enduit)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-126 - Référence *BV3EC1636 Réf. plan : P.126 Niveau R : Pas Perdus / TGI/ R-1/ Salle de médiation/Revêtement de plafond - Peinture - (gouttelette/beige/avec fond d'enduit en dalle haute)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-127 - Référence *BV3EC1637 Réf. plan : P.127 Niveau R : Pas Perdus / TGI/ R-1/ Zone ICJ/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/gris(e)/avec fond d'enduit sur noyau externe du petit escalier circulaire via Dépôt Police sur Assise 1)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-128 - Référence *BV3EC1638 Réf. plan : P.128 Niveau P : Parvis / TGI/ R+0/ Zone SA N °2/Charpente - Peinture - (décorative/bleu(e)/avec fond d'enduit blanc + antirouille orange sur charpente tridimentionnelle)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-129 - Référence *BV3EC1639 Réf. plan : P.129 Niveau P : Parvis / TGI/ R+0/ Zone des Délibérés SA N°1 et N°2/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/gris(e)/avec fond d'enduit sur noyau interne du petit escalier circulaire)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-130 - Référence *BV3EC1640 Réf. plan : P.130 Niveau P : Parvis / TGI/ R+0/ Zone BAJ/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/blanc(he)/avec fond d'enduit sur paroi de doublage en plaque de plâtre dans bureau P03)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-131 - Référence *BV3EC1641 Réf. plan : P.131 Niveau P : Parvis / TGI/ R+0/ Zone BAJ/Plafond - Flocage - (cotonneux/blanc(he)/avec croûte grise en dalle haute dans dégagement)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-132 - Référence *BV3EC1642 Réf. plan : P.132 Niveau P : Parvis / TGI/ R+0/ Assise N °1/Charpente - Peinture - (décorative/bleu(e)/avec fond d'enduit blanc + antirouille orange)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-133 - Référence *BV3EC1643 Réf. plan : P.133 Niveau P : Parvis / TGI/ R+0/ Zone BAJ/Poutre - Peinture - (décorative/blanc(he)/avec fond d'enduit dans dégagement)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-134 - Référence *BV3EC1644 Réf. plan : P.134 Niveau P : Parvis / TGI/ R+0/ Zone Infirmerie/Poteau - Peinture - (décorative/beige/avec fond d'enduit dans hall d'attente)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-135 - Référence *BV3EC1645 Réf. plan : P.135 Niveau P : Parvis / TGI/ R+0/ Zone Infirmerie/Revêtement du mur - Peinture - (décorative/blanc(he)/avec fond d'enduit sur paroi de doublage en plaque de plâtre)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-136 - Référence *BV3EC1646 Réf. plan : P.136 Niveau P : Parvis / TGI/ R+0/ Zone Tribunal pour Enfants/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/beige/avec fond d'enduit dans pièce P23)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-137 - Référence *BV3EC1647 Réf. plan : P.137 Niveau P : Parvis / TGI/ R+0/ Zone Tribunal pour Enfants/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/blanc(he)/avec fond d'enduit sur paroi de doublage en plaque de plâtre dans pièce P30)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-138 - Référence *BV3EC1648 Réf. plan : P.138 Niveau P : Parvis / TGI/ R+0/ Zone Tribunal pour Enfants/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/blanc(he)/avec fond d'enduit)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-139 - Référence *BV3EC1649 Réf. plan : P.139 Niveau P : Parvis / TGI/ R+0/ Zone SOP/Revêtement du mur - Peinture - (décorative/jaune/avec fond d'enduit blanc et ragréage gris dans salle d'ordonnance pénale)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-140 - Référence *BV3EC1650 Réf. plan : P.140 Niveau P : Parvis / TGI/ R+0/ Zone SOP/Plafond - Flocage - (cotonneux/blanc(he)/dans plénum de la salle d'ordonnance pénale)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-141 - Référence *BV3EC1651 Réf. plan : P.141 Niveau P : Parvis / TGI/ R+0/ Zone SOP/Poutre - Peinture - (décorative/blanc(he)/avec fond d'enduit dans dégagement vers SA N°5)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-142 - Référence *BV3EC1652 Réf. plan : P.142 Niveau P : Parvis / TGI/ R+0/ Zone SA N °6/Mur - Revêtement - (tapisserie/beige/y compris fond sur noyau externe du petit escalier circulaire dans dégagement vers SA N°6)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-143 - Référence *BV3EC1653 Réf. plan : P.143 Niveau P : Parvis / TGI/ R+0/ Zone des Délibérés SA N°5 et N°6/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/gris(e)/avec fond d'enduit sur noyau interne du petit escalier circulaire)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-144 - Référence *BV3EC1654 Réf. plan : P.144 Niveau P : Parvis / TGI/ R+0/ Zone Tribunal pour Enfants/Plancher - Rebouchage - (plâtreux/blanc(he)/autour chemin de câbles dans local technique électrique vers escalier S)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-145 - Référence *BV3EC1655 Réf. plan : P.145 Niveau P : Parvis / TGI/ R+0/ Escalier d'accès A/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/beige/avec fond d'enduit blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-146 - Référence *BV3EC1656 Réf. plan : P.146 Niveau P : Parvis / TGI/ R+0/ Escalier d'accès A/Revêtement de plafond - Peinture - (gouttelette/beige/avec fond d'enduit blanc en dalle haute)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-147 - Référence *BV3EC1657 Réf. plan : P.147 Niveau P : Parvis / TGI/ R+0/ Escalier d'accès D/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/beige/avec fond d'enduit blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-148 - Référence *BV3EC1658 Réf. plan : P.148 Niveau P : Parvis / TGI/ R+0/ Escalier d'accès D/Revêtement de plafond - Peinture - (gouttelette/beige/avec fond d'enduit blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-149 - Référence *BV3EC1659 Réf. plan : P.149 Niveau P : Parvis / TGI/ R+0/ Zone ICJ/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/beige/avec fond d'enduit dans pièce P75)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-150 - Référence *BV3EC1660 Réf. plan : P.150 Niveau P : Parvis / TGI/ R+0/ Zone ICJ/Mur - Toile de verre - (peint/beige/avec fond d'enduit sur paroi de doublage en plaque de plâtre dans pièce P73)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 18A022722-151 - Référence *BV3EC1661 Réf. plan : P.151 Niveau P : Parvis / TGI/ R+0/ Zone ICJ/Revêtement du mur - Peinture - (décorative/beige/avec fond d'enduit sur support plâtre)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS**
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

**BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS**
**Monsieur Didier DENAVEAUT**
10 Chaussée Jules César
Immeuble "Le Louisiane" - Zi Des Beaux Soleils
95526 CERGY PONTOISE CEDEX

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KE-053423-01
Référence laboratoire sous-traitant N° : 18KE016806
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 15/06/2018
Date d'analyse : 15/06/2018
Référence Dossier :
1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Version du : 20/06/2018 20:07
Référence de suivi du dossier N° : 18A022722
Date de réception : 14/06/2018



Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 001 | 18A022722-001 | BV3EC1511 Réf. plan : P.01 Niveau T : Sous-sol / Bât. Annexe/ R-3/ Aires de manœuvre/Plafond - Flocage - (cotonneux/blanc(he)/vers aire de stationnement 083) | Matériau friable fibreux de type flocage (gris) ; matériau (pulvérulent) (marron) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 002 (1) | 18A022722-002 | BV3EC1512 Réf. plan : P.02 Niveau T : Sous-sol / Bât. Annexe/ R-3/ Aires de stationnement/ Plafond - Flocage - (cotonneux/blanc(he)/sur aire de stationnement 021) | Matériau friable fibreux de type flocage (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 67 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KE-053423-01
Version du : 20/06/2018 20:07

Référence laboratoire sous-traitant N° : 18KE016806
Référence de suivi du dossier N° : 18A022722
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 15/06/2018
Date de réception : 14/06/2018
Date d'analyse : 15/06/2018
Référence Dossier :
1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 003 | 18A022722-003 | BV3EC1513 Réf. plan : P.03 Niveau T : Sous-sol / Bât. Annexe/ R-3/ Aires de stationnement/ Conduit d"eau - Enveloppe de calorifugeage - (bitumineux/noir(e)/lignes fluides en contact avec le chemin de câbles sur aire de stationnement 021) | Matériau souple bitumineux (noir) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 004 | 18A022722-004 | BV3EC1514 Réf. plan : P.04 Niveau T : Sous-sol / Bât. Annexe/ R-3/ Dégagement(s)/Mur - Enduit - (beige/de calfeutrement autour de la porte de sortie de secours au droit du BAES) | Matériau semi-dur de type enduit (gris) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | | | | | | |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 67 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS**
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KE-053423-01
Version du : 20/06/2018 20:07

Référence laboratoire sous-traitant N° : 18KE016806
Référence de suivi du dossier N° : 18A022722
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 15/06/2018
Date de réception : 14/06/2018
Date d'analyse : 15/06/2018
Référence Dossier :
1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 005 | 18A022722-005 | BV3EC1515 Réf. plan : P.05 Niveau T : Sous-sol / Bât. Annexe/ R-3/ Rampe(s) d''accès/Mur - Enduit de ragréage - (ciment/gris(e) /peint vert sur voile béton haut) | Matériau de type peinture (vert) (clair) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | | Matériau semi-dur de type enduit (gris) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 006 | 18A022722-006 | BV3EC1516 Réf. plan : P.06 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Escalier de secours/Mur - Enduit de ragréage - (ciment/gris(e) /peint vert sur voile béton haut) | Matériau de type peinture (vert) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | | Matériau de type peinture (vert) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (gris) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 007 | 18A022722-007 | BV3EC1517 Réf. plan : P.07 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Aires de stationnement/ Poutre - Enduit de ragréage - (ciment/gris(e) /au droit des fourreaux en passage de câbles) | Matériau semi-dur de type enduit (gris) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 67 page(s)
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS**
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KE-053423-01
Version du : 20/06/2018 20:07

Référence laboratoire sous-traitant N° : 18KE016806
Référence de suivi du dossier N° : 18A022722
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 15/06/2018
Date de réception : 14/06/2018
Date d'analyse : 15/06/2018
Référence Dossier :
1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 008 | 18A022722-008 | BV3EC1518 Réf. plan : P.08 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Rampe(s) d''accès/Plafond - Flocage - (cotonneux/blanc(he)/vers l''aire de stationnement 100) | Matériau friable fibreux de type flocage (blanc) ; matériau (pulvérulent) (noir) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 009 | 18A022722-009 | BV3EC1519 Réf. plan : P.09 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Aires de manœuvre/Mur - Fourreau - (fibre-ciment/gris(e)/encastré dans voile béton en partie basse vers aire de stationnement 190) | Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) | **MOLP** * | 3 | - | Fibres d'amiante de type chrysotile, crocidolite |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 67 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS**
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KE-053423-01
Version du : 20/06/2018 20:07

Référence laboratoire sous-traitant N° : 18KE016806
Référence de suivi du dossier N° : 18A022722
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 15/06/2018
Date de réception : 14/06/2018
Date d'analyse : 15/06/2018
Référence Dossier :
1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 010 | 18A022722-010 | BV3EC1520 Réf. plan : P.10 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Aires de manœuvre/Mur - Enduit de ragréage - (ciment/gris(e) /peint vert en bande verticale au droit du chemin de câbles vers aire de stationnement 190) | Matériau de type peinture (vert) + (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 011 | 18A022722-011 | BV3EC1521 Réf. plan : P.11 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Aires de manœuvre/Poutre - Enduit de ragréage - (ciment/gris(e) /au droit des fourreaux passage de câbles vers aire de stationnement 186) | Matériau semi-dur de type enduit (gris) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 67 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS**
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KE-053423-01 | Version du : 20/06/2018 20:07 | 
Référence laboratoire sous-traitant N° : 18KE016806 | Référence de suivi du dossier N° : 18A022722
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 15/06/2018 | Date de réception : 14/06/2018
Date d'analyse : 15/06/2018
Référence Dossier : 1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 012 | 18A022722-012 | BV3EC1522 Réf. plan : P.12 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Aires de manœuvre/Plafond - Flocage - (cotonneux/blanc(he)/en dalle haute vers aire de stationnement 188) | Matériau semi-dur (gris) ; matériau friable fibreux de type flocage (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 013 | 18A022722-013 | BV3EC1523 Réf. plan : P.13 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Escalier d''accès/Mur - Enduit - (ciment/gris(e) /peint vert sur voile béton au droit du BAES) | Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) en traces | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | | Matériau semi-dur de type enduit (gris) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 014 | 18A022722-014 | BV3EC1524 Réf. plan : P.14 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée/ R-2/ Bureaux EIFFAGE/Revêtement de plafond - Peinture - (décorative/vert(e)/avec enduit blanc sur plafond béton) | Matériau de type peinture (vert) (foncé) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 67 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS**
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KE-053423-01
Version du : 20/06/2018 20:07

Référence laboratoire sous-traitant N° : 18KE016806
Référence de suivi du dossier N° : 18A022722
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 15/06/2018
Date de réception : 14/06/2018
Date d'analyse : 15/06/2018
Référence Dossier :
1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 015 | 18A022722-015 | BV3EC1525 Réf. plan : P.15 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée/ R-2/ Bureaux EIFFAGE/Revêtement de plafond - Peinture - (décorative/beige/avec enduit blanc sur plafond béton) | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 016 | 18A022722-016 | BV3EC1526 Réf. plan : P.16 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée/ R-2/ Bureaux EIFFAGE/Revêtement du mur - Peinture - (décorative/vert(e)/avec enduit blanc sur fond doublage en plaque de plâtre) | Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | | Matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 67 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS**
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KE-053423-01 | Version du : 20/06/2018 20:07 | 
Référence laboratoire sous-traitant N° : 18KE016806 | Référence de suivi du dossier N° : 18A022722
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 15/06/2018 | Date de réception : 14/06/2018
Date d'analyse : 15/06/2018
Référence Dossier : 1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 017 | 18A022722-017 | BV3EC1527 Réf. plan : P.17 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée/ R-2/ Bureaux EIFFAGE/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/bleu(e)/avec enduit blanc sur fond doublage en plaque de plâtre) | Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 018 | 18A022722-018 | BV3EC1528 Réf. plan : P.18 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée/ R-2/ Aires de manœuvre/Mur - Enduit de ragréage - (ciment/gris(e)/en bande horizontale sur le voile dans zone Tour Aéro.) | Matériau semi-dur de type enduit (gris) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | | Matériau de type polystyrène (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 67 page(s)
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS**
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KE-053423-01 | Version du : 20/06/2018 20:07 | 
Référence laboratoire sous-traitant N° : 18KE016806 | Référence de suivi du dossier N° : 18A022722
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 15/06/2018 | Date de réception : 14/06/2018
Date d'analyse : 15/06/2018
Référence Dossier : 1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 019 | 18A022722-019 | BV3EC1529 Réf. plan : P.19 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée/ R-2/ Aires de stationnement/ Mur - Rebouchage - (ciment/gris(e) /peint vert autour chemin de câbles sur aire de stationnement 205) | Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) en traces | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | | Matériau semi-dur de type enduit (gris) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 020 | 18A022722-020 | BV3EC1530 Réf. plan : P.20 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée/ R-2/ Aires de manœuvre/Poteau - Joint de dilatation - (mastic/gris(e)/ souple au droit du BAES sur aire de stationnement 242) | Matériau souple de type mastic (gris) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 67 page(s)
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS**
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KE-053423-01
Version du : 20/06/2018 20:07

Référence laboratoire sous-traitant N° : 18KE016806
Référence de suivi du dossier N° : 18A022722
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 15/06/2018
Date de réception : 14/06/2018
Date d'analyse : 15/06/2018
Référence Dossier :
1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 021 | 18A022722-021 | BV3EC1531 Réf. plan : P.21 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée/ R-2/ Aires de manœuvre/Plafond - Flocage - (cotonneux/blanc(he)/en dalle haute vers aire de stationnement 286) | Matériau fibreux de type isolant (blanc) ; matériau (pulvérulent) (noir) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 022 | 18A022722-022 | BV3EC1532 Réf. plan : P.22 Niveau R : Pas Perdus/ R-1/ Rampe(s) d''accès/Conduit - Enveloppe de calorifugeage - (bitumineux/noir(e)/avec laine jaune sur lignes fluides en jonction des tubes IRL) | Matériau souple bitumineux (noir) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | | Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (pulvérulent) (noir) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 67 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS**
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KE-053423-01
Version du : 20/06/2018 20:07

Référence laboratoire sous-traitant N° : 18KE016806
Référence de suivi du dossier N° : 18A022722
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 15/06/2018
Date de réception : 14/06/2018
Date d'analyse : 15/06/2018
Référence Dossier :
1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 023 (1) | 18A022722-023 | BV3EC1533 Réf. plan : P.23 Niveau R : Pas Perdus/ R-1/ Aires de manœuvre/Pot eau - Joint de dilatation - (mastic/gris(e)/ souple au droit du BAES sur aire de stationnement 307) | Matériau de type peinture (noir) ; matériau souple de type joint (gris) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 024 | 18A022722-024 | BV3EC1534 Réf. plan : P.24 Niveau R : Pas Perdus/ R-1/ Escalier de secours/Mur - Enduit de ragréage - (ciment/gris(e) /peint vert au droit du BAES sur voile béton vers aire de stationnement 306) | Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) en traces | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | | Matériau semi-dur de type enduit (gris) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 025 (1) | 18A022722-025 | BV3EC1535 Réf. plan : P.25 Niveau R : Pas Perdus/ R-1/ Escalier de secours/Mur - Rebouchage - (ciment/gris(e) /peint vert au droit de l''interrupteur) | Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 67 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS**
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KE-053423-01
Version du : 20/06/2018 20:07

Référence laboratoire sous-traitant N° : 18KE016806
Référence de suivi du dossier N° : 18A022722
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 15/06/2018
Date de réception : 14/06/2018
Date d'analyse : 15/06/2018
Référence Dossier :
1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 026 | 18A022722-026 | BV3EC1536 Réf. plan : P.26 Niveau R : Pas Perdus/ R-1/ Aires de manœuvre/Plafond - Flocage - (cotonneux/blanc(he)/en dalle haute vers aire de stationnement 396) | Matériau friable fibreux de type flocage (blanc) ; matériau (poudreux) (gris) | **MET** | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 027 | 18A022722-027 | BV3EC1537 Réf. plan : P.27 Niveau R : Pas Perdus/ R-1/ Aires de manœuvre/Poutre - Flocage - (cotonneux/blanc(he)/vers aire de stationnement 396) | Matériau friable fibreux de type flocage (blanc) ; matériau (poudreux) (gris) | **MET** | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 028 (1) | 18A022722-028 | BV3EC1538 Réf. plan : P.28 Niveau R : Pas Perdus/ R-1/ Escalier d''accès/Mur - Enduit de ragréage - (ciment/gris(e) /peint vert sur voile béton au droit du BAES) | Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 67 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS**
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KE-053423-01
Version du : 20/06/2018 20:07

Référence laboratoire sous-traitant N° : 18KE016806
Référence de suivi du dossier N° : 18A022722
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 15/06/2018
Date de réception : 14/06/2018
Date d'analyse : 15/06/2018
Référence Dossier :
1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 029 (1) | 18A022722-029 | BV3EC1539 Réf. plan : P.29 Niveau R : Pas Perdus/ R-1/ Aires de manœuvre/Po utre - Enduit de ragréage - (ciment/gris(e) /vers aire de stationnement 332) | Matériau semi-dur de type enduit (gris) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 030 | 18A022722-030 | BV3EC1540 Réf. plan : P.30 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Archives/Porte coupe feu - Joint coupe-feu - (bande/beige/l anguette CF de recouvrement de la PCF à 2 vantaux dans archives T40) | Matériau semi-dur de type joint (beige) (clair) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 031 | 18A022722-031 | BV3EC1541 Réf. plan : P.31 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Archives/Porte coupe feu - Isolant intérieur porte - (rigide/blanc(h e)/type plâtre dans l''âme de la porte CF à 2 vantaux dans archives T40) | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 67 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS**
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KE-053423-01
Version du : 20/06/2018 20:07

Référence laboratoire sous-traitant N° : 18KE016806
Référence de suivi du dossier N° : 18A022722
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 15/06/2018
Date de réception : 14/06/2018
Date d'analyse : 15/06/2018
Référence Dossier :
1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 032 | 18A022722-032 | BV3EC1542 Réf. plan : P.32 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Archives/Porte coupe feu - Joint coupe-feu - (bande/blanc(he)/peint bleu sur huisserie métallique de la porte CF à 2 vantaux dans archives T40) | Matériau semi-dur de type joint (fibreux) (bleu) + (beige) (clair) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 033 | 18A022722-033 | BV3EC1543 Réf. plan : P.33 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Archives/Plafond - Flocage - (cotonneux/blanc(he)/en dalle haute dans archives T40) | Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau friable fibreux de type flocage (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 034 | 18A022722-034 | BV3EC1544 Réf. plan : P.34 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Archives/Plafond - Rebouchage - (plâtreux/blanc(he)/au droit du flocage en dalle haute dans archives T40) | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | | Matériau friable fibreux de type flocage (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 67 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS**
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KE-053423-01
Version du : 20/06/2018 20:07

Référence laboratoire sous-traitant N° : 18KE016806
Référence de suivi du dossier N° : 18A022722
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 15/06/2018
Date de réception : 14/06/2018
Date d'analyse : 15/06/2018
Référence Dossier :
1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 035 | 18A022722-035 | BV3EC1545 Réf. plan : P.35 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Archives/Clap et coupe-feu - Clapet coupe-feu - (plâtreux/rose/ avec carton et aluminium - CCF de marque SGEI dans archives T40) | Matériau semi-dur (plâtreux) (gris) (clair) + (blanc) ; matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) | **MOLP** * | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| | | | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 036 | 18A022722-036 | BV3EC1546 Réf. plan : P.36 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Archives/Clap et coupe-feu - Rebouchage clapet - (ciment/gris(e) /autour du CCF de marque SGEI dans archives T40) | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 67 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS**
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KE-053423-01 | Version du : 20/06/2018 20:07 | 
Référence laboratoire sous-traitant N° : 18KE016806 | Référence de suivi du dossier N° : 18A022722
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 15/06/2018 | Date de réception : 14/06/2018
Date d'analyse : 15/06/2018
Référence Dossier : 1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 037 | 18A022722-037 | BV3EC1547 Réf. plan : P.37 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Archives/Mur - Calfeutrement des passages de conduits - (mousse/jaune /au droit du chemin de câbles dans archives T40) | Matériau de type mousse (jaune) (clair) + (marron) (clair) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 038 | 18A022722-038 | BV3EC1548 Réf. plan : P.38 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Archives/Plafond (collé ou vissé) - Panneau collé ou vissé - (composite/gris(e)/peint blanc comprenant une couche supérieure grise épaisse avec du fibrastyrène sous flocage en dalle haute dans archives T40) | Matériau friable fibreux de type flocage (blanc) en traces ; matériau semi-dur (plâtreux) (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | | Matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | | Matériau de type polystyrène (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 67 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS**
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KE-053423-01
Version du : 20/06/2018 20:07

Référence laboratoire sous-traitant N° : 18KE016806
Référence de suivi du dossier N° : 18A022722
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 15/06/2018
Date de réception : 14/06/2018
Date d'analyse : 15/06/2018
Référence Dossier :
1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 039 | 18A022722-039 | BV3EC1549 Réf. plan : P.39 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Archives/Poteau - Peinture sur béton - (bitumineux/noir(e)/au droit du palier MC dans archives T40) | Matériau de type peinture (bitumineux) (noir) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 040 | 18A022722-040 | BV3EC1550 Réf. plan : P.40 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Archives/Mur - Enduit de ragréage - (ciment/gris(e) /sur voile béton du palier MC dans archives T40) | Matériau semi-dur de type ragréage (gris) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 67 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS**
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KE-053423-01
Version du : 20/06/2018 20:07

Référence laboratoire sous-traitant N° : 18KE016806
Référence de suivi du dossier N° : 18A022722
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 15/06/2018
Date de réception : 14/06/2018
Date d'analyse : 15/06/2018
Référence Dossier :
1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 041 | 18A022722-041 | BV3EC1551 Réf. plan : P.41 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Archives/Cloison - Panneau - (composite/gris(e)/peint blanc comprenant une couche supérieure grise épaisse avec du fibrastyrène en doublage au dessus du voile béton dans archives T65) | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau de type polystyrène (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 042 | 18A022722-042 | BV3EC1552 Réf. plan : P.42 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Archives/Plafond - Rebouchage - (plâtreux/blanc(he)/au droit du flocage en dalle haute dans archives T65) | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 67 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS**
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KE-053423-01
Version du : 20/06/2018 20:07

Référence laboratoire sous-traitant N° : 18KE016806
Référence de suivi du dossier N° : 18A022722
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 15/06/2018
Date de réception : 14/06/2018
Date d'analyse : 15/06/2018
Référence Dossier :
1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 043 | 18A022722-043 | BV3EC1553 Réf. plan : P.43 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Archives/Cloison - Peinture - (décorative/blanc(he)/avec enduit blanc sur plaque de plâtre dans archives T63) | Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 044 (1) | 18A022722-044 | BV3EC1554 Réf. plan : P.44 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Dégagements/ Mur - Rebouchage - (plâtreux/blanc(he)/vers archives T63/T64) | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 045 | 18A022722-045 | BV3EC1555 Réf. plan : P.45 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Escalier d''accès T/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/gris(e)) | Matériau semi-dur de type enduit (gris) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 67 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS**
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KE-053423-01
Version du : 20/06/2018 20:07

Référence laboratoire sous-traitant N° : 18KE016806
Référence de suivi du dossier N° : 18A022722
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 15/06/2018
Date de réception : 14/06/2018
Date d'analyse : 15/06/2018
Référence Dossier :
1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 046 | 18A022722-046 | BV3EC1556 Réf. plan : P.46 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Escalier d''accès T/Revêtement de plafond - Peinture - (gouttelette/gris(e)) | Matériau semi-dur de type enduit (gris) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 047 | 18A022722-047 | BV3EC1557 Réf. plan : P.47 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Dégagements/ Plafond (collé ou vissé) - Panneau collé ou vissé - (composite/gris(e)/peint blanc comprenant une couche supérieure grise épaisse avec du fibrastyrène en doublage dans accès vers local technique T01) | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige) ; matériau de type polystyrène (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 67 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS**
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KE-053423-01
Version du : 20/06/2018 20:07

Référence laboratoire sous-traitant N° : 18KE016806
Référence de suivi du dossier N° : 18A022722
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 15/06/2018
Date de réception : 14/06/2018
Date d'analyse : 15/06/2018
Référence Dossier :
1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 048 | 18A022722-048 | BV3EC1558 Réf. plan : P.48 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Placards techniques/Plancher - Rebouchage - (plâtreux/blanc (he)/autour du chemin de câbles vers archives T50) | Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (gris) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 049 | 18A022722-049 | BV3EC1559 Réf. plan : P.49 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Placards techniques/Plancher - Rebouchage - (plâtreux/blanc (he)/autour du chemin de câbles vers archives T40) | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 050 | 18A022722-050 | BV3EC1560 Réf. plan : P.50 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Escalier d''accès S/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/gris(e)) | Matériau semi-dur de type enduit (gris) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 67 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS**
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KE-053423-01
Version du : 20/06/2018 20:07

Référence laboratoire sous-traitant N° : 18KE016806
Référence de suivi du dossier N° : 18A022722
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 15/06/2018
Date de réception : 14/06/2018
Date d'analyse : 15/06/2018
Référence Dossier :
1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 051 | 18A022722-051 | BV3EC1561 Réf. plan : P.51 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Escalier d''accès S/Revêtement de plafond - Peinture - (gouttelette/gris(e)) | Matériau semi-dur de type enduit (gris) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 052 | 18A022722-052 | BV3EC1562 Réf. plan : P.52 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Sanitaires/Revêtement du mur - Colle de faïence - (mortier/gris(e) /faïence 5x5 beige en contact des cornières de rive du faux-plafond dans sanitaires T21) | Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 67 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS**
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KE-053423-01
Version du : 20/06/2018 20:07

Référence laboratoire sous-traitant N° : 18KE016806
Référence de suivi du dossier N° : 18A022722
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 15/06/2018
Date de réception : 14/06/2018
Date d'analyse : 15/06/2018
Référence Dossier :
1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 053 | 18A022722-053 | BV3EC1563 Réf. plan : P.53 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Sanitaires/Revêtement du mur - Joint de faïence - (ciment/gris(e) /de la faience 5x5 beige en contact des cornières de rive du faux-plafond dans sanitaires T21) | Matériau dur de type joint ciment (gris) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 054 | 18A022722-054 | BV3EC1564 Réf. plan : P.54 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Sanitaires/Conduit - Joint - (bande/gris(e)/ toilée en jonction de gaine VMC) | Matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau de type maillage de fibres (gris) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 055 | 18A022722-055 | BV3EC1565 Réf. plan : P.55 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Dégagements/ Mur - Rebouchage - (plâtreux/blanc (he)/autour du chemin de câbles vers T09/GF) | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 67 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS**
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KE-053423-01
Version du : 20/06/2018 20:07

Référence laboratoire sous-traitant N° : 18KE016806
Référence de suivi du dossier N° : 18A022722
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 15/06/2018
Date de réception : 14/06/2018
Date d'analyse : 15/06/2018
Référence Dossier :
1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 056 | 18A022722-056 | BV3EC1566 Réf. plan : P.56 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Autocom T15/Panneau - Colle - (blanche/sur panneau isolant type P.57) | Matériau dur de type ciment-colle (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 057 | 18A022722-057 | BV3EC1567 Réf. plan : P.57 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Autocom T15/Cloison - Panneau - (composite/gris(e)/peint blanc comprenant une couche supérieure grise épaisse avec du fibrastyrène en doublage au dessus du voile béton) | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige) (gris) ; matériau de type polystyrène (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 67 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS**
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KE-053423-01
Version du : 20/06/2018 20:07

Référence laboratoire sous-traitant N° : 18KE016806
Référence de suivi du dossier N° : 18A022722
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 15/06/2018
Date de réception : 14/06/2018
Date d'analyse : 15/06/2018
Référence Dossier :
1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 058 | 18A022722-058 | BV3EC1568 Réf. plan : P.58 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Autocom T15/Mur - Enduit de ragréage - (ciment/gris(e) /en jonction entre le voile béton et les panneaux de doublage) | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 059 | 18A022722-059 | BV3EC1569 Réf. plan : P.59 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Petit(s) escalier(s) circulaire(s)/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/gris(e)/avec enduit beige vers sanitaires T11) | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 67 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS**
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KE-053423-01
Version du : 20/06/2018 20:07

Référence laboratoire sous-traitant N° : 18KE016806
Référence de suivi du dossier N° : 18A022722
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 15/06/2018
Date de réception : 14/06/2018
Date d'analyse : 15/06/2018
Référence Dossier :
1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 060 | 18A022722-060 | BV3EC1570 Réf. plan : P.60 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Sanitaires/Pot eau - Colle de faïence - (mortier/gris(e) /faïence 5x5 beige en contact des supports du faux-plafond bois dans sanitaires T11) | Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 061 | 18A022722-061 | BV3EC1571 Réf. plan : P.61 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Sanitaires/Pot eau - Joint de faïence - (ciment/gris(e) /de la faïence 5x5 beige en contact des supports du faux-plafond bois dans sanitaires T11) | Matériau dur de type joint ciment (gris) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 67 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS**
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KE-053423-01
Version du : 20/06/2018 20:07

Référence laboratoire sous-traitant N° : 18KE016806
Référence de suivi du dossier N° : 18A022722
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 15/06/2018
Date de réception : 14/06/2018
Date d'analyse : 15/06/2018
Référence Dossier :
1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 062 | 18A022722-062 | BV3EC1572 Réf. plan : P.62 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Petit(s) escalier(s) circulaire(s)/Mur - Rebouchage - (plâtreux/blanc (he)/autour du câble hublot vers sanitaires T11) | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 063 | 18A022722-063 | BV3EC1573 Réf. plan : P.63 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Zone ex. réserve cuisine/Plafond - Faux plafond - (fibreux/beige/ dur en 1200x600 dans pièce T17) | Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (plâtreux) (blanc) (fibreux) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 67 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS**
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KE-053423-01
Version du : 20/06/2018 20:07

Référence laboratoire sous-traitant N° : 18KE016806
Référence de suivi du dossier N° : 18A022722
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 15/06/2018
Date de réception : 14/06/2018
Date d'analyse : 15/06/2018
Référence Dossier :
1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 064 | 18A022722-064 | BV3EC1574 Réf. plan : P.64 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Zone ex. réserve cuisine/Revêtement du mur - Colle de faïence - (mortier/gris(e) /faïence 15x15 blanche dans réserve cuisine T12) | Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 065 | 18A022722-065 | BV3EC1575 Réf. plan : P.65 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Petit(s) escalier(s) circulaire(s)/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/gris(e)/avec enduit beige vers archives T63, côté dépôt Police) | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 67 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS**
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KE-053423-01
Version du : 20/06/2018 20:07

Référence laboratoire sous-traitant N° : 18KE016806
Référence de suivi du dossier N° : 18A022722
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 15/06/2018
Date de réception : 14/06/2018
Date d'analyse : 15/06/2018
Référence Dossier :
1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 066 | 18A022722-066 | BV3EC1576 Réf. plan : P.66 Niveau T : Sous-sol / TGI/ R-3/ Dégagements/ Mur - Enduit projeté - (plâtreux/blanc (he)/type Fibrith sur dégagement dépôt) | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 067 | 18A022722-067 | BV3EC1577 Réf. plan : P.67 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI/ R-2/ Archives/Clap et coupe-feu - Clapet coupe-feu - (fibreux/blanc(he)/en partie haute du mur de marque PANOL dans local archives N°4) | Matériau semi-dur de type enduit (fibreux) (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 67 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS**
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KE-053423-01
Version du : 20/06/2018 20:07

Référence laboratoire sous-traitant N° : 18KE016806
Référence de suivi du dossier N° : 18A022722
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 15/06/2018
Date de réception : 14/06/2018
Date d'analyse : 15/06/2018
Référence Dossier :
1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 068 | 18A022722-068 | BV3EC1578 Réf. plan : P.68 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI/ R-2/ Archives/Conduit d''air - Joint - (mastic/marron/sur gaine rectangulaire en jonction du CCF dans local archives N°4) | Matériau semi-dur de type joint (marron) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 069 | 18A022722-069 | BV3EC1579 Réf. plan : P.69 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI/ R-2/ Archives/Plafond - Flocage - (cotonneux/blanc(he)/en dalle haute sur jonction poutre du local archives N°4) | Matériau semi-dur de type enduit (poudreux) (gris) ; matériau friable fibreux de type flocage (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 67 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS**
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KE-053423-01
Version du : 20/06/2018 20:07

Référence laboratoire sous-traitant N° : 18KE016806
Référence de suivi du dossier N° : 18A022722
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 15/06/2018
Date de réception : 14/06/2018
Date d'analyse : 15/06/2018
Référence Dossier :
1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 070 | 18A022722-070 | BV3EC1580 Réf. plan : P.70 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI/ R-2/ Archives/Conduit - Enveloppe de calorifugeage - (plâtreux/blanc (he)/autour de la fonte en partie haute du local archives N°4) | Matériau semi-dur (blanc) (fibreux) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 071 | 18A022722-071 | BV3EC1581 Réf. plan : P.71 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI/ R-2/ Escalier d''accès B/Revêtement de plafond - Peinture - (gouttelette/beige/avec fond d''enduit en dalle haute) | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 67 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS**
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KE-053423-01
Version du : 20/06/2018 20:07

Référence laboratoire sous-traitant N° : 18KE016806
Référence de suivi du dossier N° : 18A022722
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 15/06/2018
Date de réception : 14/06/2018
Date d'analyse : 15/06/2018
Référence Dossier :
1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 072 | 18A022722-072 | BV3EC1582 Réf. plan : P.72 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI/ R-2/ Escalier d''accès B/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/beige/avec fond d''enduit sur voile béton) | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 073 | 18A022722-073 | BV3EC1583 Réf. plan : P.73 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI/ R-2/ Escalier d''accès C/Revêtement de plafond - Peinture - (gouttelette/beige/avec fond d''enduit en dalle haute) | Matériau semi-dur de type enduit (gris) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 67 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS**
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KE-053423-01
Version du : 20/06/2018 20:07

Référence laboratoire sous-traitant N° : 18KE016806
Référence de suivi du dossier N° : 18A022722
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 15/06/2018
Date de réception : 14/06/2018
Date d'analyse : 15/06/2018
Référence Dossier :
1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 074 | 18A022722-074 | BV3EC1584 Réf. plan : P.74 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI/ R-2/ Escalier d''accès C/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/beige/avec fond d''enduit sur voile béton) | Matériau semi-dur de type enduit (gris) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 075 | 18A022722-075 | BV3EC1585 Réf. plan : P.75 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI/ R-2/ Petit(s) escalier(s) circulaire(s)/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/gris(e)/avec fond d''enduit sur voile béton - escalier d''accès vers SA N°4 depuis Dépôt Police) | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (gris) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 67 page(s)
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS**
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KE-053423-01
Version du : 20/06/2018 20:07

Référence laboratoire sous-traitant N° : 18KE016806
Référence de suivi du dossier N° : 18A022722
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 15/06/2018
Date de réception : 14/06/2018
Date d'analyse : 15/06/2018
Référence Dossier :
1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 076 | 18A022722-076 | BV3EC1586 Réf. plan : P.76 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI/ R-2/ Placards techniques/Plancher - Rebouchage - (plâtreux/blanc (he)/autour du chemin de câbles vers escalier T) | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 077 | 18A022722-077 | BV3EC1587 Réf. plan : P.77 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI/ R-2/ Placards techniques/Plancher - Rebouchage - (mousse expensée/jaune/autour du chemin de câbles vers escalier T) | Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type mousse (jaune) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 67 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS**
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KE-053423-01
Version du : 20/06/2018 20:07

Référence laboratoire sous-traitant N° : 18KE016806
Référence de suivi du dossier N° : 18A022722
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 15/06/2018
Date de réception : 14/06/2018
Date d'analyse : 15/06/2018
Référence Dossier :
1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 078 | 18A022722-078 | BV3EC1588 Réf. plan : P.78 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI/ R-2/ Ensemble des pièces Ind.S/Revêtement de cloison - Peinture - (décorative/gris(e)/avec fond d''enduit sur paroi de doublage plâtre dans pièce S23) | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 079 | 18A022722-079 | BV3EC1589 Réf. plan : P.79 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI/ R-2/ Ensemble des pièces Ind.S/Poteau - Peinture - (décorative/gris(e)/avec fond d''enduit sur poteau béton dans pièce S23) | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 67 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS**
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KE-053423-01
Version du : 20/06/2018 20:07

Référence laboratoire sous-traitant N° : 18KE016806
Référence de suivi du dossier N° : 18A022722
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 15/06/2018
Date de réception : 14/06/2018
Date d'analyse : 15/06/2018
Référence Dossier :
1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 080 | 18A022722-080 | BV3EC1590 Réf. plan : P.80 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI/ R-2/ Sanitaires/Revêtement du mur - Colle de faïence - (mortier/gris(e) /faïence 5x5 beige en jonction des supports du faux-plafond bois dans sanitaires hommes vers pièce S23) | Matériau dur de type ciment-colle (gris) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 081 (1) | 18A022722-081 | BV3EC1591 Réf. plan : P.81 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI/ R-2/ Sanitaires/Revêtement du mur - Colle de faïence - (mortier/gris(e) /faïence 5x5 beige en jonction des supports du faux-plafond bois dans sanitaires femmes vers pièce S23) | Matériau dur de type ciment-colle (fibreux) (gris) (clair) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 67 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS**
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KE-053423-01
Version du : 20/06/2018 20:07

Référence laboratoire sous-traitant N° : 18KE016806
Référence de suivi du dossier N° : 18A022722
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 15/06/2018
Date de réception : 14/06/2018
Date d'analyse : 15/06/2018
Référence Dossier :
1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 082 | 18A022722-082 | BV3EC1592 Réf. plan : P.82 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI/ R-2/ Ensemble des pièces Ind.S/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/gris(e)/avec fond d''enduit dans pièce S24) | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) en traces | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | | Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | | Matériau semi-dur de type enduit (gris) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 083 (1) (2) | 18A022722-083 | BV3EC1593 Réf. plan : P.83 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI/ R-2/ Ensemble des pièces Ind.S/Revêtement de plafond - Peinture - (gouttelette/gris(e)/avec fond d''enduit en dalle haute dans pièce S24) | Matériau de type peinture (bleu) en traces ; matériau de type peinture (gris) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (clair) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 67 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS**
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KE-053423-01
Version du : 20/06/2018 20:07

Référence laboratoire sous-traitant N° : 18KE016806
Référence de suivi du dossier N° : 18A022722
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 15/06/2018
Date de réception : 14/06/2018
Date d'analyse : 15/06/2018
Référence Dossier :
1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 084 (1) | 18A022722-084 | BV3EC1594 Réf. plan : P.84 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI/ R-2/ CTA assise N °2/Mur - Enduit de ragréage - (ciment/gris(e) /peint gris sur voile béton) | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 085 | 18A022722-085 | BV3EC1595 Réf. plan : P.85 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI/ R-2/ Stockage Assise N °2/Mur - Enduit de ragréage - (ciment/gris(e) /peint gris sur voile béton) | Matériau de type peinture (gris) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | | Matériau semi-dur de type enduit (gris) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 086 | 18A022722-086 | BV3EC1596 Réf. plan : P.86 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI/ R-2/ Escalier d''accès Assise N °2/Revêtement du mur - Peinture - (décorative/gris(e)/avec fond d''enduit sur voile béton) | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) en traces | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | | Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | | Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (gris) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 67 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS**
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KE-053423-01
Version du : 20/06/2018 20:07

Référence laboratoire sous-traitant N° : 18KE016806
Référence de suivi du dossier N° : 18A022722
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 15/06/2018
Date de réception : 14/06/2018
Date d'analyse : 15/06/2018
Référence Dossier :
1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 087 | 18A022722-087 | BV3EC1597 Réf. plan : P.87 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI/ R-2/ Logement S10 - Rez-de-chaussée/Mur - Toile de verre - (peint/beige/sur fond de doublage en plaque de plâtre dans séjour) | Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) | **MOLP** * | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| | | | Matériau semi-dur de type plâtre (fibreux) (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 088 | 18A022722-088 | BV3EC1598 Réf. plan : P.88 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI/ R-2/ Logement S10 - Rez-de-chaussée/Revêtement de plafond - Peinture - (décorative/blanc(he)/avec fond d''enduit en dalle haute du séjour) | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige) (clair) + (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | | Matériau semi-dur de type enduit (fibreux) (gris) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 67 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS**
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KE-053423-01
Version du : 20/06/2018 20:07

Référence laboratoire sous-traitant N° : 18KE016806
Référence de suivi du dossier N° : 18A022722
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 15/06/2018
Date de réception : 14/06/2018
Date d'analyse : 15/06/2018
Référence Dossier :
1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 089 | 18A022722-089 | BV3EC1599 Réf. plan : P.89 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI/ R-2/ Logement S10 - Rez-de-chaussée/Revêtement de plafond - Peinture - (décorative/blanc(he)/avec fond d''enduit en dalle haute dans chambre 1) | Matériau de type peinture (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | | Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | | Matériau semi-dur de type enduit (gris) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 090 | 18A022722-090 | BV3EC1600 Réf. plan : P.90 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI/ R-2/ Logement S10 - Rez-de-chaussée/Revêtement du mur - Colle de faïence - (mortier/blanc(he)/avec joint beige sur faïence 20x10 rose au dessus du lavabo dans SDB) | Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (fibreux) (blanc) en traces | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | | Matériau semi-dur (plâtreux) (fibreux) (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 67 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS**
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KE-053423-01
Version du : 20/06/2018 20:07

Référence laboratoire sous-traitant N° : 18KE016806
Référence de suivi du dossier N° : 18A022722
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 15/06/2018
Date de réception : 14/06/2018
Date d'analyse : 15/06/2018
Référence Dossier :
1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 091 (1) | 18A022722-091 | BV3EC1601 Réf. plan : P.91 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI/ R-2/ Escalier de secours Assise N °2/Mur - Enduit projeté - (plâtreux/blanc (he)/type Fibrith depuis Dépôt Police) | Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 092 | 18A022722-092 | BV3EC1602 Réf. plan : P.92 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI/ R-2/ Ensemble des pièces Ind.S/Mur - Rebouchage - (plâtreux/blanc (he)/au droit de la boite d''encastrement simple électrique dans pièce S43) | Matériau de type peinture (gris) en traces ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) en traces | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | | Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 67 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS**
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KE-053423-01
Version du : 20/06/2018 20:07

Référence laboratoire sous-traitant N° : 18KE016806
Référence de suivi du dossier N° : 18A022722
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 15/06/2018
Date de réception : 14/06/2018
Date d'analyse : 15/06/2018
Référence Dossier :
1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 093 | 18A022722-093 | BV3EC1603 Réf. plan : P.93 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI/ R-2/ Placards techniques/Plancher - Rebouchage - (plâtreux/blanc (he)/autour du chemin de câbles vers escalier S) | Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige) (clair) + (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 094 | 18A022722-094 | BV3EC1604 Réf. plan : P.94 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI/ R-2/ Escalier d''accès S/Revêtement de plafond - Peinture - (gouttelette/beige/avec fond d''enduit en dalle haute) | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (gris) (clair) en traces | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | | Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (gris) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) en traces | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 095 | 18A022722-095 | BV3EC1605 Réf. plan : P.95 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI/ R-2/ Escalier d''accès S/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/beige/avec fond d''enduit) | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (clair) en traces | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | | Matériau semi-dur de type enduit (gris) (clair) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 67 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS**
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KE-053423-01
Version du : 20/06/2018 20:07

Référence laboratoire sous-traitant N° : 18KE016806
Référence de suivi du dossier N° : 18A022722
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 15/06/2018
Date de réception : 14/06/2018
Date d'analyse : 15/06/2018
Référence Dossier :
1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 096 | 18A022722-096 | BV3EC1606 Réf. plan : P.96 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI/ R-2/ Escalier d''accès T/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/beige/avec fond d''enduit) | Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (gris) (clair) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 097 | 18A022722-097 | BV3EC1607 Réf. plan : P.97 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI/ R-2/ Escalier d''accès T/Revêtement de plafond - Peinture - (gouttelette/beige/avec fond d''enduit en dalle haute) | Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (gris) (clair) ; matériau (beige) en traces | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 098 | 18A022722-098 | BV3EC1608 Réf. plan : P.98 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI/ R-2/ Ensemble des pièces Ind.S/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/gris(e)/avec fond d''enduit dans pièce S41) | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | | Matériau semi-dur de type enduit (gris) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (fibreux) (gris) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 67 page(s)
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS**
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KE-053423-01
Version du : 20/06/2018 20:07

Référence laboratoire sous-traitant N° : 18KE016806
Référence de suivi du dossier N° : 18A022722
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 15/06/2018
Date de réception : 14/06/2018
Date d'analyse : 15/06/2018
Référence Dossier :
1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 099 | 18A022722-099 | BV3EC1609 Réf. plan : P.99 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI/ R-2/ Ensemble des pièces Ind.S/Revêtement de plafond - Peinture - (gouttelette/gris(e)/avec fond d''enduit en dalle haute dans pièce S41) | Matériau de type peinture (gris) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | | Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) + (beige) (clair) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 100 | 18A022722-100 | BV3EC1610 Réf. plan : P.100 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI/ R-2/ Zone ex. cuisine/Panneau sandwich - Panneau - (composite/gris(e)/panneau isolant de chambre froide (isothermique) type ciment peint beige avec polystyrène dans pièce S18) | Matériau de type peinture (blanc) + (beige) (clair) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | | Matériau semi-dur de type ciment (gris) (clair) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | | Matériau semi-dur de type ciment (gris) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | | Matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau (marron) en traces | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 67 page(s)
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS**
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KE-053423-01
Version du : 20/06/2018 20:07

Référence laboratoire sous-traitant N° : 18KE016806
Référence de suivi du dossier N° : 18A022722
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 15/06/2018
Date de réception : 14/06/2018
Date d'analyse : 15/06/2018
Référence Dossier :
1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 101 (1) | 18A022722-101 | BV3EC1611 Réf. plan : P.101 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI/ R-2/ Ensemble des pièces Ind.S/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/blanc(he)/avec fond d''enduit dans espace pièces S21/S22) | Matériau de type peinture (blanc) + (gris) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 102 | 18A022722-102 | BV3EC1612 Réf. plan : P.102 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI/ R-2/ Dégagements/ Porte coupe feu - Joint coupe-feu - (mousse/jaune /en pénétration du chemin de câbles dans imposte de la porte CF de la zone machine à café vers escalier B) | Matériau (marron) ; matériau de type mousse (jaune) (clair) ; matériau (gris) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 67 page(s)
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS**
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KE-053423-01
Version du : 20/06/2018 20:07

Référence laboratoire sous-traitant N° : 18KE016806
Référence de suivi du dossier N° : 18A022722
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 15/06/2018
Date de réception : 14/06/2018
Date d'analyse : 15/06/2018
Référence Dossier :
1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 103 | 18A022722-103 | BV3EC1613 Réf. plan : P.103 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI/ R-2/ Zone ex. cuisine/Revêtement de plafond - Peinture - (gouttelette/beige/avec fond d''enduit en dalle haute dans espace cuisine) | Matériau (marron) en traces ; matériau de type peinture (gris) + (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige) (clair) + (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 104 | 18A022722-104 | BV3EC1614 Réf. plan : P.104 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI/ R-2/ Zone ex. cuisine/Revêtement de plafond - Peinture - (gouttelette/beige/avec fond d''enduit dans local poubelles) | Matériau de type peinture (gris) + (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 67 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS**
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KE-053423-01
Version du : 20/06/2018 20:07

Référence laboratoire sous-traitant N° : 18KE016806
Référence de suivi du dossier N° : 18A022722
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 15/06/2018
Date de réception : 14/06/2018
Date d'analyse : 15/06/2018
Référence Dossier :
1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 105 | 18A022722-105 | BV3EC1615 Réf. plan : P.105 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI/ R-2/ Zone ex. cuisine/Revêtement du mur - Colle de faïence - (mortier/blanc(he)/faïence 20x20 blanc dans espace cuisine) | Matériau dur (marron) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (clair) en traces | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 106 | 18A022722-106 | BV3EC1616 Réf. plan : P.106 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI/ R-2/ Zone ex. cuisine/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/beige/avec fond d''enduit dans espace cuisine) | Matériau de type peinture (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau (marron) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 67 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS**
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KE-053423-01
Version du : 20/06/2018 20:07

Référence laboratoire sous-traitant N° : 18KE016806
Référence de suivi du dossier N° : 18A022722
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 15/06/2018
Date de réception : 14/06/2018
Date d'analyse : 15/06/2018
Référence Dossier :
1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 107 | 18A022722-107 | BV3EC1617 Réf. plan : P.107 Niveau S : R-2 / Rez-de-chaussée / TGI/ R-2/ Zone ex. cuisine/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/beige/avec fond d''enduit ciment sur mur en parpaings dans le bureau) | Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) en traces | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | | Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | | Matériau semi-dur de type enduit (gris) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | | Matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris) (clair) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 108 | 18A022722-108 | BV3EC1618 Réf. plan : P.108 Niveau R : Pas Perdus / TGI/ R-1/ Zone Ordre des Avocats/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/beige/avec fond d''enduit au droit du petit escalier circulaire) | Matériau de type peinture (beige) (clair) + (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 67 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS**
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KE-053423-01
Version du : 20/06/2018 20:07

Référence laboratoire sous-traitant N° : 18KE016806
Référence de suivi du dossier N° : 18A022722
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 15/06/2018
Date de réception : 14/06/2018
Date d'analyse : 15/06/2018
Référence Dossier :
1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 109 | 18A022722-109 | BV3EC1619 Réf. plan : P.109 Niveau R : Pas Perdus / TGI/ R-1/ Zone Ordre des Avocats/Potea u - Peinture - (décorative/bei ge/avec fond d''enduit dans bureau) | Matériau de type peinture (beige) (clair) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 110 | 18A022722-110 | BV3EC1620 Réf. plan : P.110 Niveau R : Pas Perdus / TGI/ R-1/ Zone Ordre des Avocats/Plafo nd - Flocage - (cotonneux/bla nc(he)/avec croûte blanche en dalle haute de l''espace des avocats) | Matériau de type peinture (beige) ; matériau friable fibreux de type flocage (blanc) en traces | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | | Matériau friable fibreux de type flocage (blanc) ; matériau (gris) en traces | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 67 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS**
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KE-053423-01
Version du : 20/06/2018 20:07

Référence laboratoire sous-traitant N° : 18KE016806
Référence de suivi du dossier N° : 18A022722
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 15/06/2018
Date de réception : 14/06/2018
Date d'analyse : 15/06/2018
Référence Dossier :
1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 111 | 18A022722-111 | BV3EC1621 Réf. plan : P.111 Niveau R : Pas Perdus / TGI/ R-1/ Zone Tribunal pour Enfants/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/jaune/avec fond d''enduit sur paroi de doublage en plaque de plâtre dans pièce R30) | Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) en traces | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 112 | 18A022722-112 | BV3EC1622 Réf. plan : P.112 Niveau R : Pas Perdus / TGI/ R-1/ Zone Tribunal pour Enfants/Poutre - Peinture - (gouttelette/jaune/avec fond d''enduit sur poutre béton dans pièce R30) | Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) en traces | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 67 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS**
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KE-053423-01
Version du : 20/06/2018 20:07

Référence laboratoire sous-traitant N° : 18KE016806
Référence de suivi du dossier N° : 18A022722
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 15/06/2018
Date de réception : 14/06/2018
Date d'analyse : 15/06/2018
Référence Dossier :
1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 113 | 18A022722-113 | BV3EC1623 Réf. plan : P.113 Niveau R : Pas Perdus / TGI/ R-1/ Zone Tribunal pour Enfants/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/beige/avec fond d''enduit sur paroi de doublage en plaque de plâtre dans pièce R42) | Matériau de type peinture (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 114 | 18A022722-114 | BV3EC1624 Réf. plan : P.114 Niveau R : Pas Perdus / TGI/ R-1/ Zone Tribunal pour Enfants/Revêtement de plafond - Peinture - (décorative/blanc(he)/avec fond d''enduit en dalle haute dans pièce R44) | Matériau de type peinture (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | | Matériau (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 67 page(s)
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS**
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KE-053423-01 | Version du : 20/06/2018 20:07 | 
Référence laboratoire sous-traitant N° : 18KE016806 | Référence de suivi du dossier N° : 18A022722
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 15/06/2018 | Date de réception : 14/06/2018
Date d'analyse : 15/06/2018
Référence Dossier : 1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 115 | 18A022722-115 | BV3EC1625 Réf. plan : P.115 Niveau R : Pas Perdus / TGI/ R-1/ Zone ICJ/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/beige/avec fond d''enduit sur paroi de doublage en plaque de plâtre dans pièce R72) | Matériau de type peinture (beige) (clair) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 116 | 18A022722-116 | BV3EC1626 Réf. plan : P.116 Niveau R : Pas Perdus / TGI/ R-1/ Zone ICJ/Poutre - Peinture - (gouttelette/beige/avec fond d''enduit sur poutre béton dans pièce R72) | Matériau de type peinture (beige) (clair) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 117 | 18A022722-117 | BV3EC1627 Réf. plan : P.117 Niveau R : Pas Perdus / TGI/ R-1/ Zone ICJ/Revêtement de cloison - Peinture - (gouttelette/beige/avec fond d''enduit dans pièce R60) | Matériau de type peinture (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) | **MOLP** * | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| | | | | | | | |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 67 page(s)
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS**
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KE-053423-01
Référence laboratoire sous-traitant N° : 18KE016806
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 15/06/2018
Date d'analyse : 15/06/2018
Référence Dossier : 1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Version du : 20/06/2018 20:07
Référence de suivi du dossier N° : 18A022722
Date de réception : 14/06/2018



Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| | | | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 118 | 18A022722-118 | BV3EC1628 Réf. plan : P.118 Niveau R : Pas Perdus / TGI/ R-1/ Zone SAP N °4/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/gris(e)/avec fond d''enduit sur mur du petit escalier circulaire) | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 119 | 18A022722-119 | BV3EC1629 Réf. plan : P.119 Niveau R : Pas Perdus / TGI/ R-1/ Zone SAP N °3/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/gris(e)/avec fond d''enduit sur dégagement du petit escalier circulaire via Dépôt Police) | Matériau de type peinture (gris) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | | Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau (beige) en traces | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 67 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS**
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KE-053423-01
Version du : 20/06/2018 20:07

Référence laboratoire sous-traitant N° : 18KE016806
Référence de suivi du dossier N° : 18A022722
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 15/06/2018
Date de réception : 14/06/2018
Date d'analyse : 15/06/2018
Référence Dossier :
1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 120 (1) (2) | 18A022722-120 | BV3EC1630 Réf. plan : P.120 Niveau R : Pas Perdus / TGI/ R-1/ Zone ICJ/Revêtement du mur - Peinture - (décorative/blanc(he)/avec fond d''enduit sur noyau externe du petit escalier circulaire via Dépôt Police) | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 121 | 18A022722-121 | BV3EC1631 Réf. plan : P.121 Niveau R : Pas Perdus / TGI/ R-1/ Zone ICJ/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/gris(e)/avec fond d''enduit sur noyau interne du petit escalier circulaire via Dépôt Police) | Matériau de type peinture (gris) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | | Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 67 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS**
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KE-053423-01
Version du : 20/06/2018 20:07

Référence laboratoire sous-traitant N° : 18KE016806
Référence de suivi du dossier N° : 18A022722
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 15/06/2018
Date de réception : 14/06/2018
Date d'analyse : 15/06/2018
Référence Dossier :
1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 122 (1) | 18A022722-122 | BV3EC1632 Réf. plan : P.122 Niveau R : Pas Perdus / TGI/ R-1/ Zone Tribunal pour Enfants/Revêtement du mur - Colle de faïence - (mortier/gris(e) /faience 5x5 beige en jonction des support du faux-plafond bois dans sanitaires via Dépôt Police) | Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 123 (2) | 18A022722-123 | BV3EC1633 Réf. plan : P.123 Niveau R : Pas Perdus / TGI/ R-1/ Zone Tribunal pour Enfants/Revêtement de plafond - Peinture - (gouttelette/gris(e)/avec fond d''enduit dans dégagement via Dépôt de Police) | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 67 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS**
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KE-053423-01
Version du : 20/06/2018 20:07

Référence laboratoire sous-traitant N° : 18KE016806
Référence de suivi du dossier N° : 18A022722
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 15/06/2018
Date de réception : 14/06/2018
Date d'analyse : 15/06/2018
Référence Dossier :
1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 124 | 18A022722-124 | BV3EC1634 Réf. plan : P.124 Niveau R : Pas Perdus / TGI/ R-1/ Zone Tribunal pour Enfants/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/gris(e)/avec fond d''enduit sur noyau interne du petit escalier circulaire via Dépôt Police) | Matériau de type peinture (gris) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | | Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 125 | 18A022722-125 | BV3EC1635 Réf. plan : P.125 Niveau R : Pas Perdus / TGI/ R-1/ Salle de médiation/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/beige/avec fond d''enduit) | Matériau de type peinture (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (fibreux) (blanc) + (beige) (clair) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 67 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS**
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KE-053423-01
Version du : 20/06/2018 20:07

Référence laboratoire sous-traitant N° : 18KE016806
Référence de suivi du dossier N° : 18A022722
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 15/06/2018
Date de réception : 14/06/2018
Date d'analyse : 15/06/2018
Référence Dossier :
1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 126 | 18A022722-126 | BV3EC1636 Réf. plan : P.126 Niveau R : Pas Perdus / TGI/ R-1/ Salle de médiation/Revêtement de plafond - Peinture - (gouttelette/beige/avec fond d''enduit en dalle haute) | Matériau (gris) en traces ; matériau de type peinture (beige) (clair) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (fibreux) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 127 | 18A022722-127 | BV3EC1637 Réf. plan : P.127 Niveau R : Pas Perdus / TGI/ R-1/ Zone ICJ/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/gris(e)/avec fond d''enduit sur noyau externe du petit escalier circulaire via Dépôt Police sur Assise 1) | Matériau de type peinture (gris) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | | Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau (gris) en traces | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 67 page(s)
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS**
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KE-053423-01
Version du : 20/06/2018 20:07

Référence laboratoire sous-traitant N° : 18KE016806
Référence de suivi du dossier N° : 18A022722
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 15/06/2018
Date de réception : 14/06/2018
Date d'analyse : 15/06/2018
Référence Dossier :
1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 128 | 18A022722-128 | BV3EC1638 Réf. plan : P.128 Niveau P : Parvis / TGI/ R+0/ Zone SA N °2/Charpente - Peinture - (décorative/bleu(e)/avec fond d''enduit blanc + antirouille orange sur charpente tridimentionnelle) | Matériau de type peinture (bleu) + (de différentes couleurs) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 129 | 18A022722-129 | BV3EC1639 Réf. plan : P.129 Niveau P : Parvis / TGI/ R+0/ Zone des Délibérés SA N°1 et N °2/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/gris(e)/avec fond d''enduit sur noyau interne du petit escalier circulaire) | Matériau de type peinture (gris) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | | Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 67 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS**
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KE-053423-01
Version du : 20/06/2018 20:07

Référence laboratoire sous-traitant N° : 18KE016806
Référence de suivi du dossier N° : 18A022722
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 15/06/2018
Date de réception : 14/06/2018
Date d'analyse : 15/06/2018
Référence Dossier :
1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 130 | 18A022722-130 | BV3EC1640 Réf. plan : P.130 Niveau P : Parvis / TGI/ R+0/ Zone BAJ/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/blanc(he)/avec fond d''enduit sur paroi de doublage en plaque de plâtre dans bureau P03) | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) en traces | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | | Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 131 | 18A022722-131 | BV3EC1641 Réf. plan : P.131 Niveau P : Parvis / TGI/ R+0/ Zone BAJ/Plafond - Flocage - (cotonneux/blanc(he)/avec croûte grise en dalle haute dans dégagement) | Matériau de type peinture (gris) (clair) ; matériau friable fibreux de type flocage (blanc) en traces | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | | Matériau friable fibreux de type flocage (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 132 | 18A022722-132 | BV3EC1642 Réf. plan : P.132 Niveau P : Parvis / TGI/ R+0/ Assise N °1/Charpente - Peinture - (décorative/bleu(e)/avec fond d''enduit blanc + antirouille orange) | Matériau de type peinture (bleu) + (de différentes couleurs) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 67 page(s)
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS**
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KE-053423-01 | Version du : 20/06/2018 20:07 | 
Référence laboratoire sous-traitant N° : 18KE016806 | Référence de suivi du dossier N° : 18A022722
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 15/06/2018 | Date de réception : 14/06/2018
Date d'analyse : 15/06/2018
Référence Dossier : 1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 133 | 18A022722-133 | BV3EC1643 Réf. plan : P.133 Niveau P : Parvis / TGI/ R+0/ Zone BAJ/Poutre - Peinture - (décorative/blanc(he)/avec fond d''enduit dans dégagement) | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) en traces | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | | Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 134 | 18A022722-134 | BV3EC1644 Réf. plan : P.134 Niveau P : Parvis / TGI/ R+0/ Zone Infirmerie/Poteau - Peinture - (décorative/beige/avec fond d''enduit dans hall d''attente) | Matériau de type peinture (blanc) + (gris) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 135 | 18A022722-135 | BV3EC1645 Réf. plan : P.135 Niveau P : Parvis / TGI/ R+0/ Zone Infirmerie/Revêtement du mur - Peinture - (décorative/blanc(he)/avec fond d''enduit sur paroi de doublage en plaque de plâtre) | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 67 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS**
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KE-053423-01
Version du : 20/06/2018 20:07

Référence laboratoire sous-traitant N° : 18KE016806
Référence de suivi du dossier N° : 18A022722
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 15/06/2018
Date de réception : 14/06/2018
Date d'analyse : 15/06/2018
Référence Dossier :
1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 136 | 18A022722-136 | BV3EC1646 Réf. plan : P.136 Niveau P : Parvis / TGI/ R+0/ Zone Tribunal pour Enfants/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/beige/avec fond d''enduit dans pièce P23) | Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 137 | 18A022722-137 | BV3EC1647 Réf. plan : P.137 Niveau P : Parvis / TGI/ R+0/ Zone Tribunal pour Enfants/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/blanc(he)/avec fond d''enduit sur paroi de doublage en plaque de plâtre dans pièce P30) | Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) + (beige) (clair) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 67 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS**
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KE-053423-01
Version du : 20/06/2018 20:07

Référence laboratoire sous-traitant N° : 18KE016806
Référence de suivi du dossier N° : 18A022722
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 15/06/2018
Date de réception : 14/06/2018
Date d'analyse : 15/06/2018
Référence Dossier :
1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 138 | 18A022722-138 | BV3EC1648 Réf. plan : P.138 Niveau P : Parvis / TGI/ R+0/ Zone Tribunal pour Enfants/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/blanc(he)/avec fond d''enduit) | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) en traces | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | | Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (clair) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 139 | 18A022722-139 | BV3EC1649 Réf. plan : P.139 Niveau P : Parvis / TGI/ R+0/ Zone SOP/Revêtement du mur - Peinture - (décorative/jaune/avec fond d''enduit blanc et ragréage gris dans salle d''ordonnance pénale) | Matériau de type peinture (jaune) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | | Matériau (fibreux) (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige) (clair) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | | Matériau semi-dur de type enduit (beige) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 140 | 18A022722-140 | BV3EC1650 Réf. plan : P.140 Niveau P : Parvis / TGI/ R+0/ Zone SOP/Plafond - Flocage - (cotonneux/blanc(he)/dans plénum de la salle d''ordonnance pénale) | Matériau de type peinture (gris) ; matériau friable fibreux de type flocage (blanc) en traces | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | | Matériau friable fibreux de type flocage (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) en traces | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 67 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS**
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KE-053423-01
Version du : 20/06/2018 20:07

Référence laboratoire sous-traitant N° : 18KE016806
Référence de suivi du dossier N° : 18A022722
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 15/06/2018
Date de réception : 14/06/2018
Date d'analyse : 15/06/2018
Référence Dossier :
1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 141 | 18A022722-141 | BV3EC1651 Réf. plan : P.141 Niveau P : Parvis / TGI/ R+0/ Zone SOP/Poutre - Peinture - (décorative/blanc(he)/avec fond d''enduit dans dégagement vers SA N°5) | Matériau de type peinture (gris) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 142 | 18A022722-142 | BV3EC1652 Réf. plan : P.142 Niveau P : Parvis / TGI/ R+0/ Zone SA N °6/Mur - Revêtement - (tapisserie/beige/y compris fond sur noyau externe du petit escalier circulaire dans dégagement vers SA N°6) | Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) | **MOLP** * | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| | | | Matériau (fibreux) (gris) (clair) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau (beige) en traces | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 67 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS**
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KE-053423-01
Version du : 20/06/2018 20:07

Référence laboratoire sous-traitant N° : 18KE016806
Référence de suivi du dossier N° : 18A022722
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 15/06/2018
Date de réception : 14/06/2018
Date d'analyse : 15/06/2018
Référence Dossier :
1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 143 | 18A022722-143 | BV3EC1653 Réf. plan : P.143 Niveau P : Parvis / TGI/ R+0/ Zone des Délibérés SA N°5 et N °6/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/gris(e)/avec fond d''enduit sur noyau interne du petit escalier circulaire) | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | | Matériau semi-dur de type enduit (gris) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 144 | 18A022722-144 | BV3EC1654 Réf. plan : P.144 Niveau P : Parvis / TGI/ R+0/ Zone Tribunal pour Enfants/Plancher - Rebouchage - (plâtreux/blanc(he)/autour chemin de câbles dans local technique électrique vers escalier S) | Matériau (gris) en traces ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 67 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS**
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KE-053423-01
Version du : 20/06/2018 20:07

Référence laboratoire sous-traitant N° : 18KE016806
Référence de suivi du dossier N° : 18A022722
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 15/06/2018
Date de réception : 14/06/2018
Date d'analyse : 15/06/2018
Référence Dossier :
1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 145 | 18A022722-145 | BV3EC1655 Réf. plan : P.145 Niveau P : Parvis / TGI/ R+0/ Escalier d''accès A/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/beige/avec fond d''enduit blanc) | Matériau de type peinture (gris) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 146 | 18A022722-146 | BV3EC1656 Réf. plan : P.146 Niveau P : Parvis / TGI/ R+0/ Escalier d''accès A/Revêtement de plafond - Peinture - (gouttelette/beige/avec fond d''enduit blanc en dalle haute) | Matériau de type peinture (gris) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (gris) (clair) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 147 | 18A022722-147 | BV3EC1657 Réf. plan : P.147 Niveau P : Parvis / TGI/ R+0/ Escalier d''accès D/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/beige/avec fond d''enduit blanc) | Matériau de type peinture (gris) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (gris) (clair) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | | Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 67 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS**
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KE-053423-01 | Version du : 20/06/2018 20:07 | 
Référence laboratoire sous-traitant N° : 18KE016806 | Référence de suivi du dossier N° : 18A022722
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 15/06/2018 | Date de réception : 14/06/2018
Date d'analyse : 15/06/2018
Référence Dossier : 1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 148 | 18A022722-148 | BV3EC1658 Réf. plan : P.148 Niveau P : Parvis / TGI/ R+0/ Escalier d''accès D/Revêtement de plafond - Peinture - (gouttelette/beige/avec fond d''enduit blanc) | Matériau de type peinture (gris) (clair) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (gris) (clair) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 149 | 18A022722-149 | BV3EC1659 Réf. plan : P.149 Niveau P : Parvis / TGI/ R+0/ Zone ICJ/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/beige/avec fond d''enduit dans pièce P75) | Matériau de type peinture (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige) (clair) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 150 | 18A022722-150 | BV3EC1660 Réf. plan : P.150 Niveau P : Parvis / TGI/ R+0/ Zone ICJ/Mur - Toile de verre - (peint/beige/avec fond d''enduit sur paroi de doublage en plaque de plâtre dans pièce P73) | Matériau de type peinture (beige) (clair) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | | Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau (gris) en traces | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 67 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS**
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KE-053423-01
Version du : 20/06/2018 20:07

Référence laboratoire sous-traitant N° : 18KE016806
Référence de suivi du dossier N° : 18A022722
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 15/06/2018
Date de réception : 14/06/2018
Date d'analyse : 15/06/2018
Référence Dossier :
1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 151 | 18A022722-151 | BV3EC1661 Réf. plan : P.151 Niveau P : Parvis / TGI/ R+0/ Zone ICJ/Revêtement du mur - Peinture - (décorative/beige/avec fond d''enduit sur support plâtre) | Matériau de type peinture (beige) (clair) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | | Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) + (beige) (clair) | **MET** * | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

***Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :***

Microscopie Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) réalisée selon la norme **HSG 248 - Appendice 2**

Microscopie Electronique à Transmission (**MET**) réalisée selon les parties pertinentes de la norme **NFX 43-050**

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 2 : Le laboratoire a validé sa limite de détection. Il garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans l'échantillon est supérieure ou égale à 0.1% en masse.

*Observation(s) échantillon(s)*

(1) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes
(2) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible

Sana Hassani
Technicien Analyste en Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 67 page(s)
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS**
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE, FRANCE
Tél: +33 4 66 73 15 73 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
**Monsieur Didier DENAVEAUT**
10 Chaussée Jules César
Immeuble "Le Louisiane" - Zi Des Beaux Soleils
95526 CERGY PONTOISE CEDEX

**Numéro de dossier : 18A024912**
**Référence de dossier : 1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2**

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 18A024912-001 - Référence *BV3EC1683 Réf. plan : P.152 Niveau : Terrasse / Bât. Annexe/ R+3/ LT Machineries d'ascenseurs/Plancher - Rebouchage - (mousse expensée/jaune/type mousse injectée y compris résine de sol grise dans local machinerie côté escalier B)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 18A024912-002 - Référence *BV3EC1684 Réf. plan : P.153 Niveau : 1er étage / TGI/ R+1/ Placards techniques/Plancher - Rebouchage - (plâtreux/blanc(he)/avec laine jaune autour du chemin de câbles dans placard technique électrique vers escalier S)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 18A024912-003 - Référence *BV3EC1685 Réf. plan : P.154 Niveau : 1er étage / TGI/ R+1/ Placards techniques/Plancher - Rebouchage - (plâtreux/blanc(he)/autour du chemin de câbles dans placard technique électrique vers escalier T)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 18A024912-004 - Référence *BV3EC1686 Réf. plan : P.155 Niveau : 1er étage / TGI/ R+1/ Ensemble des pièces Ind.100/Revêtement de sol - Dalle de sol - (blanc(he)/avec masse noire y compris colle noire sous plancher technique dans local serveur 130)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 18A024912-005 - Référence *BV3EC1687 Réf. plan : P.156 Niveau : 1er étage / TGI/ R+1/ Ensemble des pièces Ind.100/Revêtement du mur - Peinture - (décorative/blanc(he)/avec enduit blanc  sur fond gris dans local serveur 130)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 18A024912-006 - Référence *BV3EC1688 Réf. plan : P.157 Niveau : 1er étage / TGI/ R+1/ Ensemble des pièces Ind.100/Revêtement du mur - Moquette - (toile/gris(e)/collée sur fond plaque de plâtre de doublage dans local serveur 130)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 18A024912-007 - Référence *BV3EC1689 Réf. plan : P.158 Niveau : 1er étage / TGI/ R+1/ Sanitaires/Gaine - Joint - (fibreux/gris(e)/toile grise d'étanchéité sur gaine VMC dans sanitaires vers escalier T)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 18A024912-008 - Référence *BV3EC1690 Réf. plan : P.159 Niveau : 1er étage / TGI/ R+1/ Ensemble des pièces Ind.100/Revêtement de plafond - Peinture - (gouttelette/beige/avec enduit blanc dans pièce 190)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 18A024912-009 - Référence *BV3EC1691 Réf. plan : P.160 Niveau : 1er étage / TGI/ R+1/ Ensemble des pièces Ind.100/Revêtement de cloison - Peinture - (gouttelette/beige/avec bande calicot et fond d'enduit plaque de plâtre de doublage dans pièce 190)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 18A024912-010 - Référence *BV3EC1692 Réf. plan : P.161 Niveau : 1er étage / TGI/ R+1/ Ensemble des pièces Ind.100/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/beige/avec enduit blanc sur fond ciment dans pièce 190)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 18A024912-011 - Référence *BV3EC1693 Réf. plan : P.162 Niveau : 2ème étage / TGI/ R+2/ Dégagements et zones d'attente/Revêtement de sol - Dalle de sol - (plastique/beige/dalle de sol souple 50x50 avec colle jaune et ragréage rose dans local Baie Informatique SR02 dans zone attente de l'escalier C)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 18A024912-012 - Référence *BV3EC1694 Réf. plan : P.163 Niveau : 2ème étage / TGI/ R+2/ Dégagements et zones d'attente/Cloison - Bande calicot - (plâtre/blanc(he)/avec enduit et peinture blanche dans local Baie Informatique SR02 dans zone attente de l'escalier C)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 18A024912-013 - Référence *BV3EC1695 Réf. plan : P.164 Niveau : 2ème étage / TGI/ R+2/ Escalier d'accès C/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/beige/avec fond d'enduit blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 18A024912-014 - Référence *BV3EC1696 Réf. plan : P.165 Niveau : 2ème étage / TGI/ R+2/ Escalier d'accès C/Revêtement de plafond - Peinture - (gouttelette/beige/avec fond d'enduit blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 18A024912-015 - Référence *BV3EC1697 Réf. plan : P.166 Niveau : 2ème étage / TGI/ R+2/ Petit(s) escalier(s) circulaire(s)/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/gris(e)/avec fond d'enduit blanc au droit de la pièce 284)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 18A024912-016 - Référence *BV3EC1698 Réf. plan : P.167 Niveau : 2ème étage / TGI/ R+2/ Escalier d'accès D/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/beige/avec fond d'enduit blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 18A024912-017 - Référence *BV3EC1699 Réf. plan : P.168 Niveau : 2ème étage / TGI/ R+2/ Escalier d'accès D/Revêtement de plafond - Peinture - (gouttelette/gris(e)/avec fond d'enduit blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 18A024912-018 - Référence *BV3EC1700 Réf. plan : P.169 Niveau : 2ème étage / TGI/ R+2/ Petit(s) escalier(s) circulaire(s)/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/gris(e)/avec fond d'enduit blanc au droit de la pièce 280)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 18A024912-019 - Référence *BV3EC1701 Réf. plan : P.170 Niveau : 2ème étage / TGI/ R+2/ Placards techniques/Plancher - Rebouchage - (plâtreux/blanc(he)/au droit du chemin de câbles (goulotte) dans placard technique électrique TDN 10.05 face à la pièce 282)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 18A024912-020 - Référence *BV3EC1702 Réf. plan : P.171 Niveau : 2ème étage / TGI/ R+2/ Petit(s) escalier(s) circulaire(s)/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/gris(e)/avec fond d'enduit blanc au droit de la pièce 212)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 18A024912-021 - Référence *BV3EC1703 Réf. plan : P.172 Niveau : 2ème étage / TGI/ R+2/ Escalier d'accès T/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/gris(e)/avec fond d'enduit blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 18A024912-022 - Référence *BV3EC1704 Réf. plan : P.173 Niveau : 2ème étage / TGI/ R+2/ Escalier d'accès T/Revêtement de plafond - Peinture - (gouttelette/gris(e)/avec fond d'enduit blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 18A024912-023 - Référence *BV3EC1705 Réf. plan : P.174 Niveau : 2ème étage / TGI/ R+2/ Dégagements et zones d'attente/Cloison - Rebouchage - (mousse expensée/jaune/autour chemin de câbles en pénétration dans imposte de la porte coupe-feu vers l'escalier S)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 18A024912-024 - Référence *BV3EC1706 Réf. plan : P.175 Niveau : 3ème étage / TGI/ R+3/ Escalier d'accès B/Revêtement de plafond - Peinture - (gouttelette/beige/avec fond d'enduit blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 18A024912-025 - Référence *BV3EC1707 Réf. plan : P.176 Niveau : 3ème étage / TGI/ R+3/ Escalier d'accès S/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/gris(e)/avec fond d'enduit blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 18A024912-026 - Référence *BV3EC1708 Réf. plan : P.177 Niveau : 3ème étage / TGI/ R+3/ Escalier d'accès S/Revêtement de plafond - Peinture - (gouttelette/gris(e)/avec fond d'enduit blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 18A024912-027 - Référence *BV3EC1709 Réf. plan : P.178 Niveau : 3ème étage / TGI/ R+3/ Placards techniques/Plancher - Rebouchage - (plâtreux/blanc(he)/autour chemin de câbles dans placard technique électrique vers l'escalier S)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 18A024912-028 - Référence *BV3EC1710 Réf. plan : P.179 Niveau : 3ème étage / TGI/ R+3/ Dégagements et zones d'attente/Cloison - Rebouchage - (mousse expensée/jaune/au droit du chemin de câbles en pénétration dans imposte de la porte coupe-feu du dégagement vers sanitaires de l'escalier T)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 18A024912-029 - Référence *BV3EC1711 Réf. plan : P.180 Niveau : 3ème étage / TGI/ R+3/ Dégagements et zones d'attente/Plancher - Joint de dilatation - (mousse/gris(e)/dans zone attente de l'escalier B)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 18A024912-030 - Référence *BV3EC1712 Réf. plan : P.181 Niveau : 6ème étage / TGI/ R+6/ Ensemble des pièces Ind.600/Plafond - Flocage - (cotonneux/blanc(he)/en dalle haute de la bibliothèque 675)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 18A024912-031 - Référence *BV3EC1713 Réf. plan : P.182 Niveau : 6ème étage / TGI/ R+6/ Escalier d'accès T/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/gris(e)/avec fond d'enduit blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 18A024912-032 - Référence *BV3EC1714 Réf. plan : P.183 Niveau : 6ème étage / TGI/ R+6/ Escalier d'accès T/Revêtement de plafond - Peinture - (gouttelette/gris(e)/avec fond d'enduit blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 18A024912-033 - Référence *BV3EC1715 Réf. plan : P.184 Niveau : 6ème étage / TGI/ R+6/ Escalier d'accès C/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/beige/avec fond d'enduit blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 18A024912-034 - Référence *BV3EC1716 Réf. plan : P.185 Niveau : 6ème étage / TGI/ R+6/ Escalier d'accès C/Revêtement de plafond - Peinture - (gouttelette/beige/avec fond d'enduit blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 18A024912-035 - Référence *BV3EC1717 Réf. plan : P.186 Niveau : 6ème étage / TGI/ R+6/ Ensemble des pièces Ind.600/Revêtement de cloison - Moquette avec sous couche - (toile/vert(e)/avec colle jaune sur doublage en plaque de plâtre dans la bibliothèque 675)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 18A024912-036 - Référence *BV3EC1718 Réf. plan : P.187 Niveau : 7ème étage / TGI/ R+7/ Zones locaux techniques/Gaine - Joint - (fibreux/gris(e)/en jonction sur gaine VMC)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 18A024912-037 - Référence *BV3EC1719 Réf. plan : P.188 Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe/ R-1/ Escalier d'accès A/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/gris(e)/avec fond d'enduit blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 18A024912-038 - Référence *BV3EC1720 Réf. plan : P.189 Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe/ R-1/ Escalier d'accès A/Revêtement de plafond - Peinture - (gouttelette/gris(e)/avec fond d'enduit blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 18A024912-039 - Référence *BV3EC1721 Réf. plan : P.190 Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe/ R-1/ Dégagements/Revêtement du mur - Moquette avec sous couche - (gris(e)/avec fond papier beige y compris colle jaune sur enduit blanc dans dégagement vers l'escalier A)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 18A024912-040 - Référence *BV3EC1722 Réf. plan : P.191 Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe/ R-1/ Sanitaires/Clapet coupe-feu - Clapet coupe-feu - (plâtreux/rose/paroi avec carton et aluminium - CCF de marque SGEI)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 18A024912-041 - Référence *BV3EC1723 Réf. plan : P.192 Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe/ R-1/ Sanitaires/Clapet coupe-feu - Rebouchage clapet - (ciment/gris(e)/autour du CCF SGEI)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 18A024912-042 - Référence *BV3EC1724 Réf. plan : P.193 Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe/ R-1/ Sanitaires/Gaine - Joint - (fibreux/gris(e)/en jonction de gaine VMC en sortie du CCF)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 18A024912-043 - Référence *BV3EC1725 Réf. plan : P.194 Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe/ R-1/ Sanitaires/Gaine - Joint - (mastic/beige/sur gaine VMC)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 18A024912-044 - Référence *BV3EC1726 Réf. plan : P.195 Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe/ R-1/ Sanitaires/Gaine horizontale - Flocage - (cotonneux/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 18A024912-045 - Référence *BV3EC1727 Réf. plan : P.196 Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe/ R-1/ Sanitaires/Revêtement de poteau - Colle de faïence - (mortier/gris(e)/faïence 5x5 beige avec joint gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 18A024912-046 - Référence *BV3EC1728 Réf. plan : P.197 Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe/ R-1/ Archives/Plafond - Flocage - (cotonneux/blanc(he)/en dalle haute des archives S02)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 18A024912-047 - Référence *BV3EC1729 Réf. plan : P.198 Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe/ R-1/ Archives/Plafond - Flocage - (cotonneux/blanc(he)/en dalle haute des archives S01)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 18A024912-048 - Référence *BV3EC1730 Réf. plan : P.199 Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe/ R-1/ Archives/Gaine - Joint - (mastic/marron/dans archives S02)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 18A024912-049 - Référence *BV3EC1731 Réf. plan : P.200 Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe/ R-1/ Archives/Cloison - Bande calicot - (papier/blanc(he)/avec enduit et peinture blanche sur paroi de doublage en plaque de plâtre)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 18A024912-050 - Référence *BV3EC1732 Réf. plan : P.201 Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe/ R-1/ Archives/Plafond - Rebouchage - (plâtreux/beige/au droit du boitier encastrable électrique dans flocage en dalle haute des archives S01)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 18A024912-051 - Référence *BV3EC1733 Réf. plan : P.202 Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe/ R-1/ Escalier d'accès B/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/gris(e)/avec fond d'enduit blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 18A024912-052 - Référence *BV3EC1734 Réf. plan : P.203 Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe/ R-1/ Escalier d'accès B/Revêtement de plafond - Peinture - (gouttelette/gris(e)/avec fond d'enduit blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 18A024912-053 - Référence *BV3EC1735 Réf. plan : P.204 Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe/ R-1/ Escalier d'accès B/Mur - Rebouchage - (plâtreux/blanc(he)/au droit du boitier encastrable électrique sur dégagement de l'escalier B)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 18A024912-054 - Référence *BV3EC1736 Réf. plan : P.205 Niveau : Pas Perdus / Bât. Annexe/ R+1/ Zone SA N°1/Plafond - Flocage - (cotonneux/blanc(he)/en dalle haute)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 18A024912-055 - Référence *BV3EC1737 Réf. plan : P.206 Niveau : Pas Perdus / Bât. Annexe/ R+1/ Zone SA N°1/Mur - Revêtement - (tapisserie/gris(e)/avec fond beige sur enduit ciment)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 18A024912-056 - Référence *BV3EC1738 Réf. plan : P.207 Niveau : Pas Perdus / Bât. Annexe/ R+1/ Zone SA N°1/Charpente - Peinture - (décorative/bleu(e)/avec enduit blanc sur antirouille orange)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 18A024912-057 - Référence *BV3EC1739 Réf. plan : P.208 Niveau : Pas Perdus / Bât. Annexe/ R+1/ Zone SA N°2/Mur - Revêtement - (tapisserie/gris(e)/avec fond beige sur doublage en plaque de plâtre)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 18A024912-058 - Référence *BV3EC1740 Réf. plan : P.209 Niveau : Pas Perdus / Bât. Annexe/ R+1/ Petit escalier/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/beige/avec fond d'enduit blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 18A024912-059 - Référence *BV3EC1741 Réf. plan : P.210 Niveau : Pas Perdus / Bât. Annexe/ R+1/ Petit escalier/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/beige/moucheté noir/gris en raccord sur P.209)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 18A024912-060 - Référence *BV3EC1742 Réf. plan : P.211 Niveau : Pas Perdus / Bât. Annexe/ R+1/ Salle des délibérés/Revêtement du mur - Peinture - (décorative/beige/avec fond d'enduit blanc sur doublage en plaque de plâtre)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 18A024912-061 - Référence *BV3EC1743 Réf. plan : P.212 Niveau : Pas Perdus / Bât. Annexe/ R+1/ Zone des délibérés avec WC/Plafond - Flocage - (cotonneux/blanc(he)/en dalle haute)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 18A024912-062 - Référence *BV3EC1744 Réf. plan : P.213 Niveau S : R-2 / RDC / Bât. Annexe/ Rez-de-chaussée/ Dégagement Escalier A/Revêtement du mur - Peinture - (décorative/blanc(he)/avec enduit blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 18A024912-063 - Référence *BV3EC1745 Réf. plan : P.214 Niveau S : R-2 / RDC / Bât. Annexe/ Rez-de-chaussée/ Dégagement Escalier A/Revêtement de sol - Dalle de sol - (cassante/gris(e)/moucheté bleu avec colle jaune et ragréage rose)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS**
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

**BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS**
**Monsieur Didier DENAVEAUT**
10 Chaussée Jules César
Immeuble "Le Louisiane" - Zi Des Beaux Soleils
95526 CERGY PONTOISE CEDEX

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KC-074998-01
Référence laboratoire sous-traitant N° : 18K022845
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 28/06/2018
Date d'analyse : 28/06/2018
Référence Dossier :
1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Version du : 04/07/2018 16:09
Référence de suivi du dossier N° : 18A024912
Date de réception : 27/06/2018



Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 001 | 18A024912-001 | BV3EC1683 Réf. plan : P.152 Niveau : Terrasse / Bât. Annexe/ R+3/ LT Machineries d''ascenseurs/ Plancher - Rebouchage - (mousse expensée/jaune/type mousse injectée y compris résine de sol grise dans local machinerie côté escalier B) | Matériau de type mousse (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) | **MET** * | 1 | Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KC-074998-01
Référence laboratoire sous-traitant N° : 18K022845
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 28/06/2018
Date d'analyse : 28/06/2018
Référence Dossier : 1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Version du : 04/07/2018 16:09
Référence de suivi du dossier N° : 18A024912
Date de réception : 27/06/2018



Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 002 | 18A024912-002 | BV3EC1684 Réf. plan : P.153 Niveau : 1er étage / TGI/ R+1/ Placards techniques/Plancher - Rebouchage - (plâtreux/blanc (he)/avec laine jaune autour du chemin de câbles dans placard technique électrique vers escalier S) | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | | Matériau fibreux de type isolant (jaune) | **MOLP** * | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 003 | 18A024912-003 | BV3EC1685 Réf. plan : P.154 Niveau : 1er étage / TGI/ R+1/ Placards techniques/Plancher - Rebouchage - (plâtreux/blanc (he)/autour du chemin de câbles dans placard technique électrique vers escalier T) | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) | **MET** * | 1 | Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest**
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 GRADIGNAN CEDEX, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: + 33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KC-074998-01
Version du : 04/07/2018 16:09

Référence laboratoire sous-traitant N° : 18K022845
Référence de suivi du dossier N° : 18A024912
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 28/06/2018
Date de réception : 27/06/2018
Date d'analyse : 28/06/2018
Référence Dossier :
1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 004 | 18A024912-004 | BV3EC1686 Réf. plan : P.155 Niveau : 1er étage / TGI/ R+1/ Ensemble des pièces Ind.100/Revêtement de sol - Dalle de sol - (blanc(he)/avec masse noire y compris colle noire sous plancher technique dans local serveur 130) | Matériau souple de type revêtement de sol (blanc) (bleu) | **MET** * | 1 | Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | | Matériau de type colle (noir) (brillant) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 005 | 18A024912-005 | BV3EC1687 Réf. plan : P.156 Niveau : 1er étage / TGI/ R+1/ Ensemble des pièces Ind.100/Revêtement du mur - Peinture - (décorative/blanc(he)/avec enduit blanc sur fond gris dans local serveur 130) | Matériau de type peinture (blanc) (gris) | **MET** * | 1 | Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest**
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 GRADIGNAN CEDEX, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: + 33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KC-074998-01
Version du : 04/07/2018 16:09

Référence laboratoire sous-traitant N° : 18K022845
Référence de suivi du dossier N° : 18A024912
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 28/06/2018
Date de réception : 27/06/2018
Date d'analyse : 28/06/2018
Référence Dossier :
1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 006 | 18A024912-006 | BV3EC1688 Réf. plan : P.157 Niveau : 1er étage / TGI/ R+1/ Ensemble des pièces Ind.100/Revêtement du mur - Moquette - (toile/gris(e)/collée sur fond plaque de plâtre de doublage dans local serveur 130) | Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (jaune) | **MOLP** * | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| | | | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 007 | 18A024912-007 | BV3EC1689 Réf. plan : P.158 Niveau : 1er étage / TGI/ R+1/ Sanitaires/Gaine - Joint - (fibreux/gris(e)/toile grise d''étanchéité sur gaine VMC dans sanitaires vers escalier T) | Matériau de type maillage de fibres et liant (gris) (fibreux) | **MET** * | 1 | Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s)
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest**
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 GRADIGNAN CEDEX, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: + 33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KC-074998-01
Version du : 04/07/2018 16:09

Référence laboratoire sous-traitant N° : 18K022845
Référence de suivi du dossier N° : 18A024912
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 28/06/2018
Date de réception : 27/06/2018
Date d'analyse : 28/06/2018
Référence Dossier :
1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 008 | 18A024912-008 | BV3EC1690 Réf. plan : P.159 Niveau : 1er étage / TGI/ R+1/ Ensemble des pièces Ind.100/Revêtement de plafond - Peinture - (gouttelette/beige/avec enduit blanc dans pièce 190) | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) | **MET** * | 1 | Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 009 | 18A024912-009 | BV3EC1691 Réf. plan : P.160 Niveau : 1er étage / TGI/ R+1/ Ensemble des pièces Ind.100/Revêtement de cloison - Peinture - (gouttelette/beige/avec bande calicot et fond d''enduit plaque de plâtre de doublage dans pièce 190) | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | | Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) | **MOLP** * | 1 | - | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s)
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest**
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 GRADIGNAN CEDEX, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: + 33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KC-074998-01
Version du : 04/07/2018 16:09

Référence laboratoire sous-traitant N° : 18K022845
Référence de suivi du dossier N° : 18A024912
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 28/06/2018
Date de réception : 27/06/2018
Date d'analyse : 28/06/2018
Référence Dossier :
1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 010 | 18A024912-010 | BV3EC1692 Réf. plan : P.161 Niveau : 1er étage / TGI/ R+1/ Ensemble des pièces Ind.100/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/beige/avec enduit blanc sur fond ciment dans pièce 190) | Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) | **MET** * | 1 | Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 011 | 18A024912-011 | BV3EC1693 Réf. plan : P.162 Niveau : 2ème étage / TGI/ R+2/ Dégagements et zones d''attente/Revêtement de sol - Dalle de sol - (plastique/beige/dalle de sol souple 50x50 avec colle jaune et ragréage rose dans local Baie Informatique SR02 dans zone attente de l''escalier C) | Matériau souple de type dalle de sol (jaune) (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) | **MET** * | 1 | Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest**
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 GRADIGNAN CEDEX, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: + 33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KC-074998-01
Version du : 04/07/2018 16:09

Référence laboratoire sous-traitant N° : 18K022845
Référence de suivi du dossier N° : 18A024912
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 28/06/2018
Date de réception : 27/06/2018
Date d'analyse : 28/06/2018
Référence Dossier :
1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 012 | 18A024912-012 | BV3EC1694 Réf. plan : P.163 Niveau : 2ème étage / TGI/ R+2/ Dégagements et zones d''attente/Cloison - Bande calicot - (plâtre/blanc(he)/avec enduit et peinture blanche dans local Baie Informatique SR02 dans zone attente de l''escalier C) | Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 013 | 18A024912-013 | BV3EC1695 Réf. plan : P.164 Niveau : 2ème étage / TGI/ R+2/ Escalier d''accès C/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/beige/avec fond d''enduit blanc) | Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest**
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 GRADIGNAN CEDEX, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: + 33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KC-074998-01
Version du : 04/07/2018 16:09

Référence laboratoire sous-traitant N° : 18K022845
Référence de suivi du dossier N° : 18A024912
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 28/06/2018
Date de réception : 27/06/2018
Date d'analyse : 28/06/2018
Référence Dossier :
1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 014 | 18A024912-014 | BV3EC1696 Réf. plan : P.165 Niveau : 2ème étage / TGI/ R+2/ Escalier d''accès C/Revêtement de plafond - Peinture - (gouttelette/beige/avec fond d''enduit blanc) | Matériau semi-dur de type enduit (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 015 | 18A024912-015 | BV3EC1697 Réf. plan : P.166 Niveau : 2ème étage / TGI/ R+2/ Petit(s) escalier(s) circulaire(s)/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/gris(e)/avec fond d''enduit blanc au droit de la pièce 284) | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 016 | 18A024912-016 | BV3EC1698 Réf. plan : P.167 Niveau : 2ème étage / TGI/ R+2/ Escalier d''accès D/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/beige/avec fond d''enduit blanc) | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) | **MET** * | 1 | Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest**
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 GRADIGNAN CEDEX, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: + 33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KC-074998-01
Version du : 04/07/2018 16:09

Référence laboratoire sous-traitant N° : 18K022845
Référence de suivi du dossier N° : 18A024912
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 28/06/2018
Date de réception : 27/06/2018
Date d'analyse : 28/06/2018
Référence Dossier :
1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 017 | 18A024912-017 | BV3EC1699 Réf. plan : P.168 Niveau : 2ème étage / TGI/ R+2/ Escalier d''accès D/Revêtement de plafond - Peinture - (gouttelette/gris(e)/avec fond d''enduit blanc) | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) | **MET** * | 1 | Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 018 | 18A024912-018 | BV3EC1700 Réf. plan : P.169 Niveau : 2ème étage / TGI/ R+2/ Petit(s) escalier(s) circulaire(s)/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/gris(e)/avec fond d''enduit blanc au droit de la pièce 280) | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest**
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 GRADIGNAN CEDEX, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: + 33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KC-074998-01
Version du : 04/07/2018 16:09

Référence laboratoire sous-traitant N° : 18K022845
Référence de suivi du dossier N° : 18A024912
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 28/06/2018
Date de réception : 27/06/2018
Date d'analyse : 28/06/2018
Référence Dossier :
1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 019 | 18A024912-019 | BV3EC1701 Réf. plan : P.170 Niveau : 2ème étage / TGI/ R+2/ Placards techniques/Plancher - Rebouchage - (plâtreux/blanc(he)/au droit du chemin de câbles (goulotte) dans placard technique électrique TDN 10.05 face à la pièce 282) | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 020 | 18A024912-020 | BV3EC1702 Réf. plan : P.171 Niveau : 2ème étage / TGI/ R+2/ Petit(s) escalier(s) circulaire(s)/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/gris(e)/avec fond d''enduit blanc au droit de la pièce 212) | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) | **MET** * | 1 | Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s)
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest**
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 GRADIGNAN CEDEX, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: + 33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KC-074998-01
Version du : 04/07/2018 16:09

Référence laboratoire sous-traitant N° : 18K022845
Référence de suivi du dossier N° : 18A024912
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 28/06/2018
Date de réception : 27/06/2018
Date d'analyse : 28/06/2018
Référence Dossier :
1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 021 | 18A024912-021 | BV3EC1703 Réf. plan : P.172 Niveau : 2ème étage / TGI/ R+2/ Escalier d''accès T/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/gris(e)/avec fond d''enduit blanc) | Matériau de type peinture (blanc) matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) | **MET** * | 1 | Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 022 | 18A024912-022 | BV3EC1704 Réf. plan : P.173 Niveau : 2ème étage / TGI/ R+2/ Escalier d''accès T/Revêtement de plafond - Peinture - (gouttelette/gris(e)/avec fond d''enduit blanc) | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest**
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 GRADIGNAN CEDEX, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: + 33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KC-074998-01
Version du : 04/07/2018 16:09

Référence laboratoire sous-traitant N° : 18K022845
Référence de suivi du dossier N° : 18A024912
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 28/06/2018
Date de réception : 27/06/2018
Date d'analyse : 28/06/2018
Référence Dossier :
1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 023 | 18A024912-023 | BV3EC1705 Réf. plan : P.174 Niveau : 2ème étage / TGI/ R+2/ Dégagements et zones d''attente/Clois on - Rebouchage - (mousse expensée/jaun e/autour chemin de câbles en pénétration dans imposte de la porte coupe-feu vers l''escalier S) | Matériau de type mousse (jaune) | **MET** * | 1 | Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 024 | 18A024912-024 | BV3EC1706 Réf. plan : P.175 Niveau : 3ème étage / TGI/ R+3/ Escalier d''accès B/Revêtement de plafond - Peinture - (gouttelette/bei ge/avec fond d''enduit blanc) | Matériau semi-dur de type enduit (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest**
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 GRADIGNAN CEDEX, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: + 33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KC-074998-01
Version du : 04/07/2018 16:09

Référence laboratoire sous-traitant N° : 18K022845
Référence de suivi du dossier N° : 18A024912
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 28/06/2018
Date de réception : 27/06/2018
Date d'analyse : 28/06/2018
Référence Dossier :
1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 025 | 18A024912-025 | BV3EC1707 Réf. plan : P.176 Niveau : 3ème étage / TGI/ R+3/ Escalier d''accès S/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/gris(e)/avec fond d''enduit blanc) | Matériau semi-dur de type enduit (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 026 | 18A024912-026 | BV3EC1708 Réf. plan : P.177 Niveau : 3ème étage / TGI/ R+3/ Escalier d''accès S/Revêtement de plafond - Peinture - (gouttelette/gris(e)/avec fond d''enduit blanc) | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest**
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 GRADIGNAN CEDEX, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: + 33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KC-074998-01
Version du : 04/07/2018 16:09

Référence laboratoire sous-traitant N° : 18K022845
Référence de suivi du dossier N° : 18A024912
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 28/06/2018
Date de réception : 27/06/2018
Date d'analyse : 28/06/2018
Référence Dossier :
1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 027 | 18A024912-027 | BV3EC1709 Réf. plan : P.178 Niveau : 3ème étage / TGI/ R+3/ Placards techniques/Plancher - Rebouchage - (plâtreux/blanc (he)/autour chemin de câbles dans placard technique électrique vers l''escalier S) | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 028 | 18A024912-028 | BV3EC1710 Réf. plan : P.179 Niveau : 3ème étage / TGI/ R+3/ Dégagements et zones d''attente/Cloison - Rebouchage - (mousse expensée/jaune/au droit du chemin de câbles en pénétration dans imposte de la porte coupe-feu du dégagement vers sanitaires de l''escalier T) | Matériau de type mousse (jaune) | **MET** * | 1 | Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s)
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest**
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 GRADIGNAN CEDEX, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: + 33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KC-074998-01
Version du : 04/07/2018 16:09

Référence laboratoire sous-traitant N° : 18K022845
Référence de suivi du dossier N° : 18A024912
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 28/06/2018
Date de réception : 27/06/2018
Date d'analyse : 28/06/2018
Référence Dossier :
1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 029 (1) | 18A024912-029 | BV3EC1711 Réf. plan : P.180 Niveau : 3ème étage / TGI/ R+3/ Dégagements et zones d''attente/Plancher - Joint de dilatation - (mousse/gris(e)/dans zone attente de l''escalier B) | Matériau de type mousse (gris) ; matériau de type tresse de fibres (blanc) | **MOLP** * | 2 | - | Fibres d'amiante de type chrysotile |
| 030 | 18A024912-030 | BV3EC1712 Réf. plan : P.181 Niveau : 6ème étage / TGI/ R+6/ Ensemble des pièces Ind.600/Plafond - Flocage - (cotonneux/blanc(he)/en dalle haute de la bibliothèque 675) | Matériau friable fibreux de type flocage (blanc) | **MOLP** * | 1 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 031 | 18A024912-031 | BV3EC1713 Réf. plan : P.182 Niveau : 6ème étage / TGI/ R+6/ Escalier d''accès T/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/gris(e)/avec fond d''enduit blanc) | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest**
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 GRADIGNAN CEDEX, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: + 33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KC-074998-01 | Version du : 04/07/2018 16:09 | 
Référence laboratoire sous-traitant N° : 18K022845 | Référence de suivi du dossier N° : 18A024912
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 28/06/2018 | Date de réception : 27/06/2018
Date d'analyse : 28/06/2018
Référence Dossier : 1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 032 | 18A024912-032 | BV3EC1714 Réf. plan : P.183 Niveau : 6ème étage / TGI/ R+6/ Escalier d''accès T/Revêtement de plafond - Peinture - (gouttelette/gris(e)/avec fond d''enduit blanc) | Matériau semi-dur de type enduit (gris) | **MET** * | 1 | Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 033 | 18A024912-033 | BV3EC1715 Réf. plan : P.184 Niveau : 6ème étage / TGI/ R+6/ Escalier d''accès C/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/beige/avec fond d''enduit blanc) | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 034 | 18A024912-034 | BV3EC1716 Réf. plan : P.185 Niveau : 6ème étage / TGI/ R+6/ Escalier d''accès C/Revêtement de plafond - Peinture - (gouttelette/beige/avec fond d''enduit blanc) | Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest**
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 GRADIGNAN CEDEX, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: + 33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KC-074998-01
Version du : 04/07/2018 16:09

Référence laboratoire sous-traitant N° : 18K022845
Référence de suivi du dossier N° : 18A024912
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 28/06/2018
Date de réception : 27/06/2018
Date d'analyse : 28/06/2018
Référence Dossier :
1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 035 | 18A024912-035 | BV3EC1717 Réf. plan : P.186 Niveau : 6ème étage / TGI/ R+6/ Ensemble des pièces Ind.600/Revêtement de cloison - Moquette avec sous couche - (toile/vert(e)/avec colle jaune sur doublage en plaque de plâtre dans la bibliothèque 675) | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | | Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) (fibreux) | **MET** * | 1 | Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 036 | 18A024912-036 | BV3EC1718 Réf. plan : P.187 Niveau : 7ème étage / TGI/ R+7/ Zones locaux techniques/Gaine - Joint - (fibreux/gris(e)/en jonction sur gaine VMC) | Matériau souple (gris) ; matériau de type maillage de fibres et liant (gris) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest**
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 GRADIGNAN CEDEX, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: + 33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KC-074998-01
Version du : 04/07/2018 16:09

Référence laboratoire sous-traitant N° : 18K022845
Référence de suivi du dossier N° : 18A024912
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 28/06/2018
Date de réception : 27/06/2018
Date d'analyse : 28/06/2018
Référence Dossier :
1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 037 | 18A024912-037 | BV3EC1719 Réf. plan : P.188 Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe/ R-1/ Escalier d''accès A/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/gris(e)/avec fond d''enduit blanc) | Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) | **MET** * | 1 | Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 038 | 18A024912-038 | BV3EC1720 Réf. plan : P.189 Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe/ R-1/ Escalier d''accès A/Revêtement de plafond - Peinture - (gouttelette/gris(e)/avec fond d''enduit blanc) | Matériau semi-dur de type enduit (beige) | **MET** * | 1 | Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest**
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 GRADIGNAN CEDEX, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: + 33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KC-074998-01
Version du : 04/07/2018 16:09

Référence laboratoire sous-traitant N° : 18K022845
Référence de suivi du dossier N° : 18A024912
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 28/06/2018
Date de réception : 27/06/2018
Date d'analyse : 28/06/2018
Référence Dossier :
1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 039 | 18A024912-039 | BV3EC1721 Réf. plan : P.190 Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe/ R-1/ Dégagements/ Revêtement du mur - Moquette avec sous couche - (gris(e)/avec fond papier beige y compris colle jaune sur enduit blanc dans dégagement vers l''escalier A) | Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) | **MET** * | 1 | Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | | Matériau souple fibreux de type papier, carton (jaune) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) | **MET** * | 1 | Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 040 | 18A024912-040 | BV3EC1722 Réf. plan : P.191 Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe/ R-1/ Sanitaires/Clapet coupe-feu - Clapet coupe-feu - (plâtreux/rose/ paroi avec carton et aluminium - CCF de marque SGEI) | Matériau de type aluminium ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (rose) (fibreux) | **MET** * | 1 | Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest**
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 GRADIGNAN CEDEX, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: + 33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KC-074998-01
Référence laboratoire sous-traitant N° : 18K022845
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 28/06/2018
Date d'analyse : 28/06/2018
Référence Dossier : 1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Version du : 04/07/2018 16:09
Référence de suivi du dossier N° : 18A024912
Date de réception : 27/06/2018



Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 041 | 18A024912-041 | BV3EC1723 Réf. plan : P.192 Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe/ R-1/ Sanitaires/Clapet coupe-feu - Rebouchage clapet - (ciment/gris(e) /autour du CCF SGEI) | Matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 042 | 18A024912-042 | BV3EC1724 Réf. plan : P.193 Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe/ R-1/ Sanitaires/Gaine - Joint - (fibreux/gris(e) /en jonction de gaine VMC en sortie du CCF) | Matériau de type maillage de fibres et liant (gris) | **MET** * | 1 | Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 043 (2) | 18A024912-043 | BV3EC1725 Réf. plan : P.194 Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe/ R-1/ Sanitaires/Gaine - Joint - (mastic/beige/ sur gaine VMC) | Matériau semi-dur de type mastic (beige) | **MET** * | 1 | Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante de type chrysotile |
| 044 | 18A024912-044 | BV3EC1726 Réf. plan : P.195 Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe/ R-1/ Sanitaires/Gaine horizontale - Flocage - (cotonneux/blanc(he)) | Matériau friable fibreux de type flocage (blanc) | **MOLP** * | 1 | - | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s)
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest**
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 GRADIGNAN CEDEX, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: + 33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KC-074998-01
Version du : 04/07/2018 16:09

Référence laboratoire sous-traitant N° : 18K022845
Référence de suivi du dossier N° : 18A024912
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 28/06/2018
Date de réception : 27/06/2018
Date d'analyse : 28/06/2018
Référence Dossier :
1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 045 | 18A024912-045 | BV3EC1727 Réf. plan : P.196 Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe/ R-1/ Sanitaires/Revêtement de poteau - Colle de faïence - (mortier/gris(e) /faïence 5x5 beige avec joint gris) | Matériau semi-dur de type joint (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) | **MET** * | 1 | Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 046 | 18A024912-046 | BV3EC1728 Réf. plan : P.197 Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe/ R-1/ Archives/Plafond - Flocage - (cotonneux/blanc(he)/en dalle haute des archives S02) | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau friable fibreux de type flocage (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 047 | 18A024912-047 | BV3EC1729 Réf. plan : P.198 Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe/ R-1/ Archives/Plafond - Flocage - (cotonneux/blanc(he)/en dalle haute des archives S01) | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau friable fibreux de type flocage (blanc) (gris) | **MET** * | 1 | Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s)
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest**
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 GRADIGNAN CEDEX, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: + 33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KC-074998-01
Version du : 04/07/2018 16:09

Référence laboratoire sous-traitant N° : 18K022845
Référence de suivi du dossier N° : 18A024912
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 28/06/2018
Date de réception : 27/06/2018
Date d'analyse : 28/06/2018
Référence Dossier :
1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 048 | 18A024912-048 | BV3EC1730 Réf. plan : P.199 Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe/ R-1/ Archives/Gaine - Joint - (mastic/marron/dans archives S02) | Matériau souple de type mastic (beige) (vert) | **MET** * | 1 | Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 049 | 18A024912-049 | BV3EC1731 Réf. plan : P.200 Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe/ R-1/ Archives/Cloison - Bande calicot - (papier/blanc(he)/avec enduit et peinture blanche sur paroi de doublage en plaque de plâtre) | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 050 | 18A024912-050 | BV3EC1732 Réf. plan : P.201 Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe/ R-1/ Archives/Plafond - Rebouchage - (plâtreux/beige /au droit du boitier encastrable électrique dans flocage en dalle haute des archives S01) | Matériau semi-dur de type enduit (beige) | **MET** * | 1 | Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest**
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 GRADIGNAN CEDEX, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: + 33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KC-074998-01
Version du : 04/07/2018 16:09

Référence laboratoire sous-traitant N° : 18K022845
Référence de suivi du dossier N° : 18A024912
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 28/06/2018
Date de réception : 27/06/2018
Date d'analyse : 28/06/2018
Référence Dossier :
1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 051 | 18A024912-051 | BV3EC1733 Réf. plan : P.202 Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe/ R-1/ Escalier d''accès B/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/gris(e)/avec fond d''enduit blanc) | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) | **MET** * | 1 | Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 052 | 18A024912-052 | BV3EC1734 Réf. plan : P.203 Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe/ R-1/ Escalier d''accès B/Revêtement de plafond - Peinture - (gouttelette/gris(e)/avec fond d''enduit blanc) | Matériau semi-dur de type enduit (rose) (clair) | **MET** * | 1 | Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest**
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 GRADIGNAN CEDEX, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: + 33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KC-074998-01
Version du : 04/07/2018 16:09

Référence laboratoire sous-traitant N° : 18K022845
Référence de suivi du dossier N° : 18A024912
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 28/06/2018
Date de réception : 27/06/2018
Date d'analyse : 28/06/2018
Référence Dossier :
1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 053 | 18A024912-053 | BV3EC1735 Réf. plan : P.204 Niveau : Sous-sol / Bât. Annexe/ R-1/ Escalier d''accès B/Mur - Rebouchage - (plâtreux/blanc (he)/au droit du boitier encastrable électrique sur dégagement de l''escalier B) | Matériau semi-dur de type enduit (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 054 | 18A024912-054 | BV3EC1736 Réf. plan : P.205 Niveau : Pas Perdus / Bât. Annexe/ R+1/ Zone SA N°1/Plafond - Flocage - (cotonneux/blanc(he)/en dalle haute) | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau friable fibreux de type flocage (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 055 | 18A024912-055 | BV3EC1737 Réf. plan : P.206 Niveau : Pas Perdus / Bât. Annexe/ R+1/ Zone SA N°1/Mur - Revêtement - (tapisserie/gris (e)/avec fond beige sur enduit ciment) | Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | | Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s)
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest**
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 GRADIGNAN CEDEX, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: + 33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KC-074998-01
Version du : 04/07/2018 16:09

Référence laboratoire sous-traitant N° : 18K022845
Référence de suivi du dossier N° : 18A024912
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 28/06/2018
Date de réception : 27/06/2018
Date d'analyse : 28/06/2018
Référence Dossier :
1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 056 | 18A024912-056 | BV3EC1738 Réf. plan : P.207 Niveau : Pas Perdus / Bât. Annexe/ R+1/ Zone SA N°1/Charpente - Peinture - (décorative/bleu(e)/avec enduit blanc sur antirouille orange) | Matériau de type peinture (bleu) (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 057 | 18A024912-057 | BV3EC1739 Réf. plan : P.208 Niveau : Pas Perdus / Bât. Annexe/ R+1/ Zone SA N°2/Mur - Revêtement - (tapisserie/gris(e)/avec fond beige sur doublage en plaque de plâtre) | Matériau souple (gris) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 058 | 18A024912-058 | BV3EC1740 Réf. plan : P.209 Niveau : Pas Perdus / Bât. Annexe/ R+1/ Petit escalier/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/beige/avec fond d''enduit blanc) | Matériau de type peinture (rose) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (rose) (clair) | **MET** * | 1 | Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s)
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest**
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 GRADIGNAN CEDEX, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: + 33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KC-074998-01
Version du : 04/07/2018 16:09

Référence laboratoire sous-traitant N° : 18K022845
Référence de suivi du dossier N° : 18A024912
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 28/06/2018
Date de réception : 27/06/2018
Date d'analyse : 28/06/2018
Référence Dossier :
1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 059 | 18A024912-059 | BV3EC1741 Réf. plan : P.210 Niveau : Pas Perdus / Bât. Annexe/ R+1/ Petit escalier/Revêtement du mur - Peinture - (gouttelette/beige/moucheté noir/gris en raccord sur P.209) | Matériau de type peinture (rose) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (rose) (clair) | **MET** * | 1 | Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 060 | 18A024912-060 | BV3EC1742 Réf. plan : P.211 Niveau : Pas Perdus / Bât. Annexe/ R+1/ Salle des délibérés/Revêtement du mur - Peinture - (décorative/beige/avec fond d''enduit blanc sur doublage en plaque de plâtre) | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (jaune) (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 061 | 18A024912-061 | BV3EC1743 Réf. plan : P.212 Niveau : Pas Perdus / Bât. Annexe/ R+1/ Zone des délibérés avec WC/Plafond - Flocage - (cotonneux/blanc(he)/en dalle haute) | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau friable fibreux de type flocage (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest**
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 GRADIGNAN CEDEX, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: + 33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KC-074998-01 | Version du : 04/07/2018 16:09 | 
Référence laboratoire sous-traitant N° : 18K022845 | Référence de suivi du dossier N° : 18A024912
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 28/06/2018 | Date de réception : 27/06/2018
Date d'analyse : 28/06/2018
Référence Dossier : 1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

| N° éch. | Code échantillon client | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nb | Type | |
| 062 | 18A024912-062 | BV3EC1744 Réf. plan : P.213 Niveau S : R-2 / RDC / Bât. Annexe/ Rez-de-chaussée/ Dégagement Escalier A/Revêtement du mur - Peinture - (décorative/blanc(he)/avec enduit blanc) | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | **MET** * | 1 | Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 063 | 18A024912-063 | BV3EC1745 Réf. plan : P.214 Niveau S : R-2 / RDC / Bât. Annexe/ Rez-de-chaussée/ Dégagement Escalier A/Revêtement de sol - Dalle de sol - (cassante/gris(e)/moucheté bleu avec colle jaune et ragréage rose) | Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) | **MET** * | 1 | Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) | **MET** * | 1 | Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

***Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :***

Microscopie Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) réalisée selon la norme **HSG 248 - Appendice 2**

Microscopie Electronique à Transmission (**MET**) réalisée selon les parties pertinentes de la norme **NFX 43-050**

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 2 : Le laboratoire a validé sa limite de détection. Il garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans l'échantillon est supérieure ou égale à 0.1% en masse.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s)
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest**
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 GRADIGNAN CEDEX, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: + 33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KC-074998-01 | Version du : 04/07/2018 16:09 | Page 28/28
Référence laboratoire sous-traitant N° : 18K022845 | Référence de suivi du dossier N° : 18A024912
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 28/06/2018 | Date de réception : 27/06/2018
Date d'analyse : 28/06/2018
Référence Dossier :
1510797622/7129567/S1/1/3_7129567/2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

*Observation(s) échantillon(s)*

(1) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « le matériau tresse de fibre ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, il n'est donc pas possible de conclure de manière définitive à la présence ou à l'absence d'amiante dans ces autres matériaux.

(2) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Cindy Lacroix
Technicien de Laboratoire

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest**
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 GRADIGNAN CEDEX, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: + 33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS
