CHU Montpellier

Concession Internat
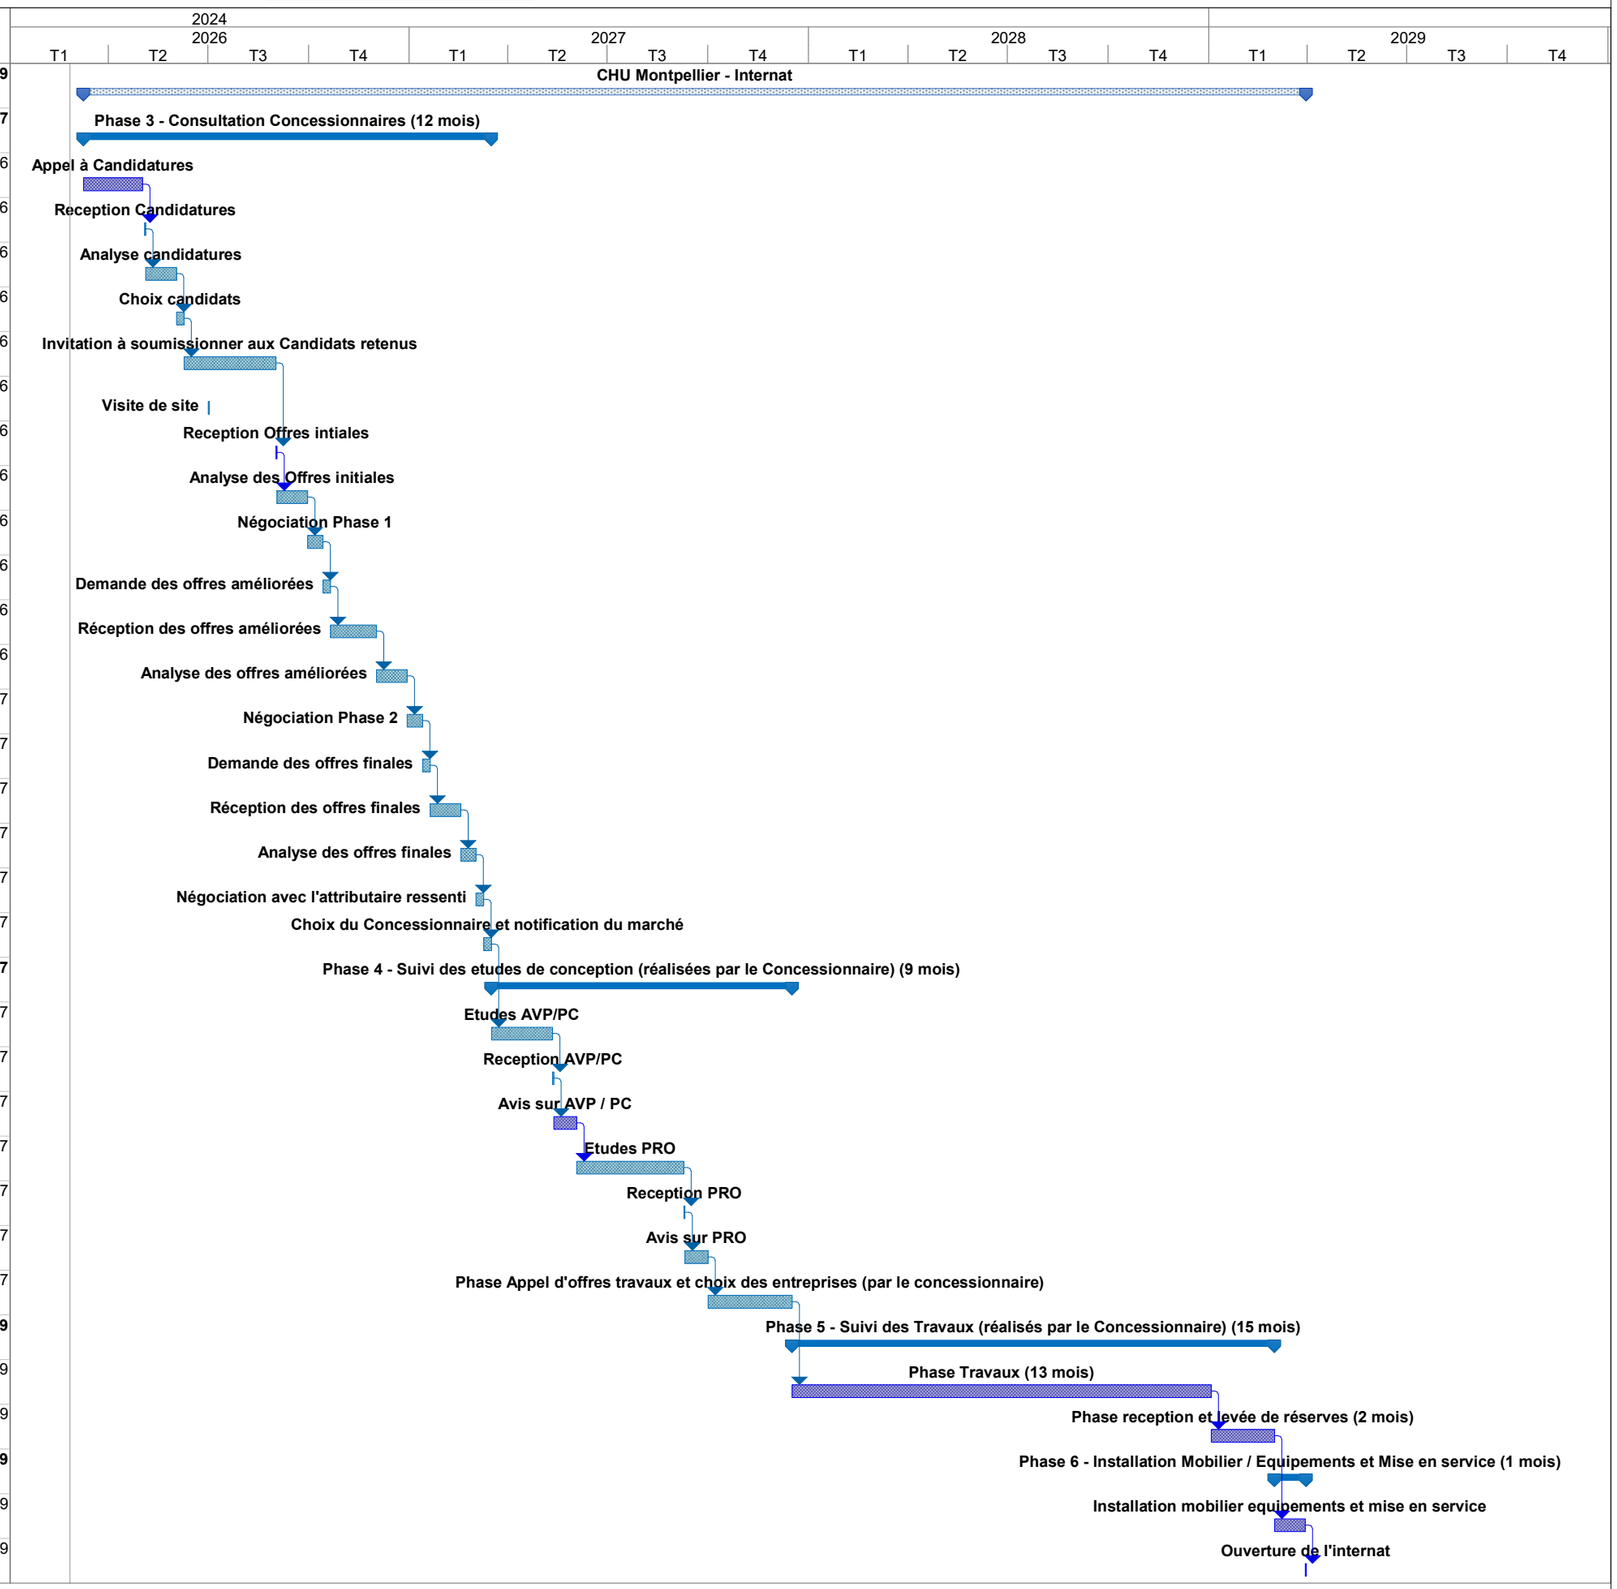
N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	**CHU Montpellier - Internat**	**800 jrs**	**Lun 09/03/26**	**Ven 30/03/29**
2	**Phase 3 - Consultation Concessionnaires (12 mois)**	**267 jrs**	**Lun 09/03/26**	**Mar 16/03/27**
3	Appel à Candidatures	40 jrs	Lun 09/03/26	Ven 01/05/26
4	Reception Candidatures	1 jr	Lun 04/05/26	Lun 04/05/26
5	Analyse candidatures	20 jrs	Mar 05/05/26	Lun 01/06/26
6	Choix candidats	5 jrs	Mar 02/06/26	Lun 08/06/26
7	Invitation à soumissionner aux Candidats retenus	60 jrs	Mar 09/06/26	Lun 31/08/26
8	Visite de site	1 jr	Mer 01/07/26	Mer 01/07/26
9	Reception Offres intiales	1 jr	Mar 01/09/26	Mar 01/09/26
10	Analyse des Offres initiales	20 jrs	Mer 02/09/26	Mar 29/09/26
11	Négociation Phase 1	10 jrs	Mer 30/09/26	Mar 13/10/26
12	Demande des offres améliorées	5 jrs	Mer 14/10/26	Mar 20/10/26
13	Réception des offres améliorées	30 jrs	Mer 21/10/26	Mar 01/12/26
14	Analyse des offres améliorées	20 jrs	Mer 02/12/26	Mar 29/12/26
15	Négociation Phase 2	10 jrs	Mer 30/12/26	Mar 12/01/27
16	Demande des offres finales	5 jrs	Mer 13/01/27	Mar 19/01/27
17	Réception des offres finales	20 jrs	Mer 20/01/27	Mar 16/02/27
18	Analyse des offres finales	10 jrs	Mer 17/02/27	Mar 02/03/27
19	Négociation avec l'attributaire ressenti	5 jrs	Mer 03/03/27	Mar 09/03/27
20	Choix du Concessionnaire et notification du marché	5 jrs	Mer 10/03/27	Mar 16/03/27
21	**Phase 4 - Suivi des etudes de conception (réalisées par le Concessionnaire) (9 mois)**	**197 jrs**	**Mer 17/03/27**	**Jeu 16/12/27**
22	Etudes AVP/PC	40 jrs	Mer 17/03/27	Mar 11/05/27
23	Reception AVP/PC	1 jr	Mer 12/05/27	Mer 12/05/27
24	Avis sur AVP / PC	15 jrs	Jeu 13/05/27	Mer 02/06/27
25	Etudes PRO	70 jrs	Jeu 03/06/27	Mer 08/09/27
26	Reception PRO	1 jr	Jeu 09/09/27	Jeu 09/09/27
27	Avis sur PRO	15 jrs	Ven 10/09/27	Jeu 30/09/27
28	Phase Appel d'offres travaux et choix des entreprises (par le concessionnaire)	55 jrs	Ven 01/10/27	Jeu 16/12/27
29	**Phase 5 - Suivi des Travaux (réalisés par le Concessionnaire) (15 mois)**	**315 jrs**	**Ven 17/12/27**	**Jeu 01/03/29**
30	Phase Travaux (13 mois)	273 jrs	Ven 17/12/27	Mar 02/01/29
31	Phase reception et levée de réserves (2 mois)	42 jrs	Mer 03/01/29	Jeu 01/03/29
32	**Phase 6 - Installation Mobilier / Equipements et Mise en service (1 mois)**	**21 jrs**	**Ven 02/03/29**	**Ven 30/03/29**
33	Installation mobilier equipements et mise en service	20 jrs	Ven 02/03/29	Jeu 29/03/29
34	Ouverture de l'internat	1 jr	Ven 30/03/29	Ven 30/03/29
