Bureau Veritas Exploitation SAS
SAINT HERBLAIN
4 rue Duguay Trouin
44800 SAINT-HERBLAIN France
Téléphone : 02 40 92 06 89
Mail : andreas.leroux@bureauveritas.com

A l'attention de Liébard Christophe
ACADEMIE DE NANTES RECTORAT
8 RUE DU GENERAL MARGUERITTE
44326 NANTES

Pré-Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020 du 5 aout 2017

Date(s) du repérage : du 17/06/2025 au 17/06/2025
du 20/08/2024 au 21/08/2024
le 16/12/2024

Nom du site : CUD LA ROCHE SUR YON

Immeuble bâti objet du repérage :
CUD LA ROCHE SUR YON
221 rue Hubert Cailler
Campus de La Roche Sur Yon
85000 LA ROCHE SUR YON

Numéro d'affaire : 23063510
Référence du rapport : 23063510/S2.2.3.rev6.R
Annule et remplace : 23063510/S2.2.3.rev5 en date du 04/12/2025
Rédigé le : 23/01/2026
Par l'opérateur de repérage : Andreas LEROUX
Date de la commande : 12/08/2024



Certification de compétence : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VERITAS CERTIFICATION 60 avenue Général De Gaulle - Immeuble Le Guillaumet --- 92046 PARIS LA DEFENSE Certificat n° 15042964

	Date de début de validité	Date de fin de validité
Amiante sans mention	11/09/2022	10/09/2029
Amiante avec mention	11/09/2022	10/09/2029

Ce rapport contient **156** pages y compris les annexes et ne peut être reproduit qu'intégralement .

Signature du rédacteur :

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION....3
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre....3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage....3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage....3

2. CONCLUSIONS....4
2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante....4
2.2. Investigation(s) approfondie(s) devant être réalisée(s) par le donneur d'ordre....11
2.3. Obligation d'information....11

3. INFORMATIONS GENERALES....12
3.1. Immeuble bâti objet de la mission....12
3.2. Intervenants....12
3.3. Opérateur(s) de repérage....12
3.4. Laboratoire(s)....12

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE....13
4.1. Textes réglementaires....13
4.2. Méthodologie de la mission....13
4.3. Limites de la mission....13

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE....15
5.1. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite....15
5.2. Conditions de visite....15

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE....15
6.1. Résultats détaillés....15
6.2. Tableau estimatif des quantités d'amiante....32

7. ANNEXES....32
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées....32
7.2. Croquis de repérage....36
7.3. Photos....50
7.4. Attestation d'assurance....82
7.5. Certificat de compétence....83
7.6. Rapports d'essais de laboratoire....84

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Diagnostic global du bâtiment sans sondages destructifs, complément du rapport 7231200/S2.4.2.R du 06/06/2019 Demande de prelevement sur la toiture complète du BAT E pour refection, demande de prelevement sur toiture BAT F et G seulement la partie revetement etanchéité pour pose de panneaux solaires (nota la zone CTA du BAT F est inondé et inaccessible)

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il est établi préalablement au repérage et définit les ouvrages ou composants de la construction et parties d'ouvrages ou de composant de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus, susceptibles d'être présents dans l'immeuble bâti.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.
Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages ou composants et parties d'ouvrages ou de composants de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou composants
Revêtements de sol	Dalles de sol, Nez de marche, Dalles moquettes avec entrecouche noire, Sous-couches (carton, feutre, .) des revêtements souples, Colles bitumineuses, Colles non bitumineuses, Moquette, Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.), Peintures de sol, Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage, Revêtements de sols sportifs, Joints de dilatation et d'assemblage, Joints de contonnement sur faux planchers, Enduit de cuvelage, Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles, Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment, Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage, Peintures décoratives (pailletées, goutelettes,.), Revêtements bitumineux, Peintures intumescentes
Plafonds	Flocages, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Panneaux collés, vissés ou cloués, Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite), Bandes calicot, Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre, Sous couches des tissus muraux, Peintures intumescentes, Revêtements bitumineux, Peintures décoratives (pailletées, goutelettes,.), Résines, Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage, Joint de dilatation
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échapement, autres fluides)	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas), Matelas, Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage, Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides, Rubans adhésifs, Mastics, Conduits en fibres-ciment, manchons, Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage), Tresses dans câbles électriques d'alimentation, (notamment de secours, souvent orange), résistants au feu
Eléments associés à la toiture	Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation, Conduits d'eau pluviale, Garnissage des joints de dilatation, Joints de dilatation, Couvre-joints, Tresses d'étanchéité à l'air, Eléments complémentaires de toiture (chéneaux, rives, closoirs, faitages, mîtres, costières, etc.), Jonctions bitumineuses, Solins en fibre ciment, Colle des solins en fibre ciment

1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

- totalité du bâtiment

2. CONCLUSIONS

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies et/ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques.

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante

Copyright BUREAU VERITAS

Matériaux et produits listés en annexe A de la norme NF X 46-020 concernés par les travaux prévus			
Localisation	**Ouvrage**	**Matériau ou produit**	**Description**
E / SS / ESPACE DETENTE	Moquette	Colle	jaune, jaune, Colle blanche epaisse amianté et non jaune
E / SS / ESPACE DETENTE	Plinthe	Colle	jaune, jaune, MOQUETTE
E / SS / ESPACE DETENTE	Plinthe	Colle	jaune, jaune, MOQUETTE
E / SS / ESPACE DETENTE	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)
E / SS / ESPACE DETENTE	Moquette	Colle	jaune, jaune, Colle blanche epaisse amianté et non jaune
E / SS / ESPACE DETENTE	Poteau	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)
E / SS / ESPACE DETENTE	Poutre	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)
E / RDC / ESPACE DETENTE	Plinthe	Colle	jaune, jaune, MOQUETTE
E / RDC / ESPACE DETENTE	Moquette	Colle	jaune, jaune
E / RDC / ESPACE DETENTE	Plinthe	Colle	jaune, jaune, MOQUETTE
E / RDC / ESPACE DETENTE	Poteau	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)
E / R+1 / ESPACE DETENTE	Moquette	Colle	jaune, jaune
E / R+1 / ESPACE DETENTE	Plinthe	Colle	jaune, jaune, MOQUETTE
E / R+1 / ESPACE DETENTE	Moquette	Colle	blanche, blanc(he)
E / R+1 / ESPACE DETENTE	Moquette	Colle	blanche, blanc(he)
E / R+1 / ESPACE DETENTE	Moquette	Colle	jaune, jaune
E / R+1 / ESPACE DETENTE	Plinthe	Colle	jaune, jaune, MOQUETTE
E / R+1 / ESPACE DETENTE	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)
E / RDC / WC HALL	Cloison	Bande de plaque de plâtre	plâtre, blanc(he)
E / RDC / WC SERVICE	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)
E / RDC / WC SERVICE	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)
E / RDC / WC SERVICE	Cloison	Bande de plaque de plâtre	plâtre, blanc(he)
E / R+1 / WC	Cloison	Bande de plaque de plâtre	plâtre, blanc(he)
E / R+1 / WC	Cloison	Bande de plaque de plâtre	plâtre, blanc(he)
E / R+1 / WC	Cloison	Bande de plaque de plâtre	plâtre, blanc(he)
E / R+4 / WC	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)
E / R+4 / WC	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)
E / R+4 / WC	Cloison	Bande de plaque de plâtre	plâtre, blanc(he)
E / R+4 / E403	Revêtement de sol	Peinture sur béton	décorative, gris(e)
E / R+4 / E403	/	Enduit	blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS
E / R+4 / E401	Revêtement de sol	Peinture sur béton	décorative, gris(e)
E / R+4 / E401	/	Enduit	blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS
E / R+4 / E401	Revêtement de sol	Peinture sur béton	décorative, gris(e)
E / R+4 / E402	/	Enduit	blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS
E / RDC / SANITAIRE	Cloison	Bande de plaque de plâtre	plâtre, blanc(he)
E / RDC / SANITAIRE	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)
E / RDC / SANITAIRE	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
E / RDC / SALLE REUNION	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)
E / RDC / SALLE REUNION	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
E / RDC / ENTREE ST	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)

Copyright BUREAU VERITAS

Matériaux et produits listés en annexe A de la norme NF X 46-020 concernés par les travaux prévus			
Localisation	**Ouvrage**	**Matériau ou produit**	**Description**
E / RDC / ENTREE ST	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
E / RDC / CAGE ESCALIER	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)
E / RDC / CAGE ESCALIER	Plafond	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)
E / RDC / CAGE ESCALIER	Poutre	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)
E / RDC / CAGE ESCALIER	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
E / RDC / DGT ESCALIER 1	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)
E / RDC / DGT ESCALIER 1	Poteau	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)
E / RDC / DGT ESCALIER 2	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)
E / R+1 / SANITAIRE	Cloison	Bande de plaque de plâtre	plâtre, blanc(he)
E / R+1 / SANITAIRE	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)
E / R+1 / SANITAIRE	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)
E / R+1 / SANITAIRE	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
E / R+1 / SANITAIRE 2	Cloison	Bande de plaque de plâtre	plâtre, blanc(he)
E / R+1 / SANITAIRE 2	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)
E / R+1 / CAGE ESCALIER	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)
E / R+1 / CAGE ESCALIER	Poteau	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)
E / R+1 / CAGE ESCALIER	Plafond	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)
E / R+1 / CAGE ESCALIER	Poutre	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)
E / R+2 / CIRC 1	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)
E / R+3 / CIRC 1	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)
E / R+3 / CIRC 1	/	Enduit	blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS
E / R+3 / CAGE ESCALIER	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)
E / R+3 / CAGE ESCALIER	Plafond	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)
E / R+4 / CAGE ESCALIER	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)
E / R+2 / CAGE ESCALIER	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)
E / RDC / HALL ENTREE	Poteau	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)
E / RDC / HALL ENTREE	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
E / RDC / CIRC ACCUEIL	Poteau	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)
E / RDC / CIRC	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
E / RDC / SALLE E001	/	Enduit	blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS
E / RDC / SALLE E001	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
E / RDC / SALLE E002	/	Enduit	blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS
E / RDC / SALLE E002	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
E / RDC / RGT	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
E / RDC / LOCAL MENAGE	Plafond	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)
E / RDC / LOCAL MENAGE	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
E / RDC / BUREAU ST	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE

Copyright BUREAU VERITAS

Matériaux et produits listés en annexe A de la norme NF X 46-020 concernés par les travaux prévus			
Localisation	**Ouvrage**	**Matériau ou produit**	**Description**
E / R+1 / DGT ESCALIER 1	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
E / R+1 / CIRC	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
E / R+1 / E101	/	Enduit	blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS
E / R+1 / E101	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
E / R+1 / E102	/	Enduit	blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS
E / R+1 / E102	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
E / R+1 / E103	Coffre	Peinture	décorative, gris(e), TABLEAU MENUISERIE
E / R+1 / E103	/	Enduit	blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS
E / R+1 / E103	Rebouchage	Enduit	plâtre, blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS
E / R+1 / E103	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
E / RDC / LOCAL ELECT	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
E / RDC / LOCAL TGBT	/	Plaque de caniveau	fibre-ciment, gris(e)
E / R+4 / AMPHI D	/	Enduit	blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS
E / R+3 / CHAUFFERIE	Chaudière	Joint de bride	compact, beige
E / RDC / ACCUEIL	/	Enduit	blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS
E / RDC / MACHINERIE ASCENSEUR	Elément associé à la toiture	Conduit de ventilation	fibre-ciment, gris(e)
E / R+1 / SALLE 102	Coffre	Peinture	décorative, gris(e), TABLEAU MENUISERIE
E / R+1 / SALLE 102	Rebouchage	Enduit	plâtre, blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS
E / RDC / BUREAU R1	/	Enduit	blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS
E / RDC / BUREAU ESPE	/	Enduit	blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS
E / RDC / BUREAU INFORMATICIEN	/	Enduit	blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS
E / RDC / STOCK INFORMATIQUE	/	Enduit	blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS
E / R+1 / E121	Coffre	Peinture	décorative, gris(e), TABLEAU MENUISERIE
E / R+1 / E121	Rebouchage	Enduit	plâtre, blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS
E / R+1 / E121	/	Enduit	blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS
E / R+1 / E122	/	Enduit	blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS
E / R+1 / E123	/	Enduit	blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS
E / R+1 / E124	/	Enduit	blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS
E / R+1 / E112	/	Enduit	blanc(he), TABLEAU

Matériaux et produits listés en annexe A de la norme NF X 46-020 concernés par les travaux prévus			
Localisation	**Ouvrage**	**Matériau ou produit**	**Description**
			MENUISERIE TETE DE VIS
E / R+1 / E133	Coffre	Peinture	décorative, blanc(he)
E / R+1 / E133	Rebouchage	Enduit	plâtre, blanc(he), TETE DE VIS
E / R+1 / E133	/	Enduit	blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS
E / R+1 / E134	/	Enduit	blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS
E / R+2 / E201	/	Enduit	blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS
E / R+2 / E203	/	Enduit	blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS
E / R+2 / E204	Coffre	Peinture	décorative, blanc(he)
E / R+2 / E204	Rebouchage	Enduit	plâtre, blanc(he), TETE DE VIS
E / R+2 / E204	Coffre	Peinture	décorative, blanc(he)
E / R+2 / E204	Rebouchage	Enduit	plâtre, blanc(he), TETE DE VIS
E / R+2 / E204	/	Enduit	blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS
E / R+3 / E301	/	Enduit	blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS
E / R+3 / E302	/	Enduit	blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS
E / RDC / E010	Coffre	Peinture	décorative, bleu(e)
E / RDC / E010	Rebouchage	Enduit	plâtre, blanc(he), TETE DE VIS
E / RDC / E029	Coffre	Peinture	décorative, bleu(e)
E / RDC / E029	Rebouchage	Enduit	plâtre, blanc(he), TETE DE VIS
E / RDC / E031	Rebouchage	Enduit	plâtre, blanc(he), TETE DE VIS
E / RDC / E040	Coffre	Peinture	décorative, gris(e), TABLEAU MENUISERIE
E / RDC / E040	Rebouchage	Enduit	plâtre, blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS
E / RDC / E044	Coffre	Peinture	décorative, gris(e), TABLEAU MENUISERIE
E / RDC / E044	Rebouchage	Enduit	plâtre, blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS
E / R+1 / E116	Rebouchage	Enduit	plâtre, blanc(he), TETE DE VIS
E / R+1 / E116	Coffre	Peinture	décorative, gris(e), TABLEAU MENUISERIE
E / R+1 / E116	Rebouchage	Enduit	plâtre, blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS
E / R+2 / E205	Coffre	Peinture	décorative, blanc(he)
E / R+2 / E205	Rebouchage	Enduit	plâtre, blanc(he), TETE DE VIS
E / R+3 / E303	Coffre	Peinture	décorative, blanc(he)
E / R+3 / E303	Rebouchage	Enduit	plâtre, blanc(he), TETE DE VIS
E / R+3 / E314 - E301	Rebouchage	Enduit	plâtre, blanc(he), TETE DE VIS
E / RDC / ESC	Coffre	Peinture	décorative, gris(e), TABLEAU MENUISERIE
E / RDC / ESC	Rebouchage	Enduit	plâtre, blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS
E / R+1 / E118	Coffre	Peinture	décorative, gris(e), TABLEAU MENUISERIE
E / R+1 / E118	Rebouchage	Enduit	plâtre, blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS

Copyright BUREAU VERITAS

Matériaux et produits listés en annexe A de la norme NF X 46-020 concernés par les travaux prévus			
Localisation	**Ouvrage**	**Matériau ou produit**	**Description**
E / R+1 / E115	Coffre	Peinture	décorative, gris(e), TABLEAU MENUISERIE
E / R+1 / E115	Rebouchage	Enduit	plâtre, blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS
E / R+1 / E110	Coffre	Peinture	décorative, gris(e), TABLEAU MENUISERIE
E / R+1 / E110	Rebouchage	Enduit	plâtre, blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS
E / R+1 / E109	Coffre	Peinture	décorative, gris(e), TABLEAU MENUISERIE
E / R+1 / E109	Rebouchage	Enduit	plâtre, blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS
E / R+1 / E107	Coffre	Peinture	décorative, gris(e), TABLEAU MENUISERIE
E / R+1 / E107	Rebouchage	Enduit	plâtre, blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS
E / R+1 / E105	Coffre	Peinture	décorative, gris(e), TABLEAU MENUISERIE
E / R+1 / E105	Rebouchage	Enduit	plâtre, blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS
E / R+1 / E104	Coffre	Peinture	décorative, gris(e), TABLEAU MENUISERIE
E / R+1 / E104	Rebouchage	Enduit	plâtre, blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS
E / R+1 / E106	Coffre	Peinture	décorative, gris(e), TABLEAU MENUISERIE
E / R+1 / E106	Rebouchage	Enduit	plâtre, blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS
E / R+1 / E108	Coffre	Peinture	décorative, gris(e), TABLEAU MENUISERIE
E / R+1 / E108	Rebouchage	Enduit	plâtre, blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS
E / R+1 / E111	Coffre	Peinture	décorative, gris(e), TABLEAU MENUISERIE
E / R+1 / E111	Rebouchage	Enduit	plâtre, blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS
F / RDC / CIRC 1	Poteau	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)
F / RDC / CIRC 1	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
F / RDC / ESC	Poteau	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)
F / RDC / F012	Poteau	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)
F / RDC / F012	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
F / R+1 / F109	Poteau	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)
F / R+1 / F109	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
F / RDC / CIRC 2	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
F / RDC / SANITAIRE 1	Cloison	Bande de plaque de plâtre	plâtre, blanc(he)
F / RDC / SANITAIRE 1	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)
F / RDC / SANITAIRE 1	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
F / RDC / SANITAIRE 2	Cloison	Bande de plaque de plâtre	plâtre, blanc(he)
F / RDC / SANITAIRE 2	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)

Copyright BUREAU VERITAS

Matériaux et produits listés en annexe A de la norme NF X 46-020 concernés par les travaux prévus			
Localisation	**Ouvrage**	**Matériau ou produit**	**Description**
F / RDC / SANITAIRE 2	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
F / RDC / F005	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
F / RDC / F006	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
F / RDC / F007	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
F / RDC / F008	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
F / RDC / F009	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
F / RDC / F010	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
F / RDC / F011	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
F / R+1 / CIRC 1	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE PORTE HUISSERIE
F / R+1 / CIRC 1	Rebouchage	Enduit	plâtre, blanc(he), ENTOURAGE PORTE HUISSERIE - TETE DE VIS
F / R+1 / CIRC 1	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
F / R+1 / CIRC 2	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
F / R+1 / ESC	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
F / R+1 / SANITAIRE 1	Cloison	Bande de plaque de plâtre	plâtre, blanc(he)
F / R+1 / SANITAIRE 1	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)
F / R+1 / SANITAIRE 1	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
F / R+1 / SANITAIRE 2	Cloison	Bande de plaque de plâtre	plâtre, blanc(he)
F / R+1 / SANITAIRE 2	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)
F / R+1 / SANITAIRE 2	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
F / R+1 / F105	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
F / R+1 / F106	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
F / R+1 / F107	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
F / R+1 / F108	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
F / R+1 / F110	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
F / R+1 / F111	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
F / R+1 / F112	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
G / SS / CIRC TECH	Porte coupe feu	Joint coupe-feu	compact, beige
G / SS / LOCAL CTA	Porte coupe feu	Joint coupe-feu	compact, beige
G / SS / CHAUFFERIE	Chaudière	Joint de bride	compact, beige, RAD RD CH
G / SS / CHAUFFERIE	Porte coupe feu	Joint coupe-feu	compact, beige
G / SS / LOCAL ELECTRIQUE	Porte coupe feu	Joint coupe-feu	compact, beige

Matériaux et produits listés en annexe A de la norme NF X 46-020 concernés par les travaux prévus			
Localisation	**Ouvrage**	**Matériau ou produit**	**Description**
G / SS / LOCAL BATTERIE	Porte coupe feu	Joint coupe-feu	compact, beige
G / SS / MACHINERIE ASC	Porte coupe feu	Joint coupe-feu	compact, beige
G / SS / RGT	Porte coupe feu	Joint coupe-feu	compact, beige

2.2. Investigation(s) approfondie(s) devant être réalisée(s) par le donneur d'ordre

Volumes, ouvrages, matériaux ou produits restant à investiguer	Motifs	Investigations approfondies à réaliser par le donneur d'ordre
E / Gaine ventilation CTA / IA2	Présence de faux plafond avec isolant dans le plenum, gaine non visible	Prévoir dépose total du faux plafond avec isolant
E / RESEAU ENTERRE ENTRE BAT ADMIN ET BATIMENT F / IA1	RESEAU TROP PROFOND - Présences d'excrements	Prévoir une intervention si conduit suspect au moment des travaux

2.3. Obligation d'information

Dans tous les cas, et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, il est nécessaire d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

Remarque(s) complémentaire(s):

Une visite complémentaire est a prevoir pour identifier précisément la localisation de la ZPSO 14/15 sur les menuiseries de facades

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré d'enrobé bitumineux contenant des H.A.P. en teneur élevée (>50mg/kg) sur le prélèvement P129 en toiture (929,8mg/kg).

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse: CUD LA ROCHE SUR YON
221 rue Hubert Cailler
Campus de La Roche Sur Yon
85000 LA ROCHE SUR YON

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date du permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications :
CUD LA ROCHE SUR YON	Enseignement supérieur/recherche	ERP catégorie 1 à 4	non communiqué	non communiqué

Le repérage porte exclusivement sur les parties de bâtiments et les locaux dont la liste est détaillée en annexe Parties d'immeubles bâti visitées

3.2. Intervenants

Partie prenante	Société	Adresse	Coordonnées
Commanditaire du repérage	ACADEMIE DE NANTES RECTORAT Christophe Liébard	8 RUE DU GENERAL MARGUERITTE 44326 NANTES	0251863069 christophe.liebard@ac-nantes.fr
Propriétaire	ACADEMIE DE NANTES RECTORAT Christophe Liébard	8 RUE DU GENERAL MARGUERITTE 44326 NANTES	0251863069 christophe.liebard@ac-nantes.fr
Pas d'accompagnateur	/	/	/

3.3. Opérateur(s) de repérage

Société	Nom	Organisme de certification	N° de certification*	Date d'obtention de la certification	Date de validité de la certification
BUREAU VERITAS EXPLOITATION 79018467500938	Andreas LEROUX	BUREAU VERITAS CERTIFICATION	15042964	11/09/2022	10/09/2029

3.4. Laboratoire(s)

Société	N° d'accréditation	Adresse	Coordonnées
Eurofins Analyses pour le Batiment Ouest	1-5597	7, Rue Pierre Adolphe BobierreCS 90827 44323NANTES CEDEX 3France	+33 2 51 83 49 48

Copyright BUREAU VERITAS

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe A de la norme NF X 46-020, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Textes réglementaires

Code du travail : articles : L4412-2, R4412-97

Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations

Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis

Norme NF X 46-020 du 5 aout 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

4.2. Méthodologie de la mission

L'opérateur de repérage examine de façon exhaustive toutes les parties de bâtiment concernées et affectées par le programme des travaux.
Il identifie les ouvrages de la construction, puis inspecte les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante en se référant à l'annexe A de la norme NF X 46-020 qui constitue la base du repérage.

Le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante comprend au minimum une inspection visuelle des ouvrages de la construction afin de rechercher et d'identifier les différents matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante.
Cette inspection peut être suivie :

d'investigations approfondies qui peuvent être destructives,
de sondages,
de prélèvements pour déterminer par analyse, la présence effective d'amiante dans les matériaux et produits préalablement identifiés comme étant susceptibles de contenir de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Les matériaux et produits sont identifiés, localisés, et leurs caractéristiques sont renseignées.
En fonction des informations dont il dispose (documents, marquage sur les matériaux), de sa connaissance des matériaux et produits, l'opérateur de repérage peut conclure à la présence d'amiante.
En cas de doute sur la présence d'amiante (absence d'informations documentaires, produits non identifiés), il effectue un (ou des) prélèvement(s) pour analyses sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour conclure.
Les prélèvements sont effectués sur toute l'épaisseur du matériau. L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés. Il transmet au laboratoire d'analyse une fiche d'accompagnement.

Conformément aux dispositions de la norme NF X 46-020, les analyses des échantillons de ces matériaux et produits sont réalisées par un organisme accrédité.

4.3. Limites de la mission

Le présent repérage ne peut être utilisé que dans les limites de la présente mission et uniquement pour le périmètre et le programme des travaux prévus communiqués par le donneur d'ordre.
La présente mission n'est en aucun cas assimilable à un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux de démolition tel que défini par les articles R.1334-19 et R.1334-22 du Code de la Santé Publique, et n'est pas adaptée ni suffisante à l'évaluation du risque amiante en cas de démolition.

Dans le cadre de notre mission, seuls les ouvrages et parties d'ouvrages clairement identifiés comme concernés par les travaux prévus selon le programme et le périmètre fourni par le donneur d'ordre, font l'objet du présent repérage.
En cas de programme et/ou de périmètre de travaux imprécis, insuffisamment détaillé, non abouti ou ambigu, il revient au donneur d'ordre de vérifier que les produits et matériaux impactés par les travaux prévus ont bien fait l'objet de recherche de présence ou d'absence d'amiante.
En cas de changement, ajout ou modification du périmètre et/ou du programme de travaux, il conviendra au donneur d'ordre de faire réaliser les investigations supplémentaires nécessaires.

La recherche des matériaux pouvant contenir de l'amiante (MPCA) de l'annexe A de la norme NF X 46-020 est réalisée par recherche visuelle et investigation destructrice d'ouvrages et de parties d'ouvrages, avec prélèvements d'échantillons selon une méthode d'échantillonnage respectant en cela les prescriptions de cette norme.

L'ancienneté des matériaux contenant de l'amiante, les diverses agressions qu'ils subissent, peuvent entraîner la dénaturation de ceux-ci et donner lieu à la libération spontanée de fibres d'amiante. Ainsi, des fibres peuvent migrer et polluer un produit ou un matériau non réputé contenir de l'amiante, se trouvant à proximité du matériau amianté. L'intervention ne

prend pas en compte dans le présent repérage, cet effet de pollution éventuelle.
Les résultats antérieurs, en matière de repérage d'amiante, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes réglementaires et normatifs.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date(s) du repérage : du 17/06/2025 au 17/06/2025
du 20/08/2024 au 21/08/2024
le 16/12/2024

5.1. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Rapports de repérage amiante :

Références rapport de repérage	Date rapport	Auteur rapport	Objet du repérage	Principales conclusions
7231200/S2.4.2.R	06/06/2019	R.FERDINAND --- BUREAU VERITAS	Repérage avant travaux	Présence de matériau ou produit contenant de l'amiante

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

Autres documents :

Aucun document nous a été communiqué ou était disponible lors de la visite.

5.2. Conditions de visite

Absence d'accompagnement par une personne préalablement désignée par le donneur d'ordre
Absence de documents décrivant les ouvrages (plans, croquis)
Absence d'informations sur la date de délivrance du permis de construire
Absence d'informations décrivant les produits, matériaux et protections physiques mises en place
Absence de communication par écrit des zones dans lesquelles sont réalisés les travaux et la nature de ceux-ci
Absence d'informations sur les techniques génératrices de nuisances (vibrations, etc.) utilisées lors des travaux
Impossibilité d'accéder à certains locaux, parties de locaux, composants ou parties de composant

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Résultats détaillés

Copyright BUREAU VERITAS

Abréviations du tableau :

Px = prélèvement pour analyse n°X (tous les prélèvements sont précédés d'un sondage)
Idem Px = produit ou matériau similaire à celui ayant fait l'objet du Px
S = sondage en complément de l'inspection visuelle

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
E / R+3 / TOITURE CTA	Conduit	Mastic	silicone, beige	P1	Résultat d'analyse	/	NON
E / R+3 / TOITURE CTA	Conduit	Mastic	silicone, beige	P2	Résultat d'analyse	/	NON
E / R+3 / TOITURE CTA	Paroi des équipements	Isolant	laine de verre, jaune, CONDUIT CTA	P3	Résultat d'analyse	/	NON
E / R+3 / TOITURE CTA	Paroi des équipements	Isolant	laine de verre, jaune, CONDUIT CTA	P4	Résultat d'analyse	/	NON
E / SS / ESPACE DETENTE	Revêtement en lé	Colle	jaune, jaune, LINO PVC GRIS	P5	Résultat d'analyse	/	NON
E / SS / ESPACE DETENTE	Revêtement en lé	Colle	jaune, jaune, LINO PVC GRIS	P6	Résultat d'analyse	/	NON
E / SS / ESPACE DETENTE	Plinthe	Colle	jaune, jaune, LINO PVC	P7	Résultat d'analyse	/	NON
E / SS / ESPACE DETENTE	Plinthe	Colle	jaune, jaune, LINO PVC GRIS	P8	Résultat d'analyse	/	NON
E / SS / ESPACE DETENTE	Moquette	Colle	jaune, jaune	P9	Résultat d'analyse	/	NON
E / SS / ESPACE DETENTE	Moquette	Colle	jaune, jaune, Colle blanche epaisse amianté et non jaune	P10	Résultat d'analyse	/	**OUI**
E / SS / ESPACE DETENTE	Plinthe	Colle	jaune, jaune, MOQUETTE	P11	Résultat d'analyse	/	**OUI**
E / SS / ESPACE DETENTE	Plinthe	Colle	jaune, jaune, MOQUETTE	P12	Résultat d'analyse	/	**OUI**
E / SS / ESPACE DETENTE	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	idem P23	Résultat d'analyse	/	**OUI**
E / SS / ESPACE DETENTE	Moquette	Colle	jaune, jaune, Colle blanche epaisse amianté et non jaune	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV1	**OUI**
E / SS / ESPACE DETENTE	Poteau	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV3	**OUI**
E / SS / ESPACE DETENTE	Poutre	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV9	**OUI**
E / RDC / ESPACE DETENTE	Moquette	Colle	jaune, jaune	P13	Résultat d'analyse	/	NON
E / RDC / ESPACE DETENTE	Plinthe	Colle	jaune, jaune, MOQUETTE	P14	Résultat d'analyse	/	**OUI**
E / RDC / ESPACE DETENTE	Moquette	Colle	jaune, jaune	idem P10	Résultat d'analyse	Colle blanche epaisse amianté et non jaune	**OUI**
E / RDC / ESPACE DETENTE	Plinthe	Colle	jaune, jaune, MOQUETTE	idem P11	Résultat d'analyse	/	**OUI**

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
E / RDC / ESPACE DETENTE	Poteau	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV3	OUI
E / R+1 / ESPACE DETENTE	Moquette	Colle	jaune, jaune	P15	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+1 / ESPACE DETENTE	Plinthe	Colle	jaune, jaune, MOQUETTE	P16	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+1 / ESPACE DETENTE	Moquette	Colle	blanche, blanc(he)	P139	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+1 / ESPACE DETENTE	Moquette	Colle	blanche, blanc(he)	P140	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+1 / ESPACE DETENTE	Coffre	Peinture	décorative, gris(e), TABLEAU FENETRE BOISERIE	P141	Résultat d'analyse	/	NON
E / R+1 / ESPACE DETENTE	Rebouchage	Enduit	plâtre, blanc(he), TABLEAU FENETRE BOISERIE TETE DE VIS	P142	Résultat d'analyse	/	NON
E / R+1 / ESPACE DETENTE	Moquette	Colle	jaune, jaune	idem P10	Résultat d'analyse	Colle blanche epaisse amianté et non jaune	OUI
E / R+1 / ESPACE DETENTE	Plinthe	Colle	jaune, jaune, MOQUETTE	idem P11	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+1 / ESPACE DETENTE	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	idem P23	Résultat d'analyse	/	OUI
E / RDC / WC HALL	Cloison	Bande de plaque de plâtre	plâtre, blanc(he)	P19	Résultat d'analyse	/	OUI
E / RDC / WC HALL	Cloison	Bande de plaque de plâtre	plâtre, blanc(he)	P20	Résultat d'analyse	/	NON
E / RDC / LABO PHOTOS	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e), 20X20 GRIS	P21	Résultat d'analyse	/	NON
E / RDC / LABO PHOTOS	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e), 20X20 GRIS	P22	Résultat d'analyse	/	NON
E / RDC / WC SERVICE	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	P23	Résultat d'analyse	/	OUI
E / RDC / WC SERVICE	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	P24	Résultat d'analyse	/	OUI
E / RDC / WC SERVICE	Cloison	Bande de plaque de plâtre	plâtre, blanc(he)	idem P19	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+1 / WC	Cloison	Bande de plaque de plâtre	plâtre, blanc(he)	P25	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+1 / WC	Cloison	Bande de plaque de plâtre	plâtre, blanc(he)	P26	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+1 / WC	Cloison	Bande de plaque de plâtre	plâtre, blanc(he)	idem P19	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+4 / WC	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	P27	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+4 / WC	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	P28	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+4 / WC	Cloison	Bande de plaque de plâtre	plâtre, blanc(he)	idem P19	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+4 / E403	Revêtement de sol	Peinture sur béton	décorative, gris(e)	P29	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+4 / E403	/	Enduit	blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS	idem P144	Résultat d'analyse	/	OUI

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
E / R+4 / E401	Revêtement de sol	Peinture sur béton	décorative, gris(e)	P30	Résultat d'analyse	/	**OUI**
E / R+4 / E401	/	Enduit	blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS	idem P144	Résultat d'analyse	/	**OUI**
E / R+4 / E401	Revêtement de sol	Peinture sur béton	décorative, gris(e)	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV10	**OUI**
E / R+4 / E402	Moquette	Colle	jaune, jaune	P31	Résultat d'analyse	/	NON
E / R+4 / E402	Moquette	Colle	jaune, jaune	P32	Résultat d'analyse	/	NON
E / R+4 / E402	/	Enduit	blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS	idem P144	Résultat d'analyse	/	**OUI**
E / R+4 / GN400	Mur	Isolant	laine de verre, jaune	P33	Résultat d'analyse	/	NON
E / R+4 / GN400	Mur	Isolant	laine de verre, jaune	P34	Résultat d'analyse	/	NON
E / COMBLES AMPHI / COMBLES	Equipement	Bourre	fibreux, beige	P35	Résultat d'analyse	/	NON
E / COMBLES AMPHI / COMBLES	Equipement	Bourre	fibreux, beige	P36	Résultat d'analyse	/	NON
E / COMBLES AMPHI / COMBLES	Plancher	Isolant	laine de verre, jaune	P37	Résultat d'analyse	/	NON
E / COMBLES AMPHI / COMBLES	Plancher	Isolant	laine de verre, jaune	P38	Résultat d'analyse	/	NON
E / COMBLES AMPHI / COMBLES	Paroi des équipements	Isolant	laine de verre, jaune, CALO CTA	P39	Résultat d'analyse	/	NON
E / COMBLES AMPHI / COMBLES	Paroi des équipements	Isolant	laine de verre, jaune, CTA CALO	P40	Résultat d'analyse	/	NON
E / COMBLES AMPHI / COMBLES	Bardage	Isolant sous bardage	laine de verre, jaune	P41	Résultat d'analyse	/	NON
E / COMBLES AMPHI / COMBLES	Bardage	Isolant sous bardage	laine de verre, jaune	P42	Résultat d'analyse	/	NON
E / EXTERIEUR / TOITURE	Conduit	Mastic	silicone, beige, CTA	P43	Résultat d'analyse	/	NON
E / EXTERIEUR / TOITURE	Conduit	Mastic	silicone, beige, CTA	P44	Résultat d'analyse	/	NON
E / EXTERIEUR / TOITURE	Conduit	Calorifuge bourrelet	tissu, noir(e)	P45	Résultat d'analyse	/	NON
E / EXTERIEUR / TOITURE	Conduit	Calorifuge bourrelet	tissu, noir(e)	P46	Résultat d'analyse	/	NON
E / EXTERIEUR / TOITURE	Toiture terrasse	Revêtement d'étanchéité	souple, gris(e), MEMBRANE PVC SUR BOIS	/	Ne contient pas d'amiante par nature	S2	NON
E / EXTERIEUR / FACADES	Façade	Joint d'assemblage	mastic, gris(e), FENETRE 1	P47	Résultat d'analyse	/	NON
E / EXTERIEUR / FACADES	/	Joint d'assemblage	mastic, blanc(he), FENETRE 1	P48	Résultat d'analyse	/	NON
E / EXTERIEUR / FACADES	Façade	Joint d'assemblage	mastic, noir(e), FENETRE 1	P49	Résultat d'analyse	/	NON
E / EXTERIEUR / FACADES	Façade	Joint d'assemblage	mastic, gris(e), PORTE 2	P50	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
E / EXTERIEUR / FACADES	Façade	Joint d'assemblage	mastic, blanc(he), PORTE 2	P51	Résultat d'analyse	/	NON
E / EXTERIEUR / FACADES	Façade	Joint d'assemblage	mastic, noir(e), PORTE 2	P52	Résultat d'analyse	/	NON
E / EXTERIEUR / FACADES	Façade	Joint d'étanchéité	mastic, gris(e)	P53	Résultat d'analyse	/	NON
E / EXTERIEUR / FACADES	Façade	Joint d'étanchéité	mastic, gris(e)	P54	Résultat d'analyse	/	NON
E / EXTERIEUR / FACADES	Façade	Joint d'assemblage	mastic, noir(e), FENETRE 3	P55	Résultat d'analyse	/	NON
E / EXTERIEUR / FACADES	Façade	Joint d'assemblage	mastic, noir(e), FENETRE 3	P56	Résultat d'analyse	/	NON
E / EXTERIEUR / FACADES	Façade	Joint d'assemblage	mastic, noir(e), FENETRE 4	P57	Résultat d'analyse	/	NON
E / EXTERIEUR / FACADES	Façade	Joint d'assemblage	mastic, noir(e), FENETRE 4	P58	Résultat d'analyse	/	NON
E / EXTERIEUR / FACADES	Façade	Joint d'assemblage	mastic, beige, FEENTRE 4	P59	Résultat d'analyse	/	NON
E / EXTERIEUR / FACADES	Façade	Joint d'assemblage	mastic, beige, FENETRE 4	P60	Résultat d'analyse	/	NON
E / EXTERIEUR / FACADES	Façade	Joint d'assemblage	mastic, noir(e), FENETRE 1	P61	Résultat d'analyse	/	NON
E / EXTERIEUR / FACADES	Façade	Joint d'assemblage	mastic, blanc(he), FENETRE 1	P62	Résultat d'analyse	/	NON
E / EXTERIEUR / FACADES	Façade	Joint d'assemblage	mastic, gris(e), FENETRE 1	P63	Résultat d'analyse	/	NON
E / EXTERIEUR / FACADES	Menuiserie extérieure	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	silicone, blanc(he)	P79	Résultat d'analyse	/	NON
E / EXTERIEUR / FACADES	Menuiserie extérieure	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	silicone, blanc(he)	P80	Résultat d'analyse	/	NON
E / EXTERIEUR / FACADES	Menuiserie extérieure	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	silicone, blanc(he)	P81	Résultat d'analyse	/	NON
E / EXTERIEUR / FACADES	Menuiserie extérieure	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	silicone, blanc(he)	P82	Résultat d'analyse	/	NON
E / EXTERIEUR / FACADES	Mur	Isolant	laine de verre, jaune	P83	Résultat d'analyse	/	NON
E / EXTERIEUR / FACADES	Mur	Isolant	laine de verre, jaune	P84	Résultat d'analyse	/	NON
E / EXTERIEUR / FACADES	Paroi des équipements	Isolant	laine de verre, jaune	P85	Résultat d'analyse	/	NON
E / EXTERIEUR / FACADES	Paroi des équipements	Isolant	laine de verre, jaune	P86	Résultat d'analyse	/	NON
E / EXTERIEUR / FACADES	Menuiserie extérieure	Joint	compact, blanc(he), COMPRIBANDE	P87	Résultat d'analyse	/	NON
E / EXTERIEUR / FACADES	Menuiserie extérieure	Joint	compact, blanc(he), COMPRIBANDE	P88	Résultat d'analyse	/	NON
E / EXTERIEUR / FACADES	Menuiserie extérieure	Joint d'étanchéité entre menuiserie et	silicone, blanc(he)	P89	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
		structure					
E / EXTERIEUR / FACADES	Menuiserie extérieure	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	silicone, blanc(he)	P90	Résultat d'analyse	/	NON
E / EXTERIEUR / FACADES	Mur	Isolant	laine de verre, jaune	P91	Résultat d'analyse	/	NON
E / EXTERIEUR / FACADES	Mur	Isolant	laine de verre, jaune	P92	Résultat d'analyse	/	NON
E / EXTERIEUR / FACADES	Mur	Isolant	laine de verre, jaune	P93	Résultat d'analyse	/	NON
E / EXTERIEUR / FACADES	Mur	Isolant	laine de verre, jaune	P94	Résultat d'analyse	/	NON
E / EXTERIEUR / FACADES	Bardage	Isolant	laine de verre, jaune	P95	Résultat d'analyse	/	NON
E / EXTERIEUR / FACADES	Bardage	Isolant	laine de verre, jaune	P96	Résultat d'analyse	/	NON
E / EXTERIEUR / FACADES	Mur	Isolant	laine de verre, jaune	P97	Résultat d'analyse	/	NON
E / EXTERIEUR / FACADES	Mur	Isolant	laine de verre, jaune	P98	Résultat d'analyse	/	NON
E / EXTERIEUR / FACADES	Façade	Enduit	peint, ciment, beige	P147	Résultat d'analyse	/	NON
E / EXTERIEUR / FACADES	Façade	Enduit	peint, ciment, beige	P148	Résultat d'analyse	/	NON
E / EXTERIEUR / FACADES	Conduit	Conduit	béton, gris(e), ABSENCE DE CONDUIT	/	Ne contient pas d'amiante par nature	S2	NON
E / EXTERIEUR / FACADES	Menuiserie extérieure	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	S1 - ABSENCE DE JOINTS	/	Ne contient pas d'amiante par nature	S1	NON
E / RDC / ATELIER	Conduit	Mastic	compact, jaune, BANDE	P77	Résultat d'analyse	/	NON
E / RDC / ATELIER	Conduit	Mastic	compact, jaune, BANDE	P78	Résultat d'analyse	/	NON
E / RDC / SANITAIRE	Cloison	Bande de plaque de plâtre	plâtre, blanc(he)	idem P19	Résultat d'analyse	/	**OUI**
E / RDC / SANITAIRE	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	idem P23	Résultat d'analyse	/	**OUI**
E / RDC / SANITAIRE	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	**OUI**
E / RDC / SALLE REUNION	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	idem P23	Résultat d'analyse	/	**OUI**
E / RDC / SALLE REUNION	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	**OUI**
E / RDC / ENTREE ST	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	idem P23	Résultat d'analyse	/	**OUI**
E / RDC / ENTREE ST	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	**OUI**
E / RDC / CAGE ESCALIER	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	idem P23	Résultat d'analyse	/	**OUI**

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
E / RDC / CAGE ESCALIER	Plafond	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV7	OUI
E / RDC / CAGE ESCALIER	Poutre	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV9	OUI
E / RDC / CAGE ESCALIER	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	OUI
E / RDC / DGT ESCALIER 1	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	idem P23	Résultat d'analyse	/	OUI
E / RDC / DGT ESCALIER 1	Poteau	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV3	OUI
E / RDC / DGT ESCALIER 2	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	idem P23	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+1 / SANITAIRE	Cloison	Bande de plaque de plâtre	plâtre, blanc(he)	idem P19	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+1 / SANITAIRE	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	idem P23	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+1 / SANITAIRE	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV2	OUI
E / R+1 / SANITAIRE	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	OUI
E / R+1 / SANITAIRE 2	Cloison	Bande de plaque de plâtre	plâtre, blanc(he)	idem P19	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+1 / SANITAIRE 2	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	idem P23	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+1 / CAGE ESCALIER	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	idem P23	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+1 / CAGE ESCALIER	Poteau	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV3	OUI
E / R+1 / CAGE ESCALIER	Plafond	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV7	OUI
E / R+1 / CAGE ESCALIER	Poutre	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV9	OUI
E / R+2 / CIRC 1	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	idem P23	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+3 / CIRC 1	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	idem P23	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+3 / CIRC 1	/	Enduit	blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS	idem P144	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+3 / CAGE ESCALIER	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	idem P23	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+3 / CAGE ESCALIER	Plafond	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV7	OUI
E / R+4 / CAGE ESCALIER	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	idem P23	Résultat d'analyse	/	OUI

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
E / R+2 / CAGE ESCALIER	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	idem P23	Résultat d'analyse	/	OUI
E / RDC / HALL ENTREE	Poteau	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV3	OUI
E / RDC / HALL ENTREE	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	OUI
E / RDC / CIRC ACCUEIL	Poteau	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV3	OUI
E / RDC / CIRC	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	OUI
E / RDC / SALLE E001	/	Enduit	blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS	idem P144	Résultat d'analyse	/	OUI
E / RDC / SALLE E001	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	OUI
E / RDC / SALLE E002	/	Enduit	blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS	idem P144	Résultat d'analyse	/	OUI
E / RDC / SALLE E002	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	OUI
E / RDC / RGT	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	OUI
E / RDC / LOCAL MENAGE	Plafond	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV7	OUI
E / RDC / LOCAL MENAGE	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	OUI
E / RDC / BUREAU ST	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	OUI
E / R+1 / DGT ESCALIER 1	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	OUI
E / R+1 / CIRC	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	OUI
E / R+1 / E101	/	Enduit	blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS	idem P144	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+1 / E101	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	OUI
E / R+1 / E102	/	Enduit	blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS	idem P144	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+1 / E102	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	OUI
E / R+1 / E103	Coffre	Peinture	décorative, gris(e), TABLEAU MENUISERIE	idem P143	Résultat d'analyse	/	OUI

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
E / R+1 / E103	/	Enduit	blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS	idem P144	Résultat d'analyse	/	**OUI**
E / R+1 / E103	Rebouchage	Enduit	plâtre, blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS	idem P144	Résultat d'analyse	/	**OUI**
E / R+1 / E103	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	**OUI**
E / RDC / LOCAL ELECT	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	**OUI**
E / RDC / LOCAL TGBT	/	Plaque de caniveau	fibre-ciment, gris(e)	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV6	**OUI**
E / R+4 / AMPHI D	/	Enduit	blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS	idem P144	Résultat d'analyse	/	**OUI**
E / R+3 / CHAUFFERIE	Paroi des équipements	Isolant	laine de verre, jaune, CHAUDIERE 1	P135	Résultat d'analyse	/	NON
E / R+3 / CHAUFFERIE	Paroi des équipements	Isolant	laine de verre, jaune, CHAUDIERE 2	P136	Résultat d'analyse	/	NON
E / R+3 / CHAUFFERIE	Conduit	Calorifugeage	laine de verre, jaune	P137	Résultat d'analyse	/	NON
E / R+3 / CHAUFFERIE	Conduit	Joint de bride	compact, noir(e)	P138	Résultat d'analyse	/	NON
E / R+3 / CHAUFFERIE	Chaudière	Joint de bride	compact, beige	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV8	**OUI**
E / RDC / ACCUEIL	/	Enduit	blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS	idem P144	Résultat d'analyse	/	**OUI**
E / RDC / MACHINERIE ASCENSEUR	Elément associé à la toiture	Conduit de ventilation	fibre-ciment, gris(e)	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV4	**OUI**
E / R+3 / TOITURE	Toiture	Revêtement d'étanchéité	bitumineux, noir(e)	P99	Résultat d'analyse	/	NON
E / R+3 / TOITURE	complexe d'étanchéité	Pare-vapeur	bitumineux, noir(e)	P100	Résultat d'analyse	/	NON
E / R+3 / TOITURE	Toiture terrasse	Relevé d'étanchéité	bitumineux, noir(e)	P101	Résultat d'analyse	/	NON
E / R+3 / TOITURE	Toiture terrasse	Revêtement d'étanchéité	souple, jaune, POLYANE + ISOLANT POLYANE	P102	Résultat d'analyse	/	NON
E / R+3 / TOITURE	Toiture	Revêtement d'étanchéité	souple, jaune, POLYANE + ISOLANT POLY	P103	Résultat d'analyse	/	NON
E / R+3 / TOITURE	complexe d'étanchéité	Pare-vapeur	bitumineux, noir(e)	P104	Résultat d'analyse	/	NON
E / R+3 / TOITURE	complexe d'étanchéité	Pare-vapeur	bitumineux, noir(e)	P105	Résultat d'analyse	/	NON
E / R+3 / TOITURE	Toiture terrasse	Relevé d'étanchéité	bitumineux, noir(e)	P106	Résultat d'analyse	/	NON
E / R+3 / TOITURE	Toiture terrasse	Relevé d'étanchéité	bitumineux, noir(e)	P107	Résultat d'analyse	/	NON
E / R+3 / TOITURE	Toiture	Revêtement d'étanchéité	bitumineux, noir(e)	P108	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
E / R+3 / TOITURE	Toiture	Revêtement d'étanchéité	bitumineux, noir(e)	P109	Résultat d'analyse	/	NON
E / R+3 / TOITURE	Toiture terrasse	Relevé d'étanchéité	bitumineux, noir(e)	P110	Résultat d'analyse	/	NON
E / R+3 / TOITURE	Toiture terrasse	Relevé d'étanchéité	bitumineux, noir(e)	P111	Résultat d'analyse	/	NON
E / R+3 / TOITURE	Toiture	Revêtement d'étanchéité	bitumineux, noir(e)	P112	Résultat d'analyse	/	NON
E / R+3 / TOITURE	Toiture	Revêtement d'étanchéité	bitumineux, noir(e)	P113	Résultat d'analyse	/	NON
E / R+3 / TOITURE	complexe d'étanchéité	Pare-vapeur	bitumineux, noir(e)	P114	Résultat d'analyse	/	NON
E / R+3 / TOITURE	complexe d'étanchéité	Pare-vapeur	bitumineux, noir(e)	P115	Résultat d'analyse	/	NON
E / R+3 / TOITURE	Toiture terrasse	Relevé d'étanchéité	bitumineux, noir(e)	P116	Résultat d'analyse	/	NON
E / R+3 / TOITURE	Toiture terrasse	Relevé d'étanchéité	bitumineux, noir(e)	P117	Résultat d'analyse	/	NON
E / R+3 / TOITURE	Paroi des équipements	Isolant	mousse expansée, noir(e), CTA	P118	Résultat d'analyse	/	NON
E / R+3 / TOITURE	Equipement	Mastic	compact, beige, CTA	P119	Résultat d'analyse	/	NON
E / R+3 / TOITURE	Equipement	Mastic	compact, beige, CTA	P120	Résultat d'analyse	/	NON
E / R+3 / TOITURE	Toiture	Revêtement d'étanchéité	souple, noir(e), PVC SUR PANNEAUX BOIS	/	Ne contient pas d'amiante par nature	S1	NON
E / R+1 / SALLE 102	Coffre	Peinture	décorative, gris(e), TABLEAU MENUISERIE	P143	Résultat d'analyse	/	**OUI**
E / R+1 / SALLE 102	Rebouchage	Enduit	plâtre, blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS	P144	Résultat d'analyse	/	**OUI**
E / R+1 / CIRCULATION ADMIN	Coffre	Peinture	décorative, gris(e), TABLEAU FENETRE	P149	Résultat d'analyse	/	NON
E / R+1 / CIRCULATION ADMIN	Rebouchage	Enduit	plâtre, blanc(he), ENTOURAGE FENETRE TETE DE VIS	P150	Résultat d'analyse	/	NON
E / R+1 / CIRCULATION ADMIN	Coffre	Peinture	décorative, gris(e), TABLEAU FENETRE	P151	Résultat d'analyse	/	NON
E / R+1 / CIRCULATION ADMIN	Rebouchage	Enduit	plâtre, blanc(he), TABLEAU FENETRE TETE DE VIS	P152	Résultat d'analyse	/	NON
E / RDC / BUREAU R1	/	Enduit	blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS	idem P144	Résultat d'analyse	/	**OUI**
E / RDC / BUREAU ESPE	/	Enduit	blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS	idem P144	Résultat d'analyse	/	**OUI**
E / RDC / BUREAU INFORMATICIEN	/	Enduit	blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS	idem P144	Résultat d'analyse	/	**OUI**
E / RDC / STOCK INFORMATIQUE	/	Enduit	blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS	idem P144	Résultat d'analyse	/	**OUI**
E / R+1 / E121	Coffre	Peinture	décorative, blanc(he)	P163	Résultat d'analyse	/	NON
E / R+1 / E121	Rebouchage	Enduit	plâtre, blanc(he), TETE DE VIS	P164	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
E / R+1 / E121	Coffre	Peinture	décorative, gris(e), TABLEAU MENUISERIE	idem P143	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+1 / E121	Rebouchage	Enduit	plâtre, blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS	idem P144	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+1 / E121	/	Enduit	blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS	idem P144	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+1 / E122	/	Enduit	blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS	idem P144	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+1 / E123	/	Enduit	blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS	idem P144	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+1 / E124	/	Enduit	blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS	idem P144	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+1 / E112	/	Enduit	blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS	idem P144	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+1 / E133	Coffre	Peinture	décorative, blanc(he)	P165	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+1 / E133	Rebouchage	Enduit	plâtre, blanc(he), TETE DE VIS	P166	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+1 / E133	/	Enduit	blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS	idem P144	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+1 / E134	/	Enduit	blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS	idem P144	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+2 / E201	/	Enduit	blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS	idem P144	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+2 / E203	/	Enduit	blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS	idem P144	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+2 / E204	Coffre	Peinture	décorative, blanc(he)	P169	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+2 / E204	Rebouchage	Enduit	plâtre, blanc(he), TETE DE VIS	P170	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+2 / E204	Coffre	Peinture	décorative, blanc(he)	P171	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+2 / E204	Rebouchage	Enduit	plâtre, blanc(he), TETE DE VIS	P172	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+2 / E204	/	Enduit	blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS	idem P144	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+3 / E301	/	Enduit	blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS	idem P144	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+3 / E302	/	Enduit	blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS	idem P144	Résultat d'analyse	/	OUI
E / RDC / E010	Coffre	Peinture	décorative, bleu(e)	P153	Résultat d'analyse	/	OUI
E / RDC / E010	Rebouchage	Enduit	plâtre, blanc(he), TETE DE VIS	P154	Résultat d'analyse	/	OUI
E / RDC / E029	Coffre	Peinture	décorative, bleu(e)	P155	Résultat d'analyse	/	OUI
E / RDC / E029	Rebouchage	Enduit	plâtre, blanc(he), TETE DE VIS	P156	Résultat d'analyse	/	OUI
E / RDC / E031	Coffre	Peinture	décorative, bleu(e)	P157	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
E / RDC / E031	Rebouchage	Enduit	plâtre, blanc(he), TETE DE VIS	P158	Résultat d'analyse	/	OUI
E / RDC / E040	Coffre	Peinture	décorative, blanc(he)	P159	Résultat d'analyse	/	NON
E / RDC / E040	Coffre	Peinture	décorative, gris(e), TABLEAU MENUISERIE	idem P143	Résultat d'analyse	/	OUI
E / RDC / E040	Rebouchage	Enduit	plâtre, blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS	idem P144	Résultat d'analyse	/	OUI
E / RDC / E044	Coffre	Peinture	décorative, blanc(he)	P160	Résultat d'analyse	/	NON
E / RDC / E044	Coffre	Peinture	décorative, gris(e), TABLEAU MENUISERIE	idem P143	Résultat d'analyse	/	OUI
E / RDC / E044	Rebouchage	Enduit	plâtre, blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS	idem P144	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+1 / E116	Coffre	Peinture	décorative, blanc(he)	P161	Résultat d'analyse	/	NON
E / R+1 / E116	Rebouchage	Enduit	plâtre, blanc(he), TETE DE VIS	P162	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+1 / E116	Coffre	Peinture	décorative, gris(e), TABLEAU MENUISERIE	idem P143	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+1 / E116	Rebouchage	Enduit	plâtre, blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS	idem P144	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+2 / E205	Coffre	Peinture	décorative, blanc(he)	P167	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+2 / E205	Rebouchage	Enduit	plâtre, blanc(he), TETE DE VIS	P168	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+3 / E303	Coffre	Peinture	décorative, blanc(he)	P173	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+3 / E303	Rebouchage	Enduit	plâtre, blanc(he), TETE DE VIS	P174	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+3 / E314 - E301	Coffre	Peinture	décorative, blanc(he)	P175	Résultat d'analyse	/	NON
E / R+3 / E314 - E301	Rebouchage	Enduit	plâtre, blanc(he), TETE DE VIS	P176	Résultat d'analyse	/	OUI
E / RDC / ESC	Coffre	Peinture	décorative, gris(e), TABLEAU MENUISERIE	idem P143	Résultat d'analyse	/	OUI
E / RDC / ESC	Rebouchage	Enduit	plâtre, blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS	idem P144	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+1 / E118	Coffre	Peinture	décorative, gris(e), TABLEAU MENUISERIE	idem P143	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+1 / E118	Rebouchage	Enduit	plâtre, blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS	idem P144	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+1 / E115	Coffre	Peinture	décorative, gris(e), TABLEAU MENUISERIE	idem P143	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+1 / E115	Rebouchage	Enduit	plâtre, blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS	idem P144	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+1 / E110	Coffre	Peinture	décorative, gris(e), TABLEAU MENUISERIE	idem P143	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+1 / E110	Rebouchage	Enduit	plâtre, blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS	idem P144	Résultat d'analyse	/	OUI

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
E / R+1 / E109	Coffre	Peinture	décorative, gris(e), TABLEAU MENUISERIE	idem P143	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+1 / E109	Rebouchage	Enduit	plâtre, blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS	idem P144	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+1 / E107	Coffre	Peinture	décorative, gris(e), TABLEAU MENUISERIE	idem P143	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+1 / E107	Rebouchage	Enduit	plâtre, blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS	idem P144	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+1 / E105	Coffre	Peinture	décorative, gris(e), TABLEAU MENUISERIE	idem P143	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+1 / E105	Rebouchage	Enduit	plâtre, blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS	idem P144	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+1 / E104	Coffre	Peinture	décorative, gris(e), TABLEAU MENUISERIE	idem P143	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+1 / E104	Rebouchage	Enduit	plâtre, blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS	idem P144	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+1 / E106	Coffre	Peinture	décorative, gris(e), TABLEAU MENUISERIE	idem P143	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+1 / E106	Rebouchage	Enduit	plâtre, blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS	idem P144	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+1 / E108	Coffre	Peinture	décorative, gris(e), TABLEAU MENUISERIE	idem P143	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+1 / E108	Rebouchage	Enduit	plâtre, blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS	idem P144	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+1 / E111	Coffre	Peinture	décorative, gris(e), TABLEAU MENUISERIE	idem P143	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+1 / E111	Rebouchage	Enduit	plâtre, blanc(he), TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS	idem P144	Résultat d'analyse	/	OUI
F / EXTERIEUR / FACADES	Façade	Joint d'assemblage	mastic, noir(e), PORTE 5	P64	Résultat d'analyse	/	NON
F / EXTERIEUR / FACADES	Façade	Joint d'assemblage	mastic, beige, PORTE 5	P65	Résultat d'analyse	/	NON
F / EXTERIEUR / FACADES	Façade	Joint d'assemblage	mastic, gris(e), PORTE 5	P66	Résultat d'analyse	/	NON
F / EXTERIEUR / FACADES	Façade	Joint d'assemblage	mastic, noir(e), FENETRE 6	P67	Résultat d'analyse	/	NON
F / EXTERIEUR / FACADES	Façade	Joint d'assemblage	mastic, beige, FENETRE 6	P68	Résultat d'analyse	/	NON
F / EXTERIEUR / FACADES	Façade	Joint d'étanchéité	mastic, gris(e)	P69	Résultat d'analyse	/	NON
F / EXTERIEUR / FACADES	Façade	Joint d'étanchéité	mastic, gris(e)	P70	Résultat d'analyse	/	NON
F / EXTERIEUR / FACADES	Façade	Joint d'assemblage	mastic, noir(e), FENETRE 7	P71	Résultat d'analyse	/	NON
F / EXTERIEUR / FACADES	Façade	Joint d'assemblage	mastic, gris(e), FENETRE 7	P72	Résultat d'analyse	/	NON
F / RDC / CIRC 1	Poteau	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV3	OUI
F / RDC / CIRC 1	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	OUI

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
F / RDC / ESC	Poteau	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV3	OUI
F / RDC / F012	Poteau	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV3	OUI
F / RDC / F012	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	OUI
F / R+1 / F109	Poteau	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV3	OUI
F / R+1 / F109	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	OUI
F / RDC / CIRC 2	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	OUI
F / RDC / SANITAIRE 1	Cloison	Bande de plaque de plâtre	plâtre, blanc(he)	idem P19	Résultat d'analyse	/	OUI
F / RDC / SANITAIRE 1	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	idem P23	Résultat d'analyse	/	OUI
F / RDC / SANITAIRE 1	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	OUI
F / RDC / SANITAIRE 2	Cloison	Bande de plaque de plâtre	plâtre, blanc(he)	idem P19	Résultat d'analyse	/	OUI
F / RDC / SANITAIRE 2	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	idem P23	Résultat d'analyse	/	OUI
F / RDC / SANITAIRE 2	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	OUI
F / RDC / F005	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	OUI
F / RDC / F006	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	OUI
F / RDC / F007	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	OUI
F / RDC / F008	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	OUI
F / RDC / F009	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	OUI
F / RDC / F010	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	OUI
F / RDC / F011	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	OUI
F / R+1 / CIRC 1	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE PORTE	P145	Résultat d'analyse	/	OUI

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
			HUISSERIE				
F / R+1 / CIRC 1	Rebouchage	Enduit	plâtre, blanc(he), ENTOURAGE PORTE HUISSERIE - TETE DE VIS	P146	Résultat d'analyse	/	**OUI**
F / R+1 / CIRC 1	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	**OUI**
F / R+1 / CIRC 2	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	**OUI**
F / R+1 / ESC	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	**OUI**
F / R+1 / SANITAIRE 1	Cloison	Bande de plaque de plâtre	plâtre, blanc(he)	idem P19	Résultat d'analyse	/	**OUI**
F / R+1 / SANITAIRE 1	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	idem P23	Résultat d'analyse	/	**OUI**
F / R+1 / SANITAIRE 1	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	**OUI**
F / R+1 / SANITAIRE 2	Cloison	Bande de plaque de plâtre	plâtre, blanc(he)	idem P19	Résultat d'analyse	/	**OUI**
F / R+1 / SANITAIRE 2	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	idem P23	Résultat d'analyse	/	**OUI**
F / R+1 / SANITAIRE 2	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	**OUI**
F / R+1 / F105	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	**OUI**
F / R+1 / F106	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	**OUI**
F / R+1 / F107	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	**OUI**
F / R+1 / F108	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	**OUI**
F / R+1 / F110	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	**OUI**
F / R+1 / F111	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	**OUI**
F / R+1 / F112	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	**OUI**
F / EXTERIEUR / TOITURE	Toiture terrasse	Revêtement d'étanchéité	bitumineux, noir(e)	P121	Résultat d'analyse	/	NON
F / EXTERIEUR / TOITURE	Toiture	Revêtement d'étanchéité	bitumineux, noir(e)	P122	Résultat d'analyse	/	NON
F / EXTERIEUR / TOITURE	Paroi des équipements	Isolant	mousse expansée, noir(e), CTA	P123	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
F / EXTERIEUR / TOITURE	Equipement	Mastic	compact, beige, CTA	P124	Résultat d'analyse	/	NON
F / EXTERIEUR / TOITURE	Equipement	Mastic	compact, beige, CTA	P125	Résultat d'analyse	/	NON
F / EXTERIEUR / TOITURE	Toiture	Revêtement d'étanchéité	souple, noir(e), PVC SUR PANNEAUX BOIS	/	Ne contient pas d'amiante par nature	S1	NON
F / EXTERIEUR / TOITURE	Toiture terrasse	Revêtement d'étanchéité	souple, gris(e), MEMBRANE PVC SUR BOIS	/	Ne contient pas d'amiante par nature	S2	NON
G / EXTERIEUR / FACADES	Façade	Joint d'assemblage	mastic, noir(e), PORTE 8	P73	Résultat d'analyse	/	NON
G / EXTERIEUR / FACADES	Façade	Joint d'assemblage	mastic, blanc(he), PORTE 8	P74	Résultat d'analyse	/	NON
G / EXTERIEUR / FACADES	Façade	Joint d'assemblage	mastic, noir(e), PORTE 9	P75	Résultat d'analyse	/	NON
G / EXTERIEUR / FACADES	Façade	Joint d'assemblage	mastic, blanc(he), PORTE 9	P76	Résultat d'analyse	/	NON
G / SS / CIRC TECH	Porte coupe feu	Joint coupe-feu	compact, beige	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV11	**OUI**
G / SS / LOCAL CTA	Porte coupe feu	Joint coupe-feu	compact, beige	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV11	**OUI**
G / SS / CHAUFFERIE	Paroi des équipements	Isolant	laine de verre, jaune, CHAUDIERE	P131	Résultat d'analyse	/	NON
G / SS / CHAUFFERIE	Chaudière	Joint de bride	compact, noir(e), DERRIERE CHAUDIERE	P132	Résultat d'analyse	/	NON
G / SS / CHAUFFERIE	Chaudière	Joint de bride	compact, beige, RAD RD CH	P133	Résultat d'analyse	/	**OUI**
G / SS / CHAUFFERIE	Conduit	Enveloppe de calorifuge	plâtreuse, toile, blanc(he)	P134	Résultat d'analyse	/	NON
G / SS / CHAUFFERIE	Porte coupe feu	Joint coupe-feu	compact, beige	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV11	**OUI**
G / SS / LOCAL ELECTRIQUE	Porte coupe feu	Joint coupe-feu	compact, beige	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV11	**OUI**
G / SS / LOCAL BATTERIE	Porte coupe feu	Joint coupe-feu	compact, beige	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV11	**OUI**
G / SS / MACHINERIE ASC	Porte coupe feu	Joint coupe-feu	compact, beige	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV11	**OUI**
G / SS / RGT	Porte coupe feu	Joint coupe-feu	compact, beige	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV11	**OUI**
G / EXTERIEUR / TOITURE	Toiture	Revêtement d'étanchéité	bitumineux, noir(e)	P126	Résultat d'analyse	/	NON
G / EXTERIEUR / TOITURE	Toiture	Revêtement d'étanchéité	bitumineux, noir(e)	P127	Résultat d'analyse	/	NON
G / EXTERIEUR / TOITURE	complexe d'étanchéité	Pare-vapeur	bitumineux, noir(e)	P128	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
G / EXTERIEUR / TOITURE	Toiture	Revêtement d'étanchéité	bitumineux, noir(e)	P129	Résultat d'analyse	/	NON
G / EXTERIEUR / TOITURE	Revêtement bitumineux	Pare-vapeur	bitumineux, noir(e)	P130	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

6.2. Tableau estimatif des quantités d'amiante

N° MPCA	Ouvrage	Produit/matériau	Quantité estimée
1	Moquette	Colle	Surface : 200 m2
2	Mur	Enduit	Surface : 920 m2
3	Poteau	Enduit	Unite : 77
4	Elément associé à la toiture	Conduit de ventilation	Unite : 1
5	Porte	Peinture	Unite : 86
8	Plinthe	Colle	Longueur : 300 m
9	Chaudière	Joint de bride	Unite : 2
10	Cloison	Bande de plaque de plâtre	Surface : 150 m2
11	Poutre	Enduit	Unite : 80
12	Revêtement de sol	Peinture sur béton	Surface : 15 m2
13	Porte coupe feu	Joint coupe-feu	Unite : 5
14	Coffre vertical	Enduit	Unite : 61
15	Rebouchage	Enduit	Unite : 61

7. ANNEXES

7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	*Commentaires*
E / R+3 / TOITURE CTA	/
E / SS / ESPACE DETENTE	/
E / RDC / ESPACE DETENTE	/
E / R+1 / ESPACE DETENTE	/
E / RDC / WC HALL	/
E / RDC / LABO PHOTOS	/
E / RDC / WC SERVICE	/
E / R+1 / WC	/
E / R+4 / WC	/
E / R+4 / E403	/
E / R+4 / E401	/
E / R+4 / E402	/
E / R+4 / GN400	/
E / COMBLES AMPHI / COMBLES	/
E / EXTERIEUR / TOITURE	/
E / EXTERIEUR / FACADES	/
E / RDC / ATELIER	/
E / RDC / SANITAIRE	/
E / RDC / SALLE REUNION	/
E / RDC / ENTREE ST	/
E / RDC / CAGE ESCALIER	/
E / RDC / DGT ESCALIER 1	/

Localisation	*Commentaires*
E / RDC / DGT ESCALIER 2	/
E / R+1 / SANITAIRE	/
E / R+1 / SANITAIRE 2	/
E / R+1 / CAGE ESCALIER	/
E / R+2 / CIRC 1	/
E / R+3 / CIRC 1	/
E / R+3 / CAGE ESCALIER	/
E / R+4 / CAGE ESCALIER	/
E / R+2 / CAGE ESCALIER	/
E / RDC / HALL ENTREE	/
E / RDC / CIRC ACCUEIL	/
E / RDC / CIRC	/
E / RDC / SALLE E001	/
E / RDC / SALLE E002	/
E / RDC / RGT	/
E / RDC / LOCAL MENAGE	/
E / RDC / BUREAU ST	/
E / R+1 / DGT ESCALIER 1	/
E / R+1 / CIRC	/
E / R+1 / E101	/
E / R+1 / E102	/
E / R+1 / E103	/
E / R+1 / E103	/
E / RDC / LOCAL ELECT	/
E / RDC / LOCAL TGBT	/
E / R+4 / AMPHI D	/
E / R+3 / CAGE ESC	/
E / R+3 / CHAUFFERIE	/
E / RDC / ACCUEIL	/
E / R+2 / RGT	/
E / R+4 / ACCES AMPHI 2	/
E / RDC / MACHINERIE ASCENSEUR	/
E / R+3 / TOITURE	/
E / R+1 / SALLE 102	/
E / R+1 / CIRCULATION ADMIN	/
E / RDC / BUREAU R1	/
E / RDC / BUREAU ESPE	/
E / RDC / BUREAU INFORMATICIEN	/
E / RDC / STOCK INFORMATIQUE	/
E / R+1 / E121	/
E / R+1 / E122	/
E / R+1 / E123	/
E / R+1 / E124	/
E / R+1 / E112	/
E / R+1 / E133	/
E / R+1 / E134	/

Localisation	*Commentaires*
E / R+2 / E201	/
E / R+2 / E203	/
E / R+2 / E204	/
E / R+3 / E301	/
E / R+3 / E302	/
E / RDC / E010	/
E / RDC / E029	/
E / RDC / E031	/
E / RDC / E040	/
E / RDC / E044	/
E / R+1 / E116	/
E / R+2 / E205	/
E / R+3 / E303	/
E / R+3 / E314 - E301	/
E / RDC / ESC	/
E / R+1 / E118	/
E / R+1 / E115	/
E / R+1 / E110	/
E / R+1 / E109	/
E / R+1 / E107	/
E / R+1 / E105	/
E / R+1 / E104	/
E / R+1 / E106	/
E / R+1 / E108	/
E / R+1 / E111	/
F / EXTERIEUR / FACADES	/
F / RDC / CIRC 1	/
F / RDC / ESC	/
F / RDC / F012	/
F / RDC / F012	/
F / R+1 / F109	/
F / R+1 / F109	/
F / RDC / CIRC 2	/
F / RDC / SANITAIRE 1	/
F / RDC / SANITAIRE 2	/
F / RDC / F005	/
F / RDC / F006	/
F / RDC / F007	/
F / RDC / F008	/
F / RDC / F009	/
F / RDC / F010	/
F / RDC / F011	/
F / R+1 / CIRC 1	/
F / R+1 / CIRC 2	/
F / R+1 / ESC	/
F / R+1 / SANITAIRE 1	/

Localisation	*Commentaires*
F / R+1 / SANITAIRE 2	/
F / R+1 / F105	/
F / R+1 / F106	/
F / R+1 / F107	/
F / R+1 / F108	/
F / R+1 / F110	/
F / R+1 / F111	/
F / R+1 / F112	/
F / EXTERIEUR / TOITURE	/
G / EXTERIEUR / FACADES	/
G / SS / CIRC TECH	/
G / SS / LOCAL CTA	/
G / SS / CHAUFFERIE	/
G / SS / LOCAL ELECTRIQUE	/
G / SS / LOCAL BATTERIE	/
G / SS / MACHINERIE ASC	/
G / SS / RGT	/
G / EXTERIEUR / TOITURE	/

Copyright BUREAU VERITAS

7.2. Croquis de repérage

Planche de repérage technique			Légende	Situation du bien
Adresse	UNIVERSITE 221 Rue Hubert Cailler 85000 LA ROCHE SUR YON		Px → Prélèvement n°X contenant de l'amiante Px → Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante S → Sondage N V Non visité H Tx Hors périmètre de repérage	Colle blanche moquette (moquette plinthes a prendre en compte) P10/P11/P12/P14/P15/P16/IV1/P139/P140 Peinture + enduit (Mur) P23/P24/P27/P28/IV2 Peinture + enduit poteaux IV3
SS BAT E	Date de visite	20/08/2024		
	Auteur	A.LEROUX		
	N° Dossier	23063510		
	Planche	1/		
Plan/Elevation	Indice	0		

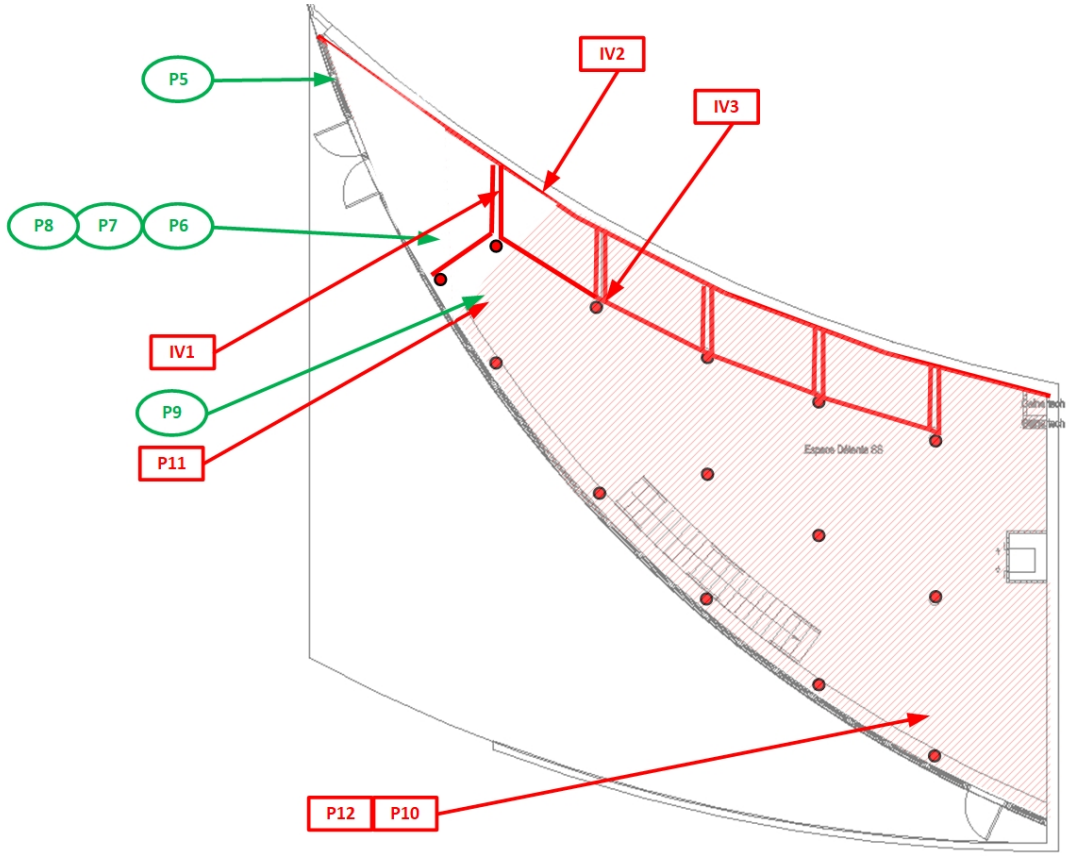


Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : CUD LA ROCHE SUR YON	Adresse : 221 rue Hubert Cailler Campus de La Roche Sur Yon 85000 LA ROCHE SUR YON	Localisation : E
Réalisé par : Andreas LEROUX	N° de planche : 1 / 13	

Copyright BUREAU VERITAS

Planche de repérage technique			Légende	Situation du bien
Adresse	UNIVERSITE 221 Rue Hubert Cailler 85000 LA ROCHE SUR YON			
RDC BAT E	Date de visite	20/08/2024		
	Auteur	A/LEROUX		
	N° Dossier	23063510		
	Planche	3/		
Plan/Elevation	Indice	0		

Px → Prélèvement n°X contenant de l'amiante

Px → Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante

S → Sondage

N V Non visité

H Tx Hors périmètre de repérage

Conduit amiante ciment IV4

Peinture + enduit (Poteaux) IV3

Peinture + enduit (Mur) P23/P24/P27/P28/IV2

Peinture + enduit (Boiserie) IV5/P153/P154/P155/P156/P158

Plaque de caniveau IV6

Peinture (Plafond) IV7

Bande plaque de platre (PH) P19/P25/P26

Plaque bitu sous evier IV12

Colle blanche moquette (moquette plinthes a prendre en compte) P10/P11/P12/P14/P15/P16/IV1/P139/P140

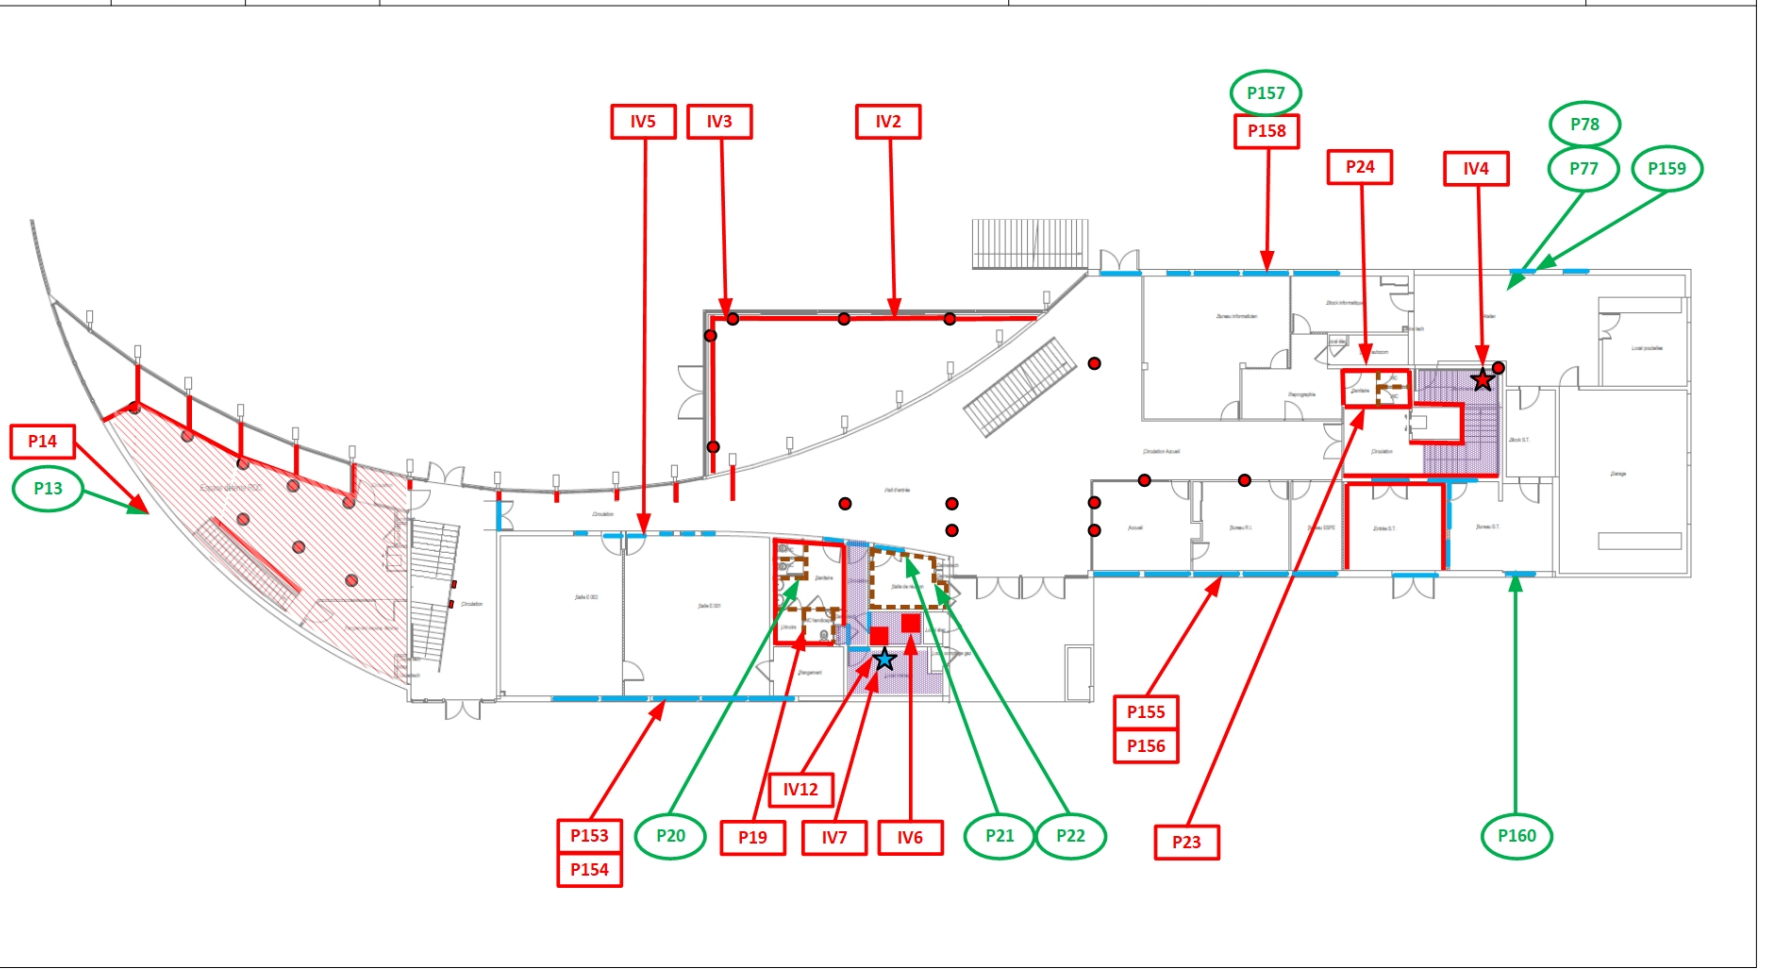


Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport*)		
Site : CUD LA ROCHE SUR YON	Adresse : 221 rue Hubert Cailler Campus de La Roche Sur Yon 85000 LA ROCHE SUR YON	Localisation : E
Réalisé par : Andreas LEROUX	N° de planche : 2 / 13	

Copyright BUREAU VERITAS

Planche de repérage technique			Légende	Situation du bien
Adresse	UNIVERSITE 221 Rue Hubert Cailler 85000 LA ROCHE SUR YON		Px → Prélèvement n°X contenant de l'amiante Px → Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante S → Sondage N V Non visité H Tx Hors périmètre de repérage	Peinture + enduit (Poteaux) IV3 Peinture + enduit (Mur) P23/P24/P27/P28/IV2 Peinture + enduit (Boiserie) IV5/P143/P144/P145/P146/P162/P165/P166 Bande plaque de platre (PH) P19/P25/P26 Peinture (Plafond) IV7 Colle blanche moquette (moquette plinthes a prendre en compte) P10/P11/P12/P14/P15/P16/IV1/P139/P140
ETAGE 1 BAT E	Date de visite	20/08/2024		
	Auteur	A/LEROUX		
	N° Dossier	23063510		
	Planche	5/		
Plan/Elevation	Indice	0		

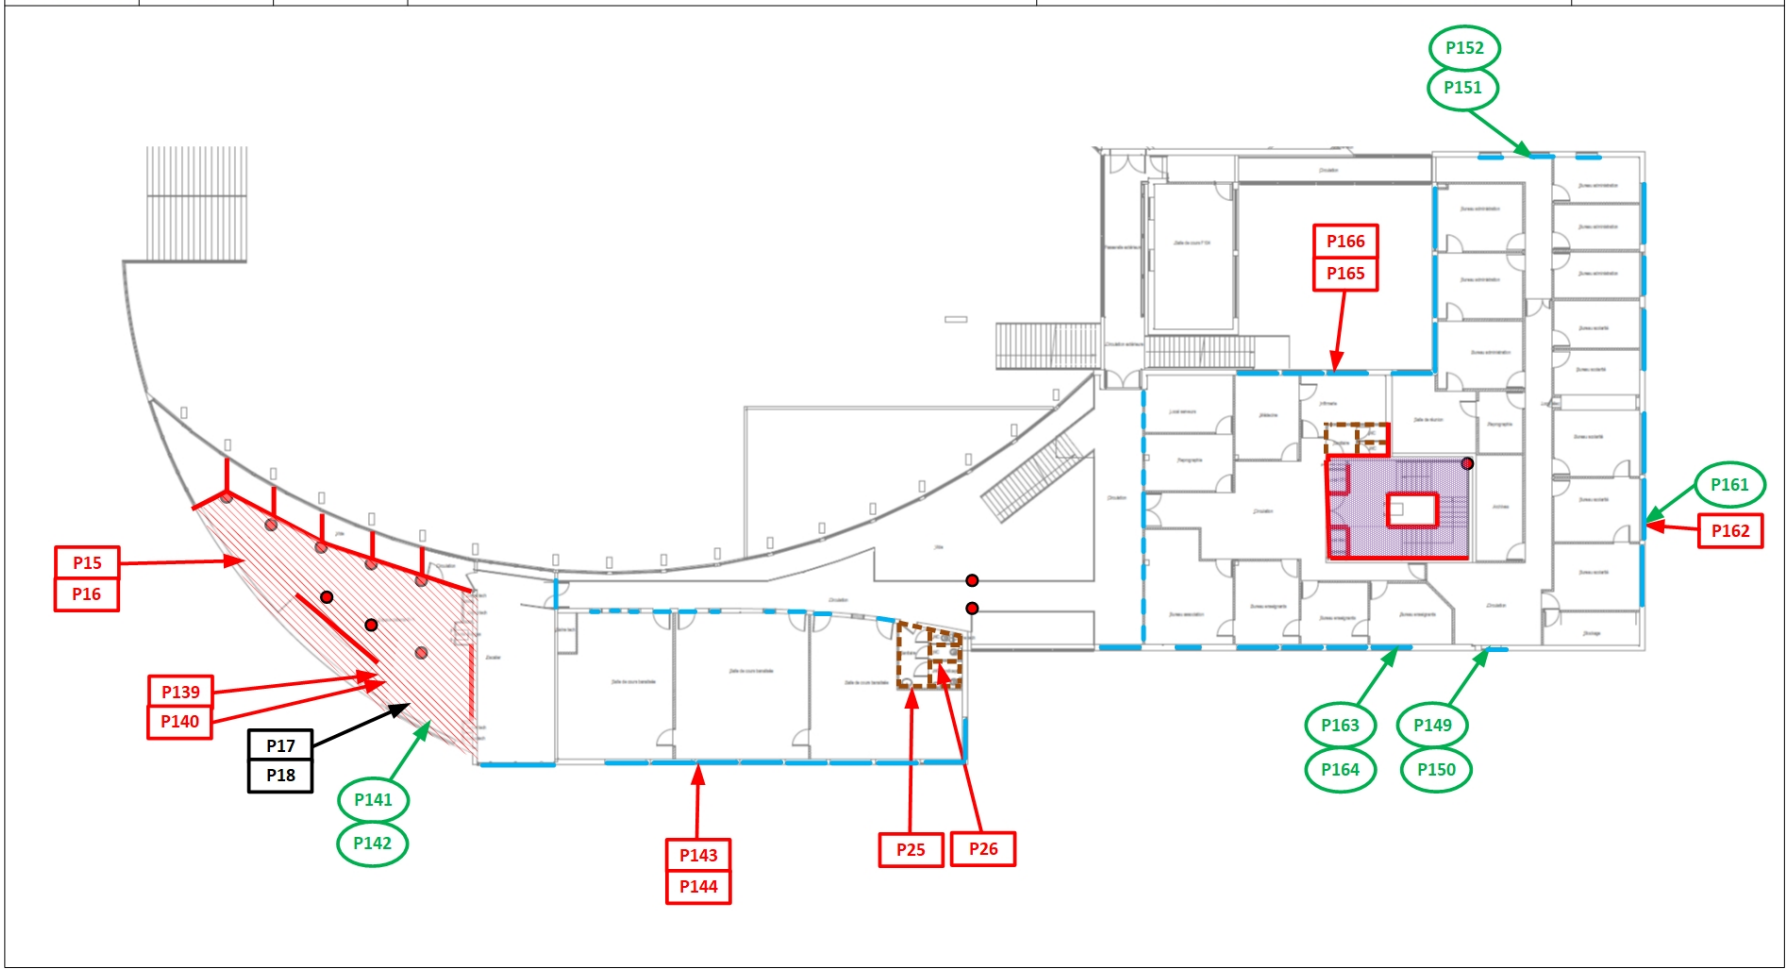


Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport*)		
Site : CUD LA ROCHE SUR YON	Adresse : 221 rue Hubert Cailler Campus de La Roche Sur Yon 85000 LA ROCHE SUR YON	Localisation : E
Réalisé par : Andreas LEROUX	N° de planche : 3 / 13	

Copyright BUREAU VERITAS

Planche de repérage technique			Légende	Situation du bien
Adresse	UNIVERSITE 221 Rue Hubert Cailler 85000 LA ROCHE SUR YON		Px → Prélèvement n°X contenant de l'amiante Px → Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante S → Sondage N V Non visité H Tx Hors périmètre de repérage Peinture + enduit (Mur) P23/P24/P27/P28/IV2 Peinture + enduit (Boiserie) IV5/P143/P144/P145/P146/P167/P168/P169/P170/P171/P172 Peinture (Plafond) IV7 Peinture + enduit (Poteaux) IV3 Bande plaque de platre (PH) P19/P25/P26	
ETAGE 2 BAT E	Date de visite	20/08/2024		
	Auteur	A.LEROUX		
	N° Dossier	23063510		
	Planche	6/		
Plan/Elevation	Indice	0		

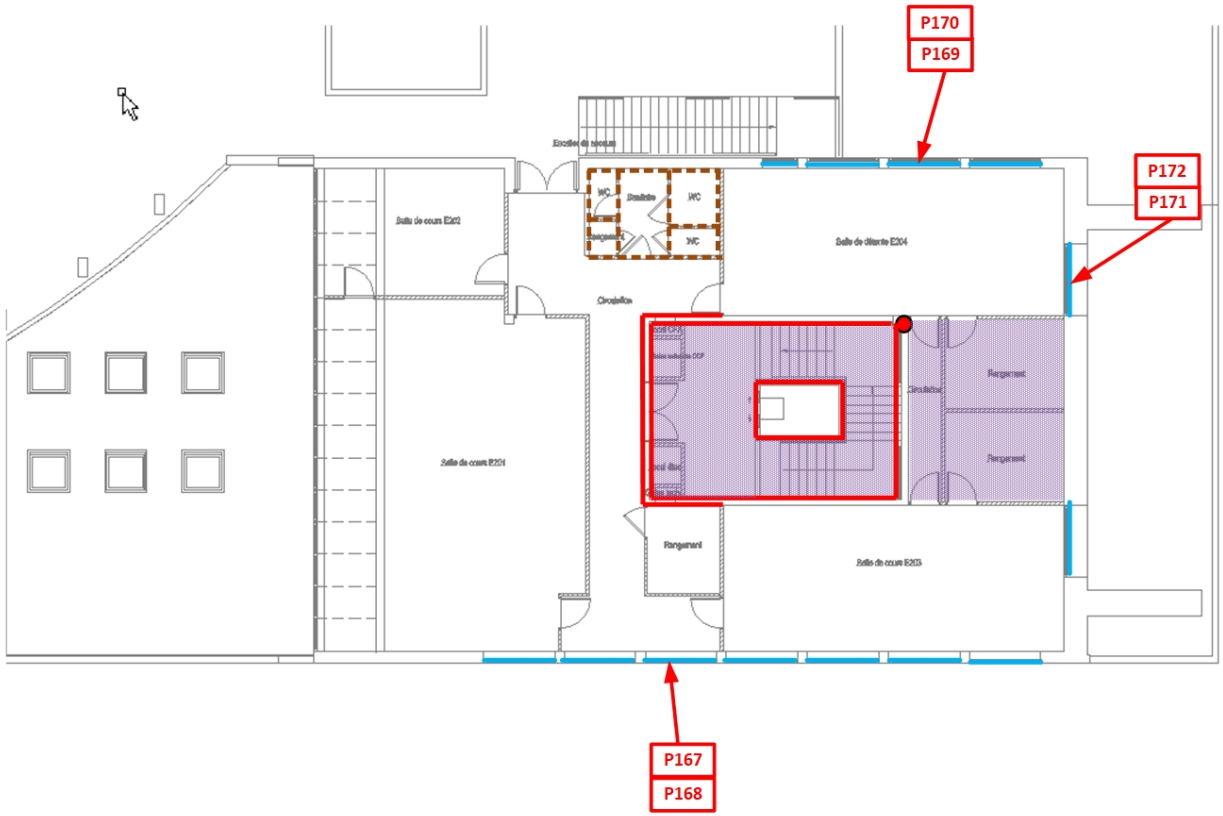


Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport*)		
Site : CUD LA ROCHE SUR YON	Adresse : 221 rue Hubert Cailler Campus de La Roche Sur Yon 85000 LA ROCHE SUR YON	Localisation : E
Réalisé par : Andreas LEROUX	N° de planche : 4 / 13	

Copyright BUREAU VERITAS

Planche de repérage technique			Légende		Situation du bien
Adresse	UNIVERSITE 221 Rue Hubert Cailler 85000 LA ROCHE SUR YON		Px → Prélèvement n°X contenant de l'amiante Px → Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante S → Sondage N V Non visité H Tx Hors périmètre de repérage	Peinture + enduit (Mur) P23/P24/P27/P28/IV2 Peinture + enduit (Boiserie) IV5/P143/P144/P145/P146/P173/P174/P176 Peinture (Plafond) IV7 Peinture + enduit (Poteaux) IV3 Joint bride IV8	
ETAGE 3 BAT E	Date de visite	20/08/2024			
	Auteur	A/LEROUX			
	N° Dossier	23063510			
	Planche	7/			
Plan/Elevation	Indice	0			

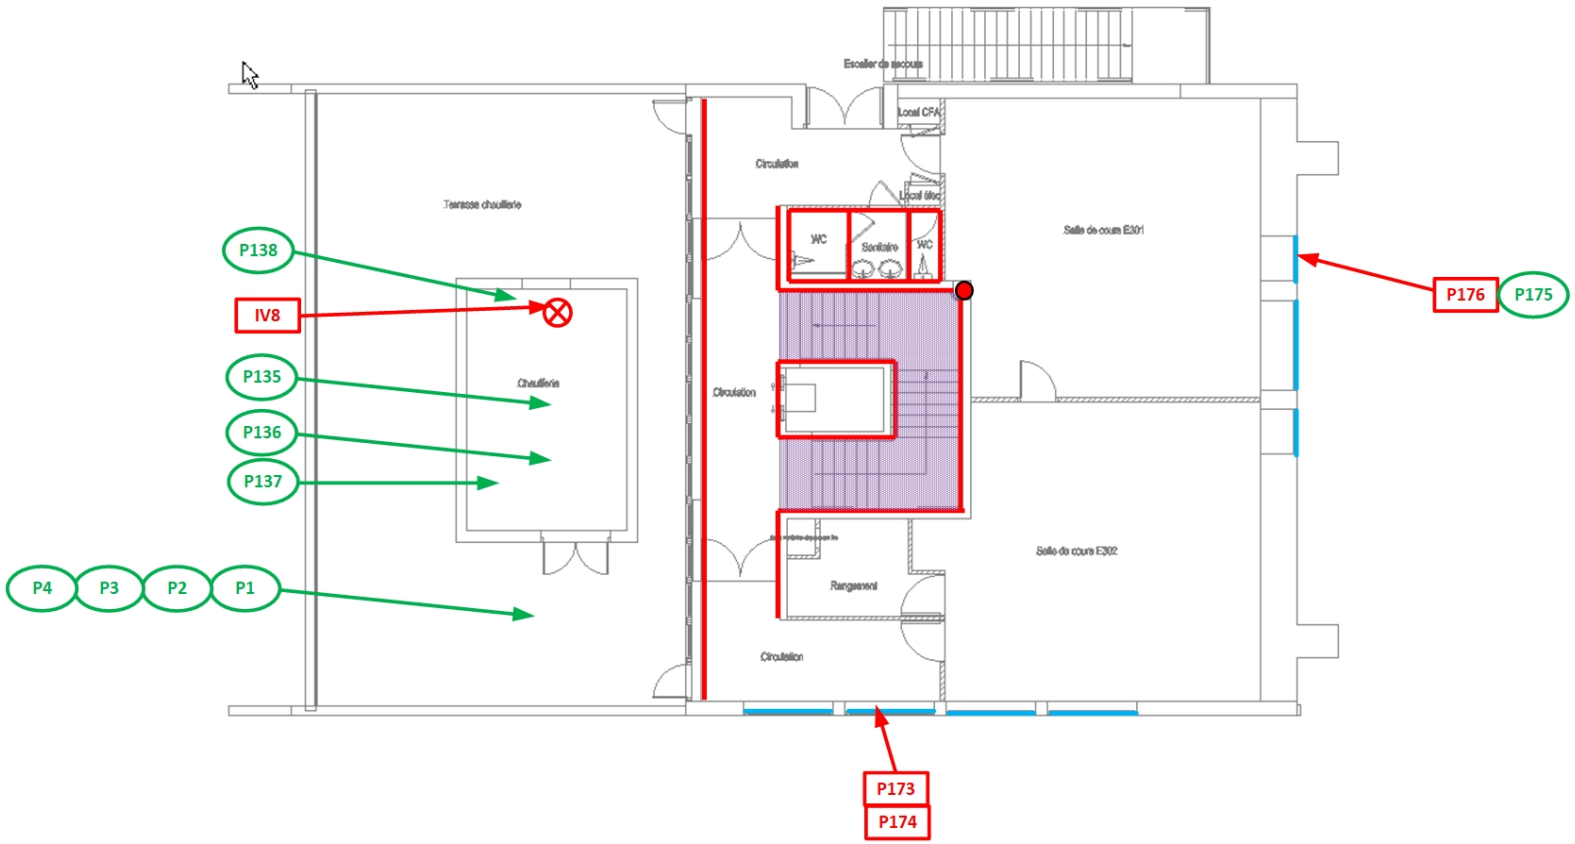


Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport*)		
Site : CUD LA ROCHE SUR YON	Adresse : 221 rue Hubert Cailler Campus de La Roche Sur Yon 85000 LA ROCHE SUR YON	Localisation : E
Réalisé par : Andreas LEROUX	N° de planche : 5 / 13	

Copyright BUREAU VERITAS

Planche de repérage technique			Légende	Situation du bien
Adresse	UNIVERSITE 221 Rue Hubert Cailler 85000 LA ROCHE SUR YON		Px → Prélèvement n°X contenant de l'amiante Px → Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante S → Sondage N V Non visité H Tx Hors périmètre de repérage	
ETAGE 3 BAT E	Date de visite	20/08/2024		
	Auteur	A/LEROUX		
	N° Dossier	23063510		
	Planche	8/		
Plan/Elevation	Indice	0		

Peinture + enduit (Mur) P23/P24/P27/P28/IV2
Peinture (Plafond) IV7
Peinture + enduit (Boiserie) IV5/P143/P144/P145/P146
Peinture + enduit (Poteaux) IV3
Joint bride IV8
Colle de moquette + ragréage blanc (moquette plinthes a prendre en compte) P10/P11/P12/P14/P15/P16/IV1

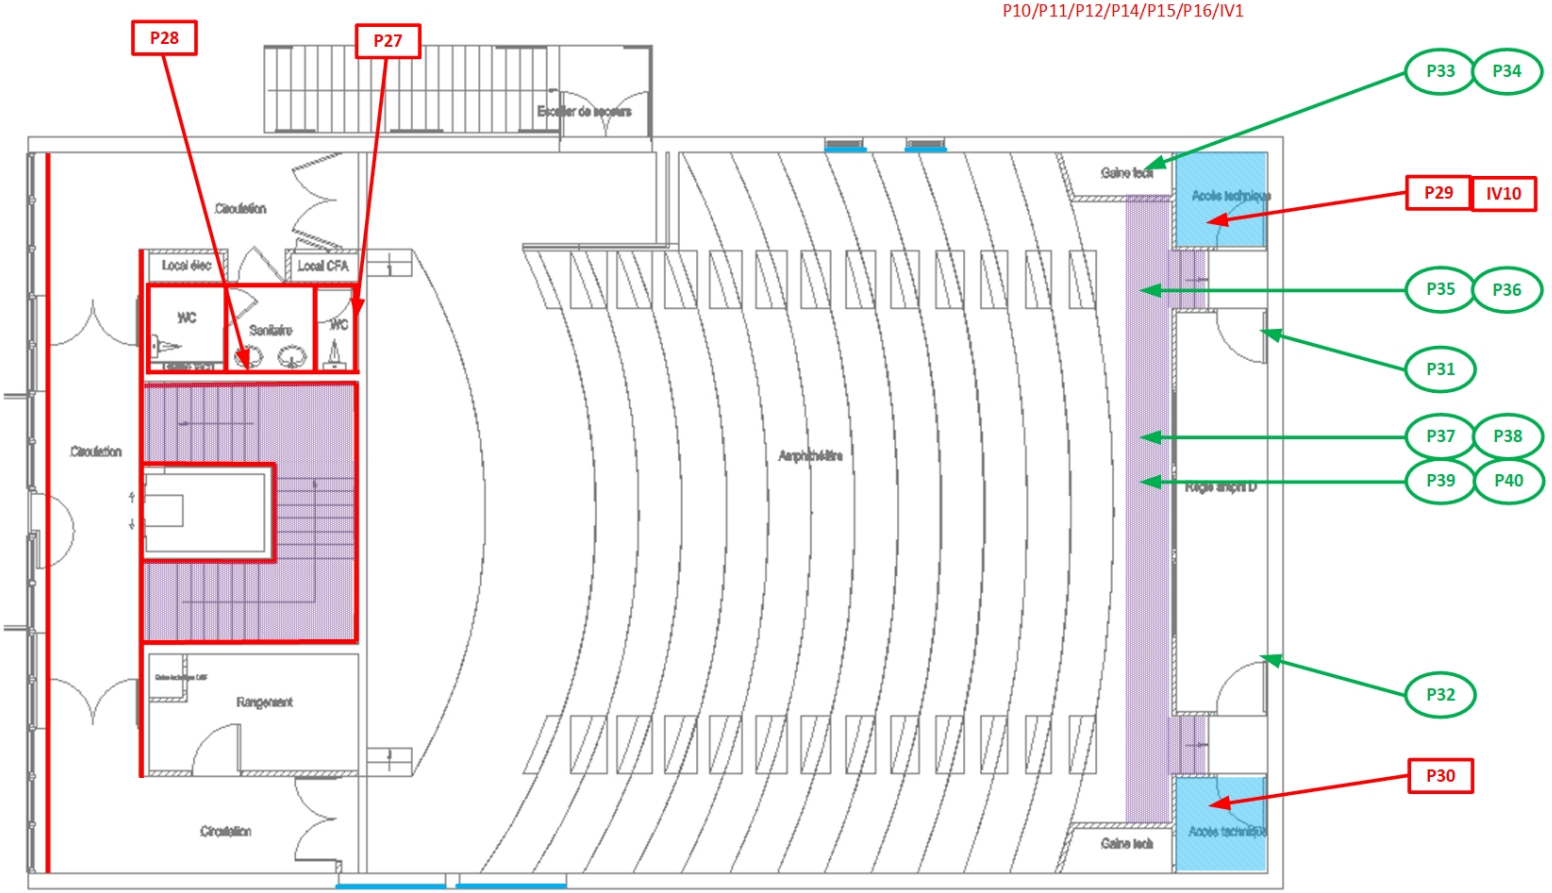


Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport*)		
Site : CUD LA ROCHE SUR YON	Adresse : 221 rue Hubert Cailler Campus de La Roche Sur Yon 85000 LA ROCHE SUR YON	Localisation : E
Réalisé par : Andreas LEROUX	N° de planche : 6 / 13	

Copyright BUREAU VERITAS

Planche de repérage technique			Légende	Situation du bien
Adresse	UNIVERSITE 221 Rue Hubert Cailler 85000 LA ROCHE SUR YON		Px → Prélèvement n°X contenant de l'amiante Px → Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante S → Sondage N V Non visité H Tx Hors périmètre de repérage Peinture + enduit (Mur) P23/P24/P27/P28/IV2 Peinture (Plafond) IV7 Peinture + enduit (Poteaux) IV3 Peinture + enduit (Boiserie) IV5 Bande plaque de platre (PH) P19/P25/P26	
RDC BAT F	Date de visite	20/08/2024		
	Auteur	A/LEROUX		
	N° Dossier	23063510		
	Planche	9/		
Plan/Elevation	Indice	0		



Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : CUD LA ROCHE SUR YON	Adresse : 221 rue Hubert Cailler Campus de La Roche Sur Yon 85000 LA ROCHE SUR YON	Localisation : E
Réalisé par : Andreas LEROUX	N° de planche : 7 / 13	

Copyright BUREAU VERITAS

Planche de repérage technique			Légende	Situation du bien
Adresse	UNIVERSITE 221 Rue Hubert Cailler 85000 LA ROCHE SUR YON		Px → Prélèvement n°X contenant de l'amiante Px → Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante S → Sondage N V Non visité H Tx Hors périmètre de repérage	
ETAGE 1 BAT F	Date de visite	20/08/2024		
	Auteur	A/LEROUX		
	N° Dossier	23063510		
	Planche	10/		
Plan/Elevation	Indice	0		

Peinture + enduit (Mur) P23/P24/P27/P28/IV2
Peinture (Plafond) IV7
Peinture + enduit (Poteaux) IV3
Peinture + enduit (Boiserie) IV5/P143/P144/P145/P146
Bande plaque de platre (PH) P19/P25/P26



Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : CUD LA ROCHE SUR YON	Adresse : 221 rue Hubert Cailler Campus de La Roche Sur Yon 85000 LA ROCHE SUR YON	Localisation : E
Réalisé par : Andreas LEROUX	N° de planche : 8 / 13	

Copyright BUREAU VERITAS

Planche de repérage technique			Légende	Situation du bien
Adresse	UNIVERSITE 221 Rue Hubert Cailler 85000 LA ROCHE SUR YON		Px → Prélèvement n°X contenant de l'amiante Px → Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante S → Sondage N V Non visité H Tx Hors périmètre de repérage Joint coupe feu porte IV11 Joint bride IV8/P133	
SS BAT G	Date de visite	20/08/2024		
	Auteur	A.LEROUX		
	N° Dossier	23063510		
	Planche	13/		
Plan/Elevation	Indice	0		

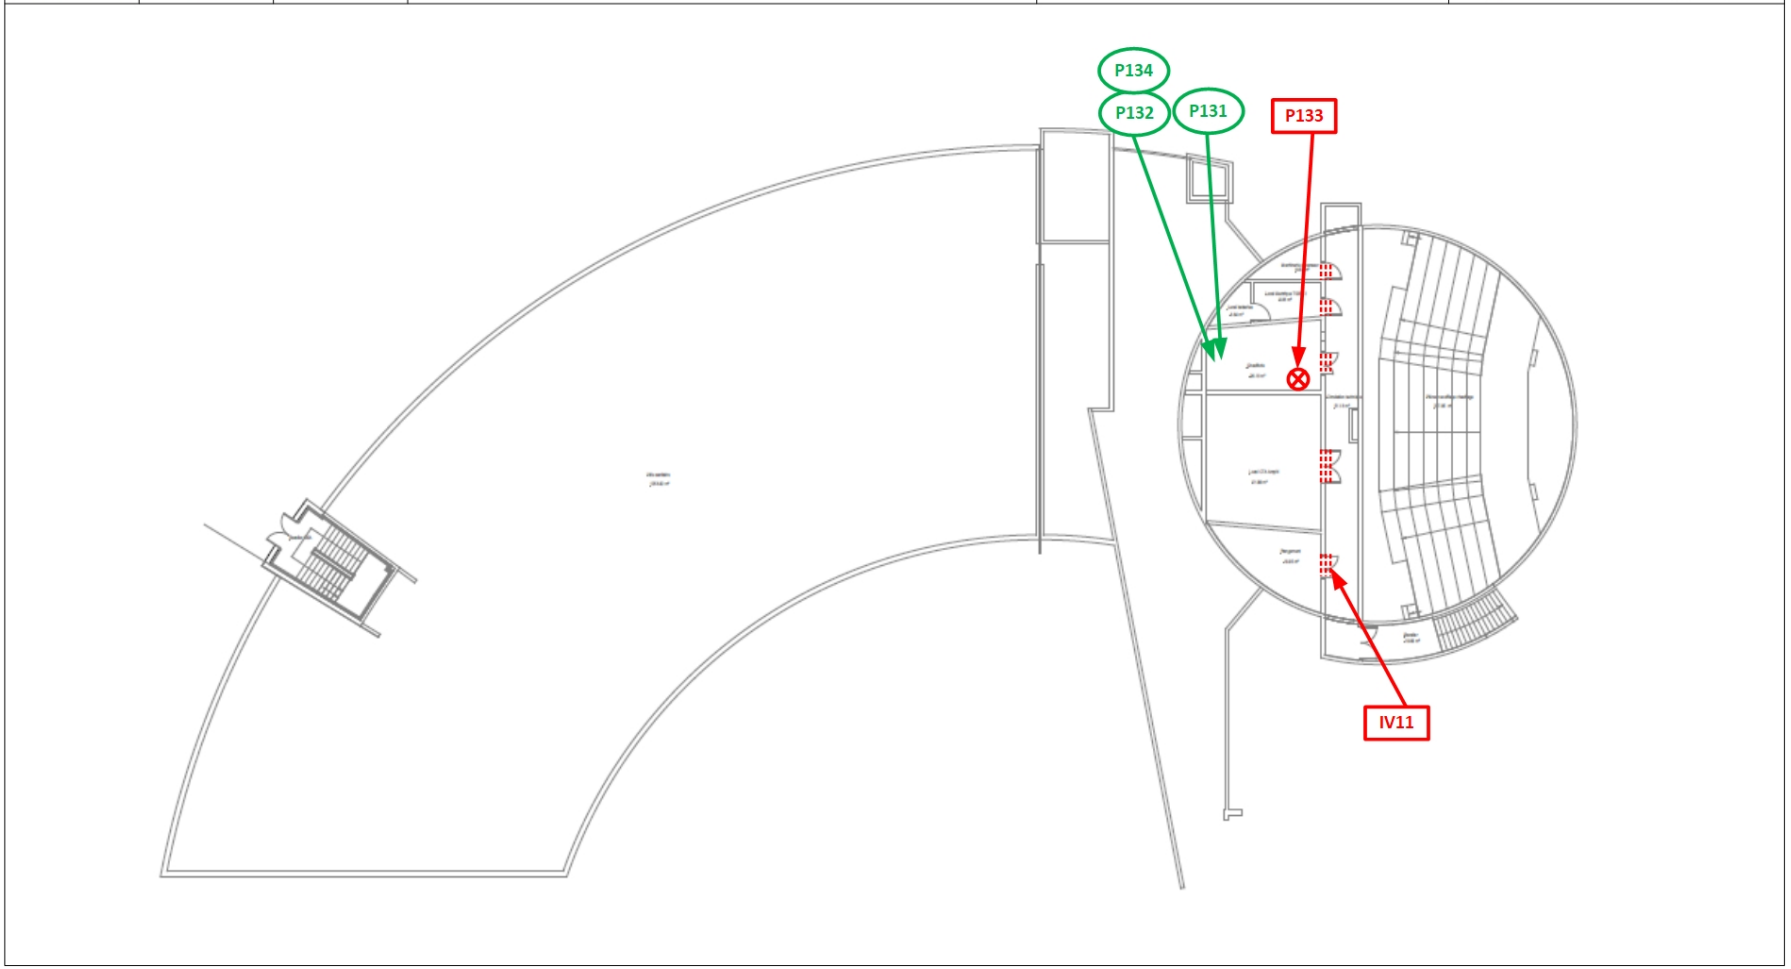


Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : CUD LA ROCHE SUR YON	Adresse : 221 rue Hubert Cailler Campus de La Roche Sur Yon 85000 LA ROCHE SUR YON	Localisation : E
Réalisé par : Andreas LEROUX	N° de planche : 9 / 13	

Copyright BUREAU VERITAS

Planche de repérage technique			Légende	Situation du bien
Adresse	UNIVERSITE 221 Rue Hubert Cailler 85000 LA ROCHE SUR YON		Px → Prélèvement n°X contenant de l'amiante Px → Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante S → Sondage N V Non visité H Tx Hors périmètre de repérage	
RDC BAT G	Date de visite	20/08/2024		
	Auteur	A.LEROUX		
	N° Dossier	23063510		
	Planche	12/		
Plan/Elevation	Indice	0		

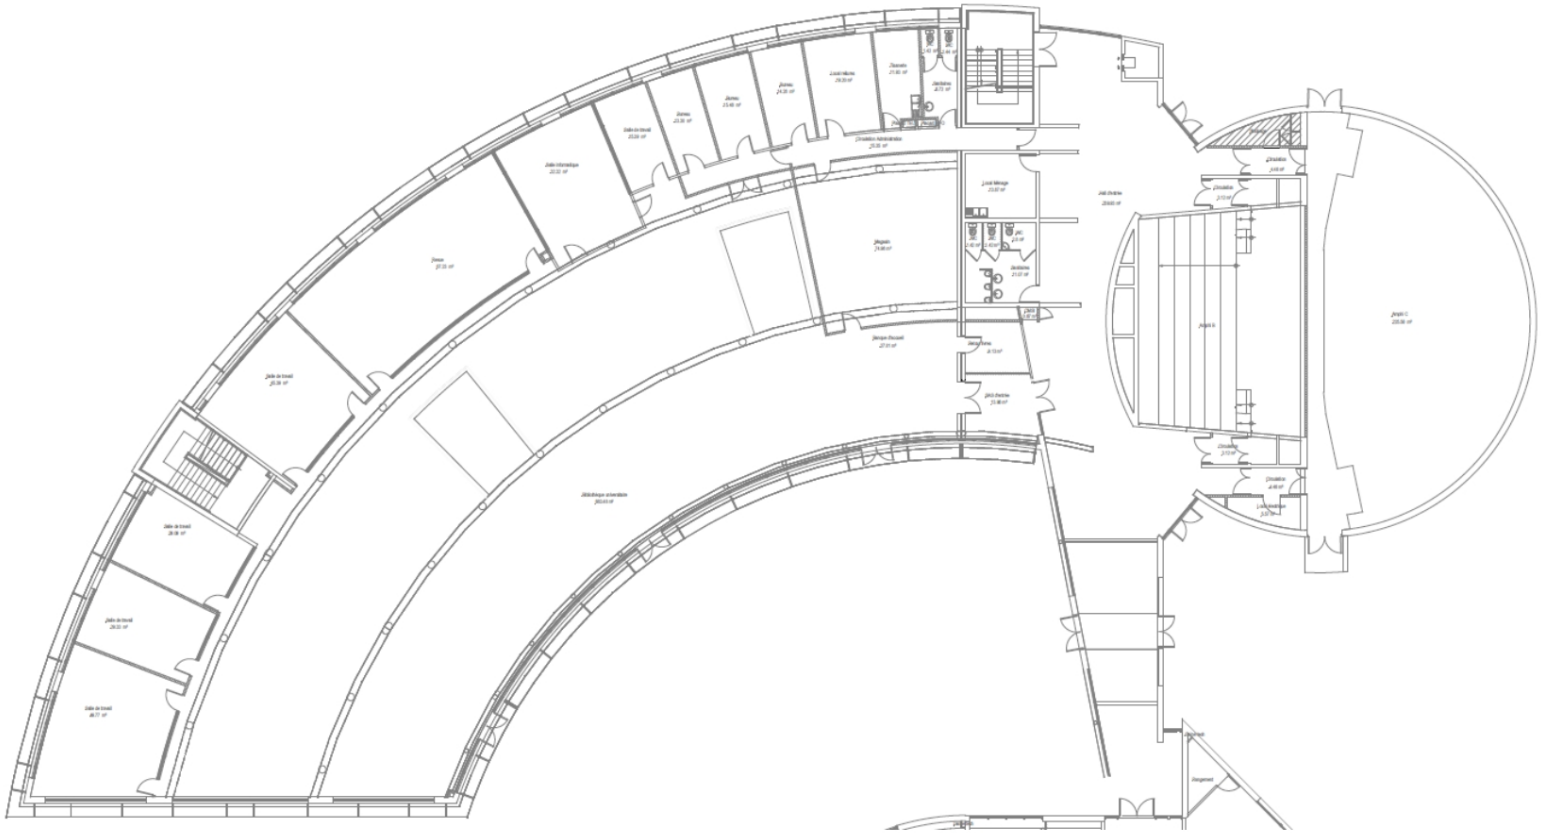


Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : CUD LA ROCHE SUR YON	Adresse : 221 rue Hubert Cailler Campus de La Roche Sur Yon 85000 LA ROCHE SUR YON	Localisation : E
Réalisé par : Andreas LEROUX	N° de planche : 10 / 13	

Copyright BUREAU VERITAS

Planche de repérage technique			Légende	Situation du bien
Adresse	UNIVERSITE 221 Rue Hubert Cailler 85000 LA ROCHE SUR YON		Px → Prélèvement n°X contenant de l'amiante Px → Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante S → Sondage N V Non visité H Tx Hors périmètre de repérage	
ETAGE 1 BAT G	Date de visite	20/08/2024		
	Auteur	A/LEROUX		
	N° Dossier	23063510		
	Planche	11/		
Plan/Elevation	Indice	0		



Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : CUD LA ROCHE SUR YON	Adresse : 221 rue Hubert Cailler Campus de La Roche Sur Yon 85000 LA ROCHE SUR YON	Localisation : E
Réalisé par : Andreas LEROUX	N° de planche : 11 / 13	

Copyright BUREAU VERITAS

Planche de repérage technique			Légende	Situation du bien
Adresse	EI 775 – MAISON DE QUARTIER AVALIX 3 Rue du docteur calmette 44600 SAINT NAZAIRE		Px → Prélèvement n°X contenant de l'amiante Px → Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante S → Sondage NV Non visité HTx Hors périmètre de repérage	
TOITURE	Date de visite	20/08/2024		
	Auteur	A/LEROUX		
	N° Dossier	23063510		
	Planche	2/2		
Plan/Elevation	Indice	0		

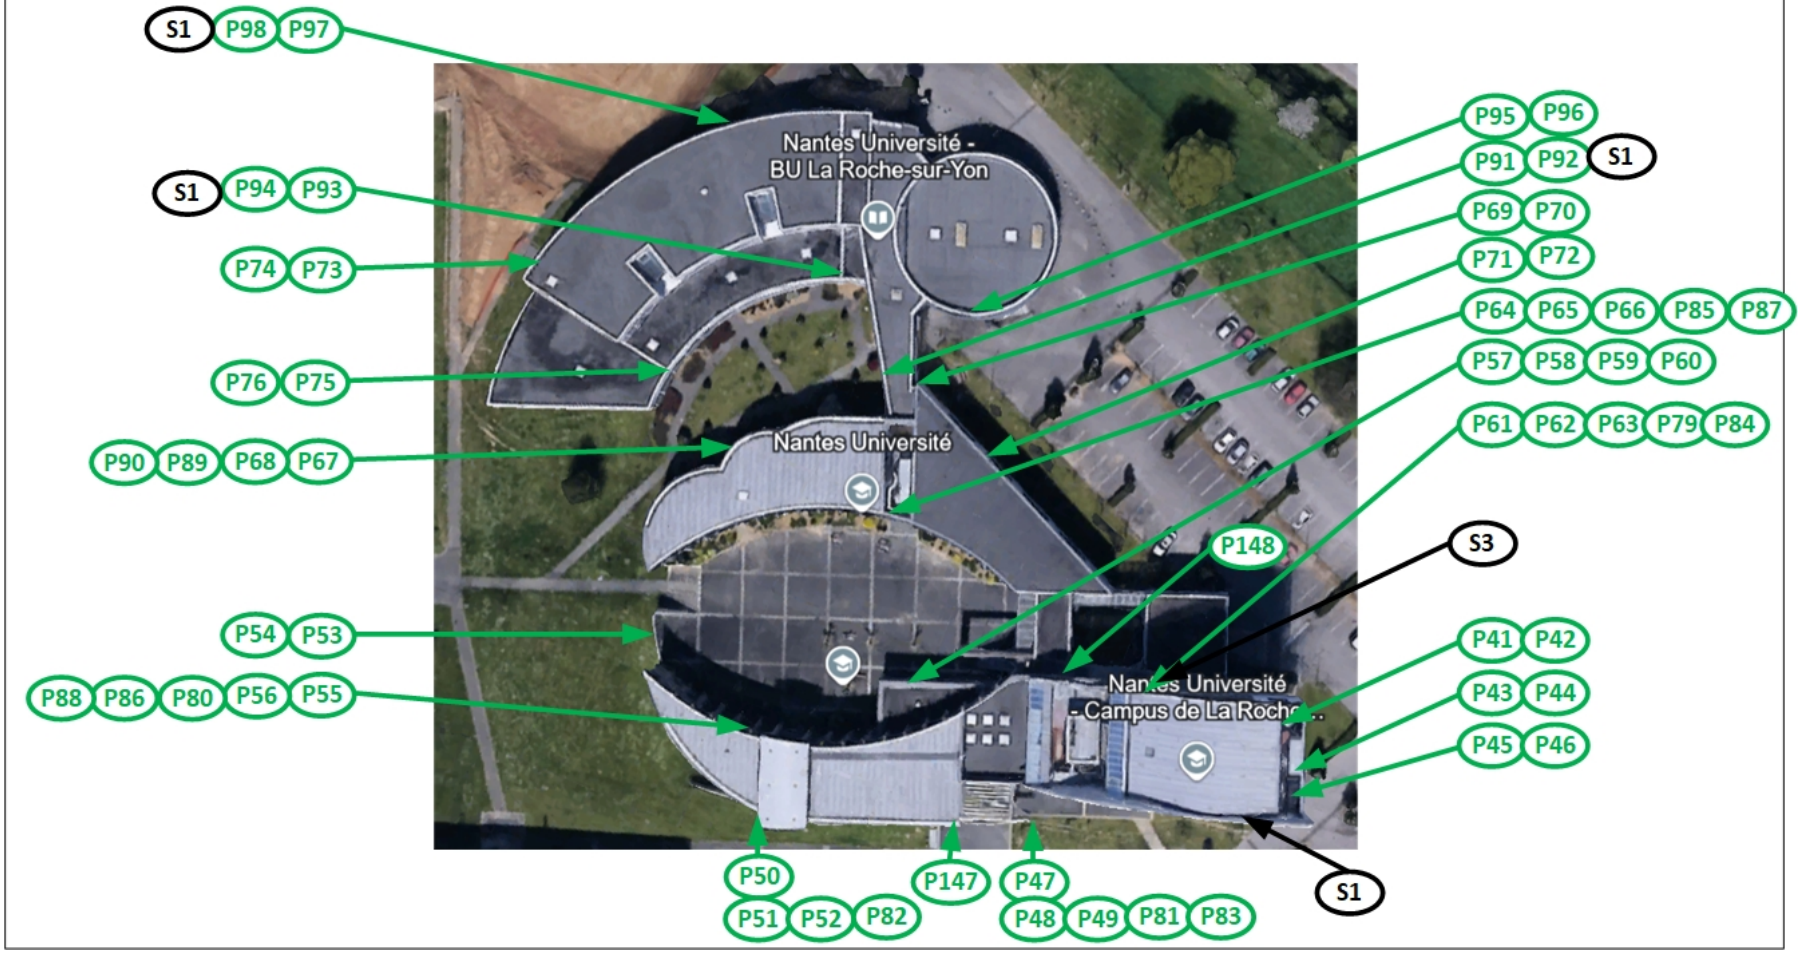


Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : CUD LA ROCHE SUR YON	Adresse : 221 rue Hubert Cailler Campus de La Roche Sur Yon 85000 LA ROCHE SUR YON	Localisation : E
Réalisé par : Andreas LEROUX	N° de planche : 12 / 13	

Copyright BUREAU VERITAS

Planche de repérage technique			Légende	Situation du bien
Adresse	EI 775 – MAISON DE QUARTIER AVALIX 3 Rue du docteur calmette 44600 SAINT NAZAIRE		Px → Prélèvement n°X contenant de l'amiante Px → Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante S → Sondage NV Non visité HTx Hors périmètre de repérage	
TOITURE	Date de visite	20/08/2024		
	Auteur	A/LEROUX		
	N° Dossier	23063510		
	Planche	2/2		
Plan/Elevation	Indice	0		

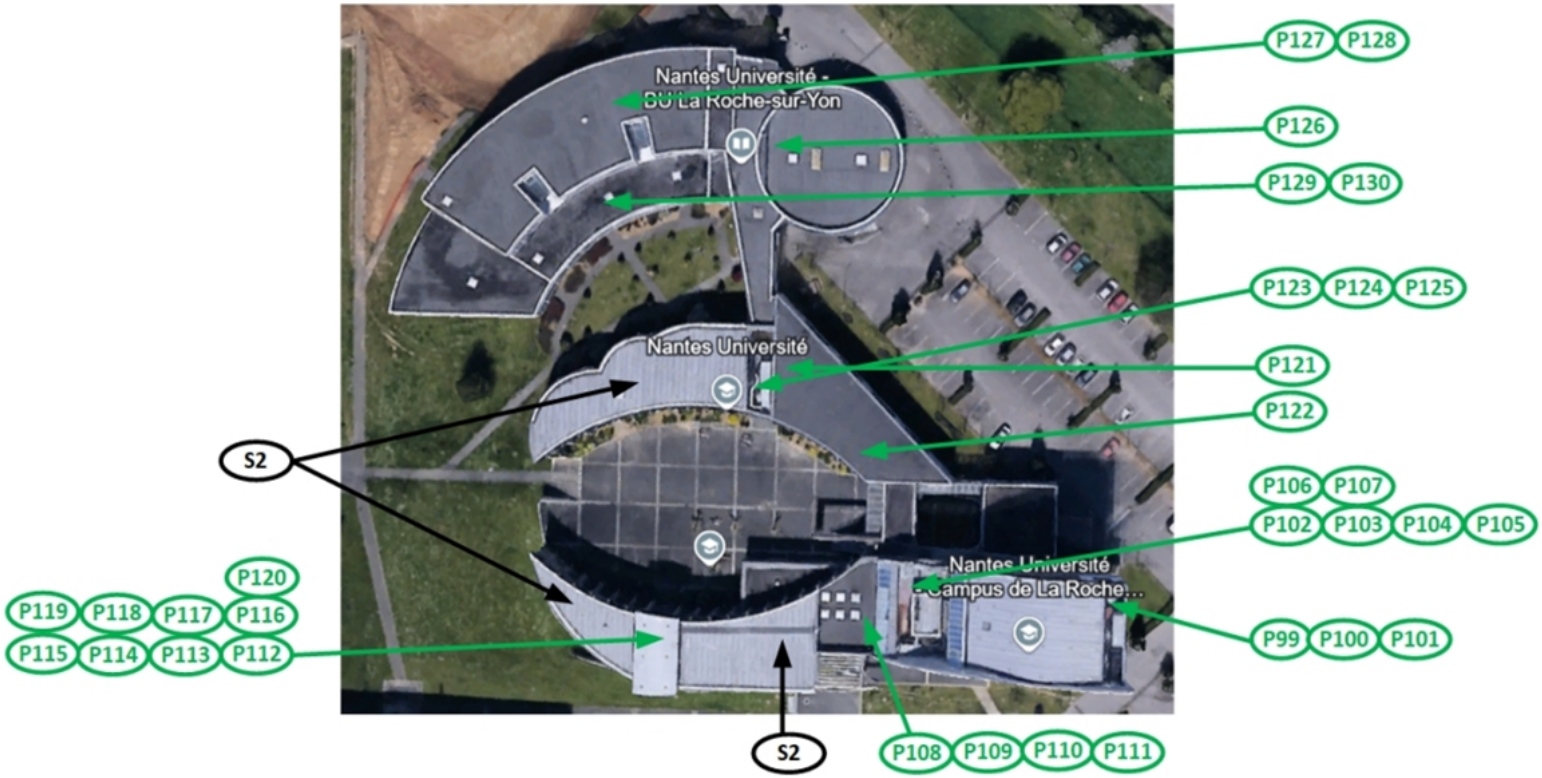


Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : CUD LA ROCHE SUR YON	Adresse : 221 rue Hubert Cailler Campus de La Roche Sur Yon 85000 LA ROCHE SUR YON	Localisation : E
Réalisé par : Andreas LEROUX	N° de planche : 13 / 13	

Copyright BUREAU VERITAS

7.3. Photos



Prélèvement - P1 : E / R+3 / TOITURE CTA - Mastic- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P2 : E / R+3 / TOITURE CTA - Mastic- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P3 : E / R+3 / TOITURE CTA - Isolant- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P4 : E / R+3 / TOITURE CTA - Isolant- (Absence d'amiante)

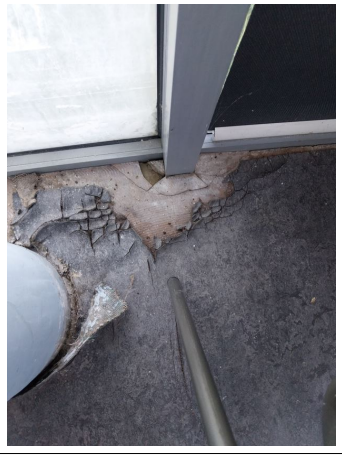

Prélèvement - P5 : E / SS / ESPACE DETENTE - Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P6 : E / SS / ESPACE DETENTE - Colle- (Absence d'amiante)


Copyright BUREAU VERITAS



Prélèvement - P7 : E / SS / ESPACE DETENTE - Colle-
(Absence d'amiante)




Prélèvement - P8 : E / SS / ESPACE DETENTE - Colle-
(Absence d'amiante)

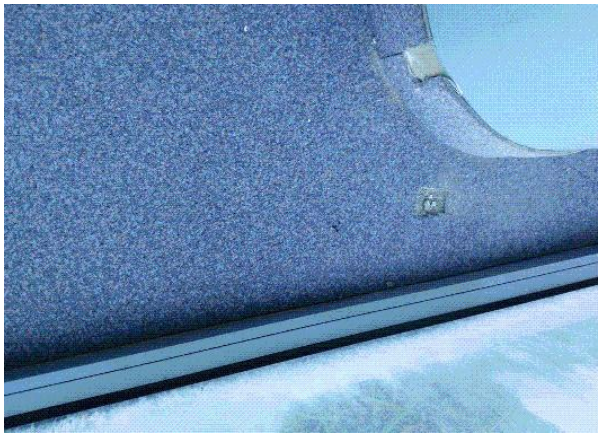

Prélèvement - P9 : E / SS / ESPACE DETENTE - Colle-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P10 : E / SS / ESPACE DETENTE - Colle-
(Présence d'amiante)

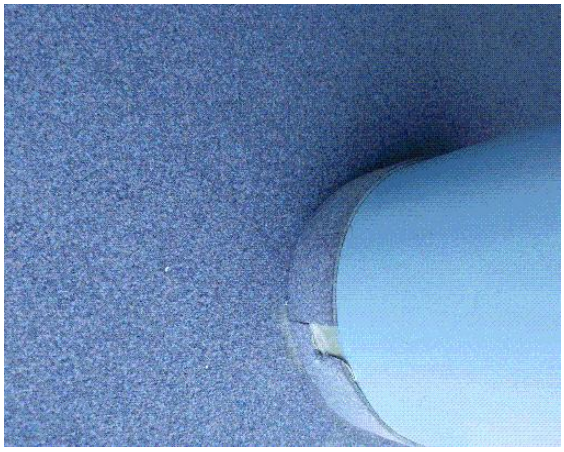

Prélèvement - P11 : E / SS / ESPACE DETENTE - Colle-
(Présence d'amiante)



Prélèvement - P12 : E / SS / ESPACE DETENTE - Colle-
(Présence d'amiante)


Copyright BUREAU VERITAS



Prélèvement - P13 : E / RDC / ESPACE DETENTE - Colle- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P14 : E / RDC / ESPACE DETENTE - Colle- (Présence d'amiante)

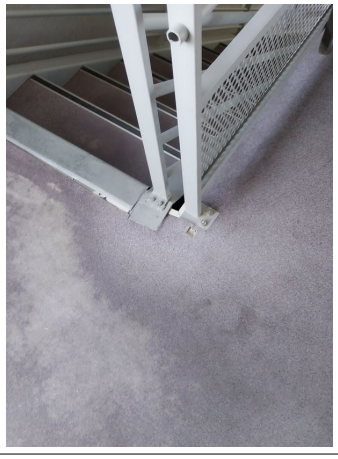


Prélèvement - P15 : E / R+1 / ESPACE DETENTE - Colle- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P16 : E / R+1 / ESPACE DETENTE - Colle- (Présence d'amiante)

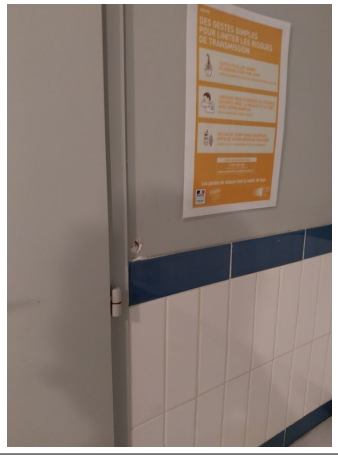

Prélèvement - P19 : E / RDC / WC HALL - Bande de plaque de plâtre- (Présence d'amiante)

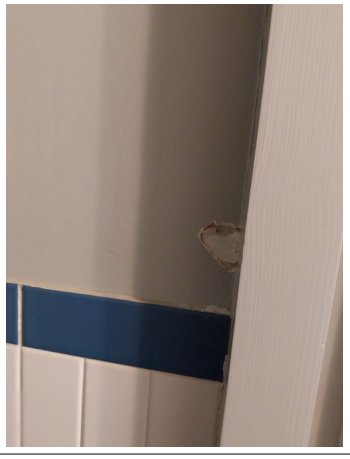

Prélèvement - P20 : E / RDC / WC HALL - Bande de plaque de plâtre- (Absence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS




Prélèvement - P21 : E / RDC / LABO PHOTOS - Colle de carrelage- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P22 : E / RDC / LABO PHOTOS - Colle de carrelage- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P23 : E / RDC / WC SERVICE - Enduit- (Présence d'amiante)

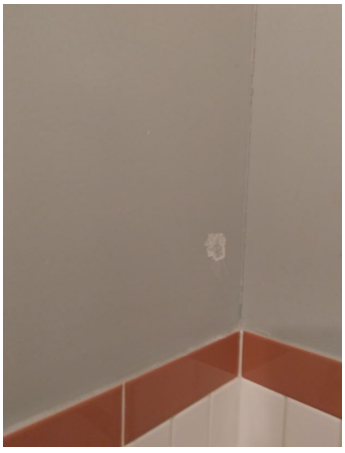

Prélèvement - P24 : E / RDC / WC SERVICE - Enduit- (Présence d'amiante)

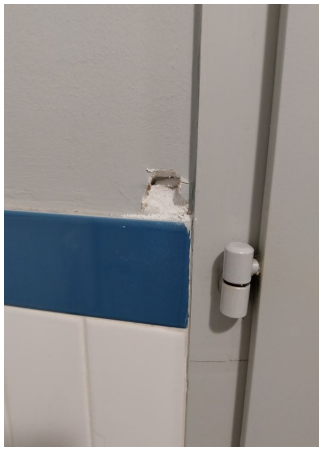


Prélèvement - P25 : E / R+1 / WC - Bande de plaque de plâtre- (Présence d'amiante)

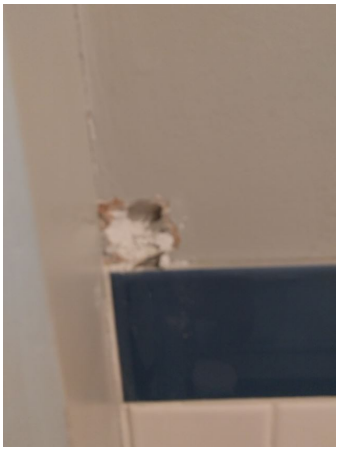


Prélèvement - P26 : E / R+1 / WC - Bande de plaque de plâtre- (Présence d'amiante)


Copyright BUREAU VERITAS

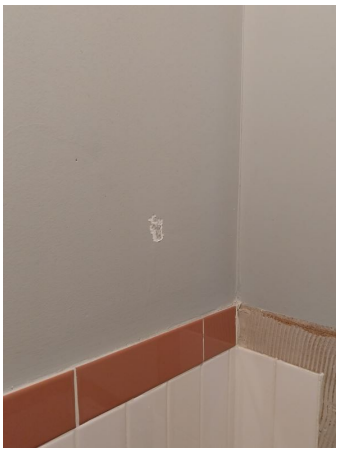

Prélèvement - P27 : E / R+4 / WC - Enduit- (Présence d'amiante)

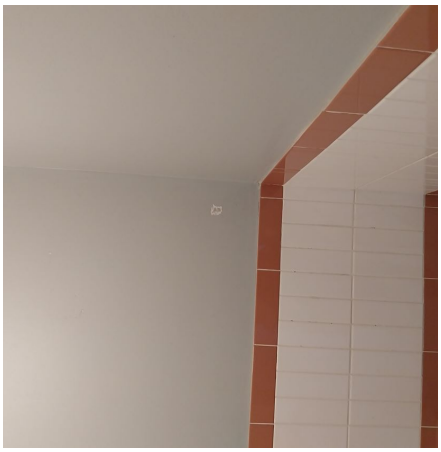

Prélèvement - P28 : E / R+4 / WC - Enduit- (Présence d'amiante)

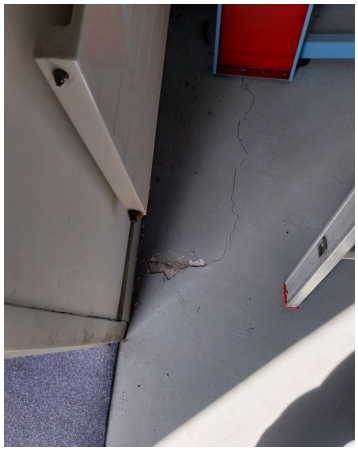


Prélèvement - P29 : E / R+4 / E403 - Peinture sur béton- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P30 : E / R+4 / E401 - Peinture sur béton- (Présence d'amiante)




Prélèvement - P31 : E / R+4 / E402 - Colle- (Absence d'amiante)

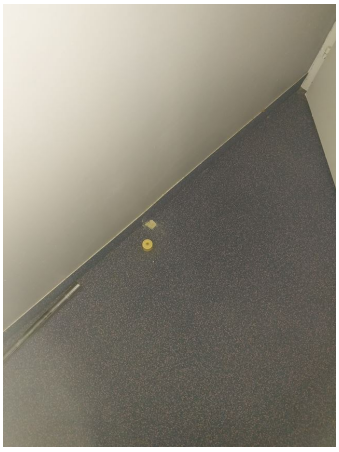

Prélèvement - P32 : E / R+4 / E402 - Colle- (Absence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS

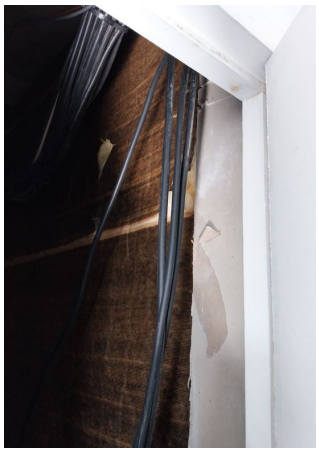

Prélèvement - P33 : E / R+4 / GN400 - Isolant- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P34 : E / R+4 / GN400 - Isolant- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P35 : E / COMBLES AMPHI / COMBLES - Bourre- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P36 : E / COMBLES AMPHI / COMBLES - Bourre- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P37 : E / COMBLES AMPHI / COMBLES - Isolant- (Absence d'amiante)

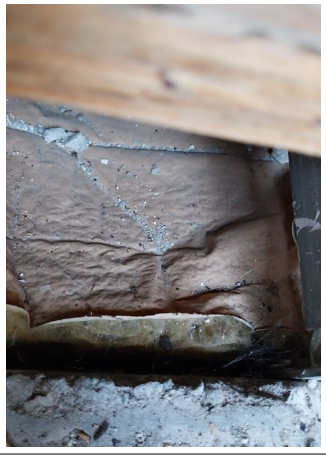

Prélèvement - P38 : E / COMBLES AMPHI / COMBLES - Isolant- (Absence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS



Prélèvement - P39 : E / COMBLES AMPHI / COMBLES - Isolant- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P40 : E / COMBLES AMPHI / COMBLES - Isolant- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P41 : E / COMBLES AMPHI / COMBLES - Isolant sous bardage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P42 : E / COMBLES AMPHI / COMBLES - Isolant sous bardage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P43 : E / EXTERIEUR / TOITURE - Mastic- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P44 : E / EXTERIEUR / TOITURE - Mastic- (Absence d'amiante)


Copyright BUREAU VERITAS



Prélèvement - P45 : E / EXTERIEUR / TOITURE - Calorifuge bourrelet- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P46 : E / EXTERIEUR / TOITURE - Calorifuge bourrelet- (Absence d'amiante)

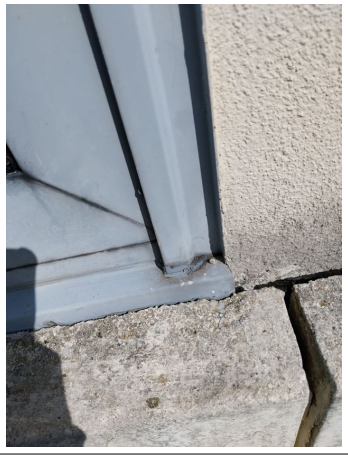

Prélèvement - P47 : E / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'assemblage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P48 : E / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'assemblage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P49 : E / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'assemblage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P50 : E / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'assemblage- (Absence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS



Prélèvement - P51 : E / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'assemblage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P52 : E / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'assemblage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P53 : E / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'étanchéité- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P54 : E / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'étanchéité- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P55 : E / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'assemblage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P56 : E / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'assemblage- (Absence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS



Prélèvement - P57 : E / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'assemblage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P58 : E / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'assemblage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P59 : E / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'assemblage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P60 : E / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'assemblage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P61 : E / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'assemblage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P62 : E / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'assemblage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P63 : E / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'assemblage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P64 : F / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'assemblage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P65 : F / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'assemblage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P66 : F / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'assemblage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P67 : F / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'assemblage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P68 : F / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'assemblage- (Absence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS



Prélèvement - P69 : F / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'étanchéité- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P70 : F / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'étanchéité- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P71 : F / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'assemblage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P72 : F / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'assemblage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P73 : G / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'assemblage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P74 : G / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'assemblage- (Absence d'amiante)


Copyright BUREAU VERITAS



Prélèvement - P75 : G / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'assemblage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P76 : G / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'assemblage- (Absence d'amiante)

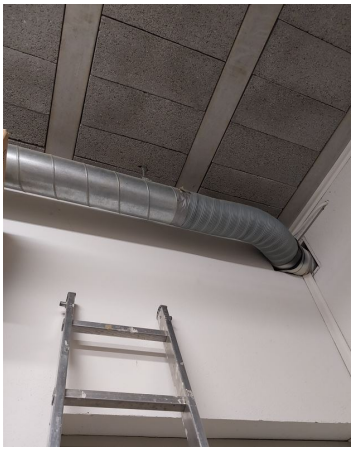


Prélèvement - P77 : E / RDC / ATELIER - Mastic- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P78 : E / RDC / ATELIER - Mastic- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P79 : E / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure- (Absence d'amiante)

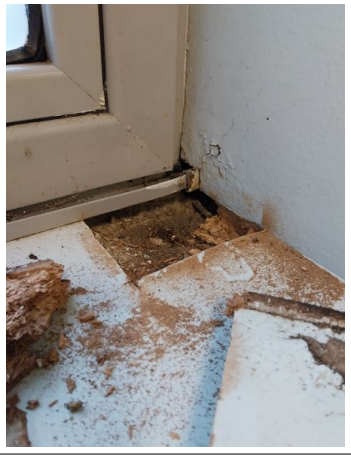


Prélèvement - P80 : E / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure- (Absence d'amiante)

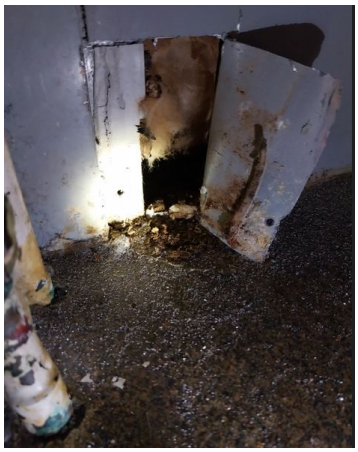

Prélèvement - P81 : E / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P82 : E / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure- (Absence d'amiante)

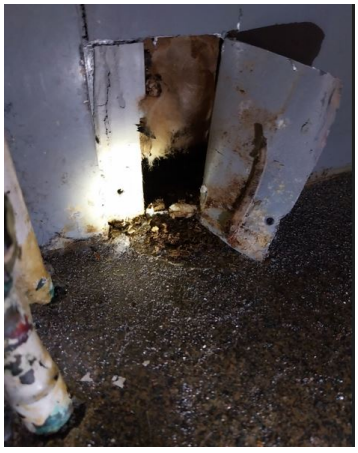


Prélèvement - P83 : E / EXTERIEUR / FACADES - Isolant- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P84 : E / EXTERIEUR / FACADES - Isolant- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P85 : E / EXTERIEUR / FACADES - Isolant- (Absence d'amiante)

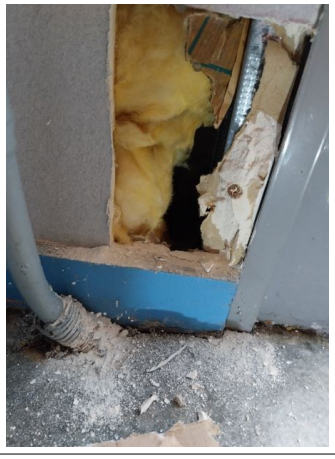

Prélèvement - P86 : E / EXTERIEUR / FACADES - Isolant- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P87 : E / EXTERIEUR / FACADES - Joint- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P88 : E / EXTERIEUR / FACADES - Joint- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P89 : E / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P90 : E / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure- (Absence d'amiante)

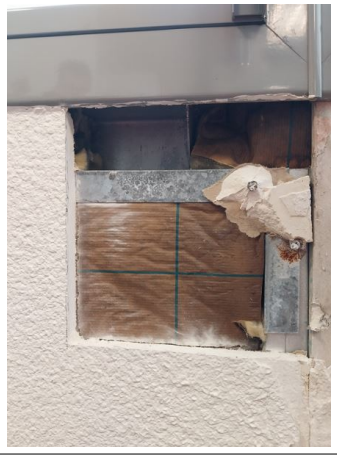

Prélèvement - P91 : E / EXTERIEUR / FACADES - Isolant- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P92 : E / EXTERIEUR / FACADES - Isolant- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P93 : E / EXTERIEUR / FACADES - Isolant- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P94 : E / EXTERIEUR / FACADES - Isolant- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P95 : E / EXTERIEUR / FACADES - Isolant- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P96 : E / EXTERIEUR / FACADES - Isolant- (Absence d'amiante)

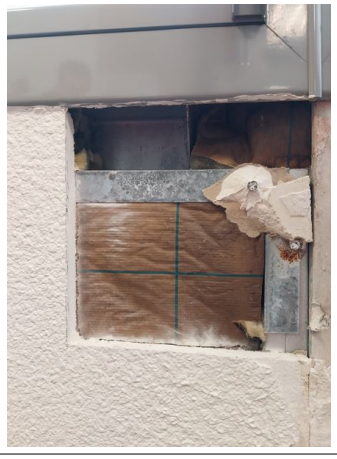

Prélèvement - P97 : E / EXTERIEUR / FACADES - Isolant- (Absence d'amiante)

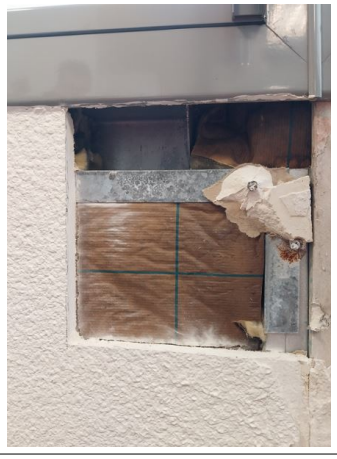

Prélèvement - P98 : E / EXTERIEUR / FACADES - Isolant- (Absence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS




Prélèvement - P99 : E / R+3 / TOITURE - Revêtement d'étanchéité- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P100 : E / R+3 / TOITURE - Pare-vapeur- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P101 : E / R+3 / TOITURE - Relevé d'étanchéité- (Absence d'amiante)

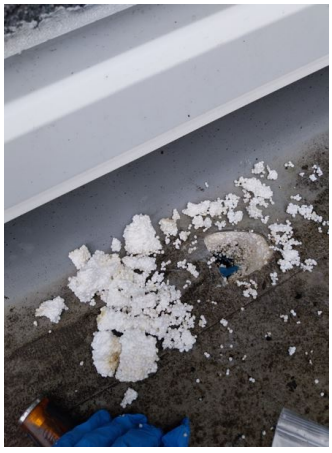

Prélèvement - P102 : E / R+3 / TOITURE - Revêtement d'étanchéité- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P103 : E / R+3 / TOITURE - Revêtement d'étanchéité- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P104 : E / R+3 / TOITURE - Pare-vapeur- (Absence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS

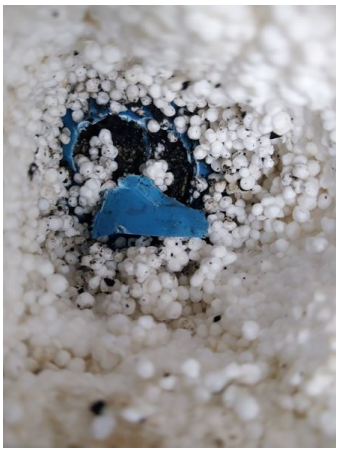

Prélèvement - P105 : E / R+3 / TOITURE - Pare-vapeur- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P106 : E / R+3 / TOITURE - Relevé d'étanchéité- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P107 : E / R+3 / TOITURE - Relevé d'étanchéité- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P108 : E / R+3 / TOITURE - Revêtement d'étanchéité- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P109 : E / R+3 / TOITURE - Revêtement d'étanchéité- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P110 : E / R+3 / TOITURE - Relevé d'étanchéité- (Absence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS



Prélèvement - P111 : E / R+3 / TOITURE - Relevé d'étanchéité- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P112 : E / R+3 / TOITURE - Revêtement d'étanchéité- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P113 : E / R+3 / TOITURE - Revêtement d'étanchéité- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P114 : E / R+3 / TOITURE - Pare-vapeur- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P115 : E / R+3 / TOITURE - Pare-vapeur- (Absence d'amiante)

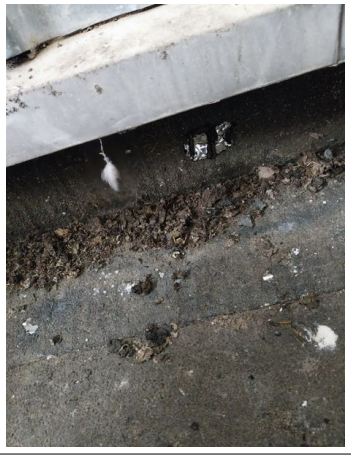

Prélèvement - P116 : E / R+3 / TOITURE - Relevé d'étanchéité- (Absence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS




Prélèvement - P117 : E / R+3 / TOITURE - Relevé d'étanchéité- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P118 : E / R+3 / TOITURE - Isolant- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P119 : E / R+3 / TOITURE - Mastic- (Absence d'amiante)

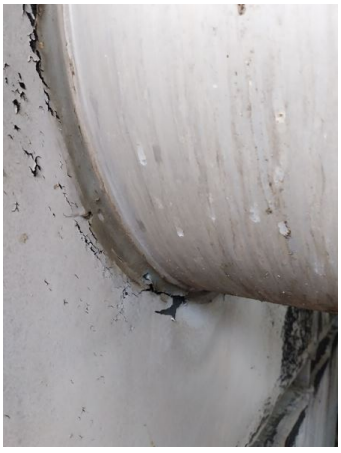

Prélèvement - P120 : E / R+3 / TOITURE - Mastic- (Absence d'amiante)

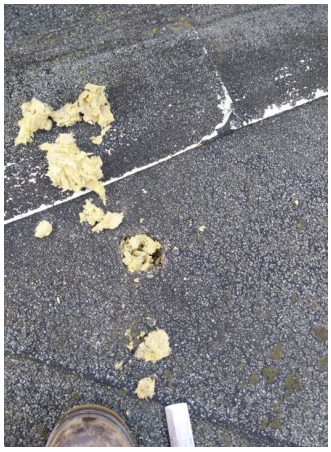

Prélèvement - P121 : F / EXTERIEUR / TOITURE - Revêtement d'étanchéité- (Absence d'amiante)

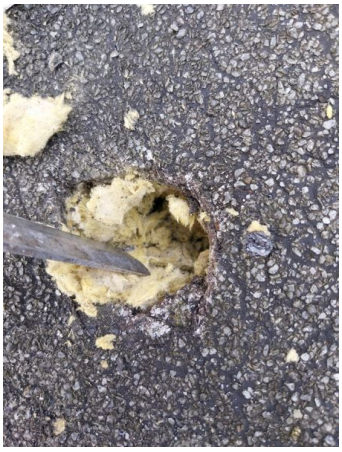

Prélèvement - P122 : F / EXTERIEUR / TOITURE - Revêtement d'étanchéité- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P123 : F / EXTERIEUR / TOITURE - Isolant- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P124 : F / EXTERIEUR / TOITURE - Mastic- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P125 : F / EXTERIEUR / TOITURE - Mastic- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P126 : G / EXTERIEUR / TOITURE - Revêtement d'étanchéité- (Absence d'amiante)

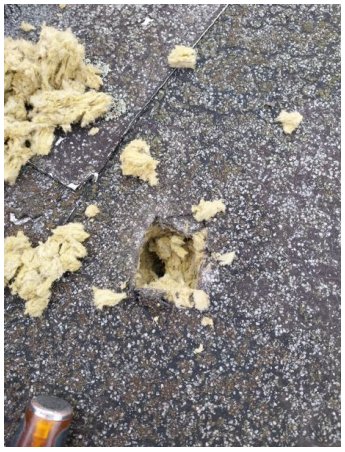


Prélèvement - P127 : G / EXTERIEUR / TOITURE - Revêtement d'étanchéité- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P128 : G / EXTERIEUR / TOITURE - Pare-vapeur- (Absence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS

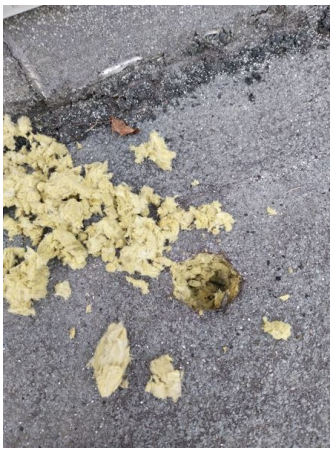

Prélèvement - P129 : G / EXTERIEUR / TOITURE - Revêtement d'étanchéité- (Absence d'amiante)

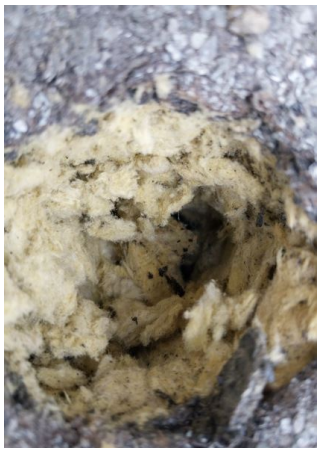

Prélèvement - P130 : G / EXTERIEUR / TOITURE - Pare-vapeur- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P131 : G / SS / CHAUFFERIE - Isolant- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P132 : G / SS / CHAUFFERIE - Joint de bride- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P133 : G / SS / CHAUFFERIE - Joint de bride- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P134 : G / SS / CHAUFFERIE - Enveloppe de calorifuge- (Absence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS




Prélèvement - P135 : E / R+3 / CHAUFFERIE - Isolant-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P136 : E / R+3 / CHAUFFERIE - Isolant-
(Absence d'amiante)




Prélèvement - P137 : E / R+3 / CHAUFFERIE - Calorifugeage-
(Absence d'amiante)

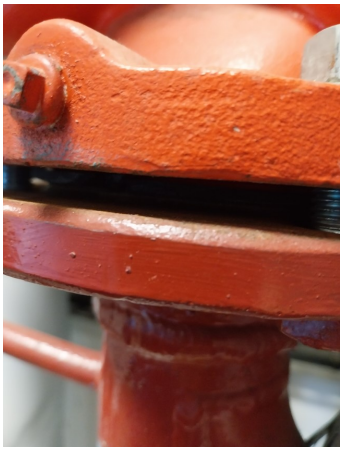

Prélèvement - P138 : E / R+3 / CHAUFFERIE - Joint de bride-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P139 : E / R+1 / ESPACE DETENTE - Colle-
(Présence d'amiante)

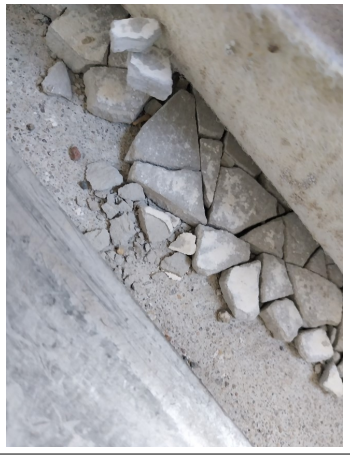

Prélèvement - P140 : E / R+1 / ESPACE DETENTE - Colle-
(Présence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS



Prélèvement - P141 : E / R+1 / ESPACE DETENTE - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P142 : E / R+1 / ESPACE DETENTE - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P143 : E / R+1 / SALLE 102 - Peinture- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P144 : E / R+1 / SALLE 102 - Enduit- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P145 : F / R+1 / CIRC 1 - Peinture- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P146 : F / R+1 / CIRC 1 - Enduit- (Présence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS




Prélèvement - P147 : E / EXTERIEUR / FACADES - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P148 : E / EXTERIEUR / FACADES - Enduit- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P149 : E / R+1 / CIRCULATION ADMIN - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P150 : E / R+1 / CIRCULATION ADMIN - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P151 : E / R+1 / CIRCULATION ADMIN - Peinture- (Absence d'amiante)

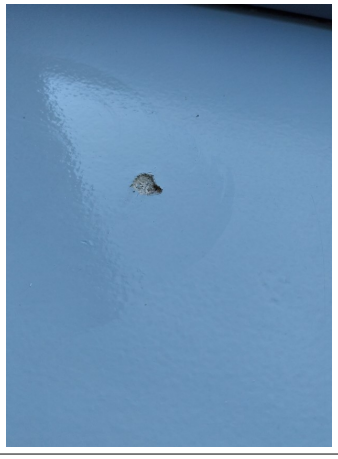

Prélèvement - P152 : E / R+1 / CIRCULATION ADMIN - Enduit- (Absence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS



Prélèvement - P153 : E / RDC / E010 - Peinture- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P154 : E / RDC / E010 - Enduit- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P155 : E / RDC / E029 - Peinture- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P156 : E / RDC / E029 - Enduit- (Présence d'amiante)




Prélèvement - P157 : E / RDC / E031 - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P158 : E / RDC / E031 - Enduit- (Présence d'amiante)


Copyright BUREAU VERITAS

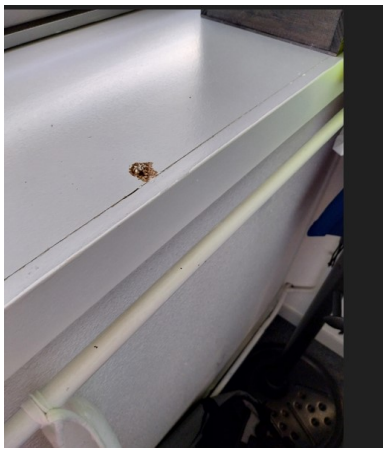


Prélèvement - P159 : E / RDC / E040 - Peinture- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P160 : E / RDC / E044 - Peinture- (Absence d'amiante)

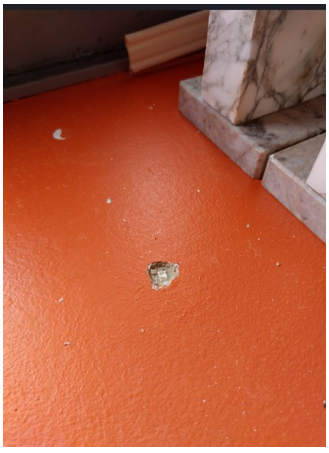


Prélèvement - P161 : E / R+1 / E116 - Peinture- (Absence d'amiante)

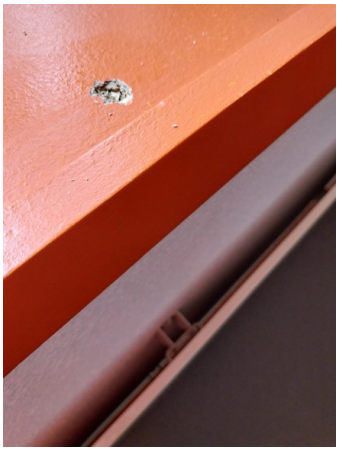

Prélèvement - P162 : E / R+1 / E116 - Enduit- (Présence d'amiante)

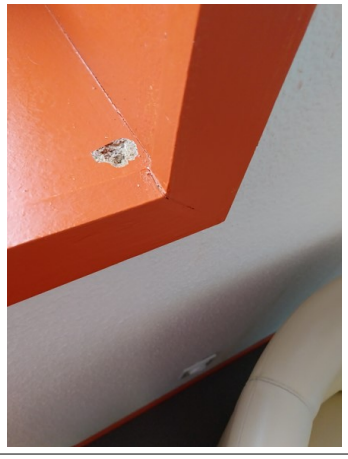

Prélèvement - P163 : E / R+1 / E121 - Peinture- (Absence d'amiante)

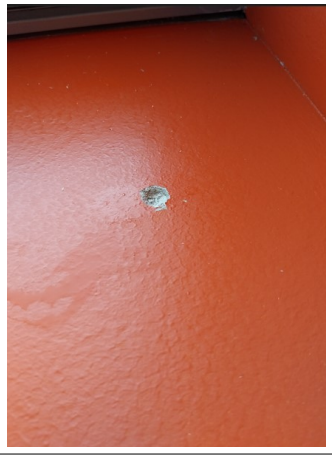

Prélèvement - P164 : E / R+1 / E121 - Enduit- (Absence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS



Prélèvement - P165 : E / R+1 / E133 - Peinture- (Présence d'amiante)




Prélèvement - P166 : E / R+1 / E133 - Enduit- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P167 : E / R+2 / E205 - Peinture- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P168 : E / R+2 / E205 - Enduit- (Présence d'amiante)

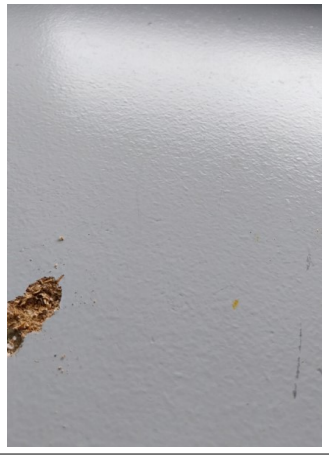

Prélèvement - P169 : E / R+2 / E204 - Peinture- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P170 : E / R+2 / E204 - Enduit- (Présence d'amiante)


Copyright BUREAU VERITAS



Prélèvement - P171 : E / R+2 / E204 - Peinture- (Présence d'amiante)




Prélèvement - P172 : E / R+2 / E204 - Enduit- (Présence d'amiante)

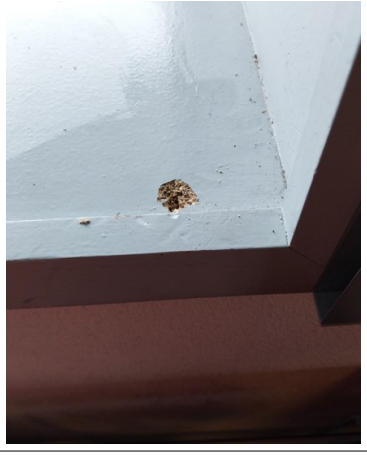

Prélèvement - P173 : E / R+3 / E303 - Peinture- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P174 : E / R+3 / E303 - Enduit- (Présence d'amiante)

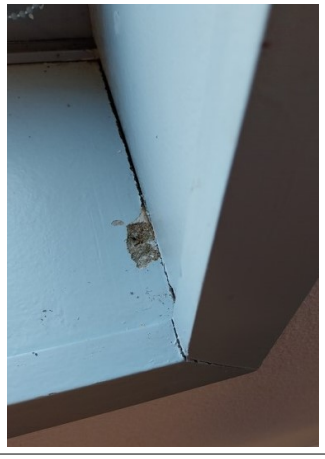

Prélèvement - P175 : E / R+3 / E314 - E301 - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P176 : E / R+3 / E314 - E301 - Enduit- (Présence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS



Déclaré - : E / SS / ESPACE DETENTE - Colle- (Présence d'amiante)



Déclaré - : E / SS / ESPACE DETENTE - Enduit- (Présence d'amiante)




Déclaré - : E / SS / ESPACE DETENTE - Enduit- (Présence d'amiante)



Déclaré - : E / R+4 / E401 - Peinture sur béton- (Présence d'amiante)



Déclaré - : E / EXTERIEUR / FACADES - Conduit- (Absence d'amiante)

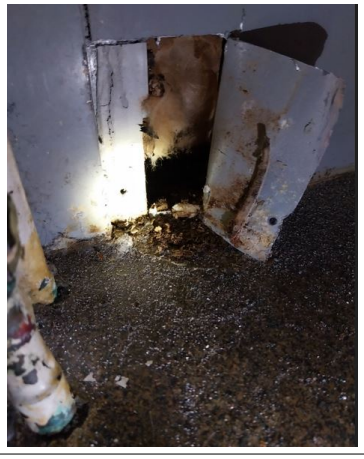

Déclaré - : E / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure- (Absence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS



Déclaré - : E / R+1 / SANITAIRE - Enduit- (Présence d'amiante)



Déclaré - : E / RDC / CIRC - Peinture- (Présence d'amiante)



Déclaré - : E / RDC / LOCAL MENAGE - Enduit- (Présence d'amiante)



Déclaré - : E / RDC / LOCAL TGBT - Plaque de caniveau- (Présence d'amiante)



Déclaré - : E / R+3 / CHAUFFERIE - Joint de bride- (Présence d'amiante)



Déclaré - : BATIMENT E / RDC / MACHINERIE ASCENSEUR - Conduit- (Présence d'amiante)

Déclaré - : E / RDC / MACHINERIE ASCENSEUR - Conduit de ventilation- (Présence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS



Déclaré - : E / R+3 / TOITURE - Revêtement d'étanchéité- (Absence d'amiante)



Déclaré - : G / SS / CIRC TECH - Joint coupe-feu- (Présence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS

7.4. Attestation d'assurance

Allianz

Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE Succursale en France** - 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex certifions par la présente que la société:

Bureau Veritas S.A.
Immeuble Newtime - 40/52 boulevard du Parc
92200 Neuilly sur Seine
France

agissant tant pour son compte que pour celui de sa filiale :

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 place des Saisons
92400 Courbevoie
France

est assurée auprès de notre compagnie par la police n° **FRL00157524** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber dans l'exercice de ses activités.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

Responsabilité Civile Exploitation /Responsabilité Civile Professionnelle.			
Tous dommages confondus (corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non)	1 000 000	EUR	Par sinistre et par année d'assurance

La garantie s'exerce dans le respect de la législation locale.

Période d'assurance du 01/01/2024 au 31/12/2024

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Paris La Défense, le 15/12/2023

Pour la Compagnie,

Signature de l'assureur/ of the insurer :

Signature autorisée/ Authorised signatory :

S PEREAU
Allianz
Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 Cours Michelet
CS 30051
92076 Paris La Défense
487 424 608 RCS Nanterre

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 Cours Michelet - CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

7.5. Certificat de compétence



BUREAU VERITAS
Certification

Certificat

Attribué à

Andréas LEROUX

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES

	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du Certificat*
Amiante avec mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	11/09/2022	10/09/2029
Amiante sans mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	11/09/2022	10/09/2029

Date :05/09/2022 Numéro de certificat : 15042964

Laurent Croguennec, Président

* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/certification-diag

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
Le Triangle de l'Arche, 9 cours du Triangle 92937 Paris-la-Défense CEDEX

cofrac
CERTIFICATION DE PERSONNES
ACCREDITATION N°4-0087
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

BUREAU VERITAS

7.6. Rapports d’essais de laboratoire

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Andreas LEROUX
Bâtiment OXANE – 4, rue Duguay Trouin
44800 SAINT HERBLAIN

Notre référence : AR-24-NS-049782-01

Numéro de dossier : 24W022903
Référence de dossier : 1510797435/23063510/S2/2/2_23063510/4/5

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 24W022903-001 - Référence *BV3LM7101 Réf. prél : P1 E/ R+3/ TOITURE CTA/Conduit - Mastic - (silicone/beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-002 - Référence *BV3LM7102 Réf. prél : P2 E/ R+3/ TOITURE CTA/Conduit - Mastic - (silicone/beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-003 - Référence *BV3LM7103 Réf. prél : P3 E/ R+3/ TOITURE CTA/Paroi des équipements - Isolant - (laine de verre/jaune/CONDUIT CTA)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-004 - Référence *BV3LM7104 Réf. prél : P4 E/ R+3/ TOITURE CTA/Paroi des équipements - Isolant - (laine de verre/jaune/CONDUIT CTA)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-005 - Référence *BV3LM7105 Réf. prél : P5 E/ SS/ ESPACE DETENTE/Revêtement en lé - Colle - (jaune/jaune/LINO PVC GRIS)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-006 - Référence *BV3LM7106 Réf. prél : P6 E/ SS/ ESPACE DETENTE/Revêtement en lé - Colle - (jaune/jaune/LINO PVC GRIS)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-007 - Référence *BV3LM7107 Réf. prél : P7 E/ SS/ ESPACE DETENTE/Plinthe - Colle - (jaune/jaune/LINO PVC)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-008 - Référence *BV3LM7108 Réf. prél : P8 E/ SS/ ESPACE DETENTE/Plinthe - Colle - (jaune/jaune/LINO PVC GRIS)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-009 - Référence *BV3LM7109 Réf. prél : P9 E/ SS/ ESPACE DETENTE/Moquette - Colle - (jaune/jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-010 - Référence *BV3LM7110 Réf. prél : P10 E/ SS/ ESPACE DETENTE/Moquette - Colle - (jaune/jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-011 - Référence *BV3LM7111 Réf. prél : P11 E/ SS/ ESPACE DETENTE/Plinthe - Colle - (jaune/jaune/MOQUETTE)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-012 - Référence *BV3LM7112 Réf. prél : P12 E/ SS/ ESPACE DETENTE/Plinthe - Colle - (jaune/jaune/MOQUETTE)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-013 - Référence *BV3LM7113 Réf. prél : P13 E/ RDC/ ESPACE DETENTE/Moquette - Colle - (jaune/jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-014 - Référence *BV3LM7114 Réf. prél : P14 E/ RDC/ ESPACE DETENTE/Plinthe - Colle - (jaune/jaune/MOQUETTE)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-015 - Référence *BV3LM7115 Réf. prél : P15 E/ R+1/ ESPACE DETENTE/Moquette - Colle - (jaune/jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-016 - Référence *BV3LM7116 Réf. prél : P16 E/ R+1/ ESPACE DETENTE/Plinthe - Colle - (jaune/jaune/MOQUETTE)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-017 - Référence *BV3LM7117 Réf. prél : P17 E/ R+1/ ESPACE DETENTE/Moquette - Colle - (blanche/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-018 - Référence *BV3LM7118 Réf. prél : P18 E/ R+1/ ESPACE DETENTE/Moquette - Colle - (blanche/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-019 - Référence *BV3LM7119 Réf. prél : P19 E/ RDC/ WC HALL/Cloison - Bande de plaque de plâtre - (plâtre/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-020 - Référence *BV3LM7120 Réf. prél : P20 E/ RDC/ WC HALL/Cloison - Bande de plaque de plâtre - (plâtre/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-021 - Référence *BV3LM7121 Réf. prél : P21 E/ RDC/ LABO PHOTOS/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment/gris(e)/20X20 GRIS)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-022 - Référence *BV3LM7122 Réf. prél : P22 E/ RDC/ LABO PHOTOS/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment/gris(e)/20X20 GRIS)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-023 - Référence *BV3LM7123 Réf. prél : P23 E/ RDC/ WC SERVICE/Mur - Enduit - (peint-plâtre/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-024 - Référence *BV3LM7124 Réf. prél : P24 E/ RDC/ WC SERVICE/Mur - Enduit - (peint-plâtre/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-025 - Référence *BV3LM7125 Réf. prél : P25 E/ R+1/ WC/Cloison - Bande de plaque de plâtre - (plâtre/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-026 - Référence *BV3LM7126 Réf. prél : P26 E/ R+1/ WC/Cloison - Bande de plaque de plâtre - (plâtre/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-027 - Référence *BV3LM7127 Réf. prél : P27 E/ R+4/ WC/Mur - Enduit - (peint-plâtre/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-028 - Référence *BV3LM7128 Réf. prél : P28 E/ R+4/ WC/Mur - Enduit - (peint-plâtre/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-029 - Référence *BV3LM7129 Réf. prél : P29 E/ R+4/ E403/Revêtement de sol - Peinture sur béton - (décorative/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-030 - Référence *BV3LM7130 Réf. prél : P30 E/ R+4/ E401/Revêtement de sol - Peinture sur béton - (décorative/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-031 - Référence *BV3LM7131 Réf. prél : P31 E/ R+4/ E402/Moquette - Colle - (jaune/jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-032 - Référence *BV3LM7132 Réf. prél : P32 E/ R+4/ E402/Moquette - Colle - (jaune/jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-033 - Référence *BV3LM7133 Réf. prél : P33 E/ R+4/ GN400/Mur - Isolant - (laine de verre/jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-034 - Référence *BV3LM7134 Réf. prél : P34 E/ R+4/ GN400/Mur - Isolant - (laine de verre/jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-035 - Référence *BV3LM7135 Réf. prél : P35 E/ COMBLES AMPHI/ COMBLES/Equipement - Bourre - (fibreux/beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-036 - Référence *BV3LM7136 Réf. prél : P36 E/ COMBLES AMPHI/ COMBLES/Equipement - Bourre - (fibreux/beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-037 - Référence *BV3LM7137 Réf. prél : P37 E/ COMBLES AMPHI/ COMBLES/Plancher - Isolant - (laine de verre/jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-038 - Référence *BV3LM7138 Réf. prél : P38 E/ COMBLES AMPHI/ COMBLES/Plancher - Isolant - (laine de verre/jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-039 - Référence *BV3LM7139 Réf. prél : P39 E/ COMBLES AMPHI/ COMBLES/Paroi des équipements - Isolant - (laine de verre/jaune/CALO CTA)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-040 - Référence *BV3LM7140 Réf. prél : P40 E/ COMBLES AMPHI/ COMBLES/Paroi des équipements - Isolant - (laine de verre/jaune/CTA CALO)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-041 - Référence *BV3LM7141 Réf. prél : P41 E/ COMBLES AMPHI/ COMBLES/Bardage - Isolant sous bardage - (laine de verre/jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-042 - Référence *BV3LM7142 Réf. prél : P42 E/ COMBLES AMPHI/ COMBLES/Bardage - Isolant sous bardage - (laine de verre/jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-043 - Référence *BV3LM7143 Réf. prél : P43 E/ EXTERIEUR/ TOITURE/Conduit - Mastic - (silicone/beige/CTA)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-044 - Référence *BV3LM7144 Réf. prél : P44 E/ EXTERIEUR/ TOITURE/Conduit - Mastic - (silicone/beige/CTA)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-045 - Référence *BV3LM7145 Réf. prél : P45 E/ EXTERIEUR/ TOITURE/Conduit - Calorifuge bourrelet - (tissu/noir(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-046 - Référence *BV3LM7146 Réf. prél : P46 E/ EXTERIEUR/ TOITURE/Conduit - Calorifuge bourrelet - (tissu/noir(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-047 - Référence *BV3LM7147 Réf. prél : P47 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/gris(e)/FENETRE 1)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-048 - Référence *BV3LM7148 Réf. prél : P48 E/ EXTERIEUR/ FACADES - Joint d'assemblage - (mastic/blanc(he)/FENETRE 1)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-049 - Référence *BV3LM7149 Réf. prél : P49 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/noir(e)/FENETRE 1)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-050 - Référence *BV3LM7150 Réf. prél : P50 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/gris(e)/PORTE 2)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-051 - Référence *BV3LM7151 Réf. prél : P51 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/blanc(he)/PORTE 2)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-052 - Référence *BV3LM7152 Réf. prél : P52 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/noir(e)/PORTE 2)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-053 - Référence *BV3LM7153 Réf. prél : P53 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'étanchéité - (mastic/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-054 - Référence *BV3LM7154 Réf. prél : P54 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'étanchéité - (mastic/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-055 - Référence *BV3LM7155 Réf. prél : P55 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/noir(e)/FENETRE 3)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-056 - Référence *BV3LM7156 Réf. prél : P56 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/noir(e)/FENETRE 3)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-057 - Référence *BV3LM7157 Réf. prél : P57 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/noir(e)/FENETRE 4)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-058 - Référence *BV3LM7158 Réf. prél : P58 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/noir(e)/FENETRE 4)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-059 - Référence *BV3LM7159 Réf. prél : P59 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/beige/FEENTRE 4)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-060 - Référence *BV3LM7160 Réf. prél : P60 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/beige/FENETRE 4)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-061 - Référence *BV3LM7161 Réf. prél : P61 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/noir(e)/FENETRE 1)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-062 - Référence *BV3LM7162 Réf. prél : P62 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/blanc(he)/FENETRE 1)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-063 - Référence *BV3LM7163 Réf. prél : P63 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/gris(e)/FENETRE 1)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-064 - Référence *BV3LM7164 Réf. prél : P64 F/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/noir(e)/PORTE 5)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-065 - Référence *BV3LM7165 Réf. prél : P65 F/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/beige/PORTE 5)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-066 - Référence *BV3LM7166 Réf. prél : P66 F/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/gris(e)/PORTE 5)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-067 - Référence *BV3LM7167 Réf. prél : P67 F/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/noir(e)/FENETRE 6)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-068 - Référence *BV3LM7168 Réf. prél : P68 F/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/beige/FENETRE 6)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-069 - Référence *BV3LM7169 Réf. prél : P69 F/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'étanchéité - (mastic/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-070 - Référence *BV3LM7170 Réf. prél : P70 F/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'étanchéité - (mastic/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-071 - Référence *BV3LM7171 Réf. prél : P71 F/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/noir(e)/FENETRE 7)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-072 - Référence *BV3LM7172 Réf. prél : P72 F/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/gris(e)/FENETRE 7)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-073 - Référence *BV3LM7173 Réf. prél : P73 G/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/noir(e)/PORTE 8)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-074 - Référence *BV3LM7174 Réf. prél : P74 G/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/blanc(he)/PORTE 8)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-075 - Référence *BV3LM7175 Réf. prél : P75 G/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/noir(e)/PORTE 9)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-076 - Référence *BV3LM7176 Réf. prél : P76 G/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/blanc(he)/PORTE 9)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-077 - Référence *BV3LM7177 Réf. prél : P77 E/ RDC/ ATELIER/Conduit - Mastic - (compact/jaune/BANDE)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-078 - Référence *BV3LM7178 Réf. prél : P78 E/ RDC/ ATELIER/Conduit - Mastic - (compact/jaune/BANDE)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

eurofins

acreditat pentru ÎNCERCARE
RENAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1229

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT OUEST SAS
Laboratoire Analyses Nantes
EUROFINS ABO
Site de la Géraudière
Rue Pierre Adolphe Bobierre - CS90827
44300 NANTES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-029812-01
Référence laboratoire N° : 24RB026091
Reçu au laboratoire le : 27/08/2024
Date d'analyse : 28/08/2024
Référence dossier Client:24W022903 - 1510797435/23063510/S2/2/2_23063510/4/5

Date d'émission de rapport : 02/09/2024 15:18
Référence de suivi du dossier N° : 24W022903
Date de réception :26/08/2024

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	24W022903-001 - BV3LM7101 Réf. prél : P1 E/ R+3/ TOITURE CTA/Conduit - Mastic - (silicone/beige)	Matériau souple de type joint (gris) ; matériau (pulvérulent) (noir)	**MET** / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	24W022903-002 - BV3LM7102 Réf. prél : P2 E/ R+3/ TOITURE CTA/Conduit - Mastic - (silicone/beige)	Matériau souple de type joint (gris) ; matériau semi-dur (gris)	**MET** / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	24W022903-003 - BV3LM7103 Réf. prél : P3 E/ R+3/ TOITURE CTA/Paroi des équipements - Isolant - (laine de verre/jaune/CONDUIT CTA)	Matériau fibreux de type isolant (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris)	**MET** / R6EW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (blanc)	**MOLP** / R5SV	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
004	24W022903-004 - BV3LM7104 Réf. prél : P4 E/ R+3/ TOITURE CTA/Paroi des équipements - Isolant - (laine de verre/jaune/CONDUIT CTA)	Matériau fibreux de type isolant (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris)	**MET** / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (blanc)	**MOLP** / R5SV	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-029812-01 | Date d'émission de rapport : 02/09/2024 15:18 | Page2/20
Référence laboratoire N° : 24RB026091 | Référence de suivi du dossier N° : 24W022903
Reçu au laboratoire le : 27/08/2024 | Date de réception :26/08/2024
Date d'analyse : 28/08/2024
Référence dossier Client:24W022903 - 1510797435/23063510/S2/2/2_23063510/4/5

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	24W022903-005 - BV3LM7105 Réf. prél : P5 E/ SS/ ESPACE DETENTE/Revêtement en lé - Colle - (jaune/jaune/LINO PVC GRIS)	Matériau semi-dur de type revêtement de sol (fibreux) (gris)	**MET** / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	**MET** / FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	24W022903-006 - BV3LM7106 Réf. prél : P6 E/ SS/ ESPACE DETENTE/Revêtement en lé - Colle - (jaune/jaune/LINO PVC GRIS)	Matériau semi-dur de type revêtement de sol (fibreux) (gris)	**MET** / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	24W022903-007 - BV3LM7107 Réf. prél : P7 E/ SS/ ESPACE DETENTE/Plinthe - Colle - (jaune/jaune/LINO PVC)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (gris)	**MET** / UZZ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (gris)	**MET** / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-029812-01
Référence laboratoire N° : 24RB026091
Reçu au laboratoire le : 27/08/2024
Date d'analyse : 28/08/2024
Référence dossier Client:24W022903 - 1510797435/23063510/S2/2/2_23063510/4/5

Date d'émission de rapport : 02/09/2024 15:18
Référence de suivi du dossier N° : 24W022903
Date de réception :26/08/2024

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008	24W022903-008 - BV3LM7108 Réf. prél : P8 E/ SS/ ESPACE DETENTE/Plinthe - Colle - (jaune/jaune/LINO PVC GRIS)	Matériau semi-dur de type revêtement de sol (fibreux) (gris)	**MET** / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type maillage de fibres et liant (gris) ; matériau de type peinture (gris)	**MET** / VT6S	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009 (1)	24W022903-009 - BV3LM7109 Réf. prél : P9 E/ SS/ ESPACE DETENTE/Moquette - Colle - (jaune/jaune)	Matériau souple fibreux de type moquette (violet) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	24W022903-010 - BV3LM7110 Réf. prél : P10 E/ SS/ ESPACE DETENTE/Moquette - Colle - (jaune/jaune)	Matériau souple fibreux de type moquette (violet) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (fibreux) (blanc)	**MET** / GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
011 (2)	24W022903-011 - BV3LM7111 Réf. prél : P11 E/ SS/ ESPACE DETENTE/Plinthe - Colle - (jaune/jaune/MOQUETTE)	Matériau souple fibreux de type moquette (gris) + (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (pulvérulent) (blanc)	**MET** / R6EW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-029812-01
Référence laboratoire N° : 24RB026091
Reçu au laboratoire le : 27/08/2024
Date d'analyse : 28/08/2024
Référence dossier Client:24W022903 - 1510797435/23063510/S2/2/2_23063510/4/5

Date d'émission de rapport : 02/09/2024 15:18
Référence de suivi du dossier N° : 24W022903
Date de réception :26/08/2024

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012 (2)	24W022903-012 - BV3LM7112 Réf. prél : P12 E/ SS/ ESPACE DETENTE/Plinthe - Colle - (jaune/jaune/MOQUETTE)	Matériau souple fibreux de type moquette (gris) + (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	**MET** / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
013 (1)	24W022903-013 - BV3LM7113 Réf. prél : P13 E/ RDC/ ESPACE DETENTE/Moquette - Colle - (jaune/jaune)	Matériau souple fibreux de type moquette (de différentes couleurs) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** / PUU9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014 (2)	24W022903-014 - BV3LM7114 Réf. prél : P14 E/ RDC/ ESPACE DETENTE/Plinthe - Colle - (jaune/jaune/MOQUETTE)	Matériau souple fibreux de type moquette (de différentes couleurs) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau semi-dur (gris) en traces	**MET** / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
015 (2)	24W022903-015 - BV3LM7115 Réf. prél : P15 E/ R+1/ ESPACE DETENTE/Moquette - Colle - (jaune/jaune)	Matériau souple fibreux de type moquette (de différentes couleurs) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** / GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-029812-01
Référence laboratoire N° : 24RB026091
Reçu au laboratoire le : 27/08/2024
Date d'analyse : 28/08/2024
Référence dossier Client:24W022903 - 1510797435/23063510/S2/2/2_23063510/4/5

Date d'émission de rapport : 02/09/2024 15:18
Référence de suivi du dossier N° : 24W022903
Date de réception :26/08/2024

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016 (3)	24W022903-016 - BV3LM7116 Réf. prél : P16 E/ R+1/ ESPACE DETENTE/Plinthe - Colle - (jaune/jaune/MOQUETTE)	Matériau souple fibreux de type moquette (de différentes couleurs) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	**MET** / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
017 (4)	24W022903-017 - BV3LM7117 Réf. prél : P17 E/ R+1/ ESPACE DETENTE/Moquette - Colle - (blanche/blanc(he))	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (fibreux) (beige) ; matériau semi-dur (gris)	**MOLP** / FN5U	3 / 3	-	Quantité insuffisante
018 (4)	24W022903-018 - BV3LM7118 Réf. prél : P18 E/ R+1/ ESPACE DETENTE/Moquette - Colle - (blanche/blanc(he))	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (fibreux) (beige) ; matériau semi-dur (gris)	**MOLP** / FN5U	3 / 3	-	Quantité insuffisante
019	24W022903-019 - BV3LM7119 Réf. prél : P19 E/ RDC/ WC HALL/Cloison - Bande de plaque de plâtre - (plâtre/blanc(he))	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	**MET** / GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** / FK6R	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-029812-01
Référence laboratoire N° : 24RB026091
Reçu au laboratoire le : 27/08/2024
Date d'analyse : 28/08/2024
Référence dossier Client:24W022903 - 1510797435/23063510/S2/2/2_23063510/4/5

Date d'émission de rapport : 02/09/2024 15:18
Référence de suivi du dossier N° : 24W022903
Date de réception :26/08/2024

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / MA8A	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020 (5)	24W022903-020 - BV3LM7120 Réf. prél : P20 E/ RDC/ WC HALL/Cloison - Bande de plaque de plâtre - (plâtre/blanc(he))	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** / FK6R	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
021	24W022903-021 - BV3LM7121 Réf. prél : P21 E/ RDC/ LABO PHOTOS/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment/gris(e)/20X20 GRIS)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) + (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	**MET** / GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	24W022903-022 - BV3LM7122 Réf. prél : P22 E/ RDC/ LABO PHOTOS/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment/gris(e)/20X20 GRIS)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) + (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (fibreux) (beige) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	**MET** / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023 (3)	24W022903-023 - BV3LM7123 Réf. prél : P23 E/ RDC/ WC SERVICE/Mur - Enduit - (peint-plâtre/blanc(he))	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (fibreux) (blanc)	**MET** / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-029812-01 | Date d'émission de rapport : 02/09/2024 15:18 | Page7/20
Référence laboratoire N° : 24RB026091 | Référence de suivi du dossier N° : 24W022903
Reçu au laboratoire le : 27/08/2024 | Date de réception :26/08/2024
Date d'analyse : 28/08/2024
Référence dossier Client:24W022903 - 1510797435/23063510/S2/2/2_23063510/4/5

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
024 (3)	24W022903-024 - BV3LM7124 Réf. prél : P24 E/ RDC/ WC SERVICE/Mur - Enduit - (peint-plâtre/blanc(he))	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (fibreux) (blanc)	**MET** / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
025	24W022903-025 - BV3LM7125 Réf. prél : P25 E/ R+1/ WC/Cloison - Bande de plaque de plâtre - (plâtre/blanc(he))	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	**MET** / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** / FK6R	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026	24W022903-026 - BV3LM7126 Réf. prél : P26 E/ R+1/ WC/Cloison - Bande de plaque de plâtre - (plâtre/blanc(he))	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	**MET** / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** / FK6R	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-029812-01 | Date d'émission de rapport : 02/09/2024 15:18 | Page8/20
Référence laboratoire N° : 24RB026091 | Référence de suivi du dossier N° : 24W022903
Reçu au laboratoire le : 27/08/2024 | Date de réception :26/08/2024
Date d'analyse : 28/08/2024
Référence dossier Client:24W022903 - 1510797435/23063510/S2/2/2_23063510/4/5

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027 (3)	24W022903-027 - BV3LM7127 Réf. prél : P27 E/ R+4/ WC/Mur - Enduit - (peint-plâtre/blanc(he))	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (fibreux) (blanc)	**MET** / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
028 (3)	24W022903-028 - BV3LM7128 Réf. prél : P28 E/ R+4/ WC/Mur - Enduit - (peint-plâtre/blanc(he))	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (fibreux) (blanc)	**MET** / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
029	24W022903-029 - BV3LM7129 Réf. prél : P29 E/ R+4/ E403/Revêtement de sol - Peinture sur béton - (décorative/gris(e))	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (fibreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau semi-dur (beige) en traces	**MET** / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
030 (2) (3)	24W022903-030 - BV3LM7130 Réf. prél : P30 E/ R+4/ E401/Revêtement de sol - Peinture sur béton - (décorative/gris(e))	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	**MET** / GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
031	24W022903-031 - BV3LM7131 Réf. prél : P31 E/ R+4/ E402/Moquette - Colle - (jaune/jaune)	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** / MA8A	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-029812-01 | Date d'émission de rapport : 02/09/2024 15:18 | Page9/20
Référence laboratoire N° : 24RB026091 | Référence de suivi du dossier N° : 24W022903
Reçu au laboratoire le : 27/08/2024 | Date de réception :26/08/2024
Date d'analyse : 28/08/2024
Référence dossier Client:24W022903 - 1510797435/23063510/S2/2/2_23063510/4/5

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
032	24W022903-032 - BV3LM7132 Réf. prél : P32 E/ R+4/ E402/Moquette - Colle - (jaune/jaune)	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / MA8A	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033	24W022903-033 - BV3LM7133 Réf. prél : P33 E/ R+4/ GN400/Mur - Isolant - (laine de verre/jaune)	Matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (marron) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MET** / MA8A	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MOLP** / QZM8	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
034	24W022903-034 - BV3LM7134 Réf. prél : P34 E/ R+4/ GN400/Mur - Isolant - (laine de verre/jaune)	Matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (marron) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MET** / MA8A	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MOLP** / QZM8	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
035	24W022903-035 - BV3LM7135 Réf. prél : P35 E/ COMBLES AMPHI/ COMBLES/Equipement - Bourre - (fibreux/beige)	Matériau semi-dur (fibreux) (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	**MET** / MA8A	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-029812-01 | Date d'émission de rapport : 02/09/2024 15:18 | Page10/20
Référence laboratoire N° : 24RB026091 | Référence de suivi du dossier N° : 24W022903
Reçu au laboratoire le : 27/08/2024 | Date de réception :26/08/2024
Date d'analyse : 28/08/2024
Référence dossier Client:24W022903 - 1510797435/23063510/S2/2/2_23063510/4/5

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
036	24W022903-036 - BV3LM7136 Réf. prél : P36 E/ COMBLES AMPHI/ COMBLES/Equipement - Bourre - (fibreux/beige)	Matériau semi-dur (fibreux) (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	**MET** / MA8A	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037	24W022903-037 - BV3LM7137 Réf. prél : P37 E/ COMBLES AMPHI/ COMBLES/Plancher - Isolant - (laine de verre/jaune)	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (pulvérulent) (noir)	**MET** / PUU9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** / MM9M	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MOLP** / MM9M	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
038	24W022903-038 - BV3LM7138 Réf. prél : P38 E/ COMBLES AMPHI/ COMBLES/Plancher - Isolant - (laine de verre/jaune)	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (pulvérulent) (noir)	**MET** / PUU9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** / MM9M	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MOLP** / MM9M	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-029812-01
Référence laboratoire N° : 24RB026091
Reçu au laboratoire le : 27/08/2024
Date d'analyse : 28/08/2024
Référence dossier Client:24W022903 - 1510797435/23063510/S2/2/2_23063510/4/5

Date d'émission de rapport : 02/09/2024 15:18
Référence de suivi du dossier N° : 24W022903
Date de réception :26/08/2024

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
039	24W022903-039 - BV3LM7139 Réf. prél : P39 E/ COMBLES AMPHI/ COMBLES/Paroi des équipements - Isolant - (laine de verre/jaune/CALO CTA	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MET** / PUU9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MOLP** / MM9M	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
040	24W022903-040 - BV3LM7140 Réf. prél : P40 E/ COMBLES AMPHI/ COMBLES/Paroi des équipements - Isolant - (laine de verre/jaune/CTA CALO	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MET** / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MOLP** / S7PM	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
041	24W022903-041 - BV3LM7141 Réf. prél : P41 E/ COMBLES AMPHI/ COMBLES/Bardage - Isolant sous bardage - (laine de verre/jaune)	Matériau fibreux de type isolant (beige) ; matériau (pulvérulent) (noir)	**MET** / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (beige)	**MOLP** / S7PM	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
042	24W022903-042 - BV3LM7142 Réf. prél : P42 E/ COMBLES AMPHI/ COMBLES/Bardage - Isolant sous bardage - (laine de verre/jaune)	Matériau fibreux de type isolant (beige) ; matériau (pulvérulent) (noir)	**MET** / VT6S	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (beige)	**MOLP** / S7PM	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-029812-01
Référence laboratoire N° : 24RB026091
Reçu au laboratoire le : 27/08/2024
Date d'analyse : 28/08/2024
Référence dossier Client:24W022903 - 1510797435/23063510/S2/2/2_23063510/4/5

Date d'émission de rapport : 02/09/2024 15:18
Référence de suivi du dossier N° : 24W022903
Date de réception :26/08/2024

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
043	24W022903-043 - BV3LM7143 Réf. prél : P43 E/ EXTERIEUR/ TOITURE/Conduit - Mastic - (silicone/beige/CTA)	Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple de type joint (gris)	**MET** / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
044	24W022903-044 - BV3LM7144 Réf. prél : P44 E/ EXTERIEUR/ TOITURE/Conduit - Mastic - (silicone/beige/CTA)	Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple de type joint (gris)	**MET** / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
045	24W022903-045 - BV3LM7145 Réf. prél : P45 E/ EXTERIEUR/ TOITURE/Conduit - Calorifuge bourrelet - (tissu/noir(e))	Matériau de type peinture (gris) ; matériau (vert) ; matériau de type mousse (noir)	**MET** / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
046	24W022903-046 - BV3LM7146 Réf. prél : P46 E/ EXTERIEUR/ TOITURE/Conduit - Calorifuge bourrelet - (tissu/noir(e))	Matériau de type peinture (gris) ; matériau (vert) ; matériau de type mousse (noir)	**MET** / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
047	24W022903-047 - BV3LM7147 Réf. prél : P47 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d''assemblage - (mastic/gris(e)/FENETRE 1)	Matériau souple de type joint (gris)	**MET** / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-029812-01 | Date d'émission de rapport : 02/09/2024 15:18 | Page13/20
Référence laboratoire N° : 24RB026091 | Référence de suivi du dossier N° : 24W022903
Reçu au laboratoire le : 27/08/2024 | Date de réception :26/08/2024
Date d'analyse : 28/08/2024
Référence dossier Client:24W022903 - 1510797435/23063510/S2/2/2_23063510/4/5

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
048	24W022903-048 - BV3LM7148 Réf. prél : P48 E/ EXTERIEUR/ FACADES - Joint d''assemblage - (mastic/blanc(he)/FENETRE 1)	Matériau souple de type joint (gris)	**MET** / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
049	24W022903-049 - BV3LM7149 Réf. prél : P49 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d''assemblage - (mastic/noir(e)/FENETRE 1)	Matériau souple de type joint (noir)	**MET** / MA8A	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
050	24W022903-050 - BV3LM7150 Réf. prél : P50 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d''assemblage - (mastic/gris(e)/PORTE 2)	Matériau souple de type joint (transparent) ; matériau (pulvérulent) (gris)	**MET** / MA8A	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
051 (3)	24W022903-051 - BV3LM7151 Réf. prél : P51 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d''assemblage - (mastic/blanc(he)/PORTE 2)	Matériau souple de type joint (gris)	**MET** / MA8A	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
052	24W022903-052 - BV3LM7152 Réf. prél : P52 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d''assemblage - (mastic/noir(e)/PORTE 2)	Matériau souple de type joint (noir) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	**MET** / MA8A	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-029812-01
Référence laboratoire N° : 24RB026091
Reçu au laboratoire le : 27/08/2024
Date d'analyse : 28/08/2024
Référence dossier Client:24W022903 - 1510797435/23063510/S2/2/2_23063510/4/5

Date d'émission de rapport : 02/09/2024 15:18
Référence de suivi du dossier N° : 24W022903
Date de réception :26/08/2024

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
053	24W022903-053 - BV3LM7153 Réf. prél : P53 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d''étanchéité - (mastic/gris(e))	Matériau souple de type joint (gris)	**MET** / MA8A	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
054	24W022903-054 - BV3LM7154 Réf. prél : P54 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d''étanchéité - (mastic/gris(e))	Matériau souple de type joint (gris)	**MET** / MA8A	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
055	24W022903-055 - BV3LM7155 Réf. prél : P55 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d''assemblage - (mastic/noir(e)/FENETRE 3)	Matériau souple de type joint (noir) ; matériau semi-dur (gris) en traces en traces	**MET** / MA8A	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
056	24W022903-056 - BV3LM7156 Réf. prél : P56 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d''assemblage - (mastic/noir(e)/FENETRE 3)	Matériau souple de type joint (noir) ; matériau semi-dur (gris) en traces	**MET** / MA8A	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
057	24W022903-057 - BV3LM7157 Réf. prél : P57 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d''assemblage - (mastic/noir(e)/FENETRE 4)	Matériau souple de type joint (noir)	**MET** / MA8A	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-029812-01 | Date d'émission de rapport : 02/09/2024 15:18 | Page15/20
Référence laboratoire N° : 24RB026091 | Référence de suivi du dossier N° : 24W022903
Reçu au laboratoire le : 27/08/2024 | Date de réception :26/08/2024
Date d'analyse : 28/08/2024
Référence dossier Client:24W022903 - 1510797435/23063510/S2/2/2_23063510/4/5

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
058	24W022903-058 - BV3LM7158 Réf. prél : P58 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d''assemblage - (mastic/noir(e)/FENETRE 4)	Matériau souple de type joint (noir)	**MET** / MA8A	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
059	24W022903-059 - BV3LM7159 Réf. prél : P59 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d''assemblage - (mastic/beige/FEENTRE 4)	Matériau souple de type joint (transparent) ; matériau (pulvérulent) (noir)	**MET** / MA8A	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
060	24W022903-060 - BV3LM7160 Réf. prél : P60 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d''assemblage - (mastic/beige/FENETRE 4)	Matériau souple de type joint (transparent) ; matériau (pulvérulent) (noir)	**MET** / MA8A	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
061	24W022903-061 - BV3LM7161 Réf. prél : P61 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d''assemblage - (mastic/noir(e)/FENETRE 1)	Matériau souple de type joint (noir) ; matériau (pulvérulent) (gris)	**MET** / MA8A	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
062	24W022903-062 - BV3LM7162 Réf. prél : P62 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d''assemblage - (mastic/blanc(he)/FENETRE 1)	Matériau souple de type joint (noir) ; matériau semi-dur (gris) en traces	**MET** / MA8A	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-029812-01 | Date d'émission de rapport : 02/09/2024 15:18 | Page16/20
Référence laboratoire N° : 24RB026091 | Référence de suivi du dossier N° : 24W022903
Reçu au laboratoire le : 27/08/2024 | Date de réception :26/08/2024
Date d'analyse : 28/08/2024
Référence dossier Client:24W022903 - 1510797435/23063510/S2/2/2_23063510/4/5

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
063	24W022903-063 - BV3LM7163 Réf. prél : P63 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d''assemblage - (mastic/gris(e)/FENETRE 1)	Matériau souple de type joint (gris) ; matériau (pulvérulent) (gris)	**MET** / MA8A	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
064	24W022903-064 - BV3LM7164 Réf. prél : P64 F/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d''assemblage - (mastic/noir(e)/PORTE 5)	Matériau souple de type joint (noir) ; matériau semi-dur (gris) en traces	**MET** / MA8A	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
065	24W022903-065 - BV3LM7165 Réf. prél : P65 F/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d''assemblage - (mastic/beige/PORTE 5)	Matériau souple de type joint (transparent) ; matériau (noir)	**MET** / MA8A	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
066	24W022903-066 - BV3LM7166 Réf. prél : P66 F/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d''assemblage - (mastic/gris(e)/PORTE 5)	Matériau souple de type joint (gris)	**MET** / MA8A	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
067	24W022903-067 - BV3LM7167 Réf. prél : P67 F/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d''assemblage - (mastic/noir(e)/FENETRE 6)	Matériau souple de type joint (noir) ; matériau (pulvérulent) (gris)	**MET** / MA8A	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-029812-01
Référence laboratoire N° : 24RB026091
Reçu au laboratoire le : 27/08/2024
Date d'analyse : 28/08/2024
Référence dossier Client:24W022903 - 1510797435/23063510/S2/2/2_23063510/4/5

Date d'émission de rapport : 02/09/2024 15:18
Référence de suivi du dossier N° : 24W022903
Date de réception :26/08/2024

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
068	24W022903-068 - BV3LM7168 Réf. prél : P68 F/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d''assemblage - (mastic/beige/FENETRE 6)	Matériau souple de type joint (transparent) ; matériau (noir)	**MET** / MA8A	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
069	24W022903-069 - BV3LM7169 Réf. prél : P69 F/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d''étanchéité - (mastic/gris(e))	Matériau souple de type joint (gris) ; matériau semi-dur (gris)	**MET** / MA8A	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
070	24W022903-070 - BV3LM7170 Réf. prél : P70 F/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d''étanchéité - (mastic/gris(e))	Matériau souple de type joint (gris) ; matériau semi-dur (gris)	**MET** / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
071	24W022903-071 - BV3LM7171 Réf. prél : P71 F/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d''assemblage - (mastic/noir(e)/FENETRE 7)	Matériau souple de type joint (noir) ; matériau (pulvérulent) (gris)	**MET** / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
072	24W022903-072 - BV3LM7172 Réf. prél : P72 F/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d''assemblage - (mastic/gris(e)/FENETRE 7)	Matériau souple de type joint (gris) ; matériau semi-dur (gris)	**MET** / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-029812-01 | Date d'émission de rapport : 02/09/2024 15:18 | Page18/20
Référence laboratoire N° : 24RB026091 | Référence de suivi du dossier N° : 24W022903
Reçu au laboratoire le : 27/08/2024 | Date de réception :26/08/2024
Date d'analyse : 28/08/2024
Référence dossier Client:24W022903 - 1510797435/23063510/S2/2/2_23063510/4/5

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
073	24W022903-073 - BV3LM7173 Réf. prél : P73 G/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d''assemblage - (mastic/noir(e)/PORTE 8)	Matériau souple de type joint (fibreux) (noir)	**MET** / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
074	24W022903-074 - BV3LM7174 Réf. prél : P74 G/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d''assemblage - (mastic/blanc(he)/PORTE 8)	Matériau souple de type joint (gris) ; matériau (pulvérulent) (gris)	**MET** / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
075	24W022903-075 - BV3LM7175 Réf. prél : P75 G/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d''assemblage - (mastic/noir(e)/PORTE 9)	Matériau souple de type joint (fibreux) (noir)	**MET** / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
076	24W022903-076 - BV3LM7176 Réf. prél : P76 G/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d''assemblage - (mastic/blanc(he)/PORTE 9)	Matériau souple de type joint (gris) ; matériau (pulvérulent) (gris)	**MET** / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
077	24W022903-077 - BV3LM7177 Réf. prél : P77 E/ RDC/ ATELIER/Conduit - Mastic - (compact/jaune/BANDE)	Matériau souple (gris) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige)	**MET** / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-029812-01
Référence laboratoire N° : 24RB026091
Reçu au laboratoire le : 27/08/2024
Date d'analyse : 28/08/2024
Référence dossier Client:24W022903 - 1510797435/23063510/S2/2/2_23063510/4/5

Date d'émission de rapport : 02/09/2024 15:18
Référence de suivi du dossier N° : 24W022903
Date de réception :26/08/2024

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
078	24W022903-078 - BV3LM7178 Réf. prél : P78 E/ RDC/ ATELIER/Conduit - Mastic - (compact/jaune/BAND E)	Matériau souple (gris) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige)	**MET** / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)

(1) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
(2) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.
(3) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
(4) Nous ne pouvons pas rendre de résultat représentatif car l'analyse nécessite plusieurs prises d'essai complémentaires que nous n'avons pas pu réaliser par faute de quantité.
(5) Un matériau de type peinture (gris); matériau semi-dur de type enduit (blanc); matériau semi-dur de type platre (blanc) est présent en trop faible quantité dans l'échantillon. Une prise d'essai a bien pu être effectuée mais d'autres auraient été nécessaires pour finaliser l'analyse et rendre un résultat représentatif de ce matériau.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP : Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2,P-MO-SOP7718 Ed. 1.1/15.03.2022.

MET : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à pa de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021,P-ME-SOP7663 Ed.1.2/08.05.2023.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-029812-01 | Date d'émission de rapport : 02/09/2024 15:18 | Page20/20
Référence laboratoire N° : 24RB026091 | Référence de suivi du dossier N° : 24W022903
Reçu au laboratoire le : 27/08/2024 | Date de réception :26/08/2024
Date d'analyse : 28/08/2024
Référence dossier Client:24W022903 - 1510797435/23063510/S2/2/2_23063510/4/5

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.
"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur https://www.renar.ro/
NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.
NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).
NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Raluca Floricel
Tehnician laborator CRO 007

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Andreas LEROUX
Bâtiment OXANE – 4, rue Duguay Trouin
44800 SAINT HERBLAIN

Notre référence : AR-24-NS-070535-01

Numéro de dossier : 24W032167
Référence de dossier : 1510797435/23063510/S2/2/2_23063510/4/5

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 24W032167-001 - Référence *BV3ML6054 Réf. prél : P79 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Menuiserie extérieure - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - (silicone/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W032167-002 - Référence *BV3ML6055 Réf. prél : P80 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Menuiserie extérieure - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - (silicone/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W032167-003 - Référence *BV3ML6056 Réf. prél : P81 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Menuiserie extérieure - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - (silicone/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W032167-004 - Référence *BV3ML6057 Réf. prél : P82 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Menuiserie extérieure - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - (silicone/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W032167-005 - Référence *BV3ML6058 Réf. prél : P83 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Mur - Isolant - (laine de verre/jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W032167-006 - Référence *BV3ML6059 Réf. prél : P84 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Mur - Isolant - (laine de verre/jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W032167-007 - Référence *BV3ML6060 Réf. prél : P85 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Paroi des équipements - Isolant - (laine de verre/jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W032167-008 - Référence *BV3ML6061 Réf. prél : P86 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Paroi des équipements - Isolant - (laine de verre/jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W032167-009 - Référence *BV3ML6062 Réf. prél : P87 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Menuiserie extérieure - Joint - (compact/blanc(he)/COMPRIBANDE)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W032167-010 - Référence *BV3ML6063 Réf. prél : P88 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Menuiserie extérieure - Joint - (compact/blanc(he)/COMPRIBANDE)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W032167-011 - Référence *BV3ML6064 Réf. prél : P89 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Menuiserie extérieure - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - (silicone/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W032167-012 - Référence *BV3ML6065 Réf. prél : P90 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Menuiserie extérieure - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - (silicone/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W032167-013 - Référence *BV3ML6066 Réf. prél : P91 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Mur - Isolant - (laine de verre/jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W032167-014 - Référence *BV3ML6067 Réf. prél : P92 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Mur - Isolant - (laine de verre/jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W032167-015 - Référence *BV3ML6068 Réf. prél : P93 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Mur - Isolant - (laine de verre/jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W032167-016 - Référence *BV3ML6069 Réf. prél : P94 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Mur - Isolant - (laine de verre/jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W032167-017 - Référence *BV3ML6070 Réf. prél : P95 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Bardage - Isolant - (laine de verre/jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W032167-018 - Référence *BV3ML6071 Réf. prél : P96 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Bardage - Isolant - (laine de verre/jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W032167-019 - Référence *BV3ML6072 Réf. prél : P97 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Mur - Isolant - (laine de verre/jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W032167-020 - Référence *BV3ML6073 Réf. prél : P98 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Mur - Isolant - (laine de verre/jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

eurofins

GEA (GRAND EST ANALYSES)

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT OUEST SAS
Sous-traitance Bâtiment Nantes
EUROFINS ABO
Site de la Géraudière
Rue Pierre Adolphe Bobierre - CS90827
44300 NANTES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-030836-01 — Date d'émission de rapport : 06/12/2024 16:56 —
Dossier N° : 24GE011048 — Date de réception : 03/12/2024 — Date d'analyse : 05/12/2024
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE011048 — Référence de suivi du dossier N° : 24W032167
Reçu au laboratoire le : 03/12/2024 — Date de réception : 02/12/2024
Date d'analyse : 05/12/2024
Référence dossier Client:1510797435/23063510/S2/2/2_23063510/4/5

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	24W032167-001 - BV3ML6054 Réf. prél : P79 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Menuiserie extérieure - Joint d''étanchéité entre menuiserie et structure - (silicone/blanc(he))	Matériau souple de type joint (gris)	**MET** * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
002	24W032167-002 - BV3ML6055 Réf. prél : P80 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Menuiserie extérieure - Joint d''étanchéité entre menuiserie et structure - (silicone/blanc(he))	Matériau souple de type joint (gris)	**MET** * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-030836-01 Date d'émission de rapport : 06/12/2024 16:56
Dossier N° : 24GE011048 Date de réception : 03/12/2024 Date d'analyse : 05/12/2024
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE011048 Référence de suivi du dossier N° : 24W032167
Reçu au laboratoire le : 03/12/2024 Date de réception : 02/12/2024
Date d'analyse : 05/12/2024
Référence dossier Client:1510797435/23063510/S2/2/2_23063510/4/5

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003	24W032167-003 - BV3ML6056 Réf. prél : P81 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Menuiserie extérieure - Joint d''étanchéité entre menuiserie et structure - (silicone/blanc(he))	Matériau souple de type joint (collant) (gris) + (marron)	**MET** * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
004	24W032167-004 - BV3ML6057 Réf. prél : P82 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Menuiserie extérieure - Joint d''étanchéité entre menuiserie et structure - (silicone/blanc(he))	Matériau souple de type joint (collant) (gris) + (marron)	**MET** * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
005	24W032167-005 - BV3ML6058 Réf. prél : P83 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Mur - Isolant - (laine de verre/jaune)	Matériau semi-dur (friable) (marron) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces	**MET** * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
006	24W032167-006 - BV3ML6059 Réf. prél : P84 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Mur - Isolant - (laine de verre/jaune)	Matériau semi-dur (friable) (marron) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces	**MET** * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s).
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N° 1-6977
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-030836-01 Date d'émission de rapport : 06/12/2024 16:56 Page3/8
Dossier N° : 24GE011048 Date de réception : 03/12/2024 Date d'analyse : 05/12/2024
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE011048 Référence de suivi du dossier N° : 24W032167
Reçu au laboratoire le : 03/12/2024 Date de réception : 02/12/2024
Date d'analyse : 05/12/2024
Référence dossier Client:1510797435/23063510/S2/2/2_23063510/4/5

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007	24W032167-007 - BV3ML6060 Réf. prél : P85 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Paroi des équipements - Isolant - (laine de verre/jaune)	Matériau souple fibreux de type papier, carton (friable) (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces	**MET** * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
008	24W032167-008 - BV3ML6061 Réf. prél : P86 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Paroi des équipements - Isolant - (laine de verre/jaune)	Matériau souple fibreux de type papier, carton (friable) (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces	**MET** * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
009	24W032167-009 - BV3ML6062 Réf. prél : P87 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Menuiserie extérieure - Joint - (compact/blanc(he)/COMPRIBANDE)	Matériau semi-dur (friable) (gris) + (marron)	**MET** * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
010	24W032167-010 - BV3ML6063 Réf. prél : P88 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Menuiserie extérieure - Joint - (compact/blanc(he)/COMPRIBANDE)	Matériau semi-dur (friable) (gris) + (marron)	**MET** * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N° 1-6977
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-030836-01 Date d'émission de rapport : 06/12/2024 16:56 Page4/8
Dossier N° : 24GE011048 Date de réception : 03/12/2024 Date d'analyse : 05/12/2024
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE011048 Référence de suivi du dossier N° : 24W032167
Reçu au laboratoire le : 03/12/2024 Date de réception : 02/12/2024
Date d'analyse : 05/12/2024
Référence dossier Client:1510797435/23063510/S2/2/2_23063510/4/5

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011	24W032167-011 - BV3ML6064 Réf. prél : P89 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Menuiserie extérieure - Joint d''étanchéité entre menuiserie et structure - (silicone/blanc(he))	Matériau souple de type joint (gris)	**MET** * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
012	24W032167-012 - BV3ML6065 Réf. prél : P90 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Menuiserie extérieure - Joint d''étanchéité entre menuiserie et structure - (silicone/blanc(he))	Matériau souple de type joint (gris)	**MET** * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
013	24W032167-013 - BV3ML6066 Réf. prél : P91 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Mur - Isolant - (laine de verre/jaune)	Matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (marron)	**MET** * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MET** * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N° 1-6977
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-030836-01 Date d'émission de rapport : 06/12/2024 16:56 Page5/8
Dossier N° : 24GE011048 Date de réception : 03/12/2024 Date d'analyse : 05/12/2024
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE011048 Référence de suivi du dossier N° : 24W032167
Reçu au laboratoire le : 03/12/2024 Date de réception : 02/12/2024
Date d'analyse : 05/12/2024
Référence dossier Client:1510797435/23063510/S2/2/2_23063510/4/5

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014	24W032167-014 - BV3ML6067 Réf. prél : P92 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Mur - Isolant - (laine de verre/jaune)	Matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (marron)	**MET** * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MET** * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
015	24W032167-015 - BV3ML6068 Réf. prél : P93 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Mur - Isolant - (laine de verre/jaune)	Matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (marron)	**MET** * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MET** * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
016	24W032167-016 - BV3ML6069 Réf. prél : P94 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Mur - Isolant - (laine de verre/jaune)	Matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (noir)	**MET** * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N° 1-6977
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-030836-01 Date d'émission de rapport : 06/12/2024 16:56 Page6/8
Dossier N° : 24GE011048 Date de réception : 03/12/2024 Date d'analyse : 05/12/2024
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE011048 Référence de suivi du dossier N° : 24W032167
Reçu au laboratoire le : 03/12/2024 Date de réception : 02/12/2024
Date d'analyse : 05/12/2024
Référence dossier Client:1510797435/23063510/S2/2/2_23063510/4/5

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MET** * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
017	24W032167-017 - BV3ML6070 Réf. prél : P95 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Bardage - Isolant - (laine de verre/jaune)	Matériau de type colle (jaune) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MET** * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
018	24W032167-018 - BV3ML6071 Réf. prél : P96 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Bardage - Isolant - (laine de verre/jaune)	Matériau de type colle (jaune) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MET** * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
019	24W032167-019 - BV3ML6072 Réf. prél : P97 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Mur - Isolant - (laine de verre/jaune)	Matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (marron)	**MET** * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)(i)	**MET** * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N° 1-6977
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-030836-01 Date d'émission de rapport : 06/12/2024 16:56 Page7/8
Dossier N° : 24GE011048 Date de réception : 03/12/2024 Date d'analyse : 05/12/2024
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE011048 Référence de suivi du dossier N° : 24W032167
Reçu au laboratoire le : 03/12/2024 Date de réception : 02/12/2024
Date d'analyse : 05/12/2024
Référence dossier Client:1510797435/23063510/S2/2/2_23063510/4/5

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020	24W032167-020 - BV3ML6073 Réf. prél : P98 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Mur - Isolant - (laine de verre/jaune)	Matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (noir)	**MET** * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MET** * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) couche(s)
(i) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).
NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N° 1-6977
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-030836-01 Date d'émission de rapport : 06/12/2024 16:56 Page8/8
Dossier N° : 24GE011048 Date de réception : 03/12/2024 Date d'analyse : 05/12/2024
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE011048 Référence de suivi du dossier N° : 24W032167
Reçu au laboratoire le : 03/12/2024 Date de réception : 02/12/2024
Date d'analyse : 05/12/2024
Référence dossier Client:1510797435/23063510/S2/2/2_23063510/4/5

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.



Alexandre Conte
Chef de Groupe Technicien META

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N° 1-6977
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Andreas LEROUX
Bâtiment OXANE – 4, rue Duguay Trouin
44800 SAINT HERBLAIN

Notre référence : AR-25-NS-000078-01

Numéro de dossier : 24W034616
Référence de dossier : 1510797435/23063510/S2/2/2_23063510/4/5

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 24W034616-001 - Référence *BV3ML6340 Réf. prél : P99 E/ R+3/ TOITURE/Toiture - Revêtement d'étanchéité - (bitumineux/noir(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24W034616-002 - Référence *BV3ML6341 Réf. prél : P100 E/ R+3/ TOITURE/Complexe d'étanchéité - Pare-vapeur - (bitumineux/noir(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24W034616-003 - Référence *BV3ML6342 Réf. prél : P101 E/ R+3/ TOITURE/Toiture terrasse - Relevé d'étanchéité - (bitumineux/noir(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24W034616-004 - Référence *BV3ML6343 Réf. prél : P102 E/ R+3/ TOITURE/Toiture terrasse - Revêtement d'étanchéité - (souple/jaune/POLYANE + ISOLANT POLYANE)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24W034616-005 - Référence *BV3ML6344 Réf. prél : P103 E/ R+3/ TOITURE/Toiture - Revêtement d'étanchéité - (souple/jaune/POLYANE + ISOLANT POLY)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24W034616-006 - Référence *BV3ML6345 Réf. prél : P104 E/ R+3/ TOITURE/Complexe d'étanchéité - Pare-vapeur - (bitumineux/noir(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24W034616-007 - Référence *BV3ML6346 Réf. prél : P105 E/ R+3/ TOITURE/Complexe d'étanchéité - Pare-vapeur - (bitumineux/noir(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24W034616-008 - Référence *BV3ML6347 Réf. prél : P106 E/ R+3/ TOITURE/Toiture terrasse - Relevé d'étanchéité - (bitumineux/noir(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24W034616-009 - Référence *BV3ML6348 Réf. prél : P107 E/ R+3/ TOITURE/Toiture terrasse - Relevé d'étanchéité - (bitumineux/noir(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24W034616-010 - Référence *BV3ML6349 Réf. prél : P108 E/ R+3/ TOITURE/Toiture - Revêtement d'étanchéité - (bitumineux/noir(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24W034616-011 - Référence *BV3ML6350 Réf. prél : P109 E/ R+3/ TOITURE/Toiture - Revêtement d'étanchéité - (bitumineux/noir(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24W034616-012 - Référence *BV3ML6351 Réf. prél : P110 E/ R+3/ TOITURE/Toiture terrasse - Relevé d'étanchéité - (bitumineux/noir(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24W034616-013 - Référence *BV3ML6352 Réf. prél : P111 E/ R+3/ TOITURE/Toiture terrasse - Relevé d'étanchéité - (bitumineux/noir(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24W034616-014 - Référence *BV3ML6353 Réf. prél : P112 E/ R+3/ TOITURE/Toiture - Revêtement d'étanchéité - (bitumineux/noir(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24W034616-015 - Référence *BV3ML6354 Réf. prél : P113 E/ R+3/ TOITURE/Toiture - Revêtement d'étanchéité - (bitumineux/noir(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24W034616-016 - Référence *BV3ML6355 Réf. prél : P114 E/ R+3/ TOITURE/Complexe d'étanchéité - Pare-vapeur - (bitumineux/noir(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24W034616-017 - Référence *BV3ML6356 Réf. prél : P115 E/ R+3/ TOITURE/Complexe d'étanchéité - Pare-vapeur - (bitumineux/noir(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24W034616-018 - Référence *BV3ML6357 Réf. prél : P116 E/ R+3/ TOITURE/Toiture terrasse - Relevé d'étanchéité - (bitumineux/noir(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24W034616-019 - Référence *BV3ML6358 Réf. prél : P117 E/ R+3/ TOITURE/Toiture terrasse - Relevé d'étanchéité - (bitumineux/noir(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24W034616-020 - Référence *BV3ML6359 Réf. prél : P118 E/ R+3/ TOITURE/Paroi des équipements - Isolant - (mousse expansée/noir(e)/CTA)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24W034616-021 - Référence *BV3ML6360 Réf. prél : P119 E/ R+3/ TOITURE/Equipement - Mastic - (compact/beige/CTA)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24W034616-022 - Référence *BV3ML6361 Réf. prél : P120 E/ R+3/ TOITURE/Equipement - Mastic - (compact/beige/CTA)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24W034616-023 - Référence *BV3ML6362 Réf. prél : P121 F/ EXTERIEUR/ TOITURE/Toiture terrasse - Revêtement d'étanchéité - (bitumineux/noir(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24W034616-024 - Référence *BV3ML6363 Réf. prél : P122 F/ EXTERIEUR/ TOITURE/Toiture - Revêtement d'étanchéité - (bitumineux/noir(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24W034616-025 - Référence *BV3ML6364 Réf. prél : P123 F/ EXTERIEUR/ TOITURE/Paroi des équipements - Isolant - (mousse expansée/noir(e)/CTA)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24W034616-026 - Référence *BV3ML6365 Réf. prél : P124 F/ EXTERIEUR/ TOITURE/Equipement - Mastic - (compact/beige/CTA)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24W034616-027 - Référence *BV3ML6366 Réf. prél : P125 F/ EXTERIEUR/ TOITURE/Equipement - Mastic - (compact/beige/CTA)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24W034616-028 - Référence *BV3ML6367 Réf. prél : P126 G/ EXTERIEUR/ TOITURE/Toiture - Revêtement d'étanchéité - (bitumineux/noir(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24W034616-029 - Référence *BV3ML6368 Réf. prél : P127 G/ EXTERIEUR/ TOITURE/Toiture - Revêtement d'étanchéité - (bitumineux/noir(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24W034616-030 - Référence *BV3ML6369 Réf. prél : P128 G/ EXTERIEUR/ TOITURE/Complexe d'étanchéité - Pare-vapeur - (bitumineux/noir(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24W034616-031 - Référence *BV3ML6370 Réf. prél : P129 G/ EXTERIEUR/ TOITURE/Toiture - Revêtement d'étanchéité - (bitumineux/noir(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24W034616-032 - Référence *BV3ML6371 Réf. prél : P130 G/ EXTERIEUR/ TOITURE/Revêtement bitumineux - Pare-vapeur - (bitumineux/noir(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

AB 1609

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT OUEST SAS
Sous-traitance Bâtiment Nantes
EUROFINS ABO
Site de la Géraudière
Rue Pierre Adolphe Bobierre - CS90827
44300 NANTES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-000027-01
Référence laboratoire N° : 24RI078616
Reçu au laboratoire le : 27/12/2024
Date d'analyse : 30/12/2024
Référence dossier Client:24W034616 - 1510797435/23063510/S2/2/2_23063510/4/5

Date d'émission de rapport : 02/01/2025 11:16
Référence de suivi du dossier N° : 24W034616
Date de réception :24/12/2024

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	24W034616-001 - BV3ML6340 Réf. prél : P99 E/ R+3/ TOITURE/Toiture - Revêtement d''étanchéité - (bitumineux/noir(e))	Matériau de type mousse (blanc) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	**MET** / NN4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	24W034616-002 - BV3ML6341 Réf. prél : P100 E/ R+3/ TOITURE/Complexe d''étanchéité - Pare-vapeur - (bitumineux/noir(e))	Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	**MET** / NN4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	24W034616-003 - BV3ML6342 Réf. prél : P101 E/ R+3/ TOITURE/Toiture terrasse - Relevé d''étanchéité - (bitumineux/noir(e))	Matériau de type aluminium ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	**MET** / NN4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-000027-01
Référence laboratoire N° : 24RI078616
Reçu au laboratoire le : 27/12/2024
Date d'analyse : 30/12/2024
Référence dossier Client:24W034616 - 1510797435/23063510/S2/2/2_23063510/4/5

Date d'émission de rapport : 02/01/2025 11:16
Référence de suivi du dossier N° : 24W034616
Date de réception :24/12/2024

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	24W034616-004 - BV3ML6343 Réf. prél : P102 E/ R+3/ TOITURE/Toiture terrasse - Revêtement d''étanchéité - (souple/jaune/POLYANE + ISOLANT POLYANE)	Matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau souple de type plaque (bleu) ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau souple de type dalle de sol (fibreux) (gris)	**MET** / NN4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	24W034616-005 - BV3ML6344 Réf. prél : P103 E/ R+3/ TOITURE/Toiture - Revêtement d''étanchéité - (souple/jaune/POLYANE + ISOLANT POLY)	Matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau souple (gris) ; matériau souple (bleu)	**MET** / NN4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	24W034616-006 - BV3ML6345 Réf. prél : P104 E/ R+3/ TOITURE/Complexe d''étanchéité - Pare-vapeur - (bitumineux/noir(e))	Matériau de type polystyrène (blanc) en traces ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	**MET** / NN4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	24W034616-007 - BV3ML6346 Réf. prél : P105 E/ R+3/ TOITURE/Complexe d''étanchéité - Pare-vapeur - (bitumineux/noir(e))	Matériau de type polystyrène (blanc) en traces ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	**MET** / NN4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-000027-01
Référence laboratoire N° : 24RI078616
Reçu au laboratoire le : 27/12/2024
Date d'analyse : 30/12/2024
Référence dossier Client:24W034616 - 1510797435/23063510/S2/2/2_23063510/4/5

Date d'émission de rapport : 02/01/2025 11:16
Référence de suivi du dossier N° : 24W034616
Date de réception :24/12/2024

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008	24W034616-008 - BV3ML6347 Réf. prél : P106 E/ R+3/ TOITURE/Toiture terrasse - Relevé d''étanchéité - (bitumineux/noir(e))	Matériau de type colle (beige) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau de type aluminium	**MET** / NN4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	24W034616-009 - BV3ML6348 Réf. prél : P107 E/ R+3/ TOITURE/Toiture terrasse - Relevé d''étanchéité - (bitumineux/noir(e))	Matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir) (fibreux) ; matériau (gris)	**MET** / KYN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	24W034616-010 - BV3ML6349 Réf. prél : P108 E/ R+3/ TOITURE/Toiture - Revêtement d''étanchéité - (bitumineux/noir(e))	Matériau semi-dur (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	**MET** / NN4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MOLP** / OTG9	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
011	24W034616-011 - BV3ML6350 Réf. prél : P109 E/ R+3/ TOITURE/Toiture - Revêtement d''étanchéité - (bitumineux/noir(e))	Matériau semi-dur (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces	**MET** / KYN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MOLP** / OTG9	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-000027-01
Référence laboratoire N° : 24RI078616
Reçu au laboratoire le : 27/12/2024
Date d'analyse : 30/12/2024
Référence dossier Client:24W034616 - 1510797435/23063510/S2/2/2_23063510/4/5

Date d'émission de rapport : 02/01/2025 11:16
Référence de suivi du dossier N° : 24W034616
Date de réception :24/12/2024

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012	24W034616-012 - BV3ML6351 Réf. prél : P110 E/ R+3/ TOITURE/Toiture terrasse - Relevé d''étanchéité - (bitumineux/noir(e))	Matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir) (fibreux)	**MET** / KYN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	24W034616-013 - BV3ML6352 Réf. prél : P111 E/ R+3/ TOITURE/Toiture terrasse - Relevé d''étanchéité - (bitumineux/noir(e))	Matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir)	**MET** / KYN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014 (1)	24W034616-014 - BV3ML6353 Réf. prél : P112 E/ R+3/ TOITURE/Toiture - Revêtement d''étanchéité - (bitumineux/noir(e))	Matériau souple bitumineux (noir)	**MET** / KYN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	24W034616-015 - BV3ML6354 Réf. prél : P113 E/ R+3/ TOITURE/Toiture - Revêtement d''étanchéité - (bitumineux/noir(e))	Matériau souple bitumineux (noir)	**MET** / KYN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-000027-01
Référence laboratoire N° : 24RI078616
Reçu au laboratoire le : 27/12/2024
Date d'analyse : 30/12/2024
Référence dossier Client:24W034616 - 1510797435/23063510/S2/2/2_23063510/4/5

Date d'émission de rapport : 02/01/2025 11:16
Référence de suivi du dossier N° : 24W034616
Date de réception :24/12/2024

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016	24W034616-016 - BV3ML6355 Réf. prél : P114 E/ R+3/ TOITURE/Complexe d''étanchéité - Pare-vapeur - (bitumineux/noir(e))	Matériau souple bitumineux (noir)	**MET** / KYN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	24W034616-017 - BV3ML6356 Réf. prél : P115 E/ R+3/ TOITURE/Complexe d''étanchéité - Pare-vapeur - (bitumineux/noir(e))	Matériau souple bitumineux (noir)	**MET** / KYN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	24W034616-018 - BV3ML6357 Réf. prél : P116 E/ R+3/ TOITURE/Toiture terrasse - Relevé d''étanchéité - (bitumineux/noir(e))	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	**MET** / KYN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	24W034616-019 - BV3ML6358 Réf. prél : P117 E/ R+3/ TOITURE/Toiture terrasse - Relevé d''étanchéité - (bitumineux/noir(e))	Matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (gris)	**MET** / KYN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-000027-01
Référence laboratoire N° : 24RI078616
Reçu au laboratoire le : 27/12/2024
Date d'analyse : 30/12/2024
Référence dossier Client:24W034616 - 1510797435/23063510/S2/2/2_23063510/4/5

Date d'émission de rapport : 02/01/2025 11:16
Référence de suivi du dossier N° : 24W034616
Date de réception :24/12/2024

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020	24W034616-020 - BV3ML6359 Réf. prél : P118 E/ R+3/ TOITURE/Paroi des équipements - Isolant - (mousse expansée/noir(e)/CTA)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type mousse (noir)	**MET** / KYN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	24W034616-021 - BV3ML6360 Réf. prél : P119 E/ R+3/ TOITURE/Equipement Mastic - (compact/beige/CTA)	Matériau souple de type mastic (gris)	**MET** / KYN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	24W034616-022 - BV3ML6361 Réf. prél : P120 E/ R+3/ TOITURE/Equipement Mastic - (compact/beige/CTA)	Matériau (gris) ; matériau souple de type joint (transparent) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau de type mousse (noir)	**MET** / NN4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	24W034616-023 - BV3ML6362 Réf. prél : P121 F/ EXTERIEUR/ TOITURE/Toiture terrasse - Revêtement d''étanchéité - (bitumineux/noir(e))	Matériau (blanc) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces	**MET** / NN4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	24W034616-024 - BV3ML6363 Réf. prél : P122 F/ EXTERIEUR/ TOITURE/Toiture - Revêtement d''étanchéité - (bitumineux/noir(e))	Matériau souple bitumineux (noir) (fibreux)	**MET** / KYN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-000027-01
Référence laboratoire N° : 24RI078616
Reçu au laboratoire le : 27/12/2024
Date d'analyse : 30/12/2024
Référence dossier Client:24W034616 - 1510797435/23063510/S2/2/2_23063510/4/5

Date d'émission de rapport : 02/01/2025 11:16
Référence de suivi du dossier N° : 24W034616
Date de réception :24/12/2024

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
025	24W034616-025 - BV3ML6364 Réf. prél : P123 F/ EXTERIEUR/ TOITURE/Paroi des équipements - Isolant - (mousse expansée/noir(e)/CTA)	Matériau de type mousse (noir)	**MET** / KYN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026 (2)	24W034616-026 - BV3ML6365 Réf. prél : P124 F/ EXTERIEUR/ TOITURE/Equipement Mastic - (compact/beige/CTA)	Matériau (marron) ; matériau souple de type joint (gris)	**MET** / VC7D	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027 (2)	24W034616-027 - BV3ML6366 Réf. prél : P125 F/ EXTERIEUR/ TOITURE/Equipement Mastic - (compact/beige/CTA)	Matériau souple de type joint (gris) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (noir)	**MET** / KYN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	24W034616-028 - BV3ML6367 Réf. prél : P126 G/ EXTERIEUR/ TOITURE/Toiture - Revêtement d''étanchéité - (bitumineux/noir(e))	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	**MET** / NN4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029	24W034616-029 - BV3ML6368 Réf. prél : P127 G/ EXTERIEUR/ TOITURE/Toiture - Revêtement d''étanchéité - (bitumineux/noir(e))	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces	**MET** / NN4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-000027-01
Référence laboratoire N° : 24RI078616
Reçu au laboratoire le : 27/12/2024
Date d'analyse : 30/12/2024
Référence dossier Client:24W034616 - 1510797435/23063510/S2/2/2_23063510/4/5

Date d'émission de rapport : 02/01/2025 11:16
Référence de suivi du dossier N° : 24W034616
Date de réception :24/12/2024

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MOLP** / OTG9	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
030	24W034616-030 - BV3ML6369 Réf. prél : P128 G/ EXTERIEUR/ TOITURE/Complexe d''étanchéité - Pare-vapeur - (bitumineux/noir(e))	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces	**MET** / NN4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MOLP** / OTG9	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
031	24W034616-031 - BV3ML6370 Réf. prél : P129 G/ EXTERIEUR/ TOITURE/Toiture - Revêtement d''étanchéité - (bitumineux/noir(e))	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces	**MET** / NN4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MOLP** / OTG9	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
032	24W034616-032 - BV3ML6371 Réf. prél : P130 G/ EXTERIEUR/ TOITURE/Revêtement bitumineux - Pare-vapeur - (bitumineux/noir(e))	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces	**MET** / NN4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MOLP** / OTG9	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)
(1) Echantillon mouillé.
(2) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-000027-01
Référence laboratoire N° : 24RI078616
Reçu au laboratoire le : 27/12/2024
Date d'analyse : 30/12/2024
Référence dossier Client:24W034616 - 1510797435/23063510/S2/2/2_23063510/4/5

Date d'émission de rapport : 02/01/2025 11:16
Référence de suivi du dossier N° : 24W034616
Date de réception :24/12/2024

MOLP:Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET:Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.
"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur https://pca.gov.pl/.
NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.
NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).
NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Małgorzata Tomala
Chef d'équipe suppléant

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur andreas LEROUX
Bâtiment OXANE – 4, rue Duguay Trouin
44800 SAINT HERBLAIN

Notre référence : AR-25-NS-076210-01

Numéro de dossier : 25W020713
Référence de dossier : 1510797435/23063510/S2/2/2_23063510/4/5

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25W020713-001 - Référence *BV3NJ8365 Réf. prél : P131 G/ SS/ CHAUFFERIE/Paroi des équipements - Isolant - (laine de verre/jaune/CHAUDIERE)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W020713-002 - Référence *BV3NJ8366 Réf. prél : P132 G/ SS/ CHAUFFERIE/Chaudière - Joint de bride - (compact/noir(e)/DERRIERE CHAUDIERE)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W020713-003 - Référence *BV3NJ8367 Réf. prél : P133 G/ SS/ CHAUFFERIE/Chaudière - Joint de bride - (compact/beige/RAD RD CH)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W020713-004 - Référence *BV3NJ8368 Réf. prél : P134 G/ SS/ CHAUFFERIE/Conduit - Enveloppe de calorifuge - (plâtreuse-toile/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W020713-005 - Référence *BV3NJ8369 Réf. prél : P135 E/ R+3/ CHAUFFERIE/Paroi des équipements - Isolant - (laine de verre/jaune/CHAUDIERE 1)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W020713-006 - Référence *BV3NJ8370 Réf. prél : P136 E/ R+3/ CHAUFFERIE/Paroi des équipements - Isolant - (laine de verre/jaune/CHAUDIERE 2)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W020713-007 - Référence *BV3NJ8371 Réf. prél : P137 E/ R+3/ CHAUFFERIE/Conduit - Calorifugeage - (laine de verre/jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W020713-008 - Référence *BV3NJ8372 Réf. prél : P138 E/ R+3/ CHAUFFERIE/Conduit - Joint de bride - (compact/noir(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W020713-009 - Référence *BV3NJ8373 Réf. prél : P139 E/ R+1/ ESPACE DETENTE/Moquette - Colle - (blanche/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W020713-010 - Référence *BV3NJ8374 Réf. prél : P140 E/ R+1/ ESPACE DETENTE/Moquette - Colle - (blanche/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W020713-011 - Référence *BV3NJ8375 Réf. prél : P141 E/ R+1/ ESPACE DETENTE/Coffre - Peinture - (décorative/gris(e)/TABLEAU FENETRE BOISERIE)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W020713-012 - Référence *BV3NJ8376 Réf. prél : P142 E/ R+1/ ESPACE DETENTE/Rebouchage - Enduit - (plâtre/blanc(he)/TABLEAU FENETRE BOISERIE TETE DE VIS)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W020713-013 - Référence *BV3NJ8377 Réf. prél : P143 E/ R+1/ SALLE 102/Coffre - Peinture - (décorative/gris(e)/TABLEAU FENETRE)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W020713-014 - Référence *BV3NJ8378 Réf. prél : P144 E/ R+1/ SALLE 102/Rebouchage - Enduit - (plâtre/blanc(he)/TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W020713-015 - Référence *BV3NJ8379 Réf. prél : P145 F/ R+1/ CIRC 1/Coffre - Peinture - (décorative/bleu(e)/ENTOURAGE PORTE HUISSERIE)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W020713-016 - Référence *BV3NJ8380 Réf. prél : P146 F/ R+1/ CIRC 1/Rebouchage - Enduit - (plâtre/blanc(he)/ENTOURAGE PORTE HUISSERIE - TETE DE VIS)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W020713-017 - Référence *BV3NJ8381 Réf. prél : P147 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Enduit - (peint-ciment/beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W020713-018 - Référence *BV3NJ8382 Réf. prél : P148 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Enduit - (peint-ciment/beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W020713-019 - Référence *BV3NJ8383 Réf. prél : P149 E/ R+1/ CIRCULATION ADMIN/Coffre - Peinture - (décorative/gris(e)/TABLEAU FENETRE)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W020713-020 - Référence *BV3NJ8384 Réf. prél : P150 E/ R+1/ CIRCULATION ADMIN/Rebouchage - Enduit - (plâtre/blanc(he)/ENTOURAGE FENETRE TETE DE VIS)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W020713-021 - Référence *BV3NJ8385 Réf. prél : P151 E/ R+1/ CIRCULATION ADMIN/Coffre - Peinture - (décorative/gris(e)/TABLEAU FENETRE)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W020713-022 - Référence *BV3NJ8386 Réf. prél : P152 E/ R+1/ CIRCULATION ADMIN/Rebouchage - Enduit - (plâtre/blanc(he)/TABLEAU FENETRE TETE DE VIS)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre
F-44308 Nantes
Tél: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

eurofins

acreditat pentru ÎNCERCARE
RENAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1229

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT OUEST SAS
Laboratoire Analyses Nantes
EUROFINS ABO
Site de la Géraudière
Rue Pierre Adolphe Bobierre - CS90827
44300 NANTES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-042402-01
Référence laboratoire N° : 25RB020550
Reçu au laboratoire le : 20/06/2025
Date d'analyse : 24/06/2025
Référence dossier Client:25W020713 - 1510797435/23063510/S2/2/2_23063510/4/5

Date d'émission de rapport : 25/06/2025 14:18
Référence de suivi du dossier N° : 25W020713
Date de réception :19/06/2025

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	25W020713-001 - BV3NJ8365 Réf. prél : P131 G/ SS/ CHAUFFERIE/Paroi des équipements - Isolant - (laine de verre/jaune/CHAUDIERE)	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (beige)	**MET** / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (beige)	**MOLP** / XTN3	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
002 (1)	25W020713-002 - BV3NJ8366 Réf. prél : P132 G/ SS/ CHAUFFERIE/Chaudière - Joint de bride - (compact/noir(e)/DERRIERE CHAUDIERE)	Matériau souple de type joint (noir)	**MET** / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	25W020713-003 - BV3NJ8367 Réf. prél : P133 G/ SS/ CHAUFFERIE/Chaudière - Joint de bride - (compact/beige/RADRD CH)	Matériau semi-dur (fibreux) (beige)	**MOLP** / XTN3	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-042402-01 | Date d'émission de rapport : 25/06/2025 14:18 | Page2/7
Référence laboratoire N° : 25RB020550 | Référence de suivi du dossier N° : 25W020713
Reçu au laboratoire le : 20/06/2025 | Date de réception :19/06/2025
Date d'analyse : 24/06/2025
Référence dossier Client:25W020713 - 1510797435/23063510/S2/2/2_23063510/4/5

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	25W020713-004 - BV3NJ8368 Réf. prél : P134 G/ SS/ CHAUFFERIE/Conduit - Enveloppe de calorifuge - (plâtreuse-toile/blanc(he))	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MET** / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MOLP** / XTN3	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
005	25W020713-005 - BV3NJ8369 Réf. prél : P135 E/ R+3/ CHAUFFERIE/Paroi des équipements - Isolant - (laine de verre/jaune/CHAUDIEF E 1)	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (rose)	**MET** / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (rose)	**MOLP** / XTN3	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
006	25W020713-006 - BV3NJ8370 Réf. prél : P136 E/ R+3/ CHAUFFERIE/Paroi des équipements - Isolant - (laine de verre/jaune/CHAUDIEF E 2)	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (rose)	**MET** / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (rose)	**MOLP** / PK3X	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
007	25W020713-007 - BV3NJ8371 Réf. prél : P137 E/ R+3/ CHAUFFERIE/Conduit - Calorifugeage - (laine de verre/jaune)	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MET** / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MOLP** / XTN3	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-042402-01 | Date d'émission de rapport : 25/06/2025 14:18 | Page3/7
Référence laboratoire N° : 25RB020550 | Référence de suivi du dossier N° : 25W020713
Reçu au laboratoire le : 20/06/2025 | Date de réception :19/06/2025
Date d'analyse : 24/06/2025
Référence dossier Client:25W020713 - 1510797435/23063510/S2/2/2_23063510/4/5

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008 (1)	25W020713-008 - BV3NJ8372 Réf. prél : P138 E/ R+3/ CHAUFFERIE/Conduit - Joint de bride - (compact/noir(e))	Matériau souple de type joint (noir)	**MET** / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	25W020713-009 - BV3NJ8373 Réf. prél : P139 E/ R+1/ ESPACE DETENTE/Moquette - Colle - (blanche/blanc(he))	Matériau dur (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	**MET** / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
010	25W020713-010 - BV3NJ8374 Réf. prél : P140 E/ R+1/ ESPACE DETENTE/Moquette - Colle - (blanche/blanc(he))	Matériau dur (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
011	25W020713-011 - BV3NJ8375 Réf. prél : P141 E/ R+1/ ESPACE DETENTE/Coffre - Peinture - (décorative/gris(e)/TABLEAU FENETRE BOISERIE)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (fibreux) (marron)	**MET** / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012 (1) (2)	25W020713-012 - BV3NJ8376 Réf. prél : P142 E/ R+1/ ESPACE DETENTE/Rebouchage - Enduit - (plâtre/blanc(he)/TABLEAU FENETRE BOISERIE TETE DE VIS)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (marron)	**MET** / FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-042402-01 | Date d'émission de rapport : 25/06/2025 14:18 | Page4/7
Référence laboratoire N° : 25RB020550 | Référence de suivi du dossier N° : 25W020713
Reçu au laboratoire le : 20/06/2025 | Date de réception :19/06/2025
Date d'analyse : 24/06/2025
Référence dossier Client:25W020713 - 1510797435/23063510/S2/2/2_23063510/4/5

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013 (3)	25W020713-013 - BV3NJ8377 Réf. prél : P143 E/ R+1/ SALLE 102/Coffre - Peinture - (décorative/gris(e)/TABLEAU FENETRE)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MET** / PUU9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
014	25W020713-014 - BV3NJ8378 Réf. prél : P144 E/ R+1/ SALLE 102/Rebouchage - Enduit - (plâtre/blanc(he)/TABLEAU MENUISERIE TETE DE VIS)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
015 (3)	25W020713-015 - BV3NJ8379 Réf. prél : P145 F/ R+1/ CIRC 1/Coffre - Peinture - (décorative/bleu(e)/ENTOURAGE PORTE HUISSERIE)	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MET** / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
016	25W020713-016 - BV3NJ8380 Réf. prél : P146 F/ R+1/ CIRC 1/Rebouchage - Enduit - (plâtre/blanc(he)/ENTOURAGE PORTE HUISSERIE - TETE DE VIS)	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-042402-01 | Date d'émission de rapport : 25/06/2025 14:18 | Page5/7
Référence laboratoire N° : 25RB020550 | Référence de suivi du dossier N° : 25W020713
Reçu au laboratoire le : 20/06/2025 | Date de réception :19/06/2025
Date d'analyse : 24/06/2025
Référence dossier Client:25W020713 - 1510797435/23063510/S2/2/2_23063510/4/5

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
017	25W020713-017 - BV3NJ8381 Réf. prél : P147 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Enduit - (peint-ciment/beige)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (granulaire) (blanc)	**MET** / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	25W020713-018 - BV3NJ8382 Réf. prél : P148 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Enduit - (peint-ciment/beige)	Matériau semi-dur (beige)	**MET** / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019 (2)	25W020713-019 - BV3NJ8383 Réf. prél : P149 E/ R+1/ CIRCULATION ADMIN/Coffre - Peinture - (décorative/gris(e)/TABLEAU FENETRE)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MET** / FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020 (1)	25W020713-020 - BV3NJ8384 Réf. prél : P150 E/ R+1/ CIRCULATION ADMIN/Rebouchage - Enduit - (plâtre/blanc(he)/ENTOURAGE FENETRE TETE DE VIS)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (marron) en traces ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) en traces	**MET** / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-042402-01 | Date d'émission de rapport : 25/06/2025 14:18 | Page6/7
Référence laboratoire N° : 25RB020550 | Référence de suivi du dossier N° : 25W020713
Reçu au laboratoire le : 20/06/2025 | Date de réception :19/06/2025
Date d'analyse : 24/06/2025
Référence dossier Client:25W020713 - 1510797435/23063510/S2/2/2_23063510/4/5

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
021 (1) (2)	25W020713-021 - BV3NJ8385 Réf. prél : P151 E/ R+1/ CIRCULATION ADMIN/Coffre - Peinture - (décorative/gris(e)/TABLEAU FENETRE)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MET** / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	25W020713-022 - BV3NJ8386 Réf. prél : P152 E/ R+1/ CIRCULATION ADMIN/Rebouchage - Enduit - (plâtre/blanc(he)/TABLEAU FENETRE TETE DE VIS)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)

(1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
(2) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
(3) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP : Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2,P-MO-SOP7718 Ed. 1.1/15.03.2022.

MET : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à pa de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021,P-ME-SOP7663 Ed.1.2/08.05.2023.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-042402-01 | Date d'émission de rapport : 25/06/2025 14:18 |
Référence laboratoire N° : 25RB020550 | Référence de suivi du dossier N° : 25W020713
Reçu au laboratoire le : 20/06/2025 | Date de réception :19/06/2025
Date d'analyse : 24/06/2025
Référence dossier Client:25W020713 - 1510797435/23063510/S2/2/2_23063510/4/5

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.
"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur https://www.renar.ro/
NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.
NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).
NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Andra Enescu
Team Leader CRO007

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Andreas LEROUX
Bâtiment OXANE – 4, rue Duguay Trouin
44800 SAINT HERBLAIN

Notre référence : AR-26-NS-003357-01

Numéro de dossier : 26W001526
Référence de dossier : 1510797435/23063510/S2/2/2_23063510/4/5

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 26W001526-001 - Référence *BV3ML0507 Réf. prél : P153 E/ RDC/ E010/Coffre - Peinture - (décorative/bleu(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26W001526-002 - Référence *BV3ML0508 Réf. prél : P154 E/ RDC/ E010/Rebouchage - Enduit - (plâtre/blanc(he)/TETE DE VIS)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26W001526-003 - Référence *BV3ML0509 Réf. prél : P155 E/ RDC/ E029/Coffre - Peinture - (décorative/bleu(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26W001526-004 - Référence *BV3ML0510 Réf. prél : P156 E/ RDC/ E029/Rebouchage - Enduit - (plâtre/blanc(he)/TETE DE VIS)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26W001526-005 - Référence *BV3ML0511 Réf. prél : P157 E/ RDC/ E031/Coffre - Peinture - (décorative/bleu(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26W001526-006 - Référence *BV3ML0512 Réf. prél : P158 E/ RDC/ E031/Rebouchage - Enduit - (plâtre/blanc(he)/TETE DE VIS)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26W001526-007 - Référence *BV3ML0513 Réf. prél : P159 E/ RDC/ E040/Coffre - Peinture - (décorative/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26W001526-008 - Référence *BV3ML0514 Réf. prél : P160 E/ RDC/ E044/Coffre - Peinture - (décorative/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26W001526-009 - Référence *BV3ML0515 Réf. prél : P161 E/ R+1/ E116/Coffre - Peinture - (décorative/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26W001526-010 - Référence *BV3ML0516 Réf. prél : P162 E/ R+1/ E116/Rebouchage - Enduit - (plâtre/blanc(he)/TETE DE VIS)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26W001526-011 - Référence *BV3ML0517 Réf. prél : P163 E/ R+1/ E121/Coffre - Peinture - (décorative/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26W001526-012 - Référence *BV3ML0518 Réf. prél : P164 E/ R+1/ E121/Rebouchage - Enduit - (plâtre/blanc(he)/TETE DE VIS)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26W001526-013 - Référence *BV3ML0519 Réf. prél : P165 E/ R+1/ E133/Coffre - Peinture - (décorative/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26W001526-014 - Référence *BV3ML0520 Réf. prél : P166 E/ R+1/ E133/Rebouchage - Enduit - (plâtre/blanc(he)/TETE DE VIS)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26W001526-015 - Référence *BV3ML0521 Réf. prél : P167 E/ R+2/ E205/Coffre - Peinture - (décorative/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26W001526-016 - Référence *BV3ML0522 Réf. prél : P168 E/ R+2/ E205/Rebouchage - Enduit - (plâtre/blanc(he)/TETE DE VIS)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26W001526-017 - Référence *BV3ML0523 Réf. prél : P169 E/ R+2/ E204/Coffre - Peinture - (décorative/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26W001526-018 - Référence *BV3ML0524 Réf. prél : P170 E/ R+2/ E204/Rebouchage - Enduit - (plâtre/blanc(he)/TETE DE VIS)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26W001526-019 - Référence *BV3ML0525 Réf. prél : P171 E/ R+2/ E204/Coffre - Peinture - (décorative/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26W001526-020 - Référence *BV3ML0526 Réf. prél : P172 E/ R+2/ E204/Rebouchage - Enduit - (plâtre/blanc(he)/TETE DE VIS)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26W001526-021 - Référence *BV3ML0527 Réf. prél : P173 E/ R+3/ E303/Coffre - Peinture - (décorative/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26W001526-022 - Référence *BV3ML0528 Réf. prél : P174 E/ R+3/ E303/Rebouchage - Enduit - (plâtre/blanc(he)/TETE DE VIS)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26W001526-023 - Référence *BV3ML0529 Réf. prél : P175 E/ R+3/ E314 - E301/Coffre - Peinture - (décorative/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26W001526-024 - Référence *BV3ML0530 Réf. prél : P176 E/ R+3/ E314 - E301/Rebouchage - Enduit - (plâtre/blanc(he)/TETE DE VIS)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre
F-44308 Nantes
Tél: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

eurofins

acreditat pentru ÎNCERCARE
RENAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1229

P-RS-FRM8220

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT OUEST SAS
Laboratoire Analyses Nantes
EUROFINS ABO
Site de la Géraudière
Rue Pierre Adolphe Bobierre - CS90827
44300 NANTES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RB-001232-01
Référence laboratoire N° : 26RB001341
Reçu au laboratoire le : 20/01/2026
Date d'analyse : 21/01/2026
Référence dossier Client:26W001526 - 1510797435/23063510/S2/2/2_23063510/4/5

Date d'émission de rapport : 23/01/2026 3:03
Référence de suivi du dossier N° : 26W001526
Date de réception :19/01/2026

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	26W001526-001 - BV3ML0507 Réf. prél : P153 E/ RDC/ E010/Coffre - Peinture (décorative/bleu(e))	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MET** / NMJ6	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
002	26W001526-002 - BV3ML0508 Réf. prél : P154 E/ RDC/ E010/Rebouchage - Enduit - (plâtre/blanc(he)/TETE DE VIS)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (gris)	**MET** / CHN8	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
003 (1)	26W001526-003 - BV3ML0509 Réf. prél : P155 E/ RDC/ E029/Coffre - Peinture (décorative/bleu(e))	Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MET** / S7VS	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
004 (2)	26W001526-004 - BV3ML0510 Réf. prél : P156 E/ RDC/ E029/Rebouchage - Enduit - (plâtre/blanc(he)/TETE DE VIS)	Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / CHN8	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RB-001232-01 | Date d'émission de rapport : 23/01/2026 3:03 | Page2/6
Référence laboratoire N° : 26RB001341 | Référence de suivi du dossier N° : 26W001526
Reçu au laboratoire le : 20/01/2026 | Date de réception :19/01/2026
Date d'analyse : 21/01/2026
Référence dossier Client:26W001526 - 1510797435/23063510/S2/2/2_23063510/4/5

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005 (2) (3)	26W001526-005 - BV3ML0511 Réf. prél : P157 E/ RDC/ E031/Coffre - Peinture (décorative/bleu(e))	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** / VR8T	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006 (2)	26W001526-006 - BV3ML0512 Réf. prél : P158 E/ RDC/ E031/Rebouchage - Enduit - (plâtre/blanc(he)/TETE DE VIS)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / CHN8	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
007	26W001526-007 - BV3ML0513 Réf. prél : P159 E/ RDC/ E040/Coffre - Peinture (décorative/blanc(he))	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MET** / CHN8	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	26W001526-008 - BV3ML0514 Réf. prél : P160 E/ RDC/ E044/Coffre - Peinture (décorative/blanc(he))	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MET** / CHN8	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	26W001526-009 - BV3ML0515 Réf. prél : P161 E/ R+1/ E116/Coffre - Peinture (décorative/blanc(he))	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MET** / RX9G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RB-001232-01 | Date d'émission de rapport : 23/01/2026 3:03 | Page3/6
Référence laboratoire N° : 26RB001341 | Référence de suivi du dossier N° : 26W001526
Reçu au laboratoire le : 20/01/2026 | Date de réception :19/01/2026
Date d'analyse : 21/01/2026
Référence dossier Client:26W001526 - 1510797435/23063510/S2/2/2_23063510/4/5

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010 (1) (2)	26W001526-010 - BV3ML0516 Réf. prél : P162 E/ R+1/ E116/Rebouchage - Enduit - (plâtre/blanc(he)/TETE DE VIS)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (fibreux) (marron)	**MET** / PUU9	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
011 (2) (3)	26W001526-011 - BV3ML0517 Réf. prél : P163 E/ R+1/ E121/Coffre - Peinture (décorative/blanc(he))	Matériau de type système d'enduit peinture (orange) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MET** / VR8T	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012 (2)	26W001526-012 - BV3ML0518 Réf. prél : P164 E/ R+1/ E121/Rebouchage - Enduit - (plâtre/blanc(he)/TETE DE VIS)	Matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur (beige)	**MET** / NMJ6	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013 (1) (2)	26W001526-013 - BV3ML0519 Réf. prél : P165 E/ R+1/ E133/Coffre - Peinture (décorative/blanc(he))	Matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MET** / VR8T	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
014	26W001526-014 - BV3ML0520 Réf. prél : P166 E/ R+1/ E133/Rebouchage - Enduit - (plâtre/blanc(he)/TETE DE VIS)	Matériau de type système d'enduit peinture (orange) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / CHN8	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RB-001232-01 | Date d'émission de rapport : 23/01/2026 3:03 | Page4/6
Référence laboratoire N° : 26RB001341 | Référence de suivi du dossier N° : 26W001526
Reçu au laboratoire le : 20/01/2026 | Date de réception :19/01/2026
Date d'analyse : 21/01/2026
Référence dossier Client:26W001526 - 1510797435/23063510/S2/2/2_23063510/4/5

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015 (1)	26W001526-015 - BV3ML0521 Réf. prél : P167 E/ R+2/ E205/Coffre - Peinture (décorative/blanc(he))	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau (pulvérulent) (noir)	**MET** / VR8T	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
016 (2)	26W001526-016 - BV3ML0522 Réf. prél : P168 E/ R+2/ E205/Rebouchage - Enduit - (plâtre/blanc(he)/TETE DE VIS)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (fibreux) (blanc)	**MET** / CHN8	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
017	26W001526-017 - BV3ML0523 Réf. prél : P169 E/ R+2/ E204/Coffre - Peinture (décorative/blanc(he))	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MET** / NMJ6	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
018 (2)	26W001526-018 - BV3ML0524 Réf. prél : P170 E/ R+2/ E204/Rebouchage - Enduit - (plâtre/blanc(he)/TETE DE VIS)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / CHN8	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
019	26W001526-019 - BV3ML0525 Réf. prél : P171 E/ R+2/ E204/Coffre - Peinture (décorative/blanc(he))	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MET** / RX9G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RB-001232-01 | Date d'émission de rapport : 23/01/2026 3:03 | Page5/6
Référence laboratoire N° : 26RB001341 | Référence de suivi du dossier N° : 26W001526
Reçu au laboratoire le : 20/01/2026 | Date de réception :19/01/2026
Date d'analyse : 21/01/2026
Référence dossier Client:26W001526 - 1510797435/23063510/S2/2/2_23063510/4/5

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020	26W001526-020 - BV3ML0526 Réf. prél : P172 E/ R+2/ E204/Rebouchage - Enduit - (plâtre/blanc(he)/TETE DE VIS)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / CHN8	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
021 (1)	26W001526-021 - BV3ML0527 Réf. prél : P173 E/ R+3/ E303/Coffre - Peinture (décorative/blanc(he))	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MET** / PUU9	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
022	26W001526-022 - BV3ML0528 Réf. prél : P174 E/ R+3/ E303/Rebouchage - Enduit - (plâtre/blanc(he)/TETE DE VIS)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / W4WA	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
023 (2) (3)	26W001526-023 - BV3ML0529 Réf. prél : P175 E/ R+3/ E314 - E301/Coffre - Peinture (décorative/blanc(he))	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige)	**MET** / VR8T	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024 (2)	26W001526-024 - BV3ML0530 Réf. prél : P176 E/ R+3/ E314 - E301/Rebouchage - Enduit - (plâtre/blanc(he)/TETE DE VIS)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (fibreux) (beige) en traces ; matériau semi-dur (gris) en traces	**MET** / W4WA	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RB-001232-01 | Date d'émission de rapport : 23/01/2026 3:03 | Page6/6
Référence laboratoire N° : 26RB001341 | Référence de suivi du dossier N° : 26W001526
Reçu au laboratoire le : 20/01/2026 | Date de réception :19/01/2026
Date d'analyse : 21/01/2026
Référence dossier Client:26W001526 - 1510797435/23063510/S2/2/2_23063510/4/5

Observation(s) échantillon(s)

(1) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.
(2) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
(3) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à pa de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021,P-ME-SOP7663 Ed.1.2/08.05.2023.

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.
NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.
"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur https://www.renar.ro/
NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.
NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).
NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Validé et approuvé par :



Vicentiu Stoica
Team Leader CRO007

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România
