N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	Noms ressources
1		**Avant projet**	**150 jours**	**Lun 03/11/25**	**Ven 12/06/26**		
2		Rédaction du PC	10 jours	Lun 03/11/25	Ven 14/11/25		
3		Dépose du PC	1 jour	Lun 17/11/25	Lun 17/11/25	2	
4		Rédaction DCE	45 jours	Lun 03/11/25	Ven 16/01/26		
5		Consultation entreprise	95 jours	Lun 02/02/26	Ven 12/06/26		
6		Obtention du PC	1 jour	Ven 17/04/26	Ven 17/04/26		
7		**Notification**	**1 jour**	**Lun 15/06/26**	**Lun 15/06/26**		
8		Notification marché	1 jour	Lun 15/06/26	Lun 15/06/26	5	
9		**Préparation de travaux**	**30 jours**	**Mar 16/06/26**	**Lun 27/07/26**		
10		Etude d'EXE et préparation	20 jours	Mar 16/06/26	Lun 13/07/26	8	
11		Validation des études	10 jours	Mar 14/07/26	Lun 27/07/26	10	
12		Repérage du site	1 jour	Mar 30/06/26	Mar 30/06/26	8FD+10 jours	
13		Installation de chantier	5 jours	Mar 30/06/26	Lun 06/07/26	8FD+10 jours	
14		**Exécution**	**149 jours**	**Mar 30/06/26**	**Lun 01/03/27**		
15		**Extension**	**125 jours**	**Mar 30/06/26**	**Mar 26/01/27**		
16		Plan de retrait	5 jours	Mar 30/06/26	Lun 06/07/26	8FD+10 jours	
17		Délai de carrence	20 jours	Mar 07/07/26	Mar 25/08/26	16	
18		Désamiantage	10 jours	Mer 26/08/26	Mar 08/09/26	17	
19		Démolitions et curage	5 jours	Mer 09/09/26	Mar 15/09/26	18	
20		Terrassement	5 jours	Mer 16/09/26	Mar 22/09/26	19	
21		Gros-œuvres	35 jours	Mer 23/09/26	Mar 10/11/26	20	
22		Menuiserie extérieure	5 jours	Mer 11/11/26	Mar 17/11/26	21	
23		Etanchéité	5 jours	Mer 25/11/26	Mar 01/12/26	24DD+5 jours	
24		Façade	15 jours	Mer 18/11/26	Mar 08/12/26	22	
25		Tirage réseaux lots techniques	40 jours	Mer 07/10/26	Mar 01/12/26	20DD+15 jours	
26		Cloison	10 jours	Mer 02/12/26	Mar 15/12/26	23	
27		Pose des sols	5 jours	Mer 16/12/26	Mar 05/01/27	26	
28		Menuiserie bois	5 jours	Mer 06/01/27	Mar 12/01/27	27	
29		Peinture	5 jours	Mer 13/01/27	Mar 19/01/27	28	
30		Appareillage lots techniques	5 jours	Mer 20/01/27	Mar 26/01/27	29	
31		Aménagement extérieur - espace vert	10 jours	Mer 16/12/26	Mar 12/01/27	26	
32		**Existant**	**26 jours**	**Mer 11/11/26**	**Mer 16/12/26**		
33		Consignation lots techniques	1 jour	Mer 11/11/26	Mer 11/11/26	21	
34		Reprise en sous-œuvre	3 jours	Jeu 12/11/26	Lun 16/11/26	33	
35		Tirage réseaux lots techniques	2 jours	Mar 17/11/26	Mer 18/11/26	34	
36		Cloison	1 jour	Jeu 19/11/26	Jeu 19/11/26	35	
37		Ragréage	5 jours	Ven 20/11/26	Jeu 26/11/26	36	
38		Pose de sol	5 jours	Ven 27/11/26	Jeu 03/12/26	37	
39		Petite menuiserie bois	2 jours	Ven 04/12/26	Lun 07/12/26	38	
40		Peinture	5 jours	Mar 08/12/26	Lun 14/12/26	39	
41		Appareillage	2 jours	Mar 15/12/26	Mer 16/12/26	40	
42		**Finition**	**24 jours**	**Mer 27/01/27**	**Lun 01/03/27**		
43		Signalétique	1 jour	Mer 27/01/27	Mer 27/01/27	30	
44		Nettoyage	1 jour	Jeu 28/01/27	Jeu 28/01/27	43	
45		OPR	21 jours	Ven 29/01/27	Ven 26/02/27	44	
46		Nettoyage final	1 jour	Lun 01/03/27	Lun 01/03/27	45	
47		**Réception**	**22 jours**	**Mar 02/03/27**	**Mer 31/03/27**		
48		PV réception	1 jour	Mar 02/03/27	Mar 02/03/27	46	
49		Levée des réserves	20 jours	Mer 03/03/27	Mar 30/03/27	48	
50		Ouverture au public	1 jour	Mer 31/03/27	Mer 31/03/27	49	

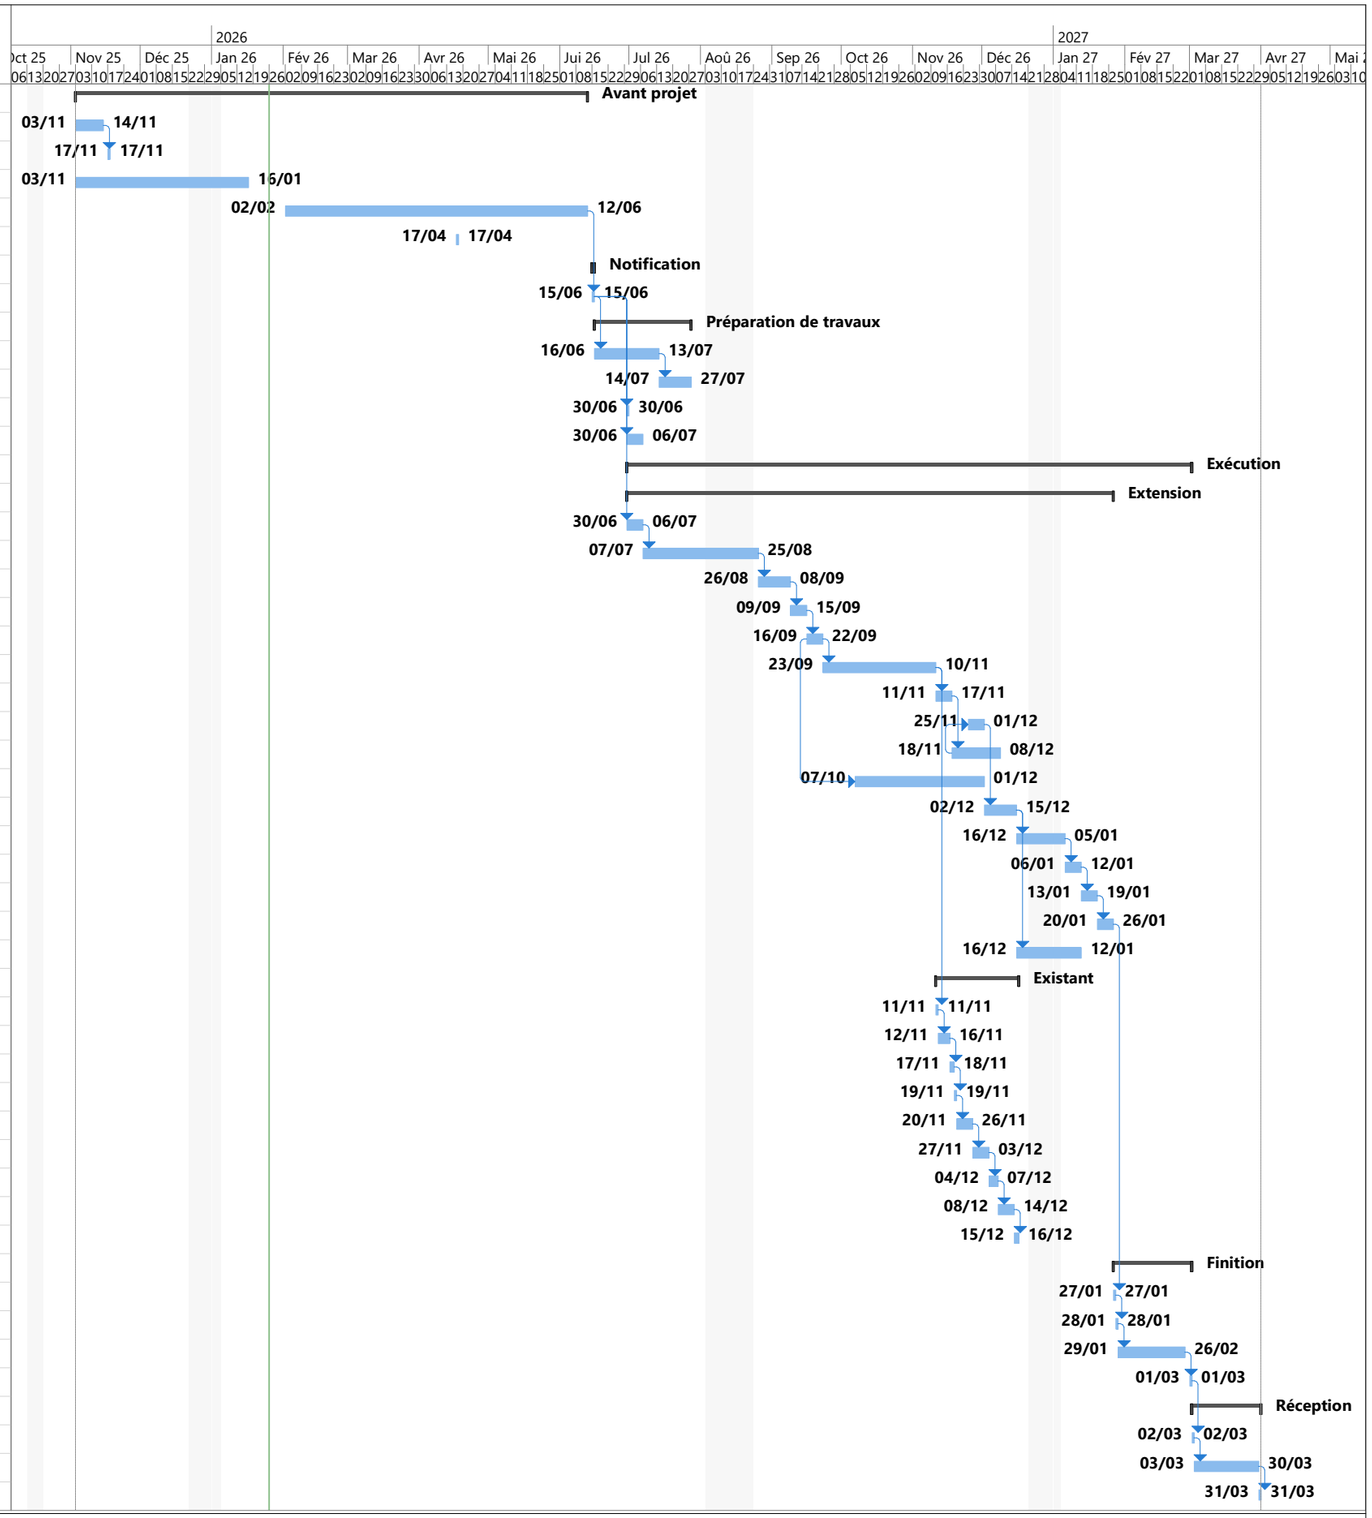

Projet : PLANNING PREV- 210
Date : Lun 26/01/26

Tâche		Récapitulatif du projet		Tâche manuelle		Début uniquement		Échéance
Fractionnement		Tâche inactive		Durée uniquement		Fin uniquement		Avancement
Jalon		Jalon inactif		Report récapitulatif manuel		Tâches externes		Progression manuelle
Récapitulative		Récapitulatif inactif		Récapitulatif manuel		Jalons externes		

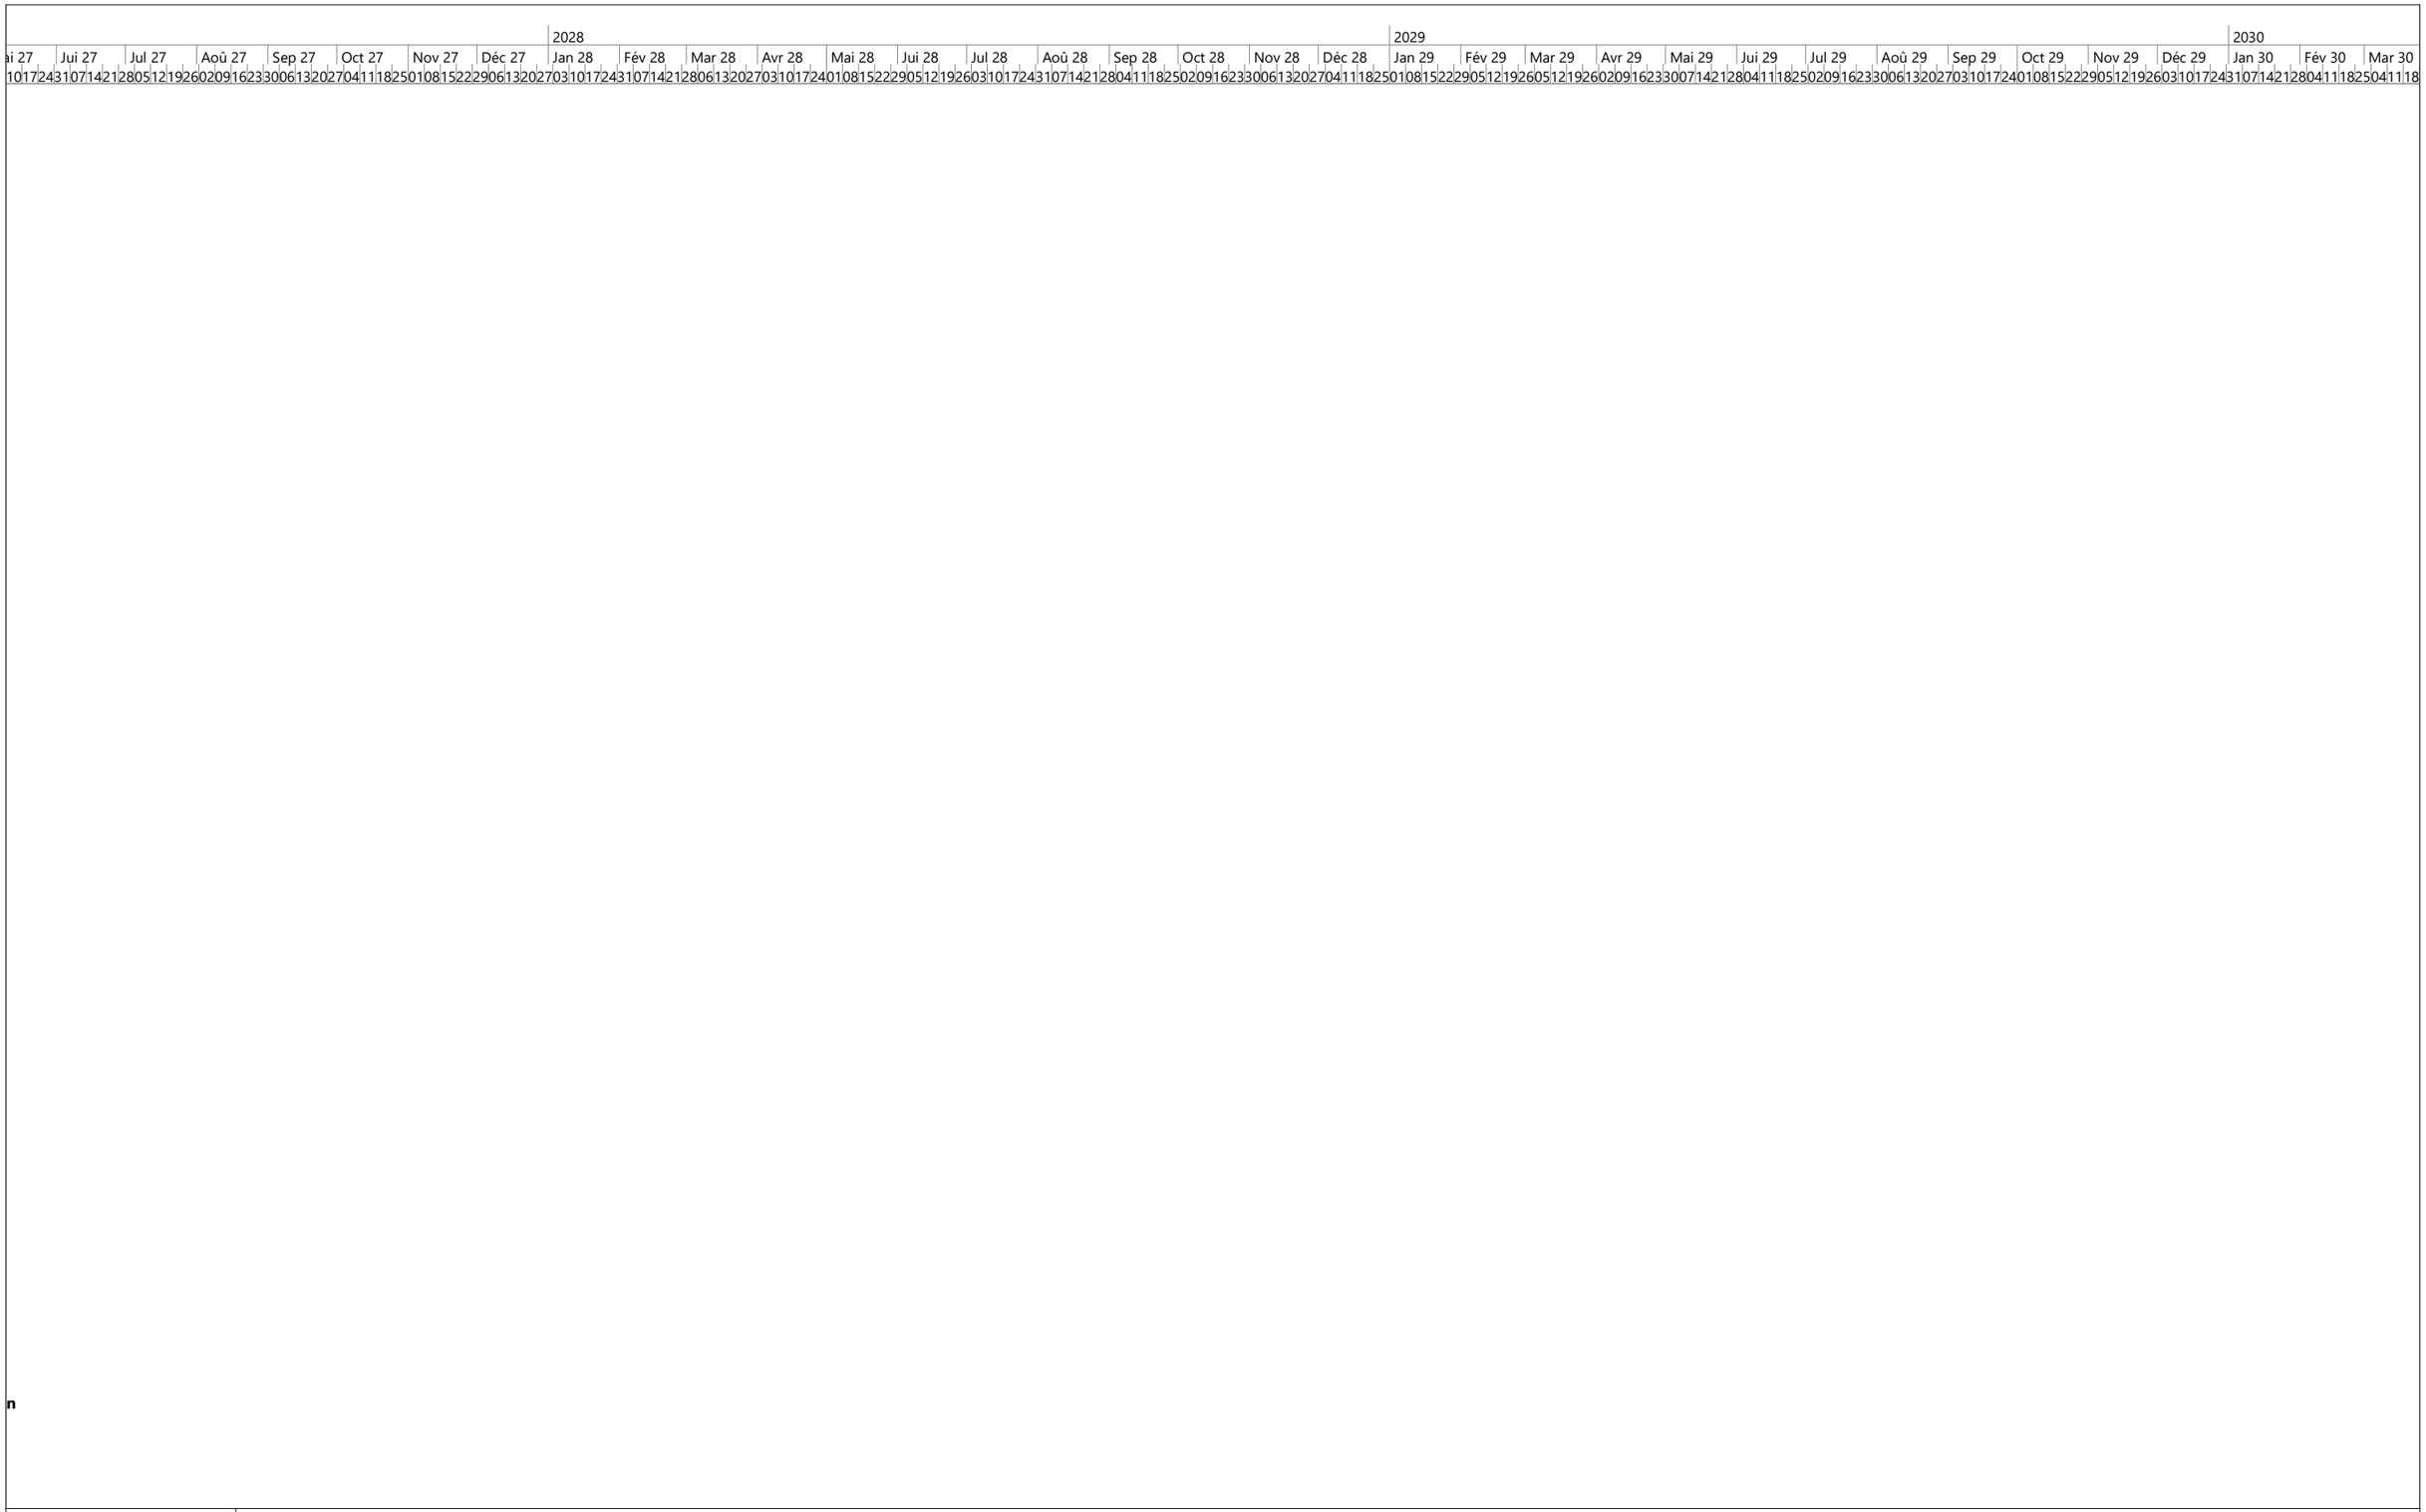

Projet : PLANNING PREV- 210
Date : Lun 26/01/26

Tâche		Récapitulatif du projet		Tâche manuelle		Début uniquement		Échéance	
Fractionnement		Tâche inactive		Durée uniquement		Fin uniquement		Avancement	
Jalon		Jalon inactif		Report récapitulatif manuel		Tâches externes		Progression manuelle	
Récapitulative		Récapitulatif inactif		Récapitulatif manuel		Jalons externes			
