alterea INGÉNIERIE

UIOSS37- CPAM TOURS
DCE - Planning prévisionnel
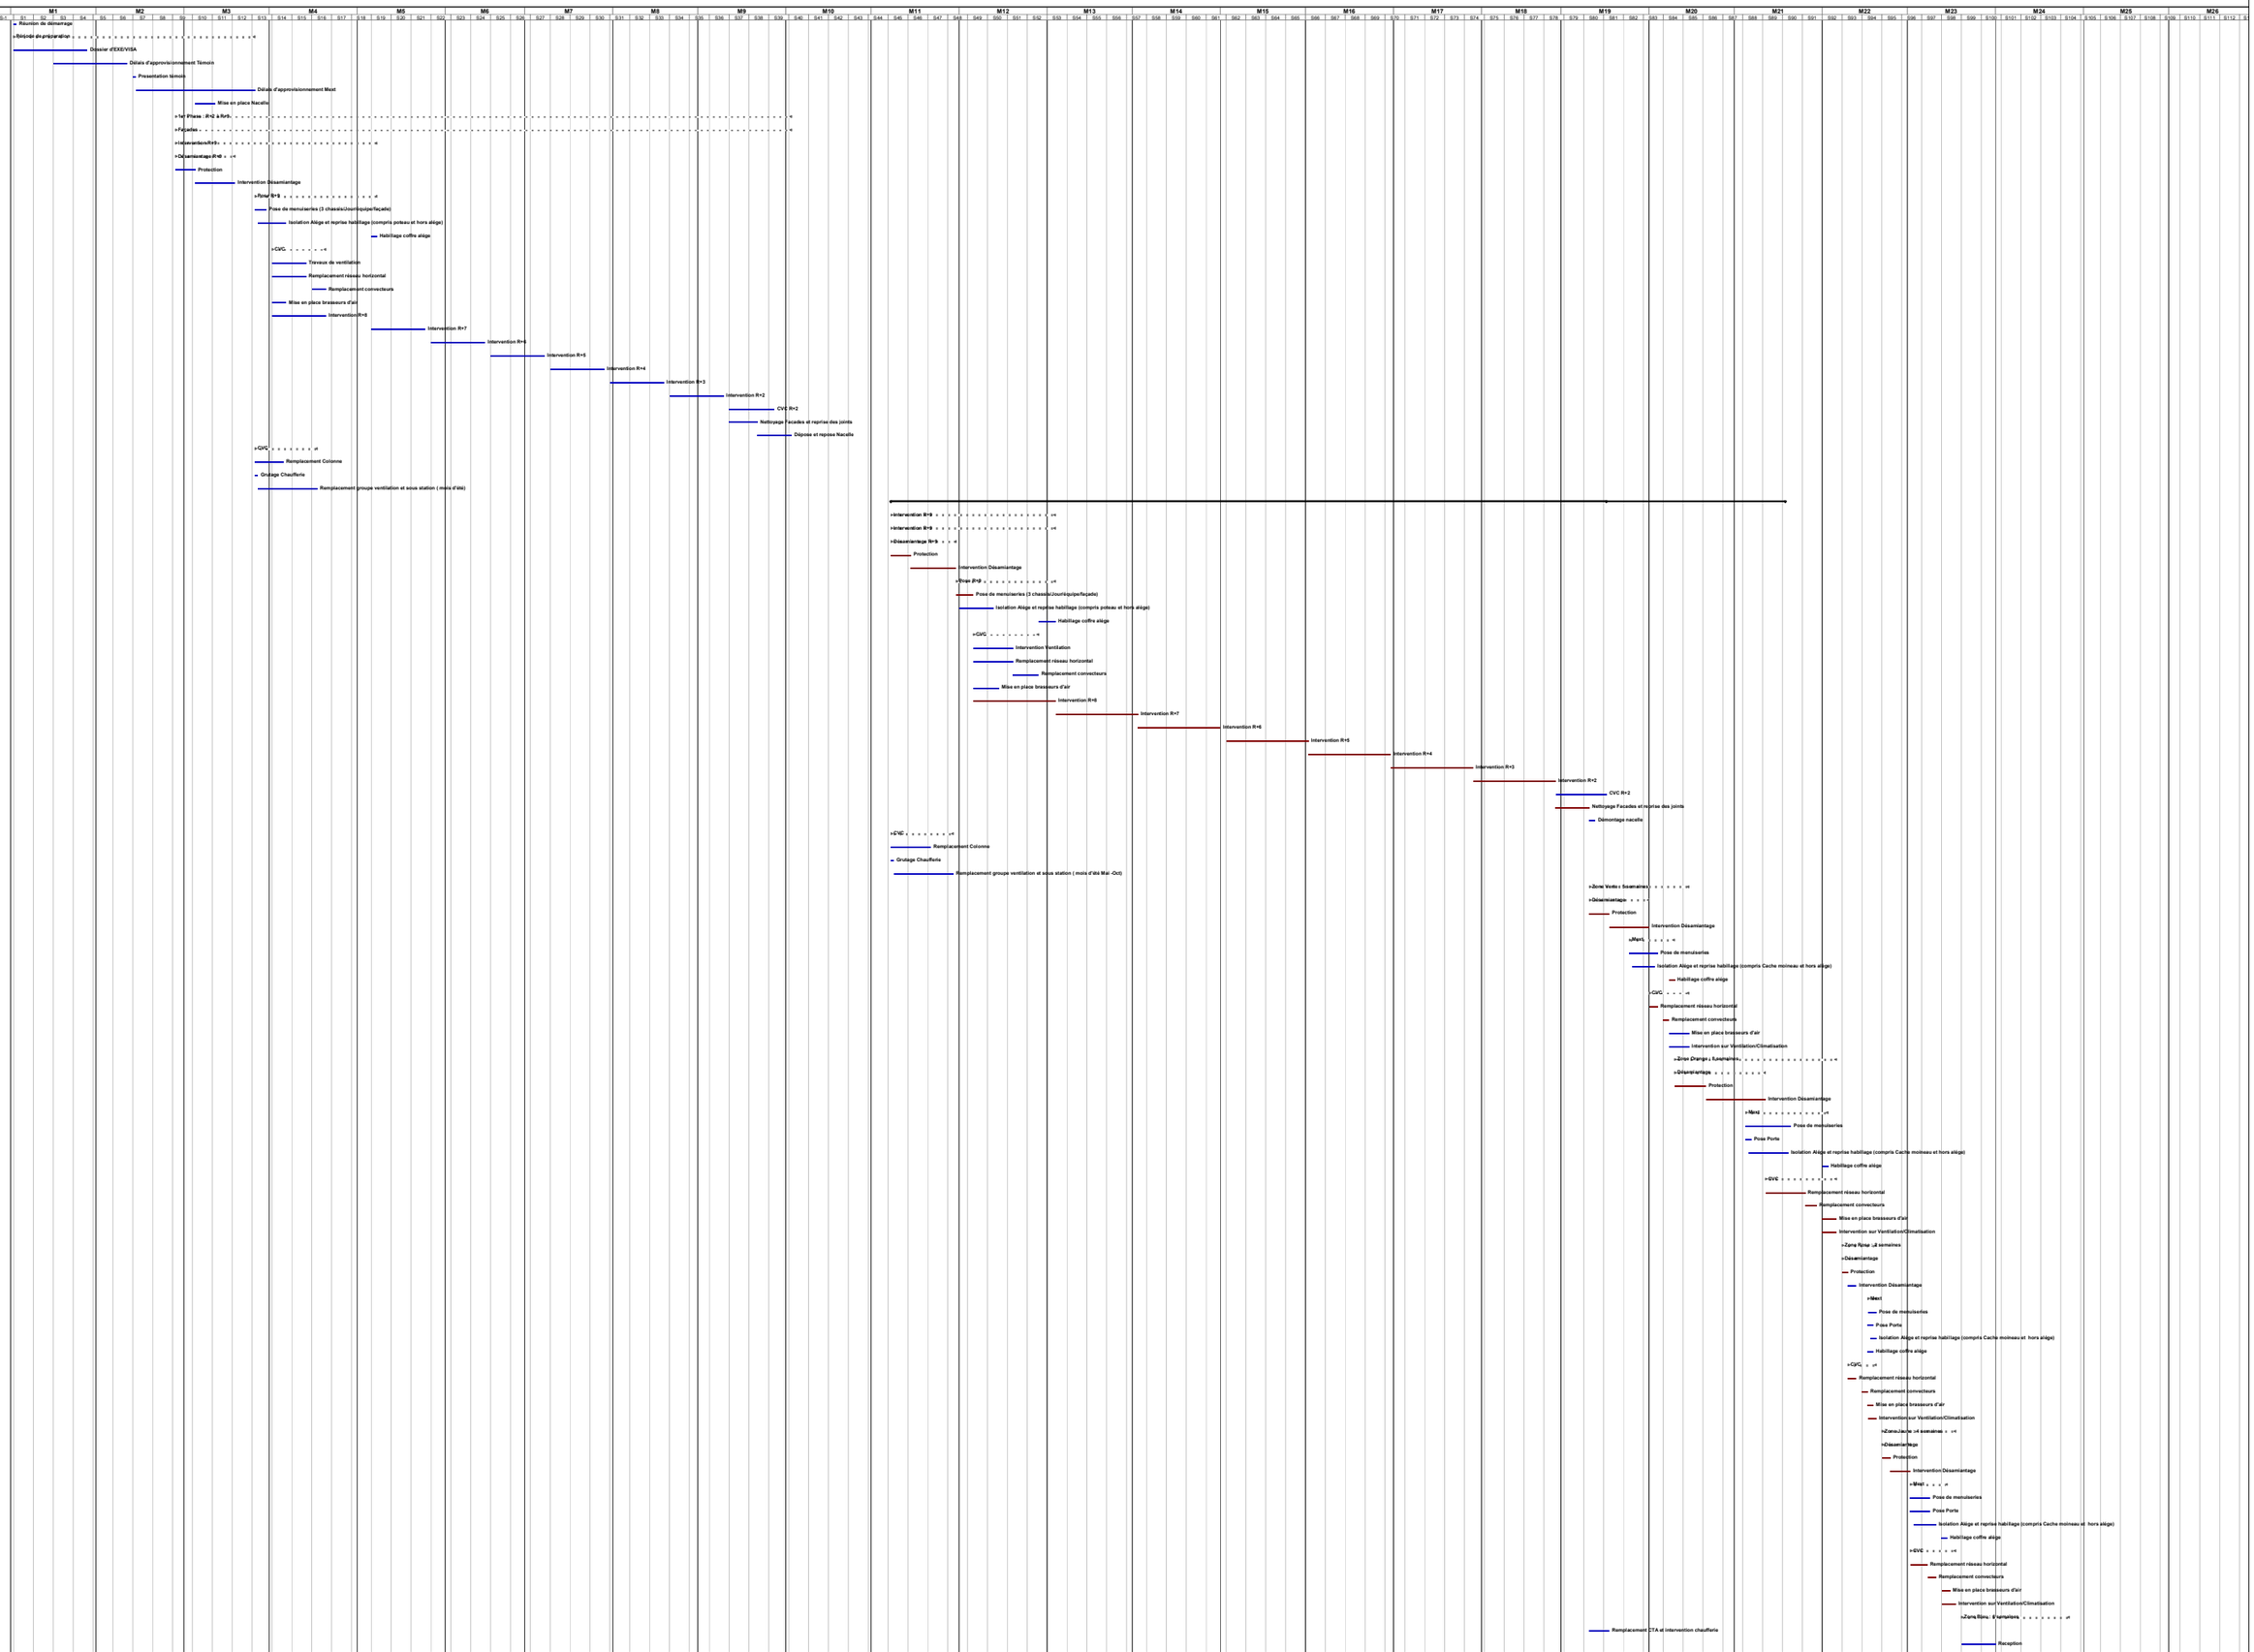
N°	Nom de la tâche	Durée
1	Réunion de démarrage	1 jour
2	**Période de préparation**	**61 jours**
3	Dossier d'EXE/VISA	1 mois
4	Délais d'approvisionnement Témoin	1 mois
5	Presentation témoin	1 jour
6	Délais d'approvisionnement Mext	1.5 mois
7	Mise en place Nacelle	5 jours
8	**1er Phase : R+2 à R+9**	**145 jours**
9	**Facades**	**145 jours**
10	**Intervention R+9**	**41 jours**
11	**Désamiantage R+9**	**15 jours**
12	Protection	5 jours
13	Intervention Désamiantage	10 jours
14	**Pose R+9**	**21 jours**
15	Pose de menuiseries (3 chassis/Jour/equipe/facade)	4 jours
16	Isolation Alége et reprise habillage (compris poteau et hors alége)	8 jours
17	Habillage coffre alége	2 jours
18	**CVC**	**15 jours**
19	Travaux de ventilation	10 jours
20	Remplacement réseau horizontal	10 jours
21	Remplacement convecteurs	5 jours
22	Mise en place brasseurs d'air	5 jours
23	Intervention R+8	15 jours
24	Intervention R+7	15 jours
25	Intervention R+6	15 jours
26	Intervention R+5	15 jours
27	Intervention R+4	15 jours
28	Intervention R+3	15 jours
29	Intervention R+2	15 jours
30	CVC R+2	12 jours
31	Nettoyage Facades et reprise des joints	8 jours
32	Dépose et repose Nacelle	8 jours
33	**CVC**	**16 jours**
34	Remplacement Colonne	8 jours
35	Grutage Chaufferie	1 jour
36	Remplacement groupe ventilation et sous station (mois d'été)	15 jours
37	**2ème Phase : R+2 à R+9**	**225 jours**
38	**Intervention R+9**	**42 jours**
39	**Intervention R+9**	**42 jours**
40	**Désamiantage R+9**	**17 jours**
41	Protection	5 jours
42	Intervention Désamiantage	12 jours
43	**Pose R+9**	**25 jours**
44	Pose de menuiseries (3 chassis/Jour/equipe/facade)	4 jours
45	Isolation Alége et reprise habillage (compris poteau et hors alége)	8 jours
46	Habillage coffre alége	4 jours
47	**CVC**	**17 jours**
48	Intervention Ventilation	10 jours
49	Remplacement réseau horizontal	10 jours
50	Remplacement convecteurs	7 jours
51	Mise en place brasseurs d'air	7 jours
52	Intervention R+8	21 jours
53	Intervention R+7	21 jours
54	Intervention R+6	21 jours
55	Intervention R+5	21 jours
56	Intervention R+4	21 jours
57	Intervention R+3	21 jours
58	Intervention R+2	21 jours
59	CVC R+2	12 jours
60	Nettoyage Facades et reprise des joints	8 jours
61	Démontage nacelle	2 jours
62	**CVC**	**16 jours**
63	Remplacement Colonne	10 jours
64	Grutage Chaufferie	1 jour
65	Remplacement groupe ventilation et sous station (mois d'été Mai -Oct)	15 jours
66	**Zone Verte : 5 semaines**	**25 jours**
67	**Désamiantage**	**15 jours**
68	Protection	5 jours
69	Intervention Désamiantage	10 jours
70	**Mext**	**12 jours**
71	Pose de menuiseries	8 jours
72	Isolation Alége et reprise habillage (compris Cache moineau et hors alége)	6 jours
73	Habillage coffre alége	2 jours
74	**CVC**	**10 jours**
75	Remplacement réseau horizontal	3 jours
76	Remplacement convecteurs	2 jours
77	Mise en place brasseurs d'air	5 jours
78	Intervention sur Ventilation/Climatisation	5 jours
79	**Zone Orange : 8 semaines**	**41 jours**
80	**Désamiantage**	**22 jours**
81	Protection	7 jours
82	Intervention Désamiantage	15 jours
83	**Mext**	**21 jours**
84	Pose de menuiseries	12 jours
85	Pose Porte	2 jours
86	Isolation Alége et reprise habillage (compris Cache moineau et hors alége)	10 jours
87	Habillage coffre alége	2 jours
88	**CVC**	**19 jours**
89	Remplacement réseau horizontal	10 jours
90	Remplacement convecteurs	4 jours
91	Mise en place brasseurs d'air	5 jours
92	Intervention sur Ventilation/Climatisation	5 jours
93	**Zone Rose : 2 semaines**	**10 jours**
94	**Désamiantage**	**5 jours**
95	Protection	2 jours
96	Intervention Désamiantage	3 jours
97	**Mext**	**3 jours**
98	Pose de menuiseries	3 jours
99	Pose Porte	2 jours
100	Isolation Alége et reprise habillage (compris Cache moineau et hors alége)	2 jours
101	Habillage coffre alége	2 jours
102	**CVC**	**8 jours**
103	Remplacement réseau horizontal	3 jours
104	Remplacement convecteurs	2 jours
105	Mise en place brasseurs d'air	2 jours
106	Intervention sur Ventilation/Climatisation	3 jours
107	**Zone Jaune : 4 semaines**	**20 jours**
108	**Désamiantage**	**8 jours**
109	Protection	3 jours
110	Intervention Désamiantage	5 jours
111	**Mext**	**9 jours**
112	Pose de menuiseries	5 jours
113	Pose Porte	5 jours
114	Isolation Alége et reprise habillage (compris Cache moineau et hors alége)	6 jours
115	Habillage coffre alége	2 jours
116	**CVC**	**12 jours**
117	Remplacement réseau horizontal	4 jours
118	Remplacement convecteurs	3 jours
119	Mise en place brasseurs d'air	3 jours
120	Intervention sur Ventilation/Climatisation	5 jours
121	**Zone Bleu : 6 semaines**	**25 jours**
135	Remplacement CTA et intervention chaufferie	5 jours
136	Reception	10 jours
