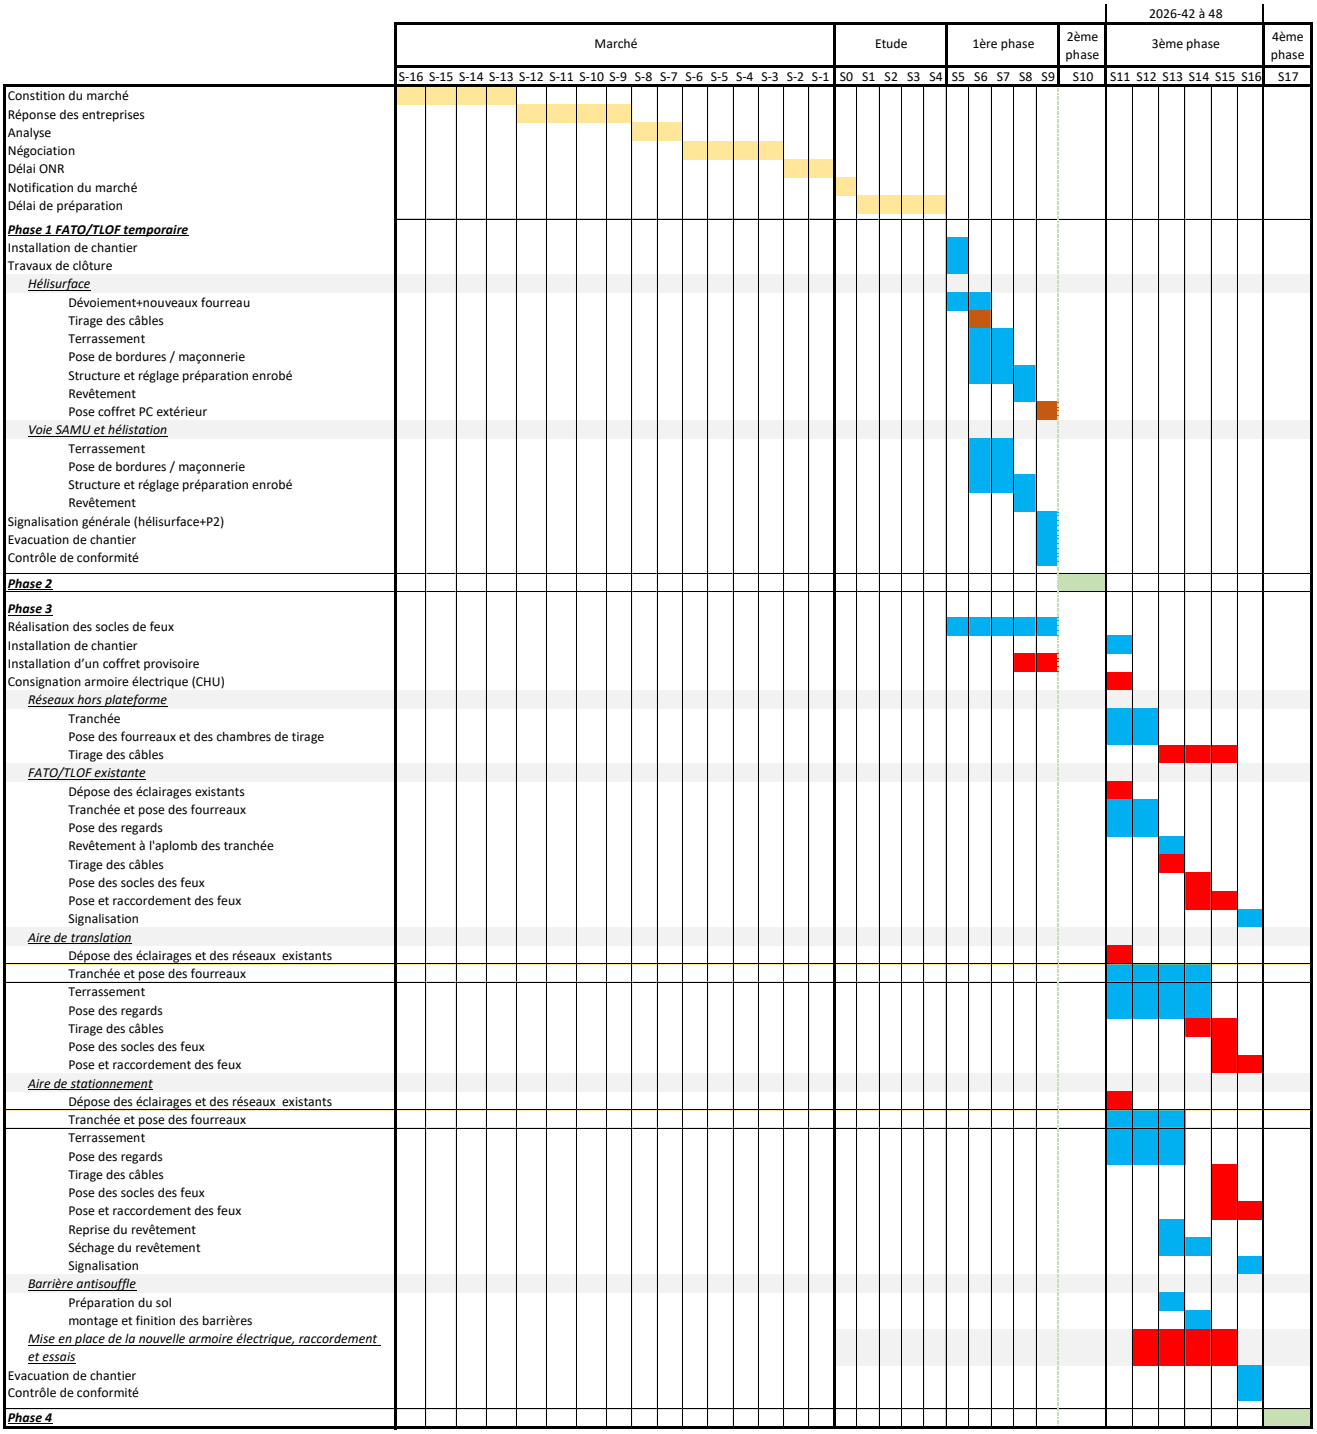
2026-42 à 48
Marché
Etude
1ère phase
2ème phase
3ème phase
4ème phase
S-16 S-15 S-14 S-13 S-12 S-11 S-10 S-9 S-8 S-7 S-6 S-5 S-4 S-3 S-2 S-1 S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17
Constition du marché
Réponse des entreprises
Analyse
Négociation
Délai ONR
Notification du marché
Délai de préparation
Phase 1 FATO/TLOF temporaire
Installation de chantier
Travaux de clôture
Hélisurface
Dévoiement+nouveaux fourreau
Tirage des câbles
Terrassement
Pose de bordures / maçonnerie
Structure et réglage préparation enrobé
Revêtement
Pose coffret PC extérieur
Voie SAMU et hélistation
Terrassement
Pose de bordures / maçonnerie
Structure et réglage préparation enrobé
Revêtement
Signalisation générale (hélisurface+P2)
Evacuation de chantier
Contrôle de conformité
Phase 2
Phase 3
Réalisation des socles de feux
Installation de chantier
Installation d'un coffret provisoire
Consignation armoire électrique (CHU)
Réseaux hors plateforme
Tranchée
Pose des fourreaux et des chambres de tirage
Tirage des câbles
FATO/TLOF existante
Dépose des éclairages existants
Tranchée et pose des fourreaux
Pose des regards
Revêtement à l'aplomb des tranchée
Tirage des câbles
Pose des socles des feux
Pose et raccordement des feux
Signalisation
Aire de translation
Dépose des éclairages et des réseaux existants
Tranchée et pose des fourreaux
Terrassement
Pose des regards
Tirage des câbles
Pose des socles des feux
Pose et raccordement des feux
Aire de stationnement
Dépose des éclairages et des réseaux existants
Tranchée et pose des fourreaux
Terrassement
Pose des regards
Tirage des câbles
Pose des socles des feux
Pose et raccordement des feux
Reprise du revêtement
Séchage du revêtement
Signalisation
Barrière antisouffle
Préparation du sol
montage et finition des barrières
Mise en place de la nouvelle armoire électrique, raccordement et essais
Evacuation de chantier
Contrôle de conformité
Phase 4
