CONTREXEVILLE

DECONSTRUCTION DE L'ANCIENNE PAPETERIE ET LOCAUX COMMERCIAUX

PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX

N°	Nom de la tâche	rédécesseur	Durée
1	OS démarrage des travaux		1 jr
2	Période de préparation	1	22 jrs
3	**SITE ANCIENNE PAPETERIE**		**1 jr?**
4	Plan de retrait amiante		22 jrs
5	Installation de chantier	2	6 jrs
6	Sécurisation voirie publique et tennis	5	2 jrs
7	Sécurisation intérieur batiment avant désamiantage	4	5 jrs
8	Désamiantage	7	10 jrs
9	Mise en place des protections au niveau des mitoyens.	8	3 jrs
10	Purge du batiment	9	10 jrs
11	Dépose éléments pollués prévus au marché	9	2 jrs
12	Déconstruction soignée de la structure jusqu'au RDC haut	10	25 jrs
13	Sécurisation pour intervention EODD (investigations pollutions)	12	2 jrs
14	Interventions EODD (1 à 10 semaines)	13	8 jrs
15	Reprise déconstruction RDC	14	8 jrs
16	Travaux de reprise des murs pignons - mitoyens avec l'habitation	15	40 jrs
17	Nivellement général de la parcelle	16	1 jr
18	Mise en œuvre de concassé sur la parcelle	17	2 jrs
19	Mise en oeuvre drains	18	3 jrs
20	Mise en oeuvre terre végétale + engazonnement	19	4 jrs
21	Réglage et finition de la parcelle	20	1 jr
22	Cloture rigide et portail	21	5 jrs
23	Finitions - nettoyage de chantier	22	2 jrs
24	Repliement des installations de chantier	23	2 jrs
25			1 jr?
26	**SITE LOCAUX COMMERCIAUX**		**1 jr?**
27	Plan de retrait amiante		22 jrs
28	Installation de chantier	13	6 jrs
29	Mise en place des protections au niveau des mitoyens.	28	3 jrs
30	Sécurisation voirie publique	28	2 jrs
31	Purge du batiment	29	5 jrs
32	Déconstruction soignée de la structure	31	10 jrs
33	Remblaiement de la cave - condamnation de la porte - Gestion des traces d'amiante dans le remblai	32	3 jrs
34	Travaux de reprise des murs pignons - mitoyens - Etanchéité cave	33	10 jrs
35	Nivellement général de la parcelle	34	2 jrs
36	Mise en œuvre de concassé sur la parcelle	35	2 jrs
37	Mise en oeuvre drains	36	2 jrs
38	Cloture rigide sur mur de berge	37	3 jrs
39	Finitions - nettoyage de chantier	38	2 jrs
40	Repliement des installations de chantier	39	2 jrs

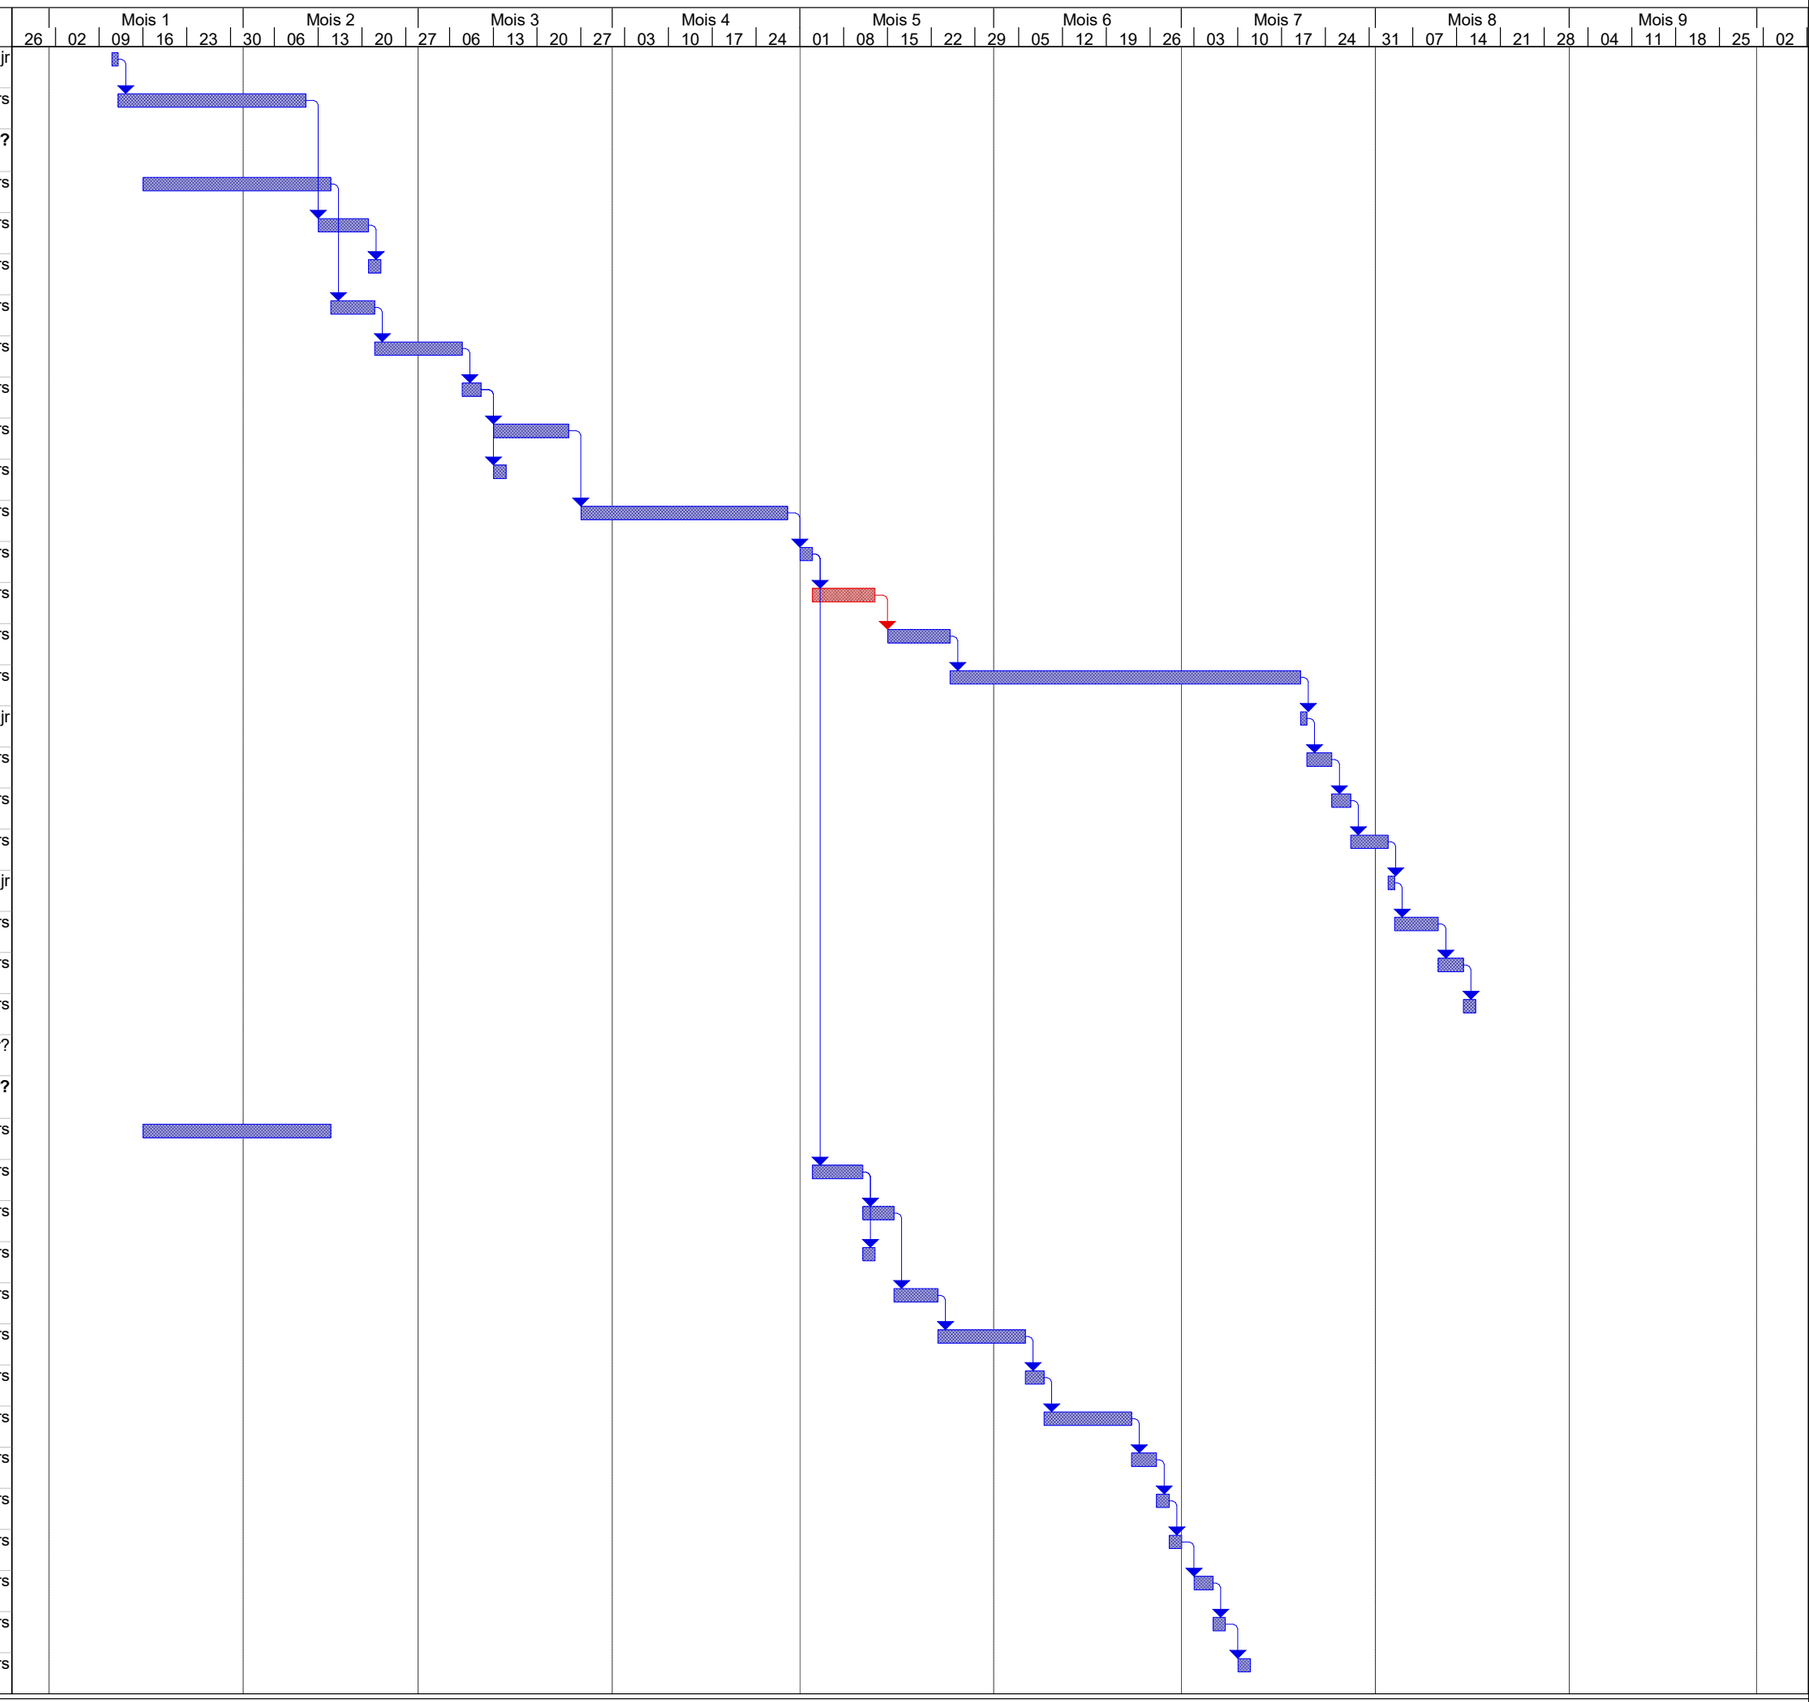

Etabli le : 27/01/26
