# RENOVATION DE BUREAUX et SANITAIRES BÂTIMENT C - PREFECTURE DE NIMES - TRANCHE FERME

| TÂCHE | ATTRIBUÉE À | |
|---|---|---|
| **PERIODE de PREPARATION** | | **26 j** |
| Transmission des fonds de plan dwg | MOE | 1 j |
| Etudes EXE | Tous lots | 26 j |
| Constat d'huissier GO | MOU + Lot 01 | 1 j |
| Déménagement des services présents sur la zone de chantier | MOU | |
| Aménagement de la base de vie | Lot 01 | 5 j |
| **DEPOSE et DEMOLITION** | | **24 j** |
| Condamnation des réseaux (EF, ECS, EU, chauffage central) | Lot 03 + maintenance | 2 j |
| Condamnation des réseaux secs (CFO/CFA) | Lot 02 + maintenance | 2 j |
| Dépose et consignation des équipements incendie | Lot 02 + maintenance | 3 j |
| Dépose et évacuation des unités de climatisation | Lot 02 | 3 j |
| Dépose et évacuation des radiateurs | Lot 02 | 3 j |
| Dépose et évacuation des équipements sanitaire | Lot 02 | 3 j |
| Dépose et remise à la maitrise d'ouvrage des accessoires sanitaires | Lot 02 | 3 j |
| Dépose et évacuation des faux-plafonds existants | Lot 01 | 5 j |
| Dépose et évacuation des revêtements de sols | Lot 01 | 5 j |
| Dépose et évacuation des faïences | Lot 01 | 5 j |
| **ETANCHEITE** | | 21 j |
| Percements en toiture pour passage des réseaux | Lot 01 | 2 j |
| Sorties de toiture et reprise d'étanchéïté | Lot 01 | 2 j |
| Réfection d'étanchéïté suite à la dépose des unités de climatisaiton | Lot 01 | 2 j |
| **RESEAUX** | | **5 j** |
| Chemins de câbles, réseaux frigo, élec et condensas | Lot 02 | 5 j |
| Réseaux de ventilation | Lot 02 | |
| Modification armoire électrique, protection nouveaux équipements | Lot 03 | 3 j |
| Adaptation réseaux CFO et CFA | Lot 02 | 5 j |
| Modification des réseaux EF, ECS, EU dans les sanitaires | Lot 03 | 5 j |
| **CLOISONS - FAUX-PLAFONDS** | | **12 j** |
| Doublages des creaux en allège des menuiseries | Lot 01 | 5 j |
| Ossatures de faux-plafonds | Lot 01 | 5 j |
| Mise en peinture | Lot 01 | 5 j |
| Redressage des murs des sanitaires | Lot 01 | 5 j |
| **REVETEMENTS DE SOLS et FAIENCES** | | **5 j** |
| Ragréage des sols | Lot 01 | 2 j |
| Revêtement de sols | Lot 01 | 2 j |
| Faïences sanitaires | Lot 01 | 5 j |
| **APPAREILLAGES** | | 26 j |
| Pose équipements sanitaires et accessoires | Lot 03 | 5 j |
| Pose et raccordement des éclairages | Lot 02 | 5 j |
| Pose et raccordement des unités intérieures | Lot 03 | 5 j |
| Pose et raccordement des unités extérieures | Lot 03 | 5 j |
| Installation des grilles de transfert | Lot 03 | 5 j |
| Pose et raccordement du caisson de ventilation | Lot 03 | 2 j |
| Mise en service de la climatisation et de la ventilation | Lot 03 | 4 j |
| Repose des équipements incendie et contrôle du bon fonctionnement | Lot 02 + maintenance | |
| **RECEPTION de CHANTIER** | | 22 j |
| OPR | | 1 j |
| Réception | | 1 j |
| Levée des réserves | | 1 j |

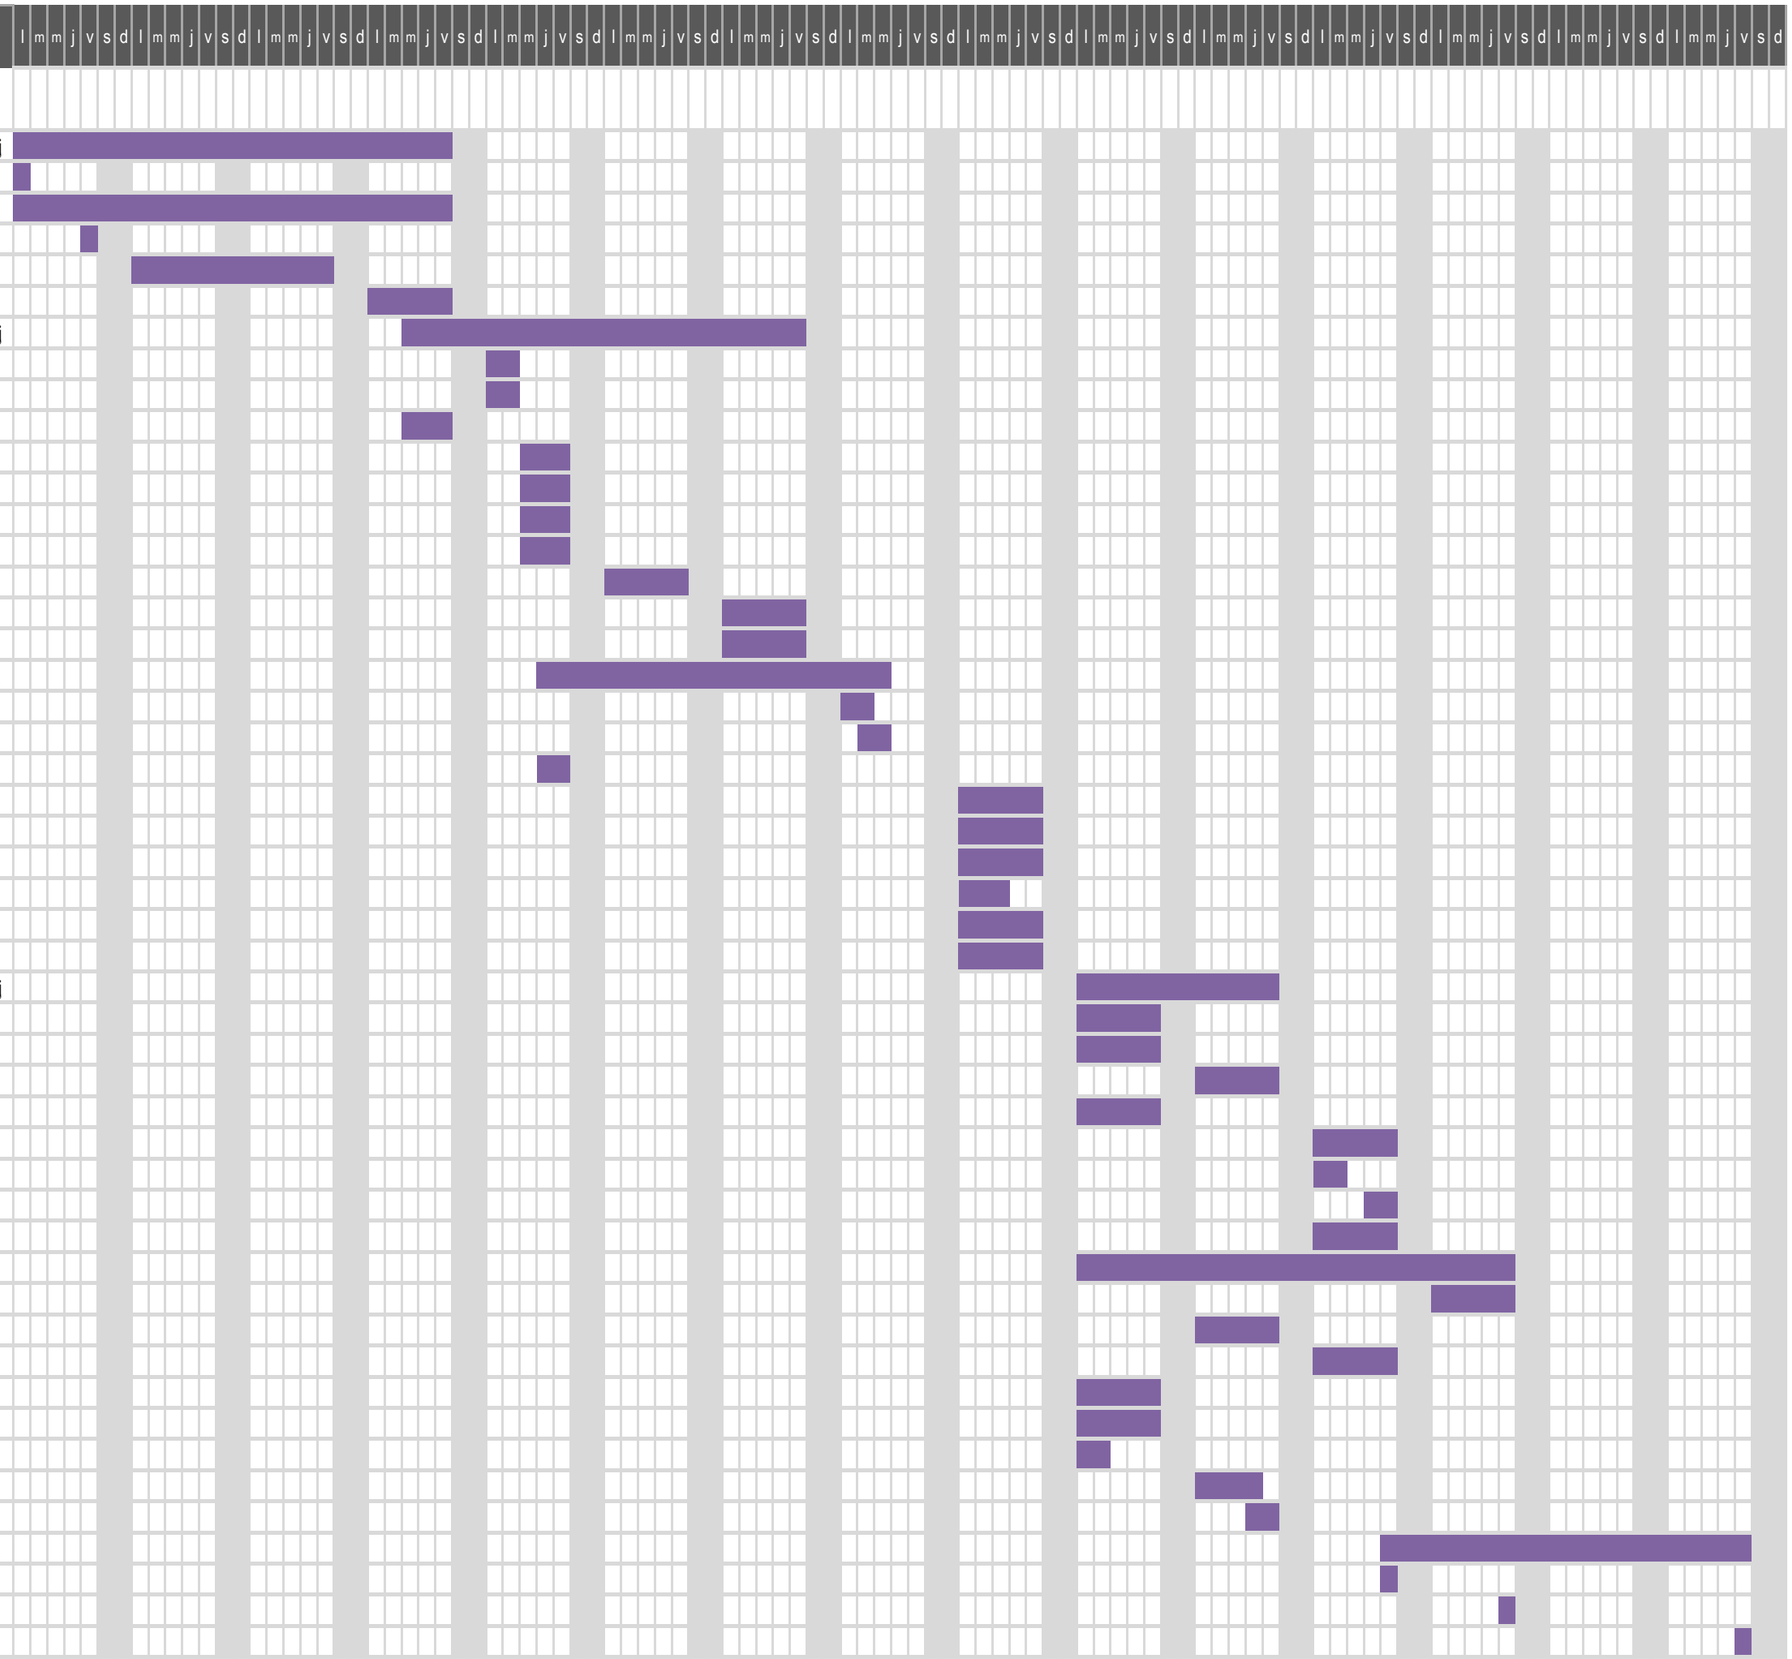


*Insérez les nouvelle lignes au-dessus de celle-ci.*
