G222 - SMR MAURICE DELORT - VIC SUR CERE
PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX - PHASE DCE

N°	Nom de la tâche	Durée
1	Ordre de service	0 jour
2	Préparation de chantier	21 jours
3	**Travaux d'aménagement du R+3 et du R+4**	**64 jours**
4	**LOT N° 01 – MENUISERIE EXTERIEURES ALU**	**7 jours**
5	Pose des occultations	5 jours
6	Pose des entrées d'air	2 jours
7	**LOT N° 02 - MENUISERIE INTERIEURE**	**42 jours**
8	Pose des blocs portes, plinthes	3 jours
9	Aménagements des chambres (placards, coffres, protections)	8 jours
10	**LOT N° 03 - CLOISONS - FAUX-PLAFONDS - PEINTURE**	**52 jours**
11	Démolitions - dépose (compris 1 pièce au R+2)	8 jours
12	Faux-plafonds	8 jours
13	Plâtrerie	8 jours
14	Peinture	10 jours
15	Nettoyage	4 jours
16	**LOT N° 04 - REVÊTEMENT DE SOL PVC**	**32 jours**
17	Dépose	2 jours
18	Revêtement de sol des chambres	8 jours
19	Revêtement des SdB	8 jours
20	**LOT N° 05 - CHAUFFAGE - PLOMBERIE - SANITAIRE - VENTILATION - PERCEMENTS**	**43 jours**
21	Neutralisation	2 jours
22	Réseaux pour chambres	15 jours
23	Pose des équipements	8 jours
24	Mise en service	2 jours
25	**LOT N°06 - FLUIDES MEDICAUX**	**12 jours**
26	Réseaux pour chambres	5 jours
27	Pose des équipements	2 jours
28	Mise en service	1 jour
29	**LOT N° 07 - ELECTRICITE - COURANTS FORTS ET FAIBLES**	**41 jours**
30	Neutralisation	2 jours
31	Incorporation - câblages	10 jours
32	Pose des équipements	5 jours
33	Mise en service	2 jours
34	**MOA : Aménagement des chambres**	**5 jours**
35	**Travaux d'aménagement du R+5**	**54 jours**
36	**LOT N° 01 – MENUISERIE EXTERIEURES ALU**	**7 jours**
37	Pose des occultations	5 jours
38	Pose des entrées d'air	2 jours
39	**LOT N° 02 - MENUISERIE INTERIEURE**	**48 jours**
40	Adaptation plancher bois	8 jours
41	Pose des blocs portes - plinthes	5 jours
42	Aménagements des chambres (placards, coffres)	5 jours
43	**LOT N° 03 - CLOISONS - FAUX-PLAFONDS - PEINTURE**	**54 jours**
44	Démolitions - dépose	2 jours
45	Faux-plafonds	10 jours
46	Plâtrerie	14 jours
47	Peinture	10 jours
48	Nettoyage	4 jours
49	**LOT N° 04 - REVÊTEMENT DE SOL PVC**	**43 jours**
50	Dépose	2 jours
51	Revêtement de sol des chambres	5 jours
52	Revêtement des SdB	20 jours
53	**LOT N° 05 - CHAUFFAGE - PLOMBERIE - SANITAIRE - VENTILATION - PERCEMENTS**	**51 jours**
54	Neutralisation	2 jours
55	Réseaux pour chambres	20 jours
56	Pose des équipements	8 jours
57	Mise en service	2 jours
58	**LOT N°06 - FLUIDES MEDICAUX**	**43 jours**
59	Réseaux en combles	15 jours
60	Réseaux pour chambres	10 jours
61	Pose des équipements	2 jours
62	Mise en service	1 jour
63	**LOT N° 07 - ELECTRICITE - COURANTS FORTS ET FAIBLES**	**42 jours**
64	Neutralisation	2 jours
65	Incorporation - câblages	10 jours
66	Pose des équipements	10 jours
67	Mise en service	2 jours
68	**Travaux divers tous niveaux**	**133 jours**
69	**LOT N° 02 - MENUISERIE INTERIEURE**	**5 jours**
70	Adaptation mains courantes	3 jours
71	Façade de gaine techniques	2 jours
72	**LOT N° 03 - CLOISONS - FAUX-PLAFONDS - PEINTURE**	**38 jours**
73	Dépose faux-plafonds	2 jours
74	Créations coffres et gaines techniques	8 jours
75	Adaptation faux-plafonds	5 jours
76	**LOT N°06 - FLUIDES MEDICAUX**	**15 jours**
77	Création des colonnes (o² et vide)	15 jours
78	**LOT N° 07 - ELECTRICITE - COURANTS FORTS ET FAIBLES**	**5 jours**
79	Dévoiement des réseaux pour création des gaines	5 jours
80	**Réception**	**79 jours**
81	OPR - mise à disposition R+3/R+4	5 jours
82	OPR - Réception définitive - congés payés	15 jours

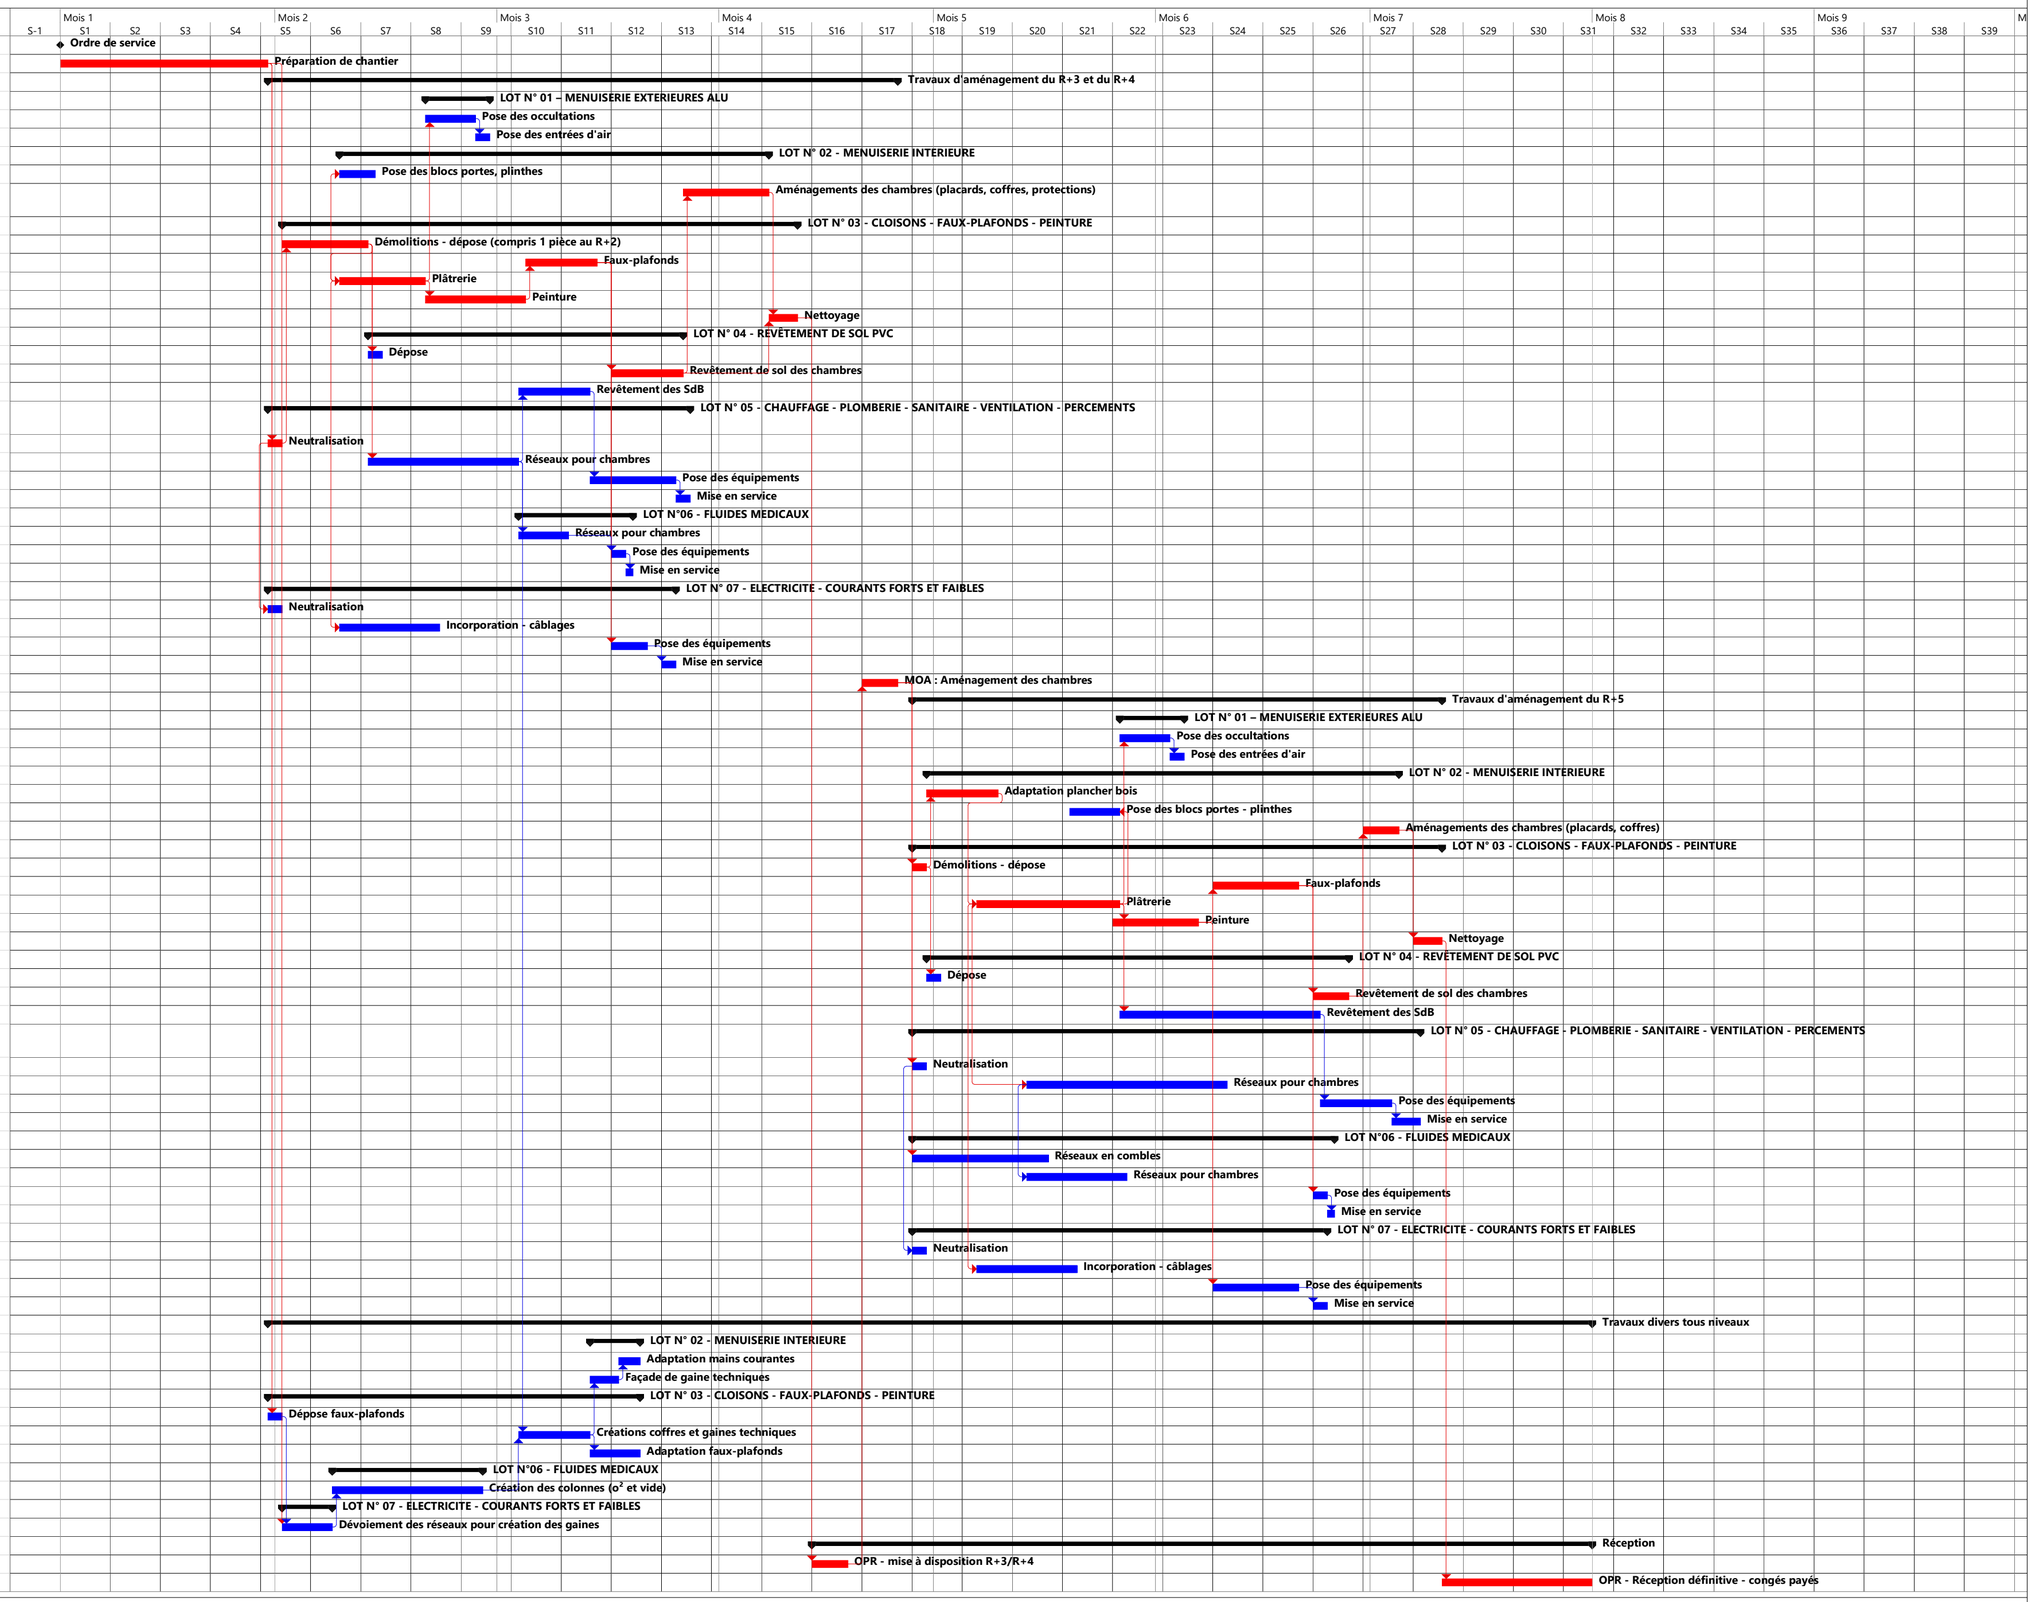

SMR MAURICE DELORT - VIC SUR CERE
PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX
PHASE DCE

Tâche | Fractionnement | Jalon | Récapitulative | Récapitulatif du projet | Tâche manuelle | Récapitulatif manuel | Tâche critique | Avancement
