N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	**HOPITAL JACQUES MONOD - Pharmacotechnie**	**185 jours**	**Mer 01/07/26**	Mar 16/03/27
2	**HOPITAL JACQUES MONOD - Pharmacotechnie**		Mer 01/07/26	
3				
4	Préparation de chantier	33 jours	Mer 15/07/26	Ven 28/08/26
5	Réception	4 jours	Mar 02/03/27	Ven 05/03/27
6	Levée des réserves	7 jours	Lun 08/03/27	Mar 16/03/27
7				
8	**GROS-OEUVRE**	**88 jours**	**Mer 15/07/26**	**Ven 13/11/26**
9	Démolition de cloisons	2 jours	Mer 15/07/26	Jeu 16/07/26
10	Cloison de chantier "Zone pharmacotechnie"	3 jours	Mar 04/08/26	Jeu 06/08/26
11	Démolition de cloisons secteur Anapath sauf cloison entre Pharmacie et Anapath	8 jours	Lun 31/08/26	Mer 09/09/26
12	Dépose des plafonds et des sols	3 jours	Lun 31/08/26	Mer 02/09/26
13	Renforts du plancher haut du 2è sous-sol en plats carbone	10 jours	Jeu 10/09/26	Mer 23/09/26
14	Protection au feu des plats carbone	10 jours	Jeu 24/09/26	Mer 07/10/26
15	Démolition de cloison entre Pharmacie et Anapath	3 jours	Jeu 29/10/26	Lun 02/11/26
16	Percement de trémie	5 jours	Mar 03/11/26	Lun 09/11/26
17	Percement de baie "locaux poubelles"	4 jours	Mar 10/11/26	Ven 13/11/26
18	Nettoyage partiel du vide sanitaire	1 jour	Lun 31/08/26	Lun 31/08/26
19	Dallage du LT dans le vide sanitaire	5 jours	Mar 01/09/26	Lun 07/09/26
20	Maçonnerie du LT dans le vide sanitaire	5 jours	Mar 08/09/26	Lun 14/09/26
21	Socles CTA dans le LT dans le vide sanitaire	2 jours	Mar 15/09/26	Mer 16/09/26
22	Socles extérieurs	2 jours	Mar 15/09/26	Mer 16/09/26
23				
24	**MENUISERIES BOIS**	**158 jours**	**Ven 17/07/26**	**Mar 23/02/27**
25	Reprise partielle de faux-plafond	4 jours	Ven 17/07/26	Mer 22/07/26
26	Bloc-porte du LT dans le vide sanitaire	1 jour	Mar 08/09/26	Mar 08/09/26
27	Bouchement châssis vitrés	1 jour	Mar 03/11/26	Mar 03/11/26
28	Cloisons Placo et Blocs-portes	8 jours	Mar 03/11/26	Jeu 12/11/26
29	Paillasses résine et plan de travail	5 jours	Mer 17/02/27	Mar 23/02/27
30	Jouée de plafond et faux-plafond	4 jours	Jeu 04/02/27	Mar 09/02/27
31				
32	**MENUISERIES EXTERIEURES**	**13 jours**	**Mar 03/11/26**	**Jeu 19/11/26**
33	Pose menuiseries extérieures aluminium	10 jours	Mar 03/11/26	Lun 16/11/26
34	Pose de la structure des locaux Poubelles	4 jours	Lun 16/11/26	Jeu 19/11/26
35				
36	**CLOISONS LABORATOIRES**	**57 jours**	**Mar 08/12/26**	**Mer 24/02/27**
37	Pose du faux-plafond et éclairages	10 jours	Mar 08/12/26	Lun 21/12/26
38	Pose des cloisons et cablage électricité	22 jours	Mar 22/12/26	Mer 20/01/27
39	Raccordement des installations électriques	10 jours	Jeu 21/01/27	Mer 03/02/27
40	Pose des portes automatiques	10 jours	Jeu 04/02/27	Mer 17/02/27
41	Essais	5 jours	Jeu 18/02/27	Mer 24/02/27
42				
43	**SOLS SOUPLES**	**148 jours**	**Ven 24/07/26**	**Mar 16/02/27**
44	Reprise partielle de sol	2 jours	Ven 24/07/26	Lun 27/07/26
45	Pose des sols	9 jours	Jeu 04/02/27	Mar 16/02/27
46				
47	**PEINTURE**	**112 jours**	**Ven 17/07/26**	**Lun 21/12/26**
48	Peinture de la réserve	5 jours	Ven 17/07/26	Jeu 23/07/26
49	Travaux de peinture	10 jours	Mar 08/12/26	Lun 21/12/26
50				
51	**ELECTRICTE**	**78 jours**	**Jeu 03/09/26**	**Lun 21/12/26**
52	Dépose des installations	10 jours	Jeu 03/09/26	Mer 16/09/26
53	Câblage CF et informatique	15 jours	Jeu 17/09/26	Mer 07/10/26
54	Pose des réseaux dans l'emprise de la pharmacotechnie	15 jours	Mar 17/11/26	Lun 07/12/26
55	Raccordements et essais	10 jours	Mar 08/12/26	Lun 21/12/26
56				
57	**CVC**	**128 jours**	**Jeu 03/09/26**	**Lun 01/03/27**
58	Dépose des installations	4 jours	Jeu 03/09/26	Mar 08/09/26
59	Dévoiement des réseaux de chauffage	10 jours	Jeu 03/09/26	Mer 16/09/26
60	Installation des CTA et extracteurs das le LT	30 jours	Jeu 17/09/26	Mer 28/10/26
61	Pose des réseaux dans l'emprise de la pharmacotechnie	10 jours	Mar 17/11/26	Lun 30/11/26
62	Pose des réseaux entre LT et Pharmacotechnie	10 jours	Mar 01/12/26	Lun 14/12/26
63	Pose des réseaux de rejets (CVC et isolateurs) en façade	10 jours	Mar 15/12/26	Lun 28/12/26
64	Raccordements final des bouches et Essais	10 jours	Mar 15/12/26	Lun 28/12/26
65	Dépose des installations plomberie	4 jours	Jeu 03/09/26	Mar 08/09/26
66	Travaux de plomberie en VS	10 jours	Mer 03/02/27	Mer 17/02/27
67	Travaux de plomberie en pharmacotechnie	5 jours	Mer 17/02/27	Mer 24/02/27
68	Raccordement des paillasses	2 jours	Mer 24/02/27	Jeu 25/02/27
69	Contrôles et Essais	2 jours	Ven 26/02/27	Lun 01/03/27
70				
71	**DESAMIANTAGE**	**76 jours**	**Mer 15/07/26**	**Mer 28/10/26**
72	Etablissement du Plan de retrait	11 jours	Mer 15/07/26	Mer 29/07/26
73	Dépôt du Plan de retrait en Préfecture	1 jour	Jeu 30/07/26	Jeu 30/07/26
74	Instruction du Plan de retrait en Préfecture	22 jours	Ven 31/07/26	Lun 31/08/26
75	Préparation de chantier	5 jours	Jeu 08/10/26	Mer 14/10/26
76	Dépose des menuiseries extérieures	5 jours	Jeu 15/10/26	Mer 21/10/26
77	Travaux de fin de chantier désamiantage	5 jours	Jeu 22/10/26	Mer 28/10/26
78	**GHH**	**5 jours**	**Mar 28/07/26**	**Lun 03/08/26**
79	Déménagement étagères	5 jours	Mar 28/07/26	Lun 03/08/26

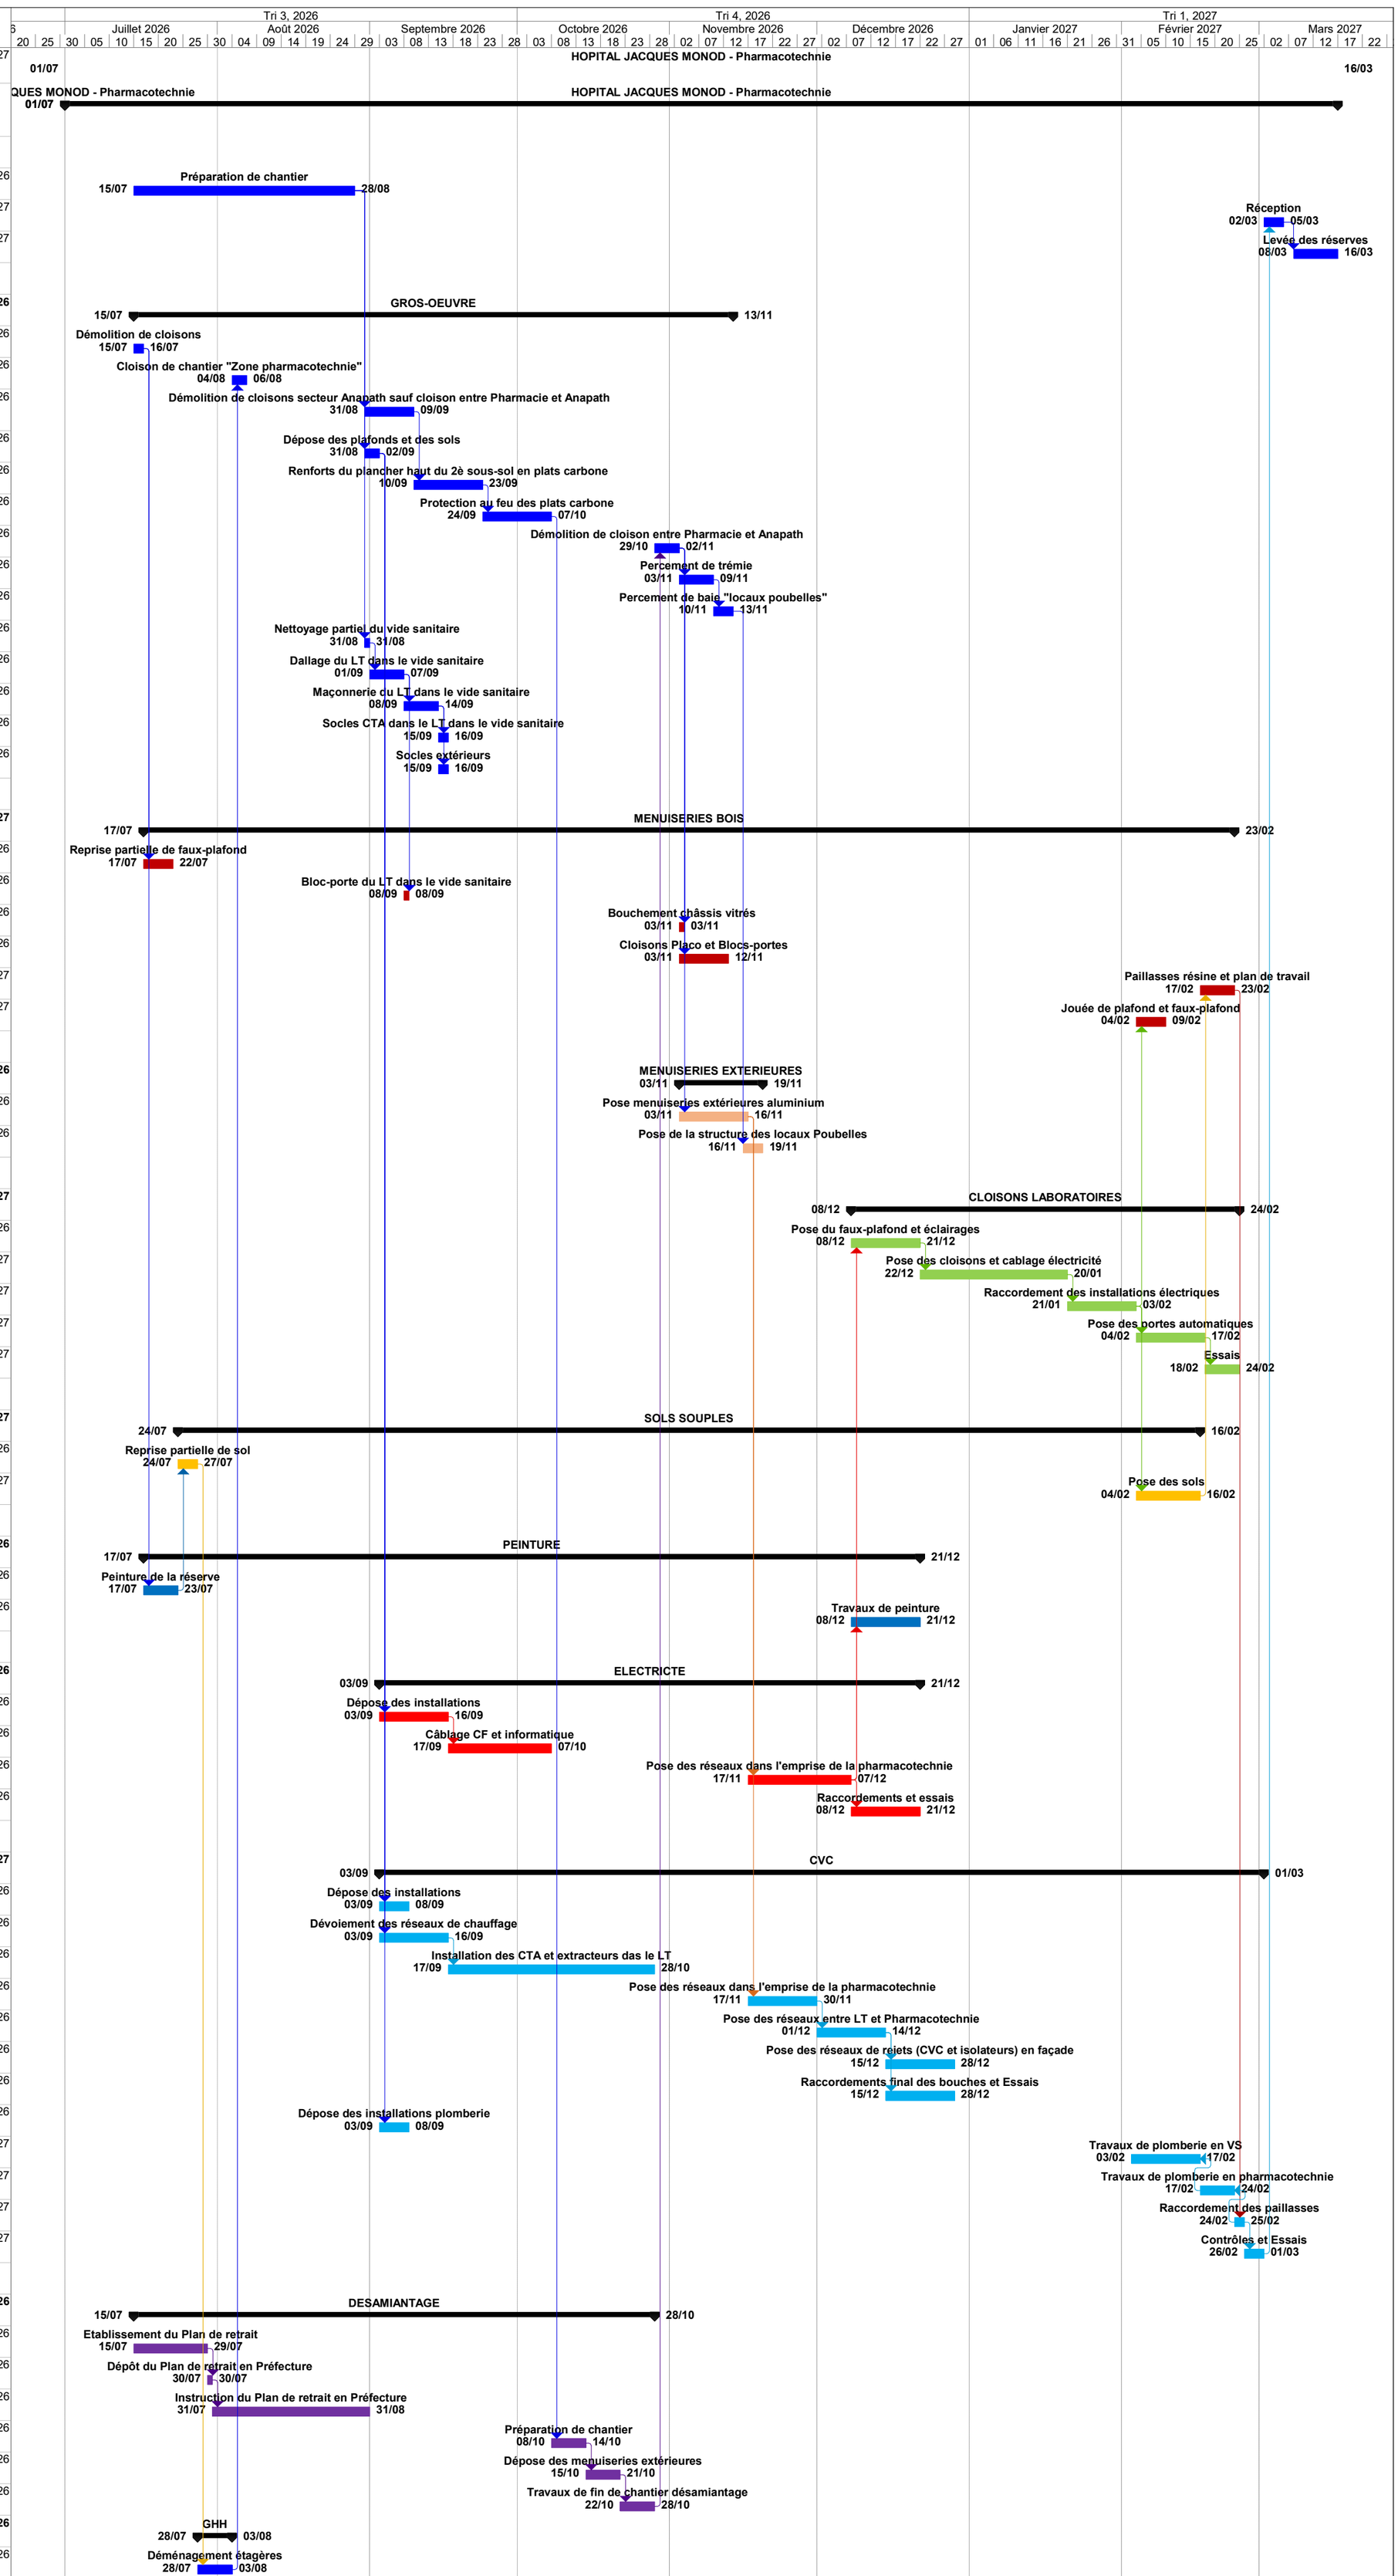

Projet : MONOD - Arsenaux
Date : Ven 24/04/26

Tâche | Fractionnement | Jalon | Récapitulative | Récapitulatif du projet | Tâches externes | Jalons externes | Jalon inactif | Récapitulatif inactif | Tâche manuelle | Durée uniquement | Report récapitulatif manuel | Récapitulatif manuel | Début uniquement | Fin uniquement | Tâches externes | Jalons externes | Avancement | Échéance
