PE.01.22

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

REALIZE
CONCEPTION • CONSTRUCTION

CRS VELIZY-VILLACOUBLAY
CALENDRIER ENVELOPPE GENERAL

CAL-LD-002
RevE du 25/03/2025

N°	Nom de la tâche	Durée
1	**RENOVATION CRS VELIZY-VILLACOUBLAY**	**1114 j**
2	OS Conception	0 j
3	**CONCEPTION**	**633 j**
4	**Esquisse**	**30 j**
5	Mise au point de l'Esquisse	15 j
6	Validation Esquisse	15 j
7	**APS**	**22 j**
8	Préparation APS	15 j
9	Validation APS	7 j
10	**APD**	**121 j**
11	Préparation APD	101 j
12	Validation APD	20 j
13	**PC**	**165 j**
14	Préparation PC	75 j
15	Dépôt PC	0 j
16	PC validé	0 j
17	**PRO**	**114 j**
18	Préparation PRO	74 j
19	Validation PRO	40 j
20	**DCE**	**110 j**
21	Préparation DCE	30 j
22	Lancement des consultations	0 j
23	Consultation des entreprises	80 j
24	Réception des offres	0 j
25	**AMT**	**120 j**
26	Préparation AMT	115 j
27	Rédaction des OS	5 j
28	**ETUDES D'EXE / APPRO / PREFA / TRAVAUX**	**473 j**
29	OS Préparation et Travaux	0 j
30	Préparation / Installations de chantier	62 j
31	**Etudes d'exécution / Synthèse technique**	**150 j**
32	Etudes d'exécution	130 j
33	Synthèse	110 j
34	VISA des études	130 j
35	Premier plan BPE	0 j
36	**Approvisionnements / Préfabrications**	**120 j**
37	Approvisionnements	80 j
38	Préfabrication béton	110 j
39	Préfabrication façades	80 j
40	Préfabrication blocs sanitaires	80 j
41	**PHASE 1 - Déménagement Armurerie**	**60 j**
42	Préparation armurerie provisoire	20 j
43	Déménagement vers Armurerie provisoire	40 j
44	Armurerie provisoire opérationnelle	0 j
45	**PHASE 2 - Nouveaux Logements**	**366 j**
46	Fondations spéciales / GO / Pilotis	80 j
47	Superstructure GO	90 j
48	Pose blocs préfa / Façades	90 j
49	Couverture / Etanchéité	90 j
50	Travaux CET / CEA	90 j
51	VRD bâtiment logement	50 j
52	OPR et Essais Logements	50 j
53	RECEPTION Logements	0 j
54	DOE Logements	40 j
55	Validation DOE Logements	20 j
56	**PHASE 3 - Rénovation Armurerie**	**240 j**
57	Installations de chantier Armurerie (Centre Nord du site)	30 j
58	Démolition / Curage Armurerie (hors zone LT)	40 j
59	Rénovation Armurerie	90 j
60	MàD nouveaux LT	0 j
61	Bascule alimentations CET dans nouveau LT	15 j
62	Essaie et Mise en service nouveaux LT	10 j
63	Démolition anciens LT	10 j
64	Reprise des abords Armurerie	30 j
65	OPR et Essais Armurerie	10 j
66	RECEPTION Armurerie	0 j
67	DOE Armurerie	40 j
68	Validation DOE Logements	20 j
69	**PHASE 4 - Rénovation Restaurant**	**264 j**
70	Installations de chantier Restaurant (Nord-Ouest du site)	30 j
71	Démolition / Curage Restaurant	30 j
72	Rénovation Restaurant	90 j
73	Reprise des abords Restaurant	40 j
74	Installation équipements cuisine	40 j
75	Essais Restaurant	10 j
76	OPR	10 j
77	RECEPTION Restaurant	0 j
78	DOE Restaurant	40 j
79	Validation DOE Restaurant	20 j
80	**PHASE 5 - Emménagement Nouvelle Armurerie**	**20 j**
81	Replis installations de chantier Armurerie	5 j
82	Déménagement de l'armurerie provisoire vers nouveau bâtiment	20 j
83	**Repli des installations**	**32 j**
84	Replis installations de chantier Restaurant	5 j
85	Replis installations de chantier Logements	10 j

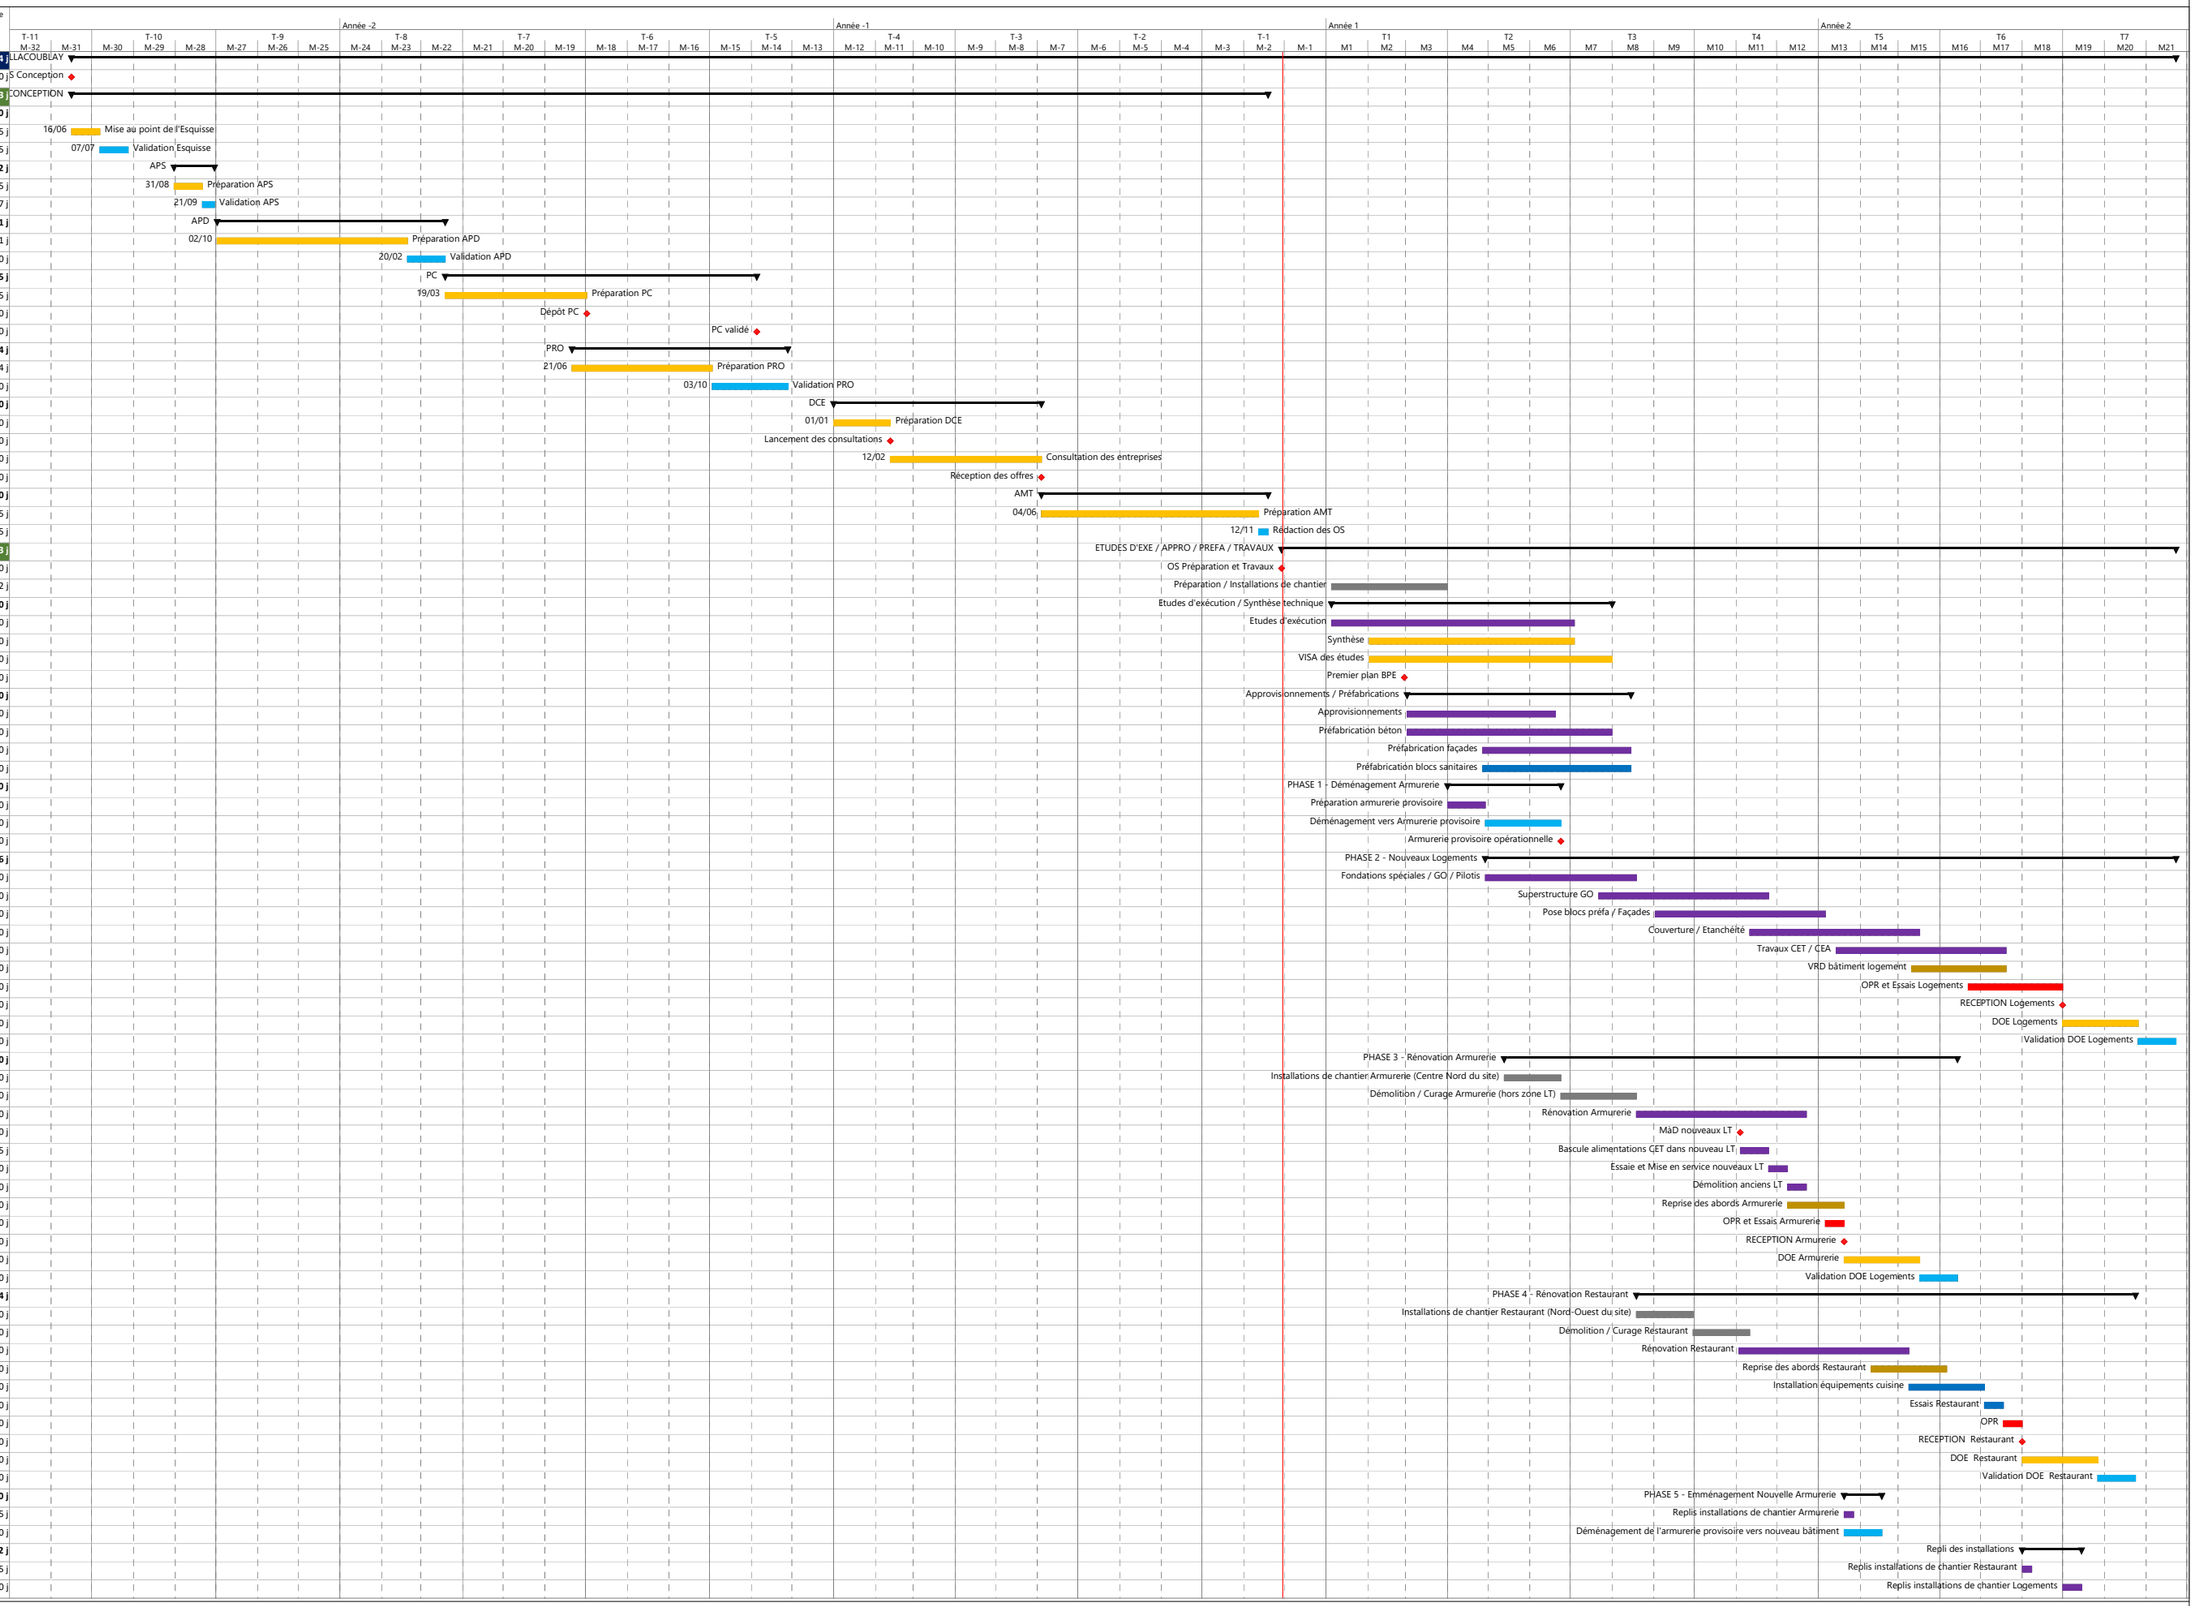

Tâche | MO | MOE | CURAGE / DEMOL | CONSTRUCTION TCE | CET | CEA | VRD | OPR / RECEPTION | Fractionnement | Jalon | Récapitulative
