Diagramme de Gantt
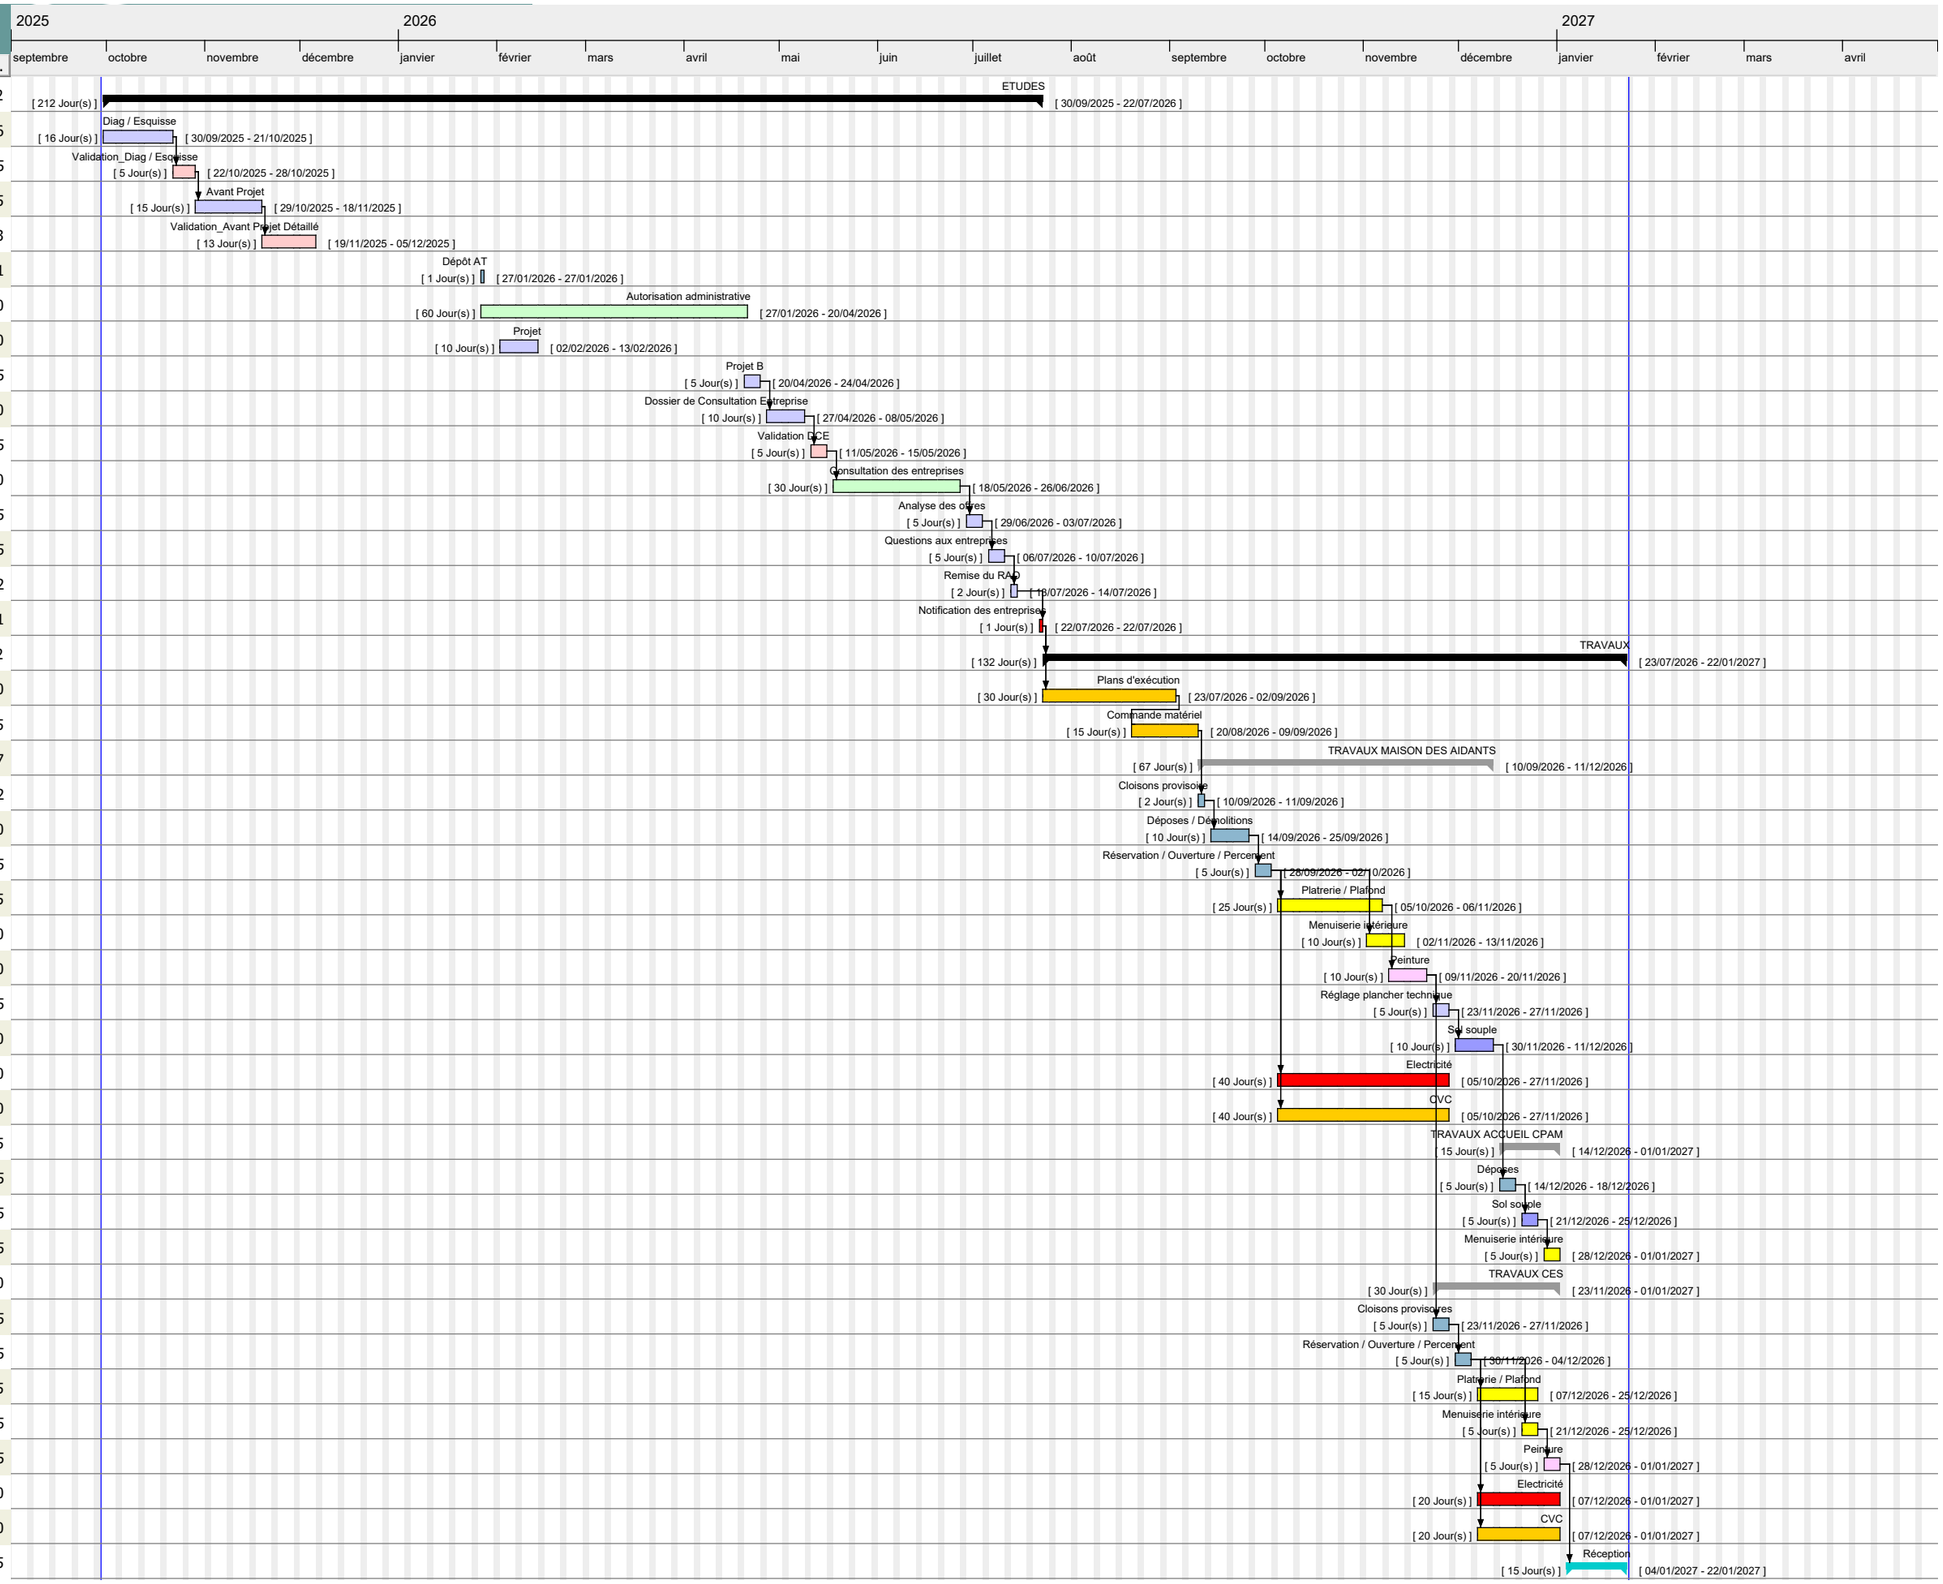
Nom	Date de début	Date de fin	D...
ETUDES	30/09/2025	22/07/20...	212
Diag / Esquisse	30/09/2025	21/10/20...	16
Validation_Diag / Esquisse	22/10/2025	28/10/20...	5
Avant Projet	29/10/2025	18/11/20...	15
Validation_Avant Projet Détaillé	19/11/2025	05/12/20...	13
Dépôt AT	27/01/2026	27/01/20...	1
Autorisation administrative	27/01/2026	20/04/20...	60
Projet	02/02/2026	13/02/20...	10
Projet B	20/04/2026	24/04/20...	5
Dossier de Consultation Entreprise	27/04/2026	08/05/20...	10
Validation DCE	11/05/2026	15/05/20...	5
Consultation des entreprises	18/05/2026	26/06/20...	30
Analyse des offres	29/06/2026	03/07/20...	5
Questions aux entreprises	06/07/2026	10/07/20...	5
Remise du RAO	13/07/2026	14/07/20...	2
Notification des entreprises	22/07/2026	22/07/20...	1
TRAVAUX	23/07/2026	22/01/20...	132
Plans d'exécution	23/07/2026	02/09/20...	30
Commande matériel	20/08/2026	09/09/20...	15
TRAVAUX MAISON DES AIDANTS	10/09/2026	11/12/20...	67
Cloisons provisoire	10/09/2026	11/09/20...	2
Déposes / Démolitions	14/09/2026	25/09/20...	10
Réservation / Ouverture / Percement	28/09/2026	02/10/20...	5
Platrerie / Plafond	05/10/2026	06/11/20...	25
Menuiserie intérieure	02/11/2026	13/11/20...	10
Peinture	09/11/2026	20/11/20...	10
Réglage plancher technique	23/11/2026	27/11/20...	5
Sol souple	30/11/2026	11/12/20...	10
Electricité	05/10/2026	27/11/20...	40
CVC	05/10/2026	27/11/20...	40
TRAVAUX ACCUEIL CPAM	14/12/2026	01/01/20...	15
Déposes	14/12/2026	18/12/20...	5
Sol souple	21/12/2026	25/12/20...	5
Menuiserie intérieure	28/12/2026	01/01/20...	5
TRAVAUX CES	23/11/2026	01/01/20...	30
Cloisons provisoires	23/11/2026	27/11/20...	5
Réservation / Ouverture / Percement	30/11/2026	04/12/20...	5
Platrerie / Plafond	07/12/2026	25/12/20...	15
Menuiserie intérieure	21/12/2026	25/12/20...	5
Peinture	28/12/2026	01/01/20...	5
Electricité	07/12/2026	01/01/20...	20
CVC	07/12/2026	01/01/20...	20
Réception	04/01/2027	22/01/20...	15
