TRAVAUX D'AMELIORATION DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DU CDFiP de SOYAUX - PLANNING PREVISIONNEL
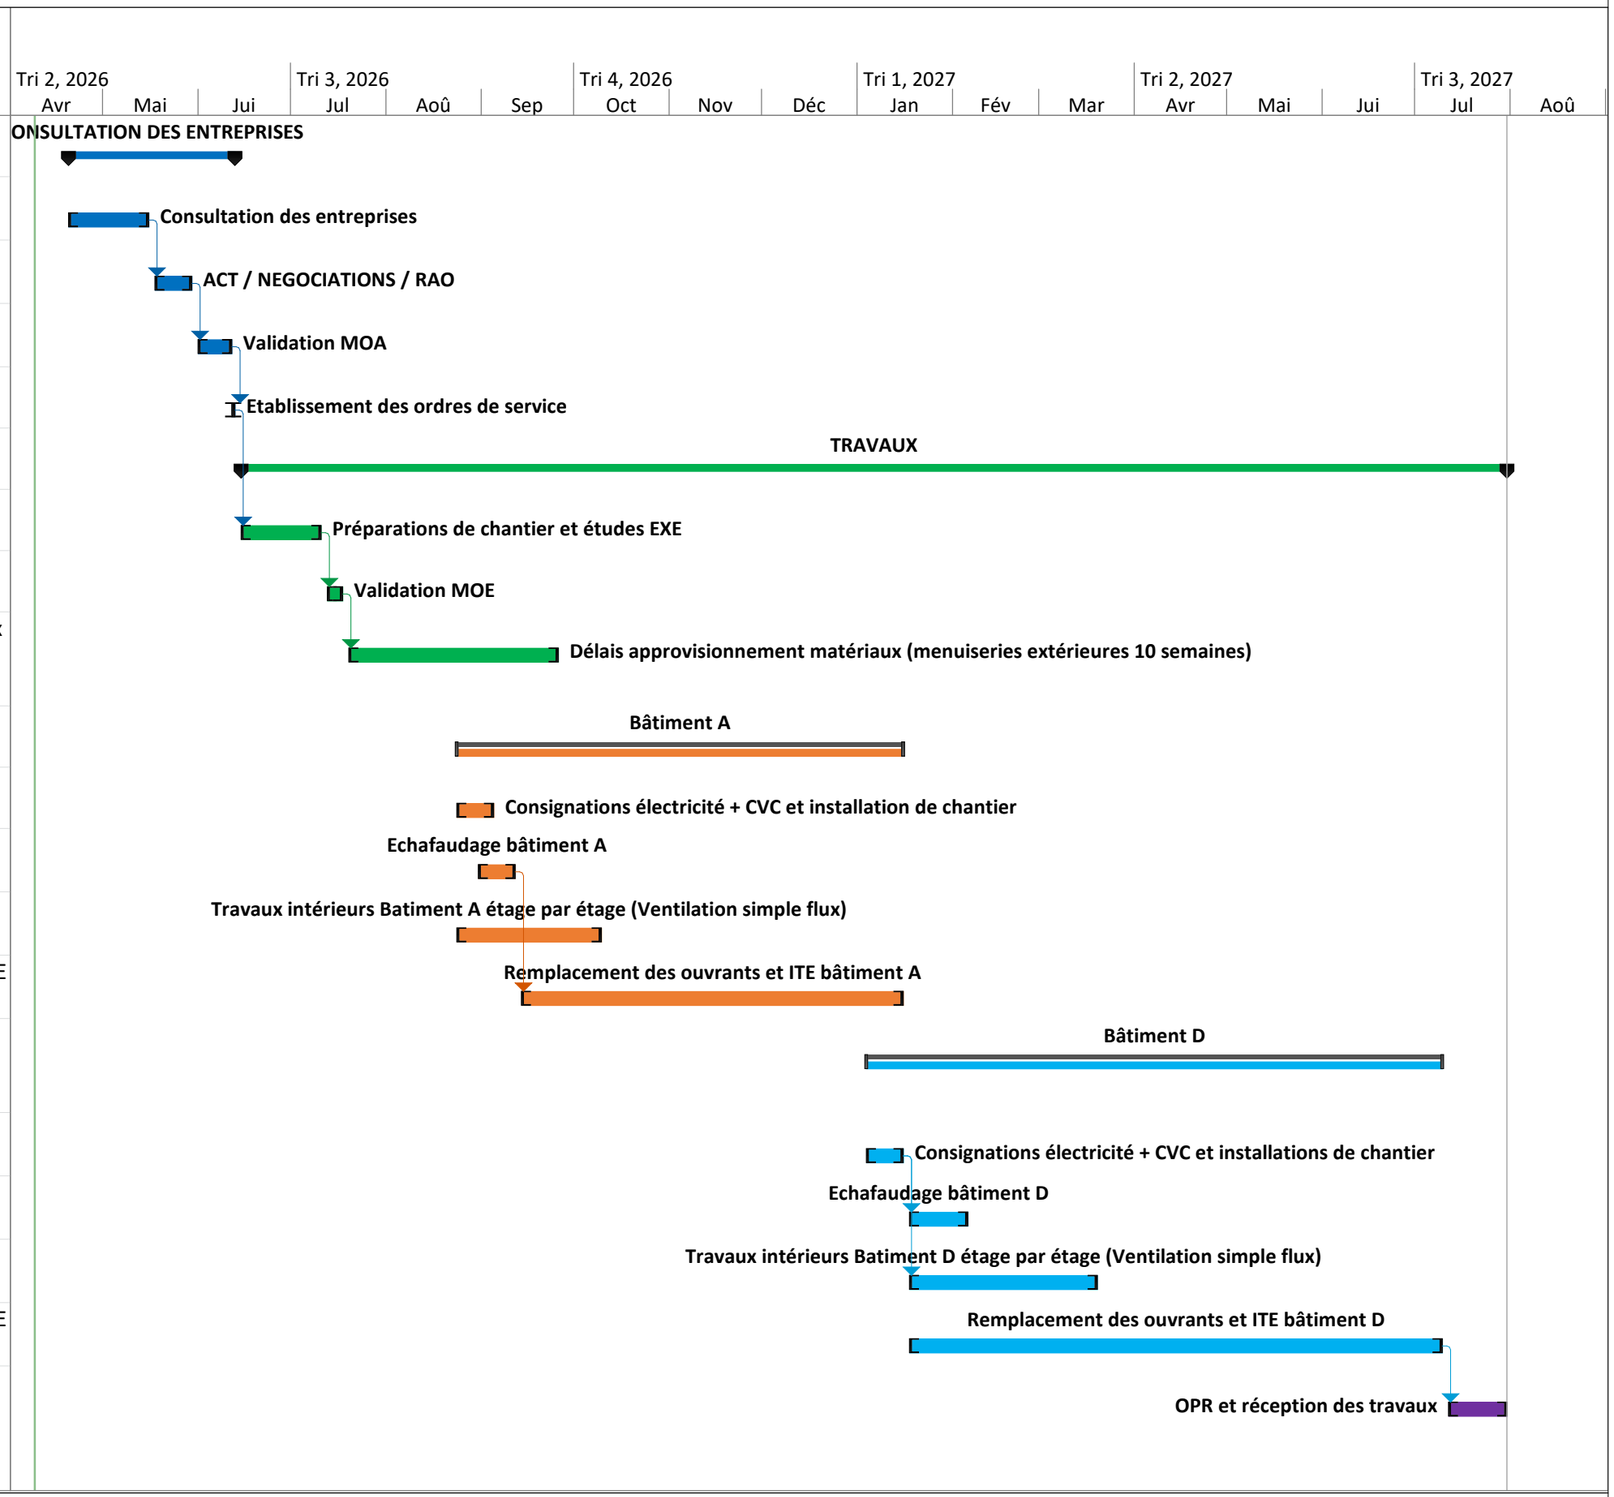
N°	Pr	Début	Fin	Durée	Nom de la tâche
1		**Lun 20/04/26**	**Ven 12/06/26**	**40 jrs**	**CONSULTATION DES ENTREPRISES**
2		Lun 20/04/26	Ven 15/05/26	20 jrs	Consultation des entreprises
3	2	Lun 18/05/26	Ven 29/05/26	10 jrs	ACT / NEGOCIATIONS / RAO
4	3	Lun 01/06/26	Jeu 11/06/26	9 jrs	Validation MOA
5	4	Ven 12/06/26	Ven 12/06/26	1 jr	Etablissement des ordres de service
6		**Lun 15/06/26**	**Ven 30/07/27**	**295 jrs**	**TRAVAUX**
7	5	Lun 15/06/26	Ven 10/07/26	20 jrs	Préparations de chantier et études EXE
8	7	Lun 13/07/26	Ven 17/07/26	5 jrs	Validation MOE
9	8	Lun 20/07/26	Ven 25/09/26	50 jrs	Délais approvisionnement matériaux (menuiseries extérieures 10 semaines)
10		**Lun 24/08/26**	**Ven 15/01/27**	**105 jrs**	**Bâtiment A**
11		Lun 24/08/26	Ven 04/09/26	10 jrs	Consignations électricité + CVC et installation de chantier
12		Lun 31/08/26	Ven 11/09/26	10 jrs	Echafaudage bâtiment A
13		Lun 24/08/26	Ven 09/10/26	35 jrs	Travaux intérieurs Batiment A étage par étage (Ventilation
14	12	Lun 14/09/26	Ven 15/01/27	90 jrs	Remplacement des ouvrants et ITE bâtiment A
15		**Lun 04/01/27**	**Ven 09/07/27**	**135 jrs**	**Bâtiment D**
16		Lun 04/01/27	Ven 15/01/27	10 jrs	Consignations électricité + CVC et installations de chantier
17	16	Lun 18/01/27	Ven 05/02/27	15 jrs	Echafaudage bâtiment D
18	16	Lun 18/01/27	Ven 19/03/27	45 jrs	Travaux intérieurs Batiment D étage par étage (Ventilation
19		Lun 18/01/27	Ven 09/07/27	125 jrs	Remplacement des ouvrants et ITE bâtiment D
20	19	Lun 12/07/27	Ven 30/07/27	15 jrs	OPR et réception des travaux
