TRAVAUX DE DÉSAMIANTAGE ET DE RÉHABILITATION DES TOITURES DES BÂTIMENTS DU CEI DE ST FLOUR
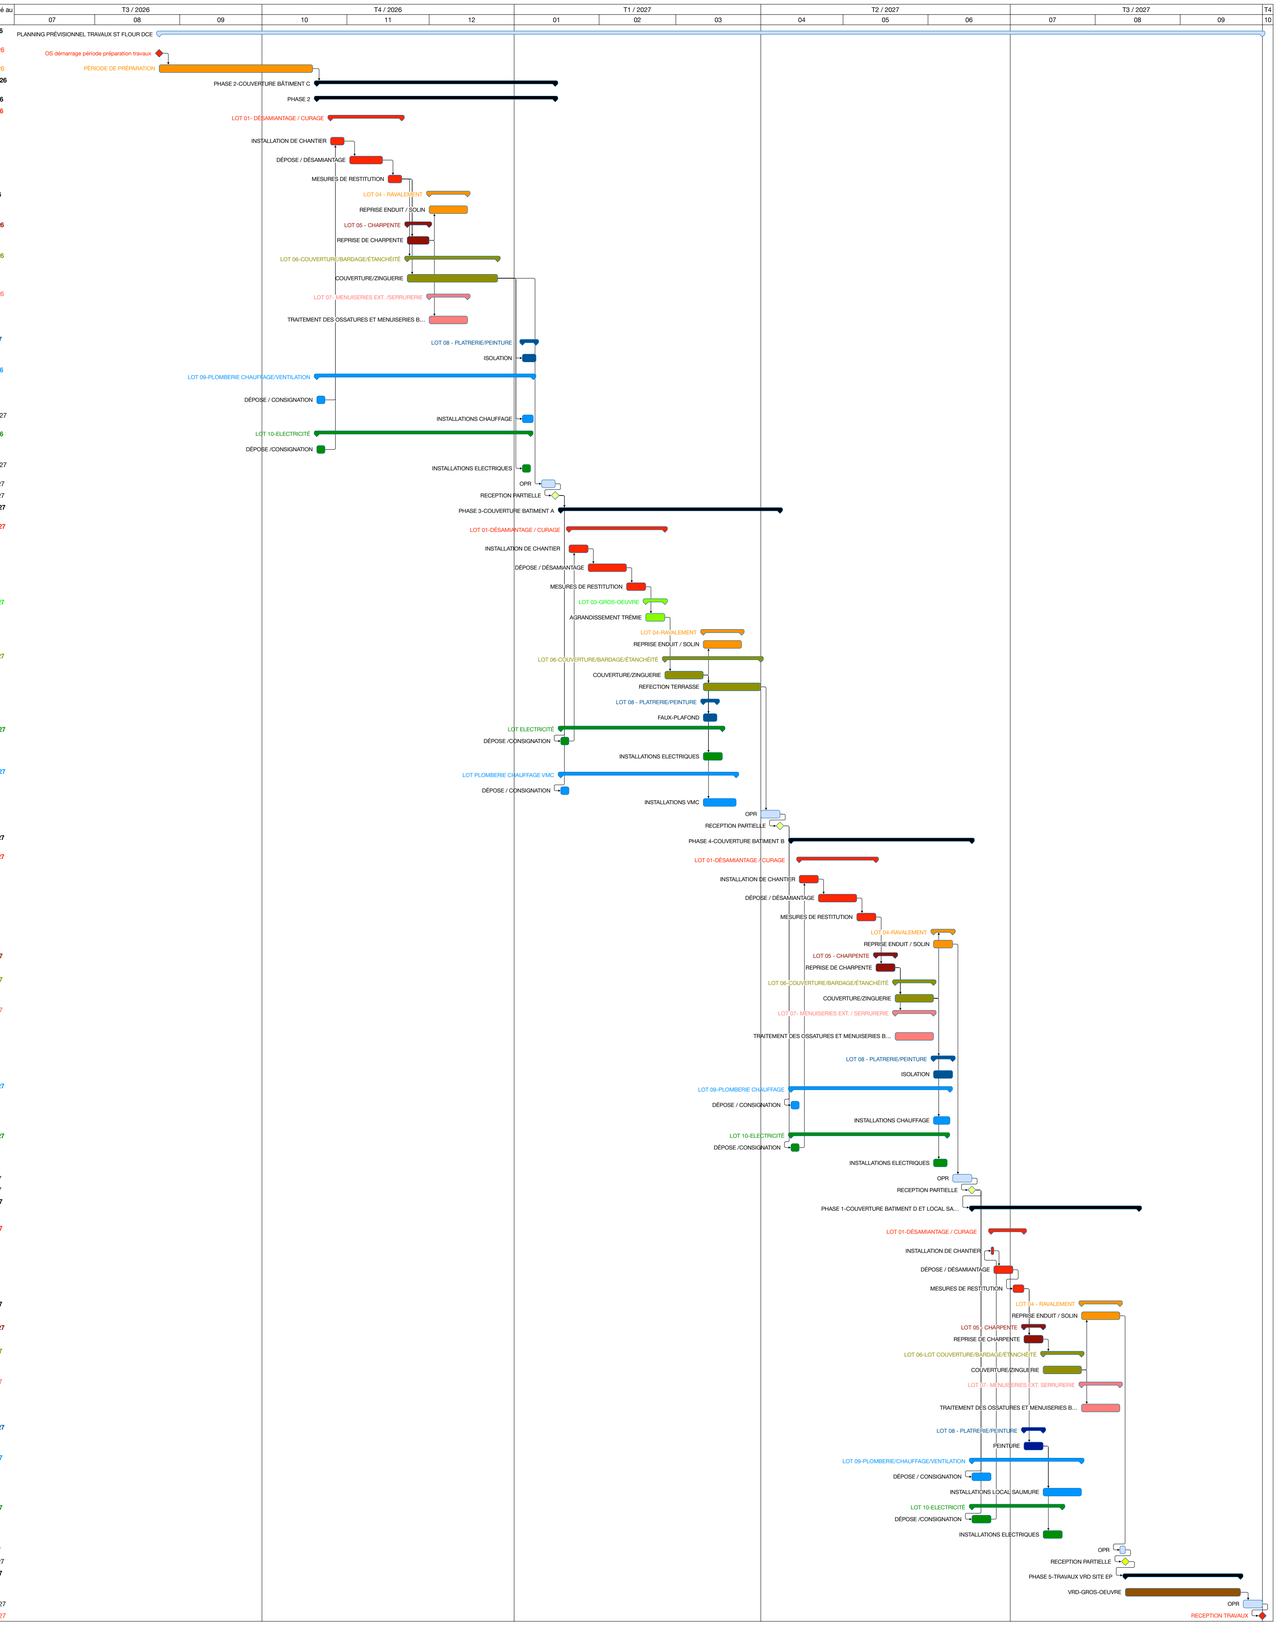
#	Traits	Titre	Travail donné	Début donné au plus tôt
0		**PLANNING PRÉVISIONNEL TRAVAUX ST FLOUR DCE**		**26 mai 2026**
1		OS démarrage période préparation travaux		24 août 2026
2		PÉRIODE DE PRÉPARATION	2 mois	24 août 2026
3		**PHASE 2-COUVERTURE BÂTIMENT C**		**25 sept. 2026**
4		**PHASE 2**		**21 oct. 2026**
5		**LOT 01-DÉSAMIANTAGE / CURAGE**		**21 oct. 2026**
6		INSTALLATION DE CHANTIER	1 semaine	
7		DÉPOSE / DÉSAMIANTAGE	2 semaines	
8		MESURES DE RESTITUTION	1 semaine	
9		LOT 04 - RAVALEMENT		**1 déc. 2026**
10		REPRISE ENDUIT / SOLIN	10 jours	
11		**LOT 05 - CHARPENTE**		**23 nov. 2026**
12		REPRISE DE CHARPENTE	6 jours	
13		LOT 06-COUVERTURE/ BARDAGE/ÉTANCHÉITÉ		23 nov. 2026
14		COUVERTURE/ ZINGUERIE	5 semaines	
15		LOT 07- MENUISERIES EXT. /SERRURERIE		30 nov. 2026
16		TRAITEMENT DES OSSATURES ET MENUISERIES BOIS	2 semaines	
17		**LOT 08 - PLATRERIE/ PEINTURE**		**4 janv. 2027**
18		ISOLATION	1 semaine	
19		**LOT 09-PLOMBERIE CHAUFFAGE/ VENTILATION**		**21 oct. 2026**
20		DÉPOSE / CONSIGNATION	3 jours	
21		INSTALLATIONS CHAUFFAGE	4 jours	4 janvier 2027
22		**LOT 10-ÉLECTRICITÉ**		**21 oct. 2026**
23		DÉPOSE / CONSIGNATION	3 jours	
24		INSTALLATIONS ELECTRIQUES	3 jours	4 janvier 2027
25		OPR	1 semaine	11 janv. 2027
26		RECEPTION PARTIELLE		15 janv. 2027
27		**PHASE 3-COUVERTURE BATIMENT A**		**18 janv. 2027**
28		**LOT 01-DÉSAMIANTAGE / CURAGE**		**21 janv. 2027**
29		INSTALLATION DE CHANTIER	1 semaine	
30		DÉPOSE / DÉSAMIANTAGE	2 semaines	
31		MESURES DE RESTITUTION	1 semaine	
32		LOT 03-GROS-OEUVRE		18 févr. 2027
33		AGRANDISSEMENT TRÉMIE	1 semaine	
34		LOT 04-RAVALEMENT		11/03/2027
35		REPRISE ENDUIT / SOLIN	10 jours	
36		LOT 06-COUVERTURE/ BARDAGE/ÉTANCHÉITÉ		25 févr. 2027
37		COUVERTURE/ZINGUERIE	2 semaines	
38		REFECTION TERRASSE	3 semaines	
39		**LOT 08 - PLATRERIE/ PEINTURE**		**11/03/2027**
40		FAUX-PLAFOND	3 jours	
41		**LOT ELECTRICITÉ**		**18 janv. 2027**
42		DÉPOSE /CONSIGNATION	3 jours	
43		INSTALLATIONS ELECTRIQUES	1 semaine	
44		**LOT PLOMBERIE CHAUFFAGE VMC**		**18 janv. 2027**
45		DÉPOSE / CONSIGNATION	3 jours	
46		INSTALLATIONS VMC	8 jours	
47		OPR	1 semaine	1 avril 2027
48		RECEPTION PARTIELLE		7 avril 2027
49		**PHASE 4-COUVERTURE BATIMENT B**		**12 avril 2027**
50		**LOT 01-DÉSAMIANTAGE / CURAGE**		**15 avril 2027**
51		INSTALLATION DE CHANTIER	1 semaine	
52		DÉPOSE / DÉSAMIANTAGE	2 semaines	
53		MESURES DE RESTITUTION	1 semaine	
54		LOT 04-RAVALEMENT		3 juin 2027
55		REPRISE ENDUIT / SOLIN	1 semaine	
56		**LOT 05 - CHARPENTE**		**13 mai 2027**
57		REPRISE DE CHARPENTE	1 semaine	
58		LOT 06-COUVERTURE/ BARDAGE/ÉTANCHÉITÉ		20 mai 2027
59		COUVERTURE/ZINGUERIE	2 semaines	
60		LOT 07- MENUISERIES EXT. / SERRURERIE		20 mai 2027
61		TRAITEMENT DES OSSATURES ET MENUISERIES BOIS	2 semaines	
62		**LOT 08 - PLATRERIE/ PEINTURE**		**3 juin 2027**
63		ISOLATION	1 semaine	
64		LOT 09-PLOMBERIE CHAUFFAGE		12 avril 2027
65		DÉPOSE / CONSIGNATION	3 jours	
66		INSTALLATIONS CHAUFFAGE	4 jours	
67		**LOT 10-ÉLECTRICITÉ**		**12 avril 2027**
68		DÉPOSE /CONSIGNATION	3 jours	
69		INSTALLATIONS ELECTRIQUES	3 jours	
70		OPR	1 semaine	10 juin 2027
71		RECEPTION PARTIELLE		15 juin 2027
72		**PHASE 1-COUVERTURE BATIMENT D ET LOCAL SAUMURE**		**16 juin 2027**
73		**LOT 01-DÉSAMIANTAGE / CURAGE**		**24 juin 2027**
74		INSTALLATION DE CHANTIER	1 jour	
75		DÉPOSE / DÉSAMIANTAGE	1 semaine	
76		MESURES DE RESTITUTION	2 jours	
77		LOT 04 - RAVALEMENT		**27 juil. 2027**
78		REPRISE ENDUIT / SOLIN	10 jours	
79		**LOT 05 - CHARPENTE**		**6 juillet 2027**
80		REPRISE DE CHARPENTE	1 semaine	
81		LOT 06-LOT COUVERTURE/ BARDAGE/ÉTANCHÉITÉ		13 juil. 2027
82		COUVERTURE/ZINGUERIE	2 semaines	
83		LOT 07- MENUISERIES EXT. SERRURERIE		27 juil. 2027
84		TRAITEMENT DES OSSATURES ET MENUISERIES BOIS	2 semaines	
85		**LOT 08 - PLATRERIE/ PEINTURE**		**6 juillet 2027**
86		PEINTURE	1 semaine	
87		LOT 09-PLOMBERIE/ CHAUFFAGE/VENTILATION		16 juin 2027
88		DÉPOSE / CONSIGNATION	5 jours	
89		INSTALLATIONS LOCAL SAUMURE	10 jours	
90		**LOT 10-ELECTRICITÉ**		**16 juin 2027**
91		DÉPOSE /CONSIGNATION	5 jours	
92		INSTALLATIONS ELECTRIQUES	5 jours	
93		OPR	2 jours	6 août 2027
94		RECEPTION PARTIELLE		11 août 2027
95		**PHASE 5-TRAVAUX VRD SITE EP**		**30 juil. 2027**
96		VRD-GROS-OEUVRE	1,5 mois	
97		OPR	1 semaine	24 sept. 2027
98		RECEPTION TRAVAUX		30 sept. 2027
