Opération : Remplacement TGBT Hôtel de Police Lobau Nancy

1 Durée

ACTIVITÉ	DÉBUT DU PLAN en Semaines	DURÉE DU PLAN en Semaines
Période de préparation	1	4
Approvisionnement TGBT et onduleur	3	11
Mesures, analyse	3	1
Dévoiement réseaux d'eau	5	2
Aménagement local onduleur	7	2
Travaux dans local citerne GE	7	2
Déplacement onduleur	9	1
Pose des cables Transfo et GE et allongements câbles	10	4
Mise en place nouveau TGBT	14	1
Permutation des cables sur nouveau TGBT	15	8
Nouvel onduleur	21	1
Evacuation TGBT existant	23	1
Purge des cables. Remise en état	24	2
Réception	26	1
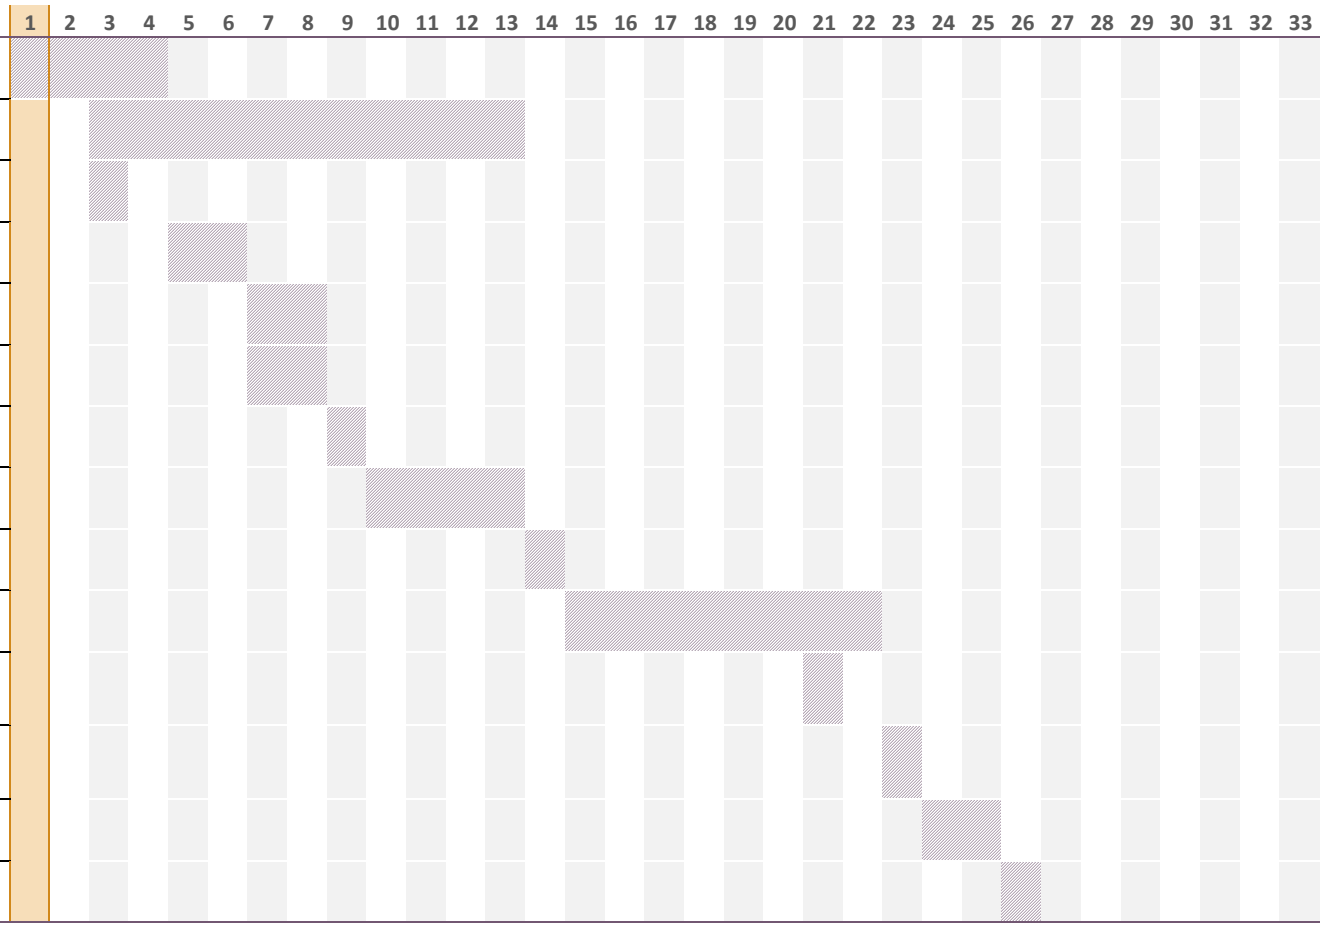
PÉRIODES
