C367_SOLEIL SYNCHROTRON_TS_DCE_Planning_mx800

N°	Nom de la tâche	Durée	% achevé	Début
1	**C367 - SYNCHROTRON - SOLEIL - TS**	**208 jo/7 0%**		**Mar 26/05/26**
1.1	1 Consultation entreprises	23 jo/0%		Mar 26/05/26
1.2	2 Réception des offres	1 jo/0%		Ven 26/06/26
1.3	3 Analyse des offres	10 jo/0%		Lun 29/06/26
1.4	4 Attribution des marchés	12 jo/0%		Lun 13/07/26
1.5	**5 Aménagement d'atelier de montage dans le TS**	**152 jo/7 0%**		**Mer 29/07/26**
1.5.1	**5.1 TRAVAUX PRELIMINAIRES - DEMOLITION - GO**	**40 jo/0%**		**Lun 21/09/26**
1.5.1.1	5.1.1 Installations de chantier	2 jo/0%		Lun 28/09/26
1.5.1.2	5.1.2 Réalisation d'un constat contradictoire	1 jo/0%		Lun 21/09/26
1.5.1.3	5.1.3 Démolition de la mezzanine existante	2 jo/0%		Mer 30/09/26
1.5.1.4	5.1.4 Ouverture de baie	4 jo/0%		Ven 02/10/26
1.5.1.5	5.1.5 Fondations pour nouveaux portiques de charpente	21 jo/0%		Ven 02/10/26
1.5.1.6	5.1.6 Maçonneries pour création des SAS	10 jo/0%		Lun 02/11/26
1.5.1.7	5.1.7 Réalisation de saignées dans le dallage	1 jo/0%		Lun 02/11/26
1.5.1.8	5.1.8 Canalisations EU/EV sous dallage	1 jo/0%		Mar 03/11/26
1.5.1.9	5.1.9 Bouchement en béton au droit des saignées	1 jo/0%		Mer 04/11/26
1.5.1.10	5.1.10 Réseaux enterrés EU/EV	5 jo/0%		Jeu 05/11/26
1.5.1.11				
1.5.2	**5.2 CHARPENTE METALLIQUE - SERRURERIE**	**91 jo/0%**		**Mer 29/07/26**
1.5.2.1	**5.2.1 Travaux préliminaires**	**41 jo/0%**		**Lun 31/08/26**
1.5.2.1.1	5.2.1.1 Elaboration et validation des plans	40 jo/0%		Mer 29/07/26
1.5.2.1.2	5.2.1.2 Fabrication de la charpente métallique	25 jo/0%		Mer 23/09/26
1.5.2.1.3	5.2.1.3 Livraison des éléments de charpente sur site	1 jo/0%		Mer 28/10/26
1.5.2.2	**5.2.2 Montage de la charpente métallique**	**25 jo/0%**		**Jeu 29/10/26**
1.5.2.2.3	5.2.2.3 Mise en place des poutres et poteaux	12 jo/0%		Jeu 29/10/26
1.5.2.2.4	5.2.2.4 Mise en place des solives	8 jo/0%		Lun 16/11/26
1.5.2.2.5	5.2.2.5 Réalisation du plancher de la mezzanine	3 jo/0%		Jeu 26/11/26
1.5.2.2.6	5.2.2.6 Pose des garde corps	2 jo/0%		Mar 01/12/26
1.5.3	**5.3 Etanchéité / Bardage**	**95 jo/0%**		**Mar 22/09/26**
1.5.3.1	5.3.1 Dévoiement des descentes EP	2 jo/0%		Jeu 26/11/26
1.5.3.2	5.3.2 Dépose des ouvrants de désenfumage et bouchements	5 jo/0%		Mar 22/09/26
1.5.3.3	5.3.3 Ouverture dans bardage	3 jo/0%		Lun 04/01/27
1.5.3.4	5.3.4 Claustra acoustique autour des PAC	3 jo/0%		Lun 08/02/27
1.5.4	**5.4 Aménagement intérieur**	**45 jo/0%**		**Lun 30/11/26**
1.5.4.1	5.4.1 Contre cloisons de doublage	10 jo/0%		Lun 30/11/26
1.5.4.2	5.4.2 Plafond isotherme	20 jo/0%		Lun 14/12/26
1.5.4.3	5.4.3 Pose de bloc portes	2 jo/0%		Lun 08/02/27
1.5.5	**5.5 PLOMBERIE - CVC**	**106 jo/0%**		**Mer 30/09/26**
1.5.5.1	5.5.1 Dépose des installations existantes non réutilisées (gaines de ventilation)	2 jo/0%		Mer 30/09/26
1.5.5.2	5.5.2 Cheminement des réseaux de plomberie et d'évacuation	1 jo/0%		Jeu 26/11/26
1.5.5.3	5.5.3 Pose des gaines de ventilation	10 jo/0%		Mer 20/01/27
1.5.5.4	5.5.4 Pose des centrales de traitement d'air	3 jo/0%		Mer 20/01/27
1.5.5.5	5.5.5 Pose des PAC réversibles	2 jo/0%		Mer 03/02/27
1.5.5.6	5.5.6 Pose des réseaux d'air chaud	2 jo/0%		Mer 03/02/27
1.5.5.7	5.5.7 Régulation	5 jo/0%		Ven 05/02/27
1.5.5.8	5.5.8 Mise en service	3 jo/0%		Ven 26/02/27
1.5.5.9	5.5.9 Pose des grilles de ventilation en façade	2 jo/0%		Mer 03/02/27
1.5.5.10	5.5.10 Essais température et vitesse d'air	3 jo/0%		Mer 03/03/27
1.5.6	**5.6 ELECTRICITE**	**181 jo/7 0%**		**Mer 16/09/26**
1.5.6.1	5.6.1 Mise en place du coffret de chantier	1 jo/0%		Mer 30/09/26
1.5.6.2	5.6.2 Consignation des réseaux existants	1 jo/0%		Mer 30/09/26
1.5.6.3	5.6.3 Dépose des installations existantes non réutilisées	3 jo/0%		Jeu 01/10/26
1.5.6.4	5.6.4 Raccordement transformateur pendant arrêt technique	5 jo/0%		Lun 11/01/27
1.5.6.5	5.6.5 Distribution courant fort et courant faible	15 jo/0%		Mer 20/01/27
1.5.6.6	5.6.6 Pose des éclairages et appareillages électriques	5 jo/0%		Mer 10/02/27
1.5.6.7	5.6.7 Pose des détecteurs incendie	3 jo/0%		Mer 10/02/27
1.5.6.8	5.6.8 Pose des armoires électriques	5 jo/0%		Lun 15/02/27
1.5.6.9	5.6.9 Pose des équipements de contrôles d'accès	2 jo/0%		Lun 22/02/27
1.5.6.10	5.6.10 Essais SSI et mise en service	2 jo/0%		Mer 24/02/27
1.5.7	**5.7 PEINTURES - REVETEMENTS DE SOL**	**53 jo/0%**		**Mer 01/12/26**
1.5.7.1	5.7.1 Peinture des éléments de charpente métalliques	15 jo/0%		Jeu 03/12/26
1.5.7.2	5.7.2 Peintures des doublages	10 jo/0%		Mer 10/02/27
1.5.7.3	5.7.3 Ragréage	2 jo/0%		Mer 24/02/27
1.5.7.4	5.7.4 Pose du revêtement de sol sur la mezzanine	1 jo/0%		Ven 26/02/27
1.5.7.5	5.7.5 Résine de sol dans les halls et les SAS	5 jo/0%		Ven 26/02/27
1.5.7.6	5.7.6 Nettoyage avant OPR	1 jo/0%		Ven 05/03/27
1.6	6 Réception de travaux	1 jo/0%		Lun 08/03/27
1.7				
1.8	7 Levée de réserves	10 jo/0%		Mar 09/03/27

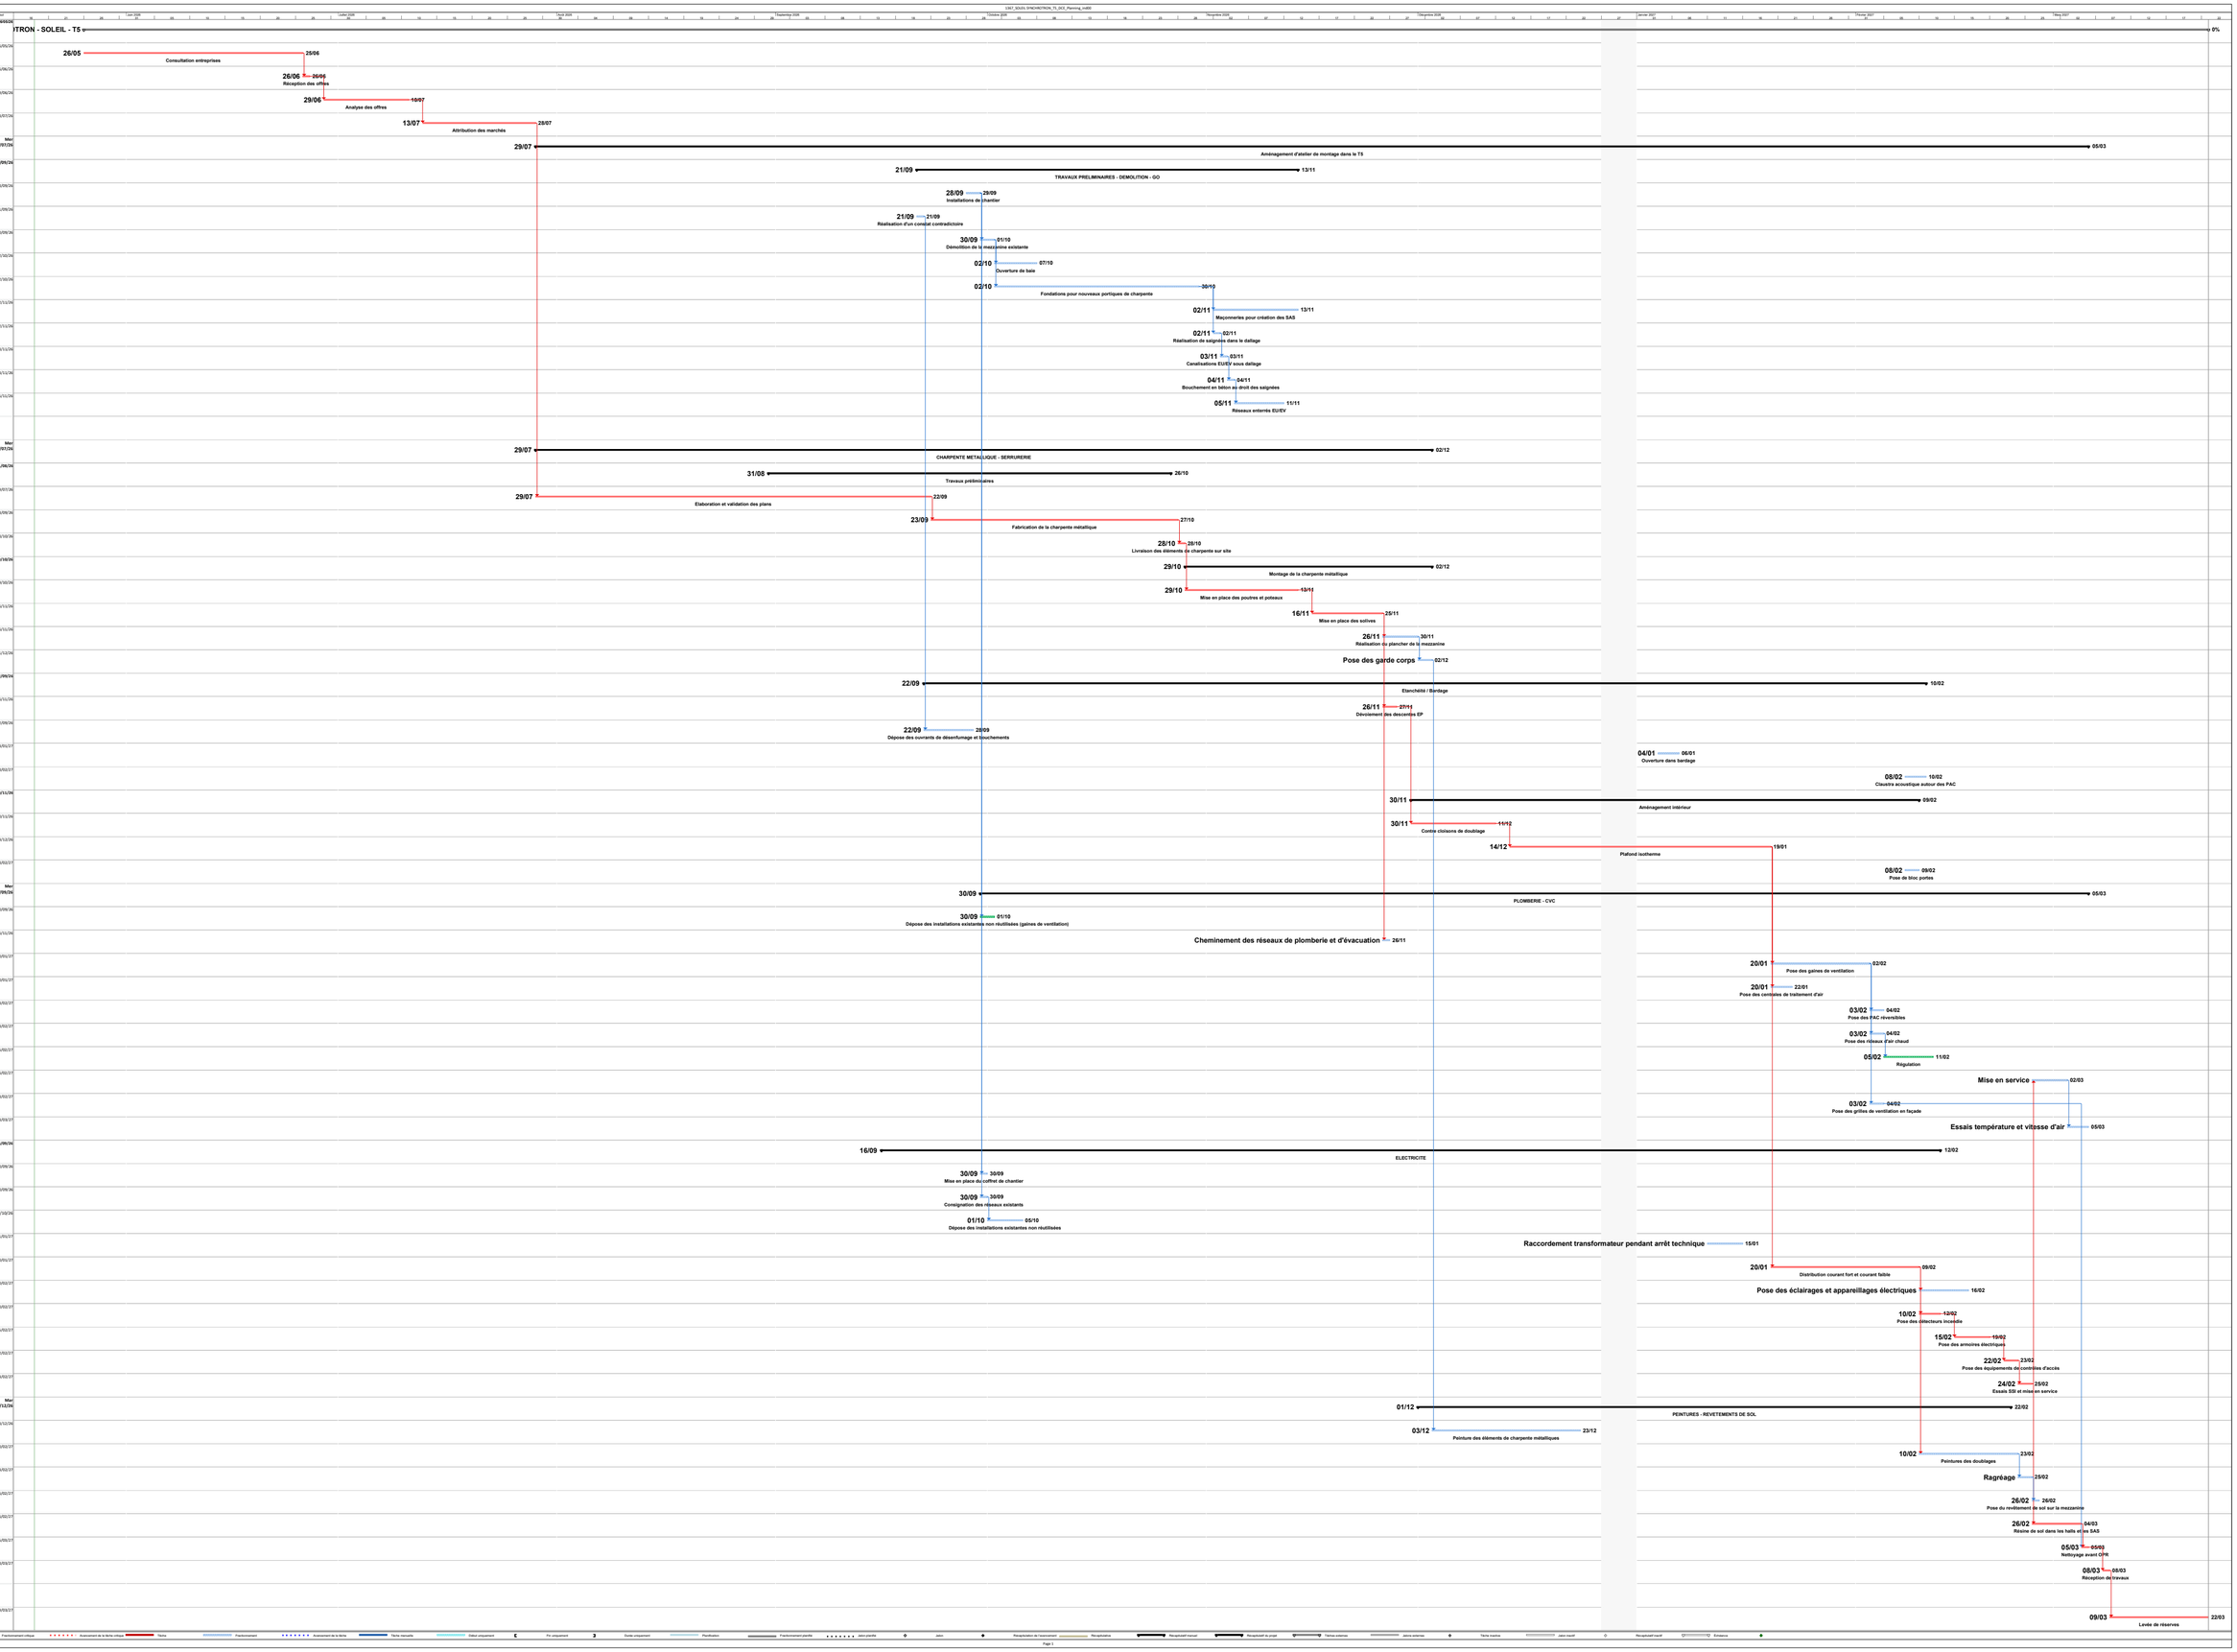

Critique | Fractionnement critique | Avancement de la tâche critique | Tâche | Fractionnement | Avancement de la tâche | Tâche manuelle | Début uniquement | Fin uniquement | Durée uniquement | Planification | Fractionnement planifié | Jalon planifié | Jalon | Récapitulation de l'avancement | Récapitulative | Récapitulatif manuel | Récapitulatif du projet | Tâches externes | Jalons externes | Tâche inactive | Jalon inactif | Récapitulatif inactif | Échéance

Janvier 2027	Février 2027	Mars 2027	Avril 2027	Mai 2027	Juin 2027	Juillet 2027	Août 2027	Septembre 2027	Octobre 2027	Novembre 2027	Décembre 2027	Janvier 2028	Février 2028
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

0%

22/03

Critique | Fractionnement critique | Avancement de la tâche critique | Tâche | Fractionnement | Avancement de la tâche | Tâche nouvelle | Début uniquement | Fin uniquement | Durée uniquement | Planification | Fractionnement planifié | Jalon planifié | Jalon | Récapitulation de l'avancement | Récapitulatif | Récapitulatif manuel | Récapitulatif du projet | Délais externes | Jalons externes | Tâche inactive | Jalon inactif | Récapitulatif inactif | Échéance
