N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	Noms ressources
1							
2							
3		**TRAVAUX**	**219 jours**	**Lun 24/08/26**	**Jeu 08/07/27**		
4		**PRÉPARATION**	**55 jours**	Lun 24/08/26	Ven 06/11/26		
5		OS entreprises	16 jours	Lun 24/08/26	Lun 14/09/26		
6		Préparation de chantier	2 mois	Lun 14/09/26	Ven 06/11/26		
7		**LOT 01 DÉCONSTRUCTION - GROS-OEUVRE**	**151 jours**	**Lun 28/09/26**	**Lun 10/05/27**		
8		**Travaux Préparatoire**	**10 jours**	**Lun 28/09/26**	**Ven 09/10/26**		
9		Installation base-vie	5 jours	Lun 28/09/26	Ven 02/10/26		
10		Réalisation accès au chantier	3 jours	Lun 05/10/26	Mer 07/10/26	9	
11		Protection des menuiseries exterieures	1 jour	Jeu 08/10/26	Jeu 08/10/26	10	
12		Protection des sols	1 jour	Ven 09/10/26	Ven 09/10/26	11	
13		**Travaux de dépose**	**21 jours**	**Lun 28/09/26**	**Lun 26/10/26**		
14		dépose des revêtement de sols souple bureaux	1 jour	Ven 16/10/26	Ven 16/10/26	61	
15		dépose de doublage intérieures	1 jour	Lun 19/10/26	Lun 19/10/26	14	
16		dépose et évacuation de plafonds suspendus intérieure bureaux	1 jour	Mar 20/10/26	Mar 20/10/26	15	
17		dépose des isolants en sous face de dalle LT	1 jour	Lun 28/09/26	Lun 28/09/26		
18		Dépose soignée de menuiserie et mise a disposition	1 jour	Mer 21/10/26	Mer 21/10/26	16	
19		Dépose de cloisons intérieures	1 jour	Lun 26/10/26	Lun 26/10/26	77	
20		**Terrassement en sous oeuvre**	**5 jours**	**Mar 03/11/26**	**Lun 09/11/26**		
21		Excavation en plaine masse	4 jours	Mar 03/11/26	Ven 06/11/26	33	
22		Plateformage dans existant	1 jour	Lun 09/11/26	Lun 09/11/26	21	
23		**Terrassement pour infrastructure**	**5 jours**	**Jeu 12/11/26**	**Mer 18/11/26**	**24**	
24		**Dallages intérieurs**	**2 jours**	**Mar 10/11/26**	**Mer 11/11/26**	**22**	
25		**Parois et murs maconnés**	**5 jours**	**Jeu 12/11/26**	**Mer 18/11/26**		
26		Maçonnerie en bloc de beton	3 jours	Jeu 12/11/26	Lun 16/11/26	24	
27		Chainage horizontaux	2 jours	Mar 17/11/26	Mer 18/11/26	26	
28		**Créations, modifications et bouchements d'ouvertures**	**105 jours**	**Mar 27/10/26**	**Lun 05/04/27**		
29		Flocage coupe-feu	2 jours	Ven 02/04/27	Lun 05/04/27	83	
30		Génie civil pour les corps d'état	20 jours	Mar 03/11/26	Lun 30/11/26	33	
31		Réalisation de socle en béton	3 jours	Mar 01/12/26	Jeu 03/12/26	30	
32		Traversées de planchers	5 jours	Mer 09/12/26	Mar 15/12/26	36	
33		Création de baies	5 jours	Mar 27/10/26	Lun 02/11/26	19	
34		Lames en fibres de carbone	2 jours	Mer 16/12/26	Jeu 17/12/26	32	
35		Protection au feu du système	2 jours	Ven 18/12/26	Lun 04/01/27	34	
36		Cour anglaise	3 jours	Ven 04/12/26	Mar 08/12/26	31	
37		ENDUIT	1 jour	Mer 09/12/26	Mer 09/12/26	36	
38		**BARDAGE INDUSTRIEL**	**17 jours**	**Mer 09/12/26**	**Jeu 14/01/27**		
39		Pose Echafaudage de chantier	1 jour	Mer 09/12/26	Mer 09/12/26	36	
40		Ouvrages de charpente métallique	5 jours	Jeu 10/12/26	Mer 16/12/26	39	
41		Bardage simple peau pose verticale	5 jours	Jeu 07/01/27	Mer 13/01/27	84	
42		Dépose echafaudage de chantier	1 jour	Jeu 14/01/27	Jeu 14/01/27	41	
43		**METALLERIE**	**1 jour**	**Mar 03/11/26**	**Mar 03/11/26**		
44		Bloc-porte métallique EI 30 (CF 1/2H)	1 jour	Mar 03/11/26	Mar 03/11/26	33	
45		**LOT 02 REVETEMENT DE SOLS SOUPLES - PEINTURES - FAUX PLAFONDS**	**166 jours**	**Lun 12/10/26**	**Lun 14/06/27**		
46		**SOL SOUPLE**	**16 jours**	**Jeu 13/05/27**	**Jeu 03/06/27**		
47		Dépose de sol dans le couloir	1 jour	Jeu 13/05/27	Jeu 13/05/27	95	
48		RAGREAGE laboratoire	4 jours	Ven 14/05/27	Mer 19/05/27	47	
49		RAGREAGE couloir	2 jours	Jeu 20/05/27	Ven 21/05/27	48	
50		Pose de sol laboratoire	6 jours	Lun 24/05/27	Lun 31/05/27	49	
51		Pose de sol couloir	3 jours	Mar 01/06/27	Jeu 03/06/27	50	
52		**Peinture**	**114 jours**	**Lun 04/01/27**	**Jeu 10/06/27**		
53		Peinture de propreté sur murs Local Technique Venti	2 jours	Lun 04/01/27	Mar 05/01/27		
54		Peinture de sol époxy bi-composant Local Technique Ventilation	3 jours	Mer 06/01/27	Ven 08/01/27	53	
55		Reprise peinture circulation	3 jours	Mar 08/06/27	Jeu 10/06/27	65	
56		**Faux Plafonds**	**166 jours**	**Lun 12/10/26**	**Lun 14/06/27**		
57		Dépose de faux plafond couloir	1 jour	Lun 12/10/26	Lun 12/10/26		
58		Pose de faux plafond couloir	2 jours	Ven 11/06/27	Lun 14/06/27	55	
59		**LOT 03 AGENCEMENT - MENUISERIE INTERIEURE**	**162 jours**	**Lun 12/10/26**	**Mar 08/06/27**		
60		**Protection et modification d'un bloc porte DAS 2 vanta**	1 jour	Lun 12/10/26	Lun 12/10/26	12	
61		**Confinement**	**3 jours**	**Mar 13/10/26**	**Jeu 15/10/26**	**60**	
62		**Paillasses seches**	**1 jour**	**Mar 08/06/27**	**Mar 08/06/27**	**65**	
63		**Bancs sautés**	**1 jour**	**Mar 01/06/27**	**Mar 01/06/27**	**50**	
64		**Casiers traversants**	**1 jour**	**Mer 02/06/27**	**Mer 02/06/27**	**63**	
65		**Dépose cloison provisoire**	**2 jours**	**Ven 04/06/27**	**Lun 07/06/27**	**51**	
66		**LOT 04 EQUIPEMENT DE SALLE BLANCHE - CHÂSSIS INTÉRIEURS**	**92 jours**	**Ven 18/12/26**	**Jeu 06/05/27**		
67		**Parois**	**40 jours**	**Ven 18/12/26**	**Jeu 25/02/27**		
68		cloisons et portes périphériques	10 jours	Ven 18/12/26	Jeu 14/01/27	34	
69		cloisons-doublages-guichets-châssis fixes	30 jours	Ven 15/01/27	Jeu 25/02/27	68	
70		**faux plafonds autoportant**	**10 jours**	**Ven 16/04/27**	**Jeu 29/04/27**	**89**	
71		**Coffret de gestion et régulation**	**5 jours**	**Ven 30/04/27**	**Jeu 06/05/27**	**70**	
72		**LOT 05 CVC - PB**	**173 jours**	**Lun 19/10/26**	**Mer 30/06/27**		
73		**Travaux préparatoire (dépose des équipements existants, neutralisation, piquages dans circulation,**	**5 jours**	**Lun 19/10/26**	**Ven 23/10/26**		
74		Neutralisation reseau change over	1 jour	Lun 19/10/26	Lun 19/10/26	14	
75		Neutralisation reseau chauffage	1 jour	Mar 20/10/26	Mar 20/10/26	74	
76		neutralisation reseau ventilation	1 jour	Mer 21/10/26	Mer 21/10/26	75	
77		Dépose	2 jours	Jeu 22/10/26	Ven 23/10/26	76	
78		**Raccordement sur les utilités chauffage/eau glacée / eau adoucie**	**3 jours**	**Lun 09/11/26**	**Mer 11/11/26**		
79		raccordement sur rseau chauffage existant en sous s	1 jour	Lun 09/11/26	Lun 09/11/26	6	
80		raccordement sur rseau Froid existant en sous statio	1 jour	Mar 10/11/26	Mar 10/11/26	79	
81		raccordement sur rseau Plomberie existant	1 jour	Mer 11/11/26	Mer 11/11/26	80	
82		**Ventilation**	**91 jours**	**Jeu 17/12/26**	**Jeu 06/05/27**		
83		Gainage SS2	10 jours	Ven 19/03/27	Jeu 01/04/27	85	
84		Gainages en façade	5 jours	Jeu 17/12/26	Mer 06/01/27	40	
85		Réseaux laboratoire	15 jours	Ven 26/02/27	Jeu 18/03/27	69	
86		terminaux laboratoire	5 jours	Ven 30/04/27	Jeu 06/05/27	70	
87		Réseaux + termineaux R+4 en toiture	5 jours	Jeu 07/01/27	Mer 13/01/27	84	
88		Équipement local CTA SS2	15 jours	Lun 15/02/27	Ven 05/03/27		
89		Calorifugeage des gaines	10 jours	Ven 02/04/27	Jeu 15/04/27	83	
90		**Canalisations chauffage-EG-Plomberie**	**85 jours**	**Jeu 14/01/27**	**Mer 12/05/27**		
91		tuyauterie chauffage	10 jours	Jeu 14/01/27	Mer 27/01/27	87	
92		tuyauterie EG	10 jours	Jeu 28/01/27	Mer 10/02/27	91	
93		Tuyauterie plomberie	3 jours	Ven 07/05/27	Mar 11/05/27	86	
94		Calorifugeage tuyauterie	5 jours	Jeu 11/02/27	Mer 17/02/27	92	
95		Appareillage sanitaire	1 jour	Mer 12/05/27	Mer 12/05/27	93	
96		**GTC supervision**	**10 jours**	**Ven 30/04/27**	**Jeu 13/05/27**	**70**	
97		**Essais et mise en service**	**10 jours**	**Jeu 17/06/27**	**Mer 30/06/27**	**120**	
98		**LOT 6 CFO - CFA**	**141 jours**	**Jeu 08/10/26**	**Jeu 06/05/27**		
99		**Installation de chantier**	**1 jour**	**Jeu 08/10/26**	**Jeu 08/10/26**	**10**	
100		**Consignation et dépose**	**5 jours**	**Ven 09/10/26**	**Jeu 15/10/26**	**99**	
101		**CDC et distribution CFO - CFA**	**119 jours**	**Lun 09/11/26**	**Jeu 06/05/27**		
102		**Tableaux électriques**	**8 jours**	**Lun 09/11/26**	**Mer 18/11/26**		
111		**Eclairage de securité**	**2 jours**	**Lun 14/12/26**	**Mar 15/12/26**		
112		**Baie informatique**	**5 jours**	**Lun 16/11/26**	**Ven 20/11/26**		
113		**Equipements**	**2 jours**	**Ven 30/04/27**	**Lun 03/05/27**		
114		**Essais et mise en service**	**1 jour**	**Mar 04/05/27**	**Mar 04/05/27**	**113**	
115		**LOT 7 FLUIDES MEDICAUX**	**34 jours**	**Ven 30/04/27**	**Mer 16/06/27**		
116		**Distribution**	**3 jours**	**Ven 30/04/27**	**Mar 04/05/27**	**70**	
117		**Appareillage**	**1 jour**	**Mer 05/05/27**	**Mer 05/05/27**	**116**	
118		**Essais et mise en service**	**1 jour**	**Mer 05/05/27**	**Mer 05/05/27**	**116**	
119							
120		**Test d'étanchéité à l'air**	**2 jours**	**Mar 15/06/27**	**Mer 16/06/27**	**58**	
121		**OPR**	**5 jours**	**Jeu 17/06/27**	**Mer 23/06/27**	**120**	
122		**Levée des réserves**	**10 jours**	**Jeu 24/06/27**	**Mer 07/07/27**	**121**	
123		**Date d'achèvement des travaux**	**1 jour**	**Jeu 08/07/27**	**Jeu 08/07/27**	**122**	

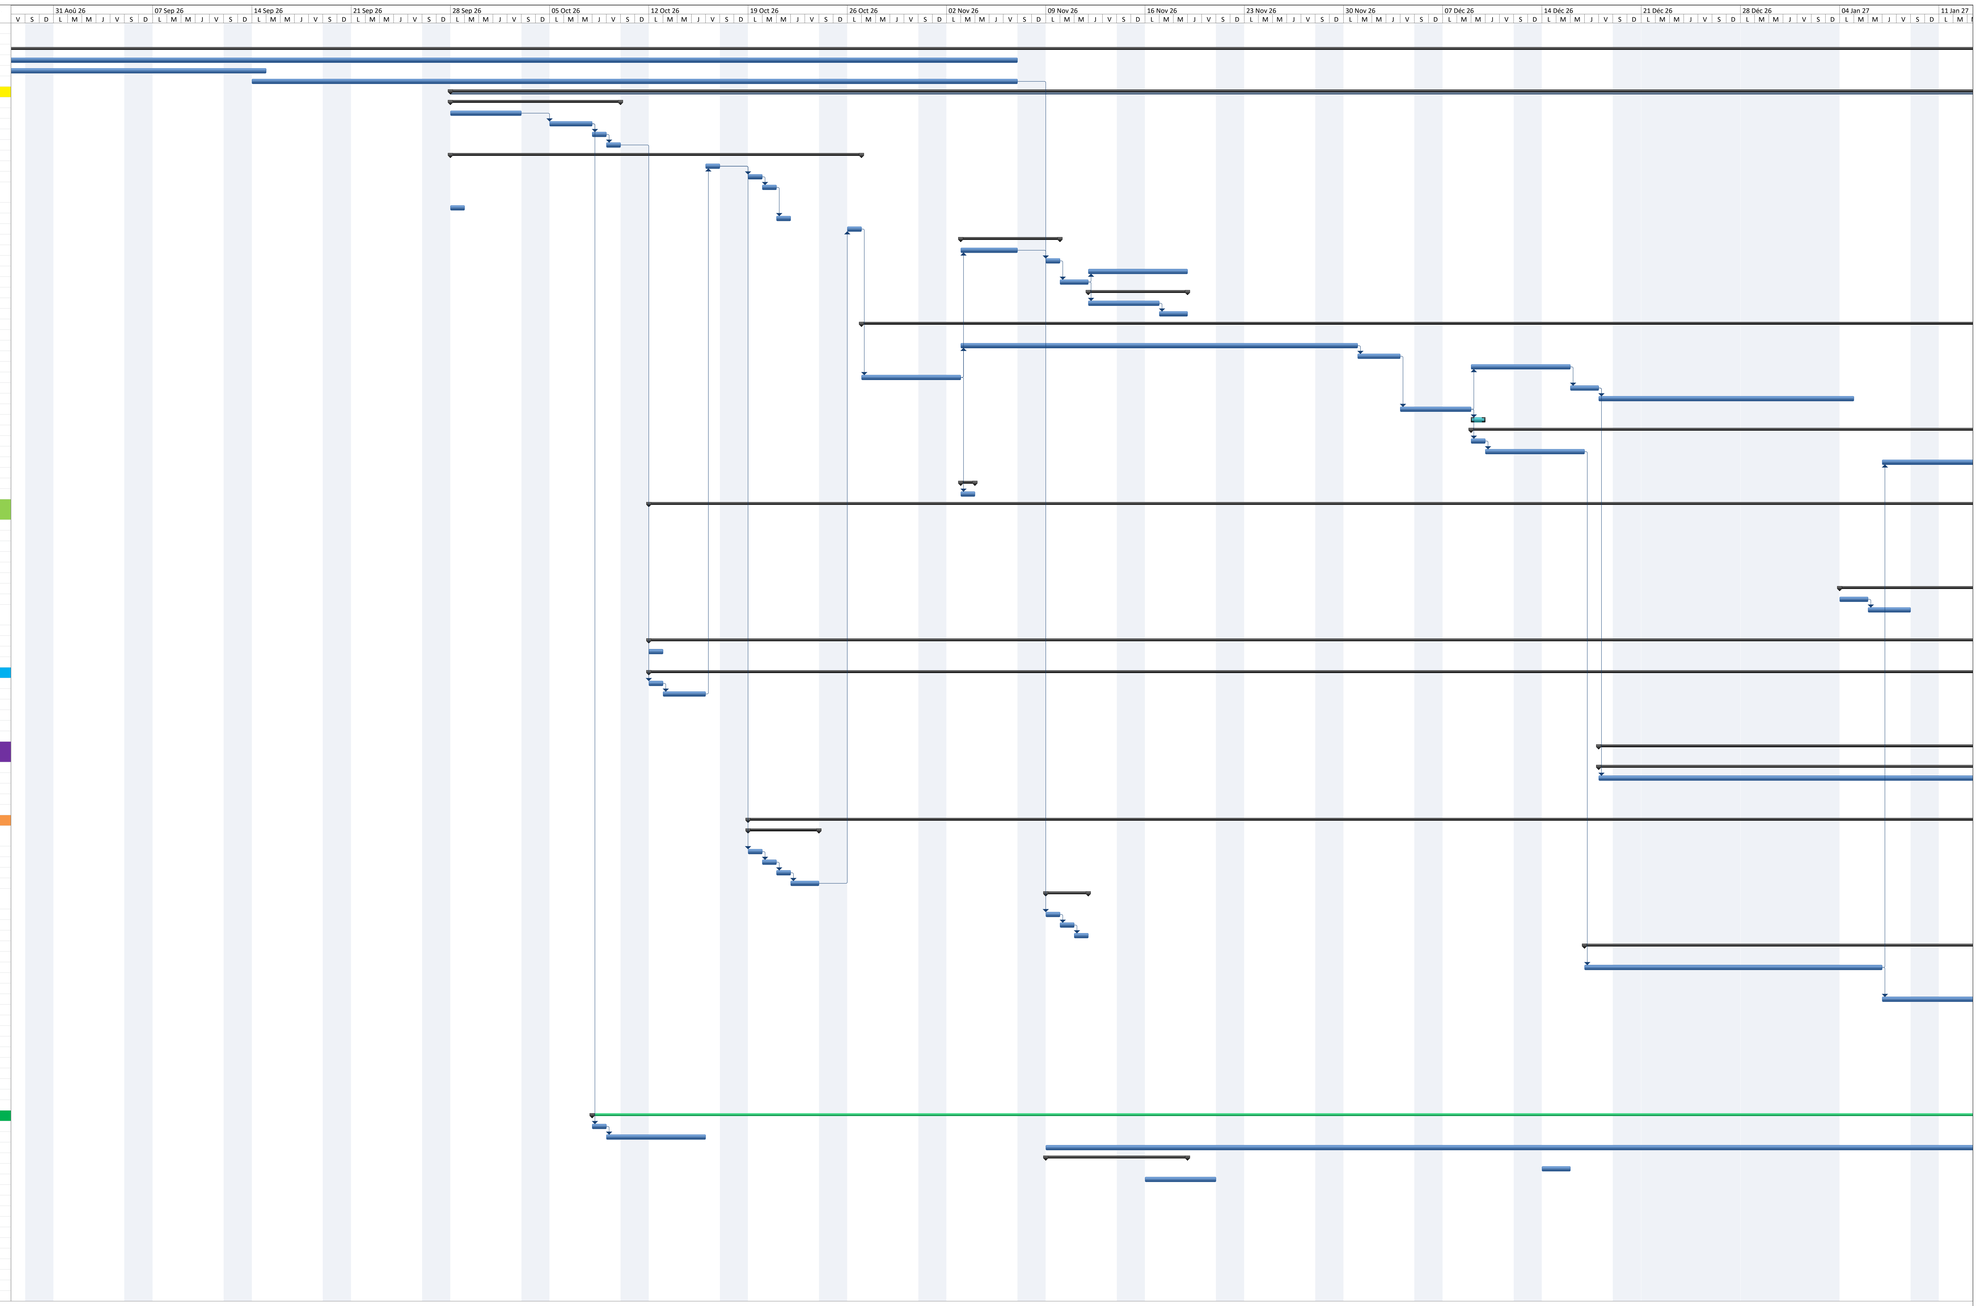

Projet : planning V0.0
Date : Ven 22/05/26

Tâche · Fractionnement · Jalon · Récapitulative · Récapitulatif du projet · Tâches externes · Jalons externes · Tâche inactive · Jalon inactif · Récapitulatif inactif · Tâche manuelle · Durée uniquement · Report récapitulatif manuel · Récapitulatif manuel · Début uniquement · Fin uniquement · Échéance · Avancement

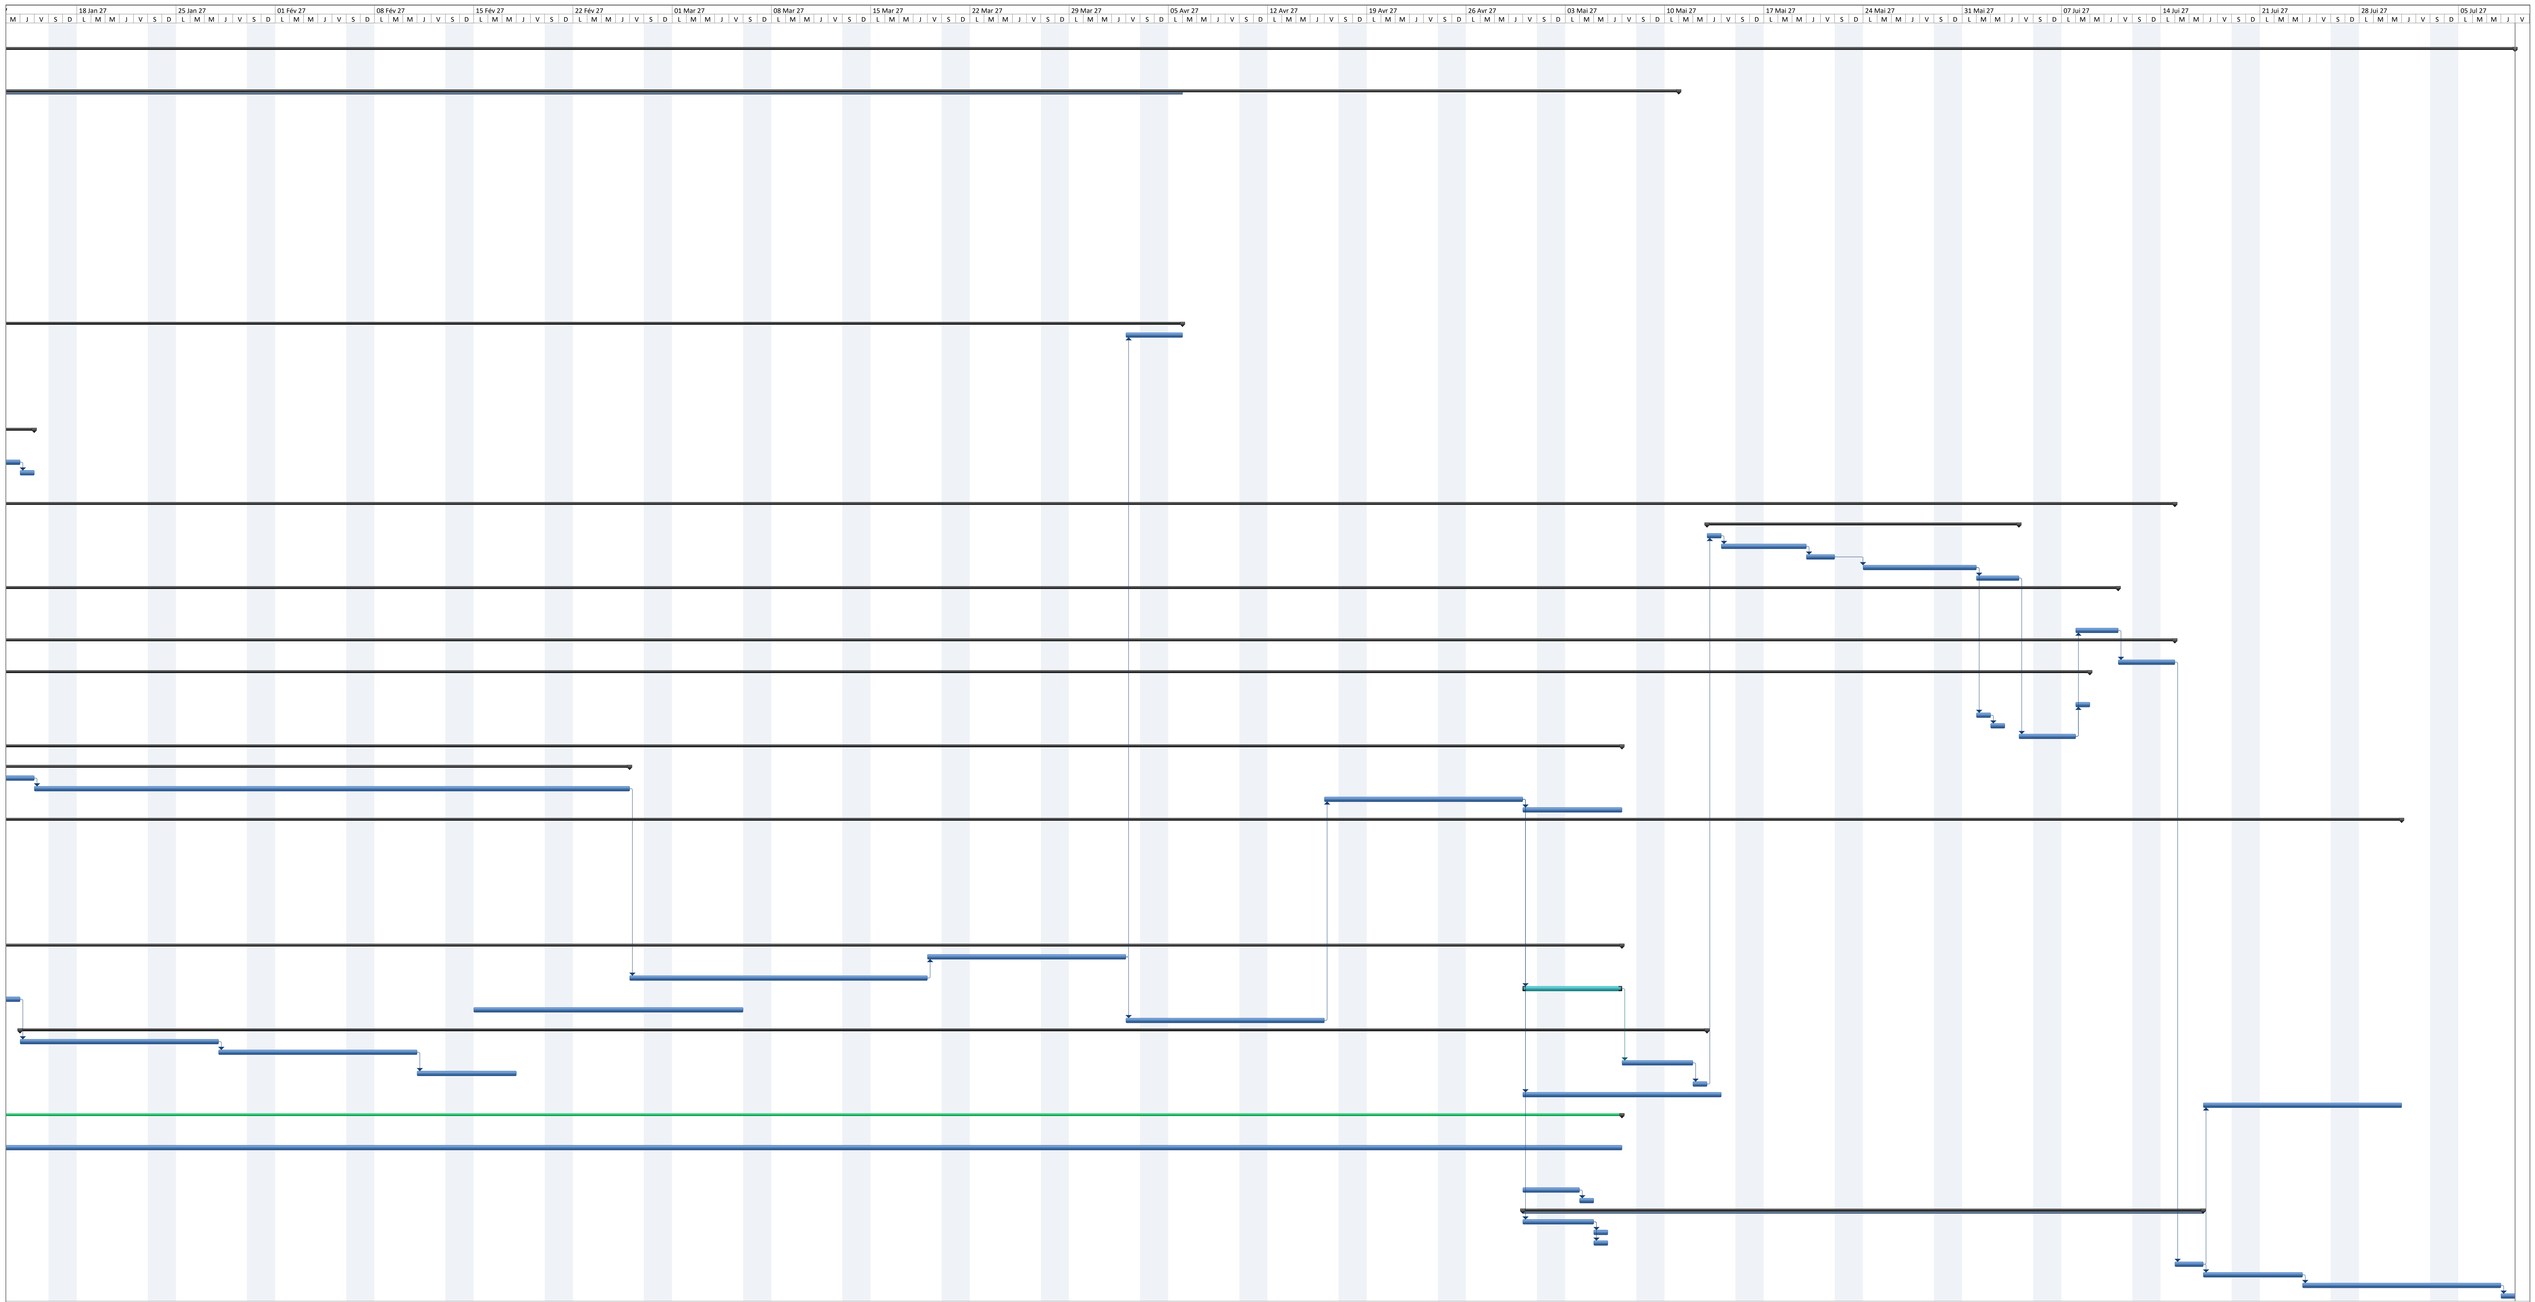

Projet : planning V0.0
Date : Ven 22/05/26

Tâche	Jalon	Récapitulatif du projet	Jalons externes	Jalon inactif	Tâche manuelle	Report récapitulatif manuel	Début uniquement	Échéance
Fractionnement	Récapitulative	Tâches externes	Tâche inactive	Récapitulatif inactif	Durée uniquement	Récapitulatif manuel	Fin uniquement	Avancement
