Centre Hospitalier Guillaume Régnier
Ensemble au service de la santé mentale

TO Planning (lundi) 06/07/2026
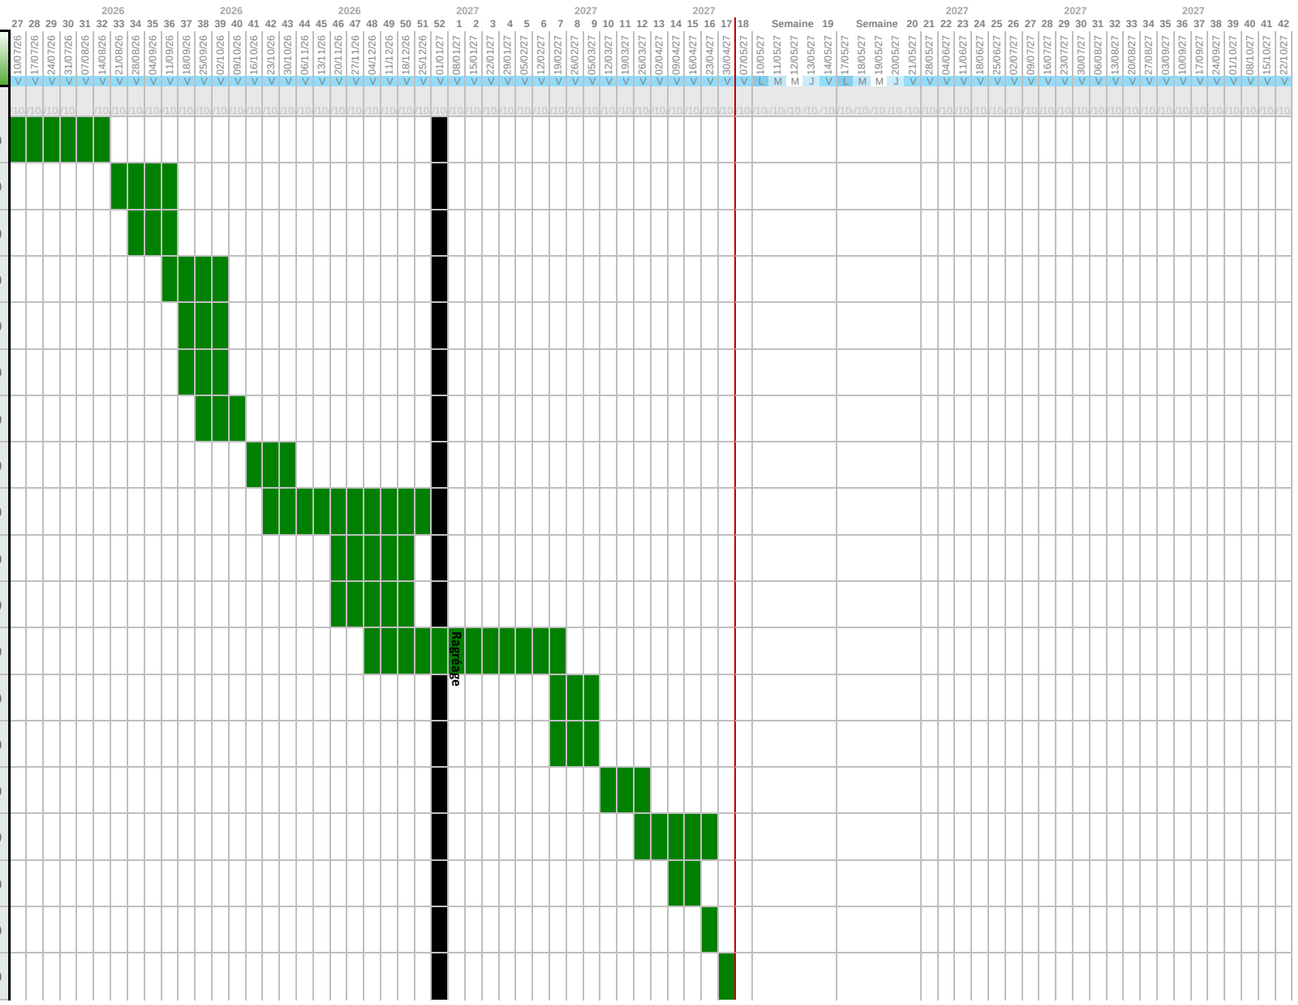
N°	Jalon	Ressource	Planning prévisionnel Début	Prévisionnel	Congés	Fin	Planning réel Début	Réel	congés	Fin	Retard
	Plan de retrait, compris délai administratif		06/07/26	6,0 semaine(s)	0,0 semaine(s)	16/08/26	06/07/26	6 semaine(s)	0,0 semaine(s)	16/08/26	0 semaine(s)
	Désamiantage		17/08/26	4,0 semaine(s)	0,0 semaine(s)	13/09/26	17/08/26	4 semaine(s)	0,0 semaine(s)	13/09/26	0 semaine(s)
	Travaux réseaux extérieures		24/08/26	3,0 semaine(s)	0,0 semaine(s)	13/09/26	24/08/26	3 semaine(s)	0,0 semaine(s)	13/09/26	0 semaine(s)
	Démolition		07/09/26	4,0 semaine(s)	0,0 semaine(s)	04/10/26	07/09/26	4 semaine(s)	0,0 semaine(s)	04/10/26	0 semaine(s)
	Lot électricité dépose neutralisation		14/09/26	3,0 semaine(s)	0,0 semaine(s)	04/10/26	14/09/26	3 semaine(s)	0,0 semaine(s)	04/10/26	0 semaine(s)
	Lot plomberie - CVC neutralisationn, canalsation dans dalles		14/09/26	3,0 semaine(s)	0,0 semaine(s)	04/10/26	14/09/26	3 semaine(s)	0,0 semaine(s)	04/10/26	0 semaine(s)
	Gros-Œuvre		21/09/26	3,0 semaine(s)	0,0 semaine(s)	11/10/26	21/09/26	3 semaine(s)	0,0 semaine(s)	11/10/26	0 semaine(s)
	Lot menuiseries extérieures		12/10/26	3,0 semaine(s)	0,0 semaine(s)	01/11/26	12/10/26	3 semaine(s)	0,0 semaine(s)	01/11/26	0 semaine(s)
	Lot cloison		19/10/26	10,0 semaine(s)	0,0 semaine(s)	27/12/26	19/10/26	10 semaine(s)	0,0 semaine(s)	27/12/26	0 semaine(s)
	Lot électricité - cheminement de câble		16/11/26	5,0 semaine(s)	0,0 semaine(s)	20/12/26	16/11/26	5 semaine(s)	0,0 semaine(s)	20/12/26	0 semaine(s)
	Lot plomberie - CVC canalisations, attentes		16/11/26	5,0 semaine(s)	0,0 semaine(s)	20/12/26	16/11/26	5 semaine(s)	0,0 semaine(s)	20/12/26	0 semaine(s)
	Lot revêtement muraux - rvt sol : Ragréage et peinture		30/11/26	12,0 semaine(s)	0,0 semaine(s)	21/02/27	30/11/26	12 semaine(s)	0,0 semaine(s)	21/02/27	0 semaine(s)
	Lot électricité - appareillage		15/02/27	3,0 semaine(s)	0,0 semaine(s)	07/03/27	15/02/27	3 semaine(s)	0,0 semaine(s)	07/03/27	0 semaine(s)
	Lot plomberie - CVC appareillage sanitaire		15/02/27	3,0 semaine(s)	0,0 semaine(s)	07/03/27	15/02/27	3 semaine(s)	0,0 semaine(s)	07/03/27	0 semaine(s)
	Lot faux-plafond		08/03/27	3,0 semaine(s)	0,0 semaine(s)	28/03/27	08/03/27	3 semaine(s)	0,0 semaine(s)	28/03/27	0 semaine(s)
	Lot revêtement de sol		22/03/27	5,0 semaine(s)	0,0 semaine(s)	25/04/27	22/03/27	5 semaine(s)	0,0 semaine(s)	25/04/27	0 semaine(s)
	Lot agencement intérieur		05/04/27	2,0 semaine(s)	0,0 semaine(s)	18/04/27	05/04/27	2 semaine(s)	0,0 semaine(s)	18/04/27	0 semaine(s)
	Lot stores		19/04/27	1,0 semaine(s)	0,0 semaine(s)	25/04/27	19/04/27	1 semaine(s)	0,0 semaine(s)	25/04/27	0 semaine(s)
	Nettoyage chantier		26/04/27	1,0 semaine(s)	0,0 semaine(s)	02/05/27	26/04/27	1 semaine(s)	0,0 semaine(s)	02/05/27	0 semaine(s)
