Diagramme de Gantt
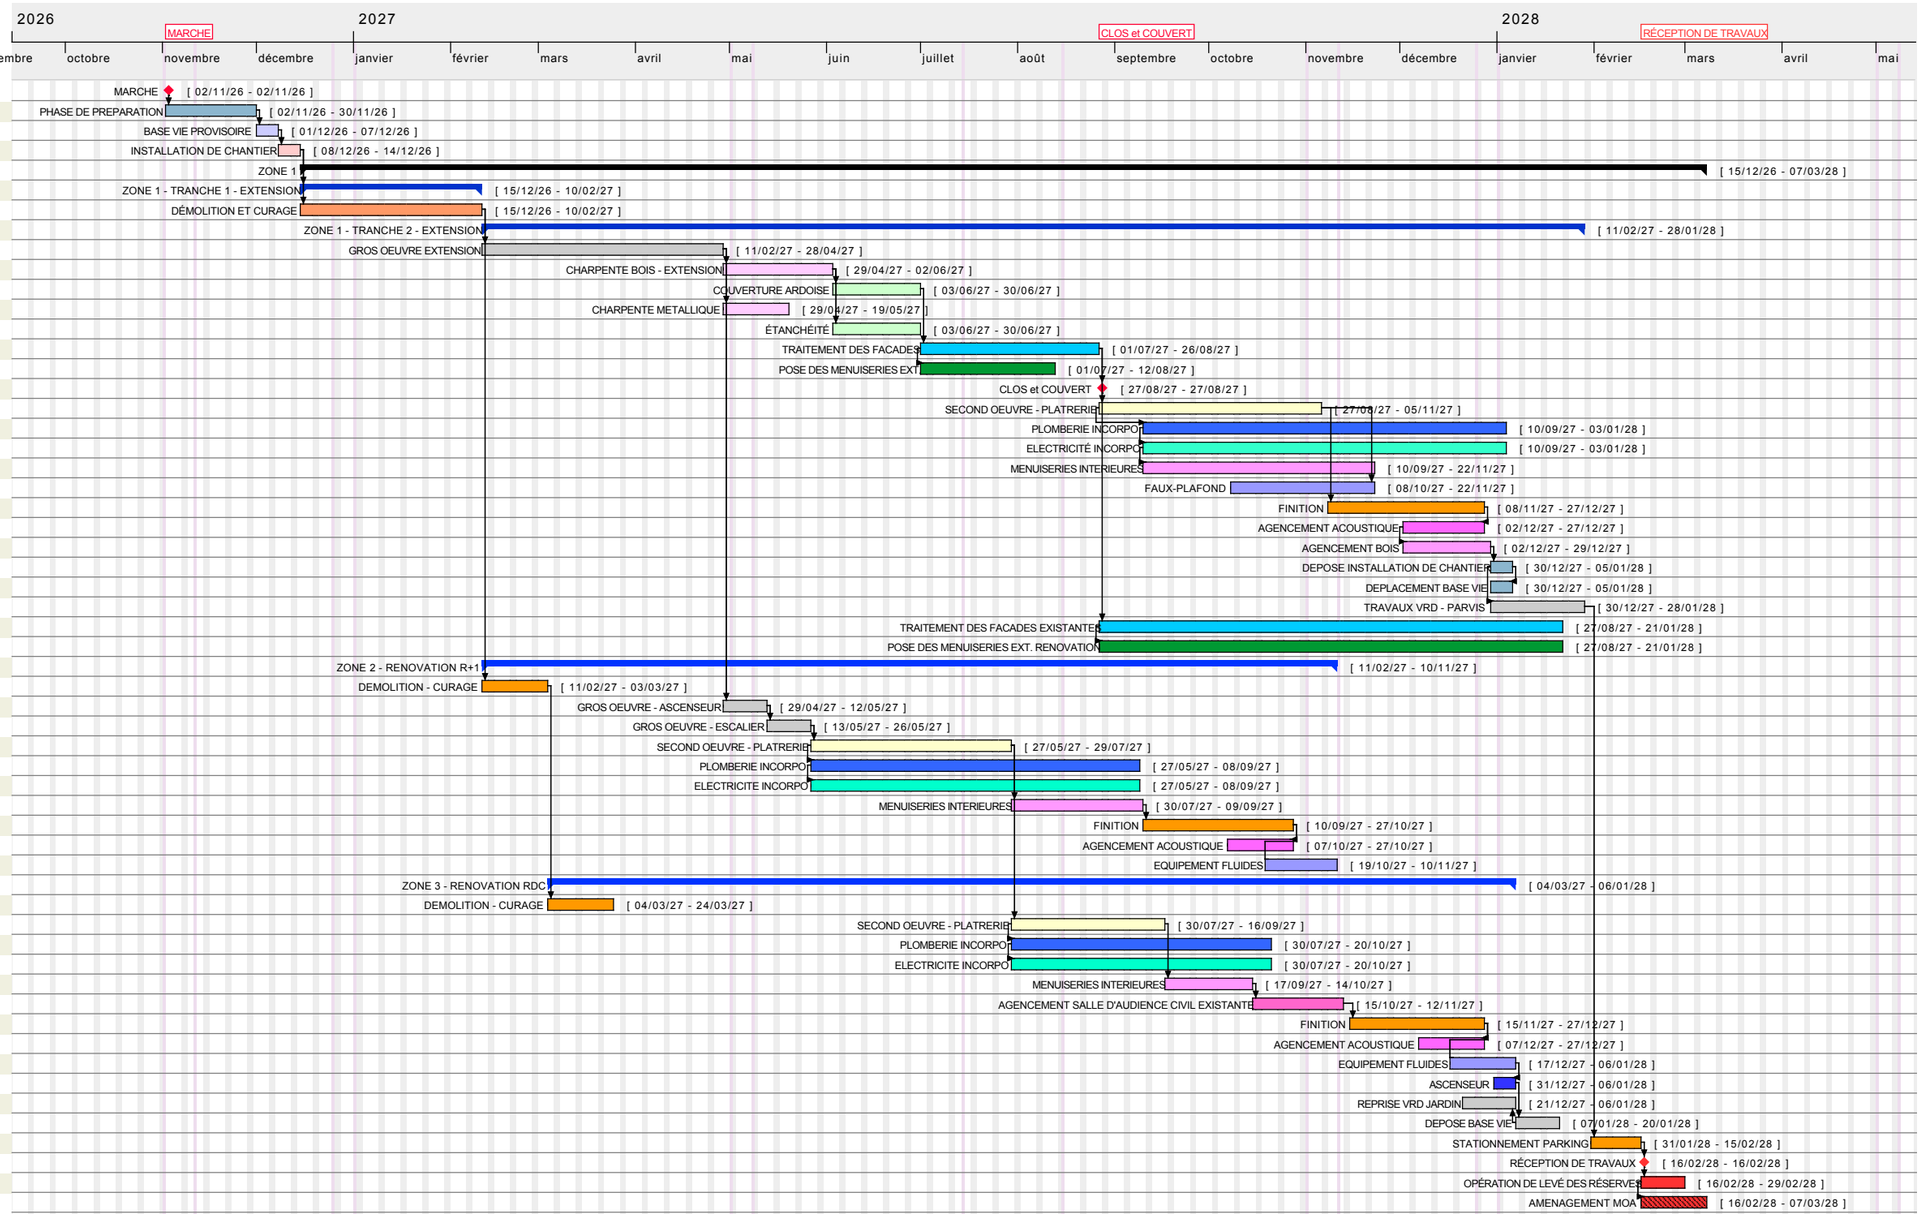
Nom	Date de début	Date de fin
MARCHE	02/11/26	02/11/26
PHASE DE PREPARATION	02/11/26	30/11/26
BASE VIE PROVISOIRE	01/12/26	07/12/26
INSTALLATION DE CHANTIER	08/12/26	14/12/26
ZONE 1	15/12/26	07/03/28
ZONE 1 - TRANCHE 1 - EXTENSION	15/12/26	10/02/27
DÉMOLITION ET CURAGE	15/12/26	10/02/27
ZONE 1 - TRANCHE 2 - EXTENSION	11/02/27	28/01/28
GROS OEUVRE EXTENSION	11/02/27	28/04/27
CHARPENTE BOIS - EXTENSION	29/04/27	02/06/27
COUVERTURE ARDOISE	03/06/27	30/06/27
CHARPENTE METALLIQUE	29/04/27	19/05/27
ÉTANCHÉITÉ	03/06/27	30/06/27
TRAITEMENT DES FACADES	01/07/27	26/08/27
POSE DES MENUISERIES EXT.	01/07/27	12/08/27
CLOS et COUVERT	27/08/27	27/08/27
SECOND OEUVRE - PLATRERIE	27/08/27	05/11/27
PLOMBERIE INCORPO	10/09/27	03/01/28
ELECTRICITÉ INCORPO	10/09/27	03/01/28
MENUISERIES INTERIEURES	10/09/27	22/11/27
FAUX-PLAFOND	08/10/27	22/11/27
FINITION	08/11/27	27/12/27
AGENCEMENT ACOUSTIQUE	02/12/27	27/12/27
AGENCEMENT BOIS	02/12/27	29/12/27
DEPOSE INSTALLATION DE CHANTIER	30/12/27	05/01/28
DEPLACEMENT BASE VIE	30/12/27	05/01/28
TRAVAUX VRD - PARVIS	30/12/27	28/01/28
TRAITEMENT DES FACADES EXISTANTES	27/08/27	21/01/28
POSE DES MENUISERIES EXT. RENOVATION	27/08/27	21/01/28
ZONE 2 - RENOVATION R+1	11/02/27	10/11/27
DEMOLITION - CURAGE	11/02/27	03/03/27
GROS OEUVRE - ASCENSEUR	29/04/27	12/05/27
GROS OEUVRE - ESCALIER	13/05/27	26/05/27
SECOND OEUVRE - PLATRERIE	27/05/27	29/07/27
PLOMBERIE INCORPO	27/05/27	08/09/27
ELECTRICITE INCORPO	27/05/27	08/09/27
MENUISERIES INTERIEURES	30/07/27	09/09/27
FINITION	10/09/27	27/10/27
AGENCEMENT ACOUSTIQUE	07/10/27	27/10/27
EQUIPEMENT FLUIDES	19/10/27	10/11/27
ZONE 3 - RENOVATION RDC	04/03/27	06/01/28
DEMOLITION - CURAGE	04/03/27	24/03/27
SECOND OEUVRE - PLATRERIE	30/07/27	16/09/27
PLOMBERIE INCORPO	30/07/27	20/10/27
ELECTRICITE INCORPO	30/07/27	20/10/27
MENUISERIES INTERIEURES	17/09/27	14/10/27
AGENCEMENT SALLE D'AUDIENCE CIVIL EXISTANTE	15/10/27	12/11/27
FINITION	15/11/27	27/12/27
AGENCEMENT ACOUSTIQUE	07/12/27	27/12/27
EQUIPEMENT FLUIDES	17/12/27	06/01/28
ASCENSEUR	31/12/27	06/01/28
REPRISE VRD JARDIN	21/12/27	06/01/28
DEPOSE BASE VIE	07/01/28	20/01/28
STATIONNEMENT PARKING	31/01/28	15/02/28
RÉCEPTION DE TRAVAUX	16/02/28	16/02/28
OPÉRATION DE LEVÉ DES RÉSERVES	16/02/28	29/02/28
AMENAGEMENT MOA	16/02/28	07/03/28
