Travaux remplacement production et boucle Eau Osmosée - Service Dialyse
HOPITAL NOVO - SITE PONTOISE
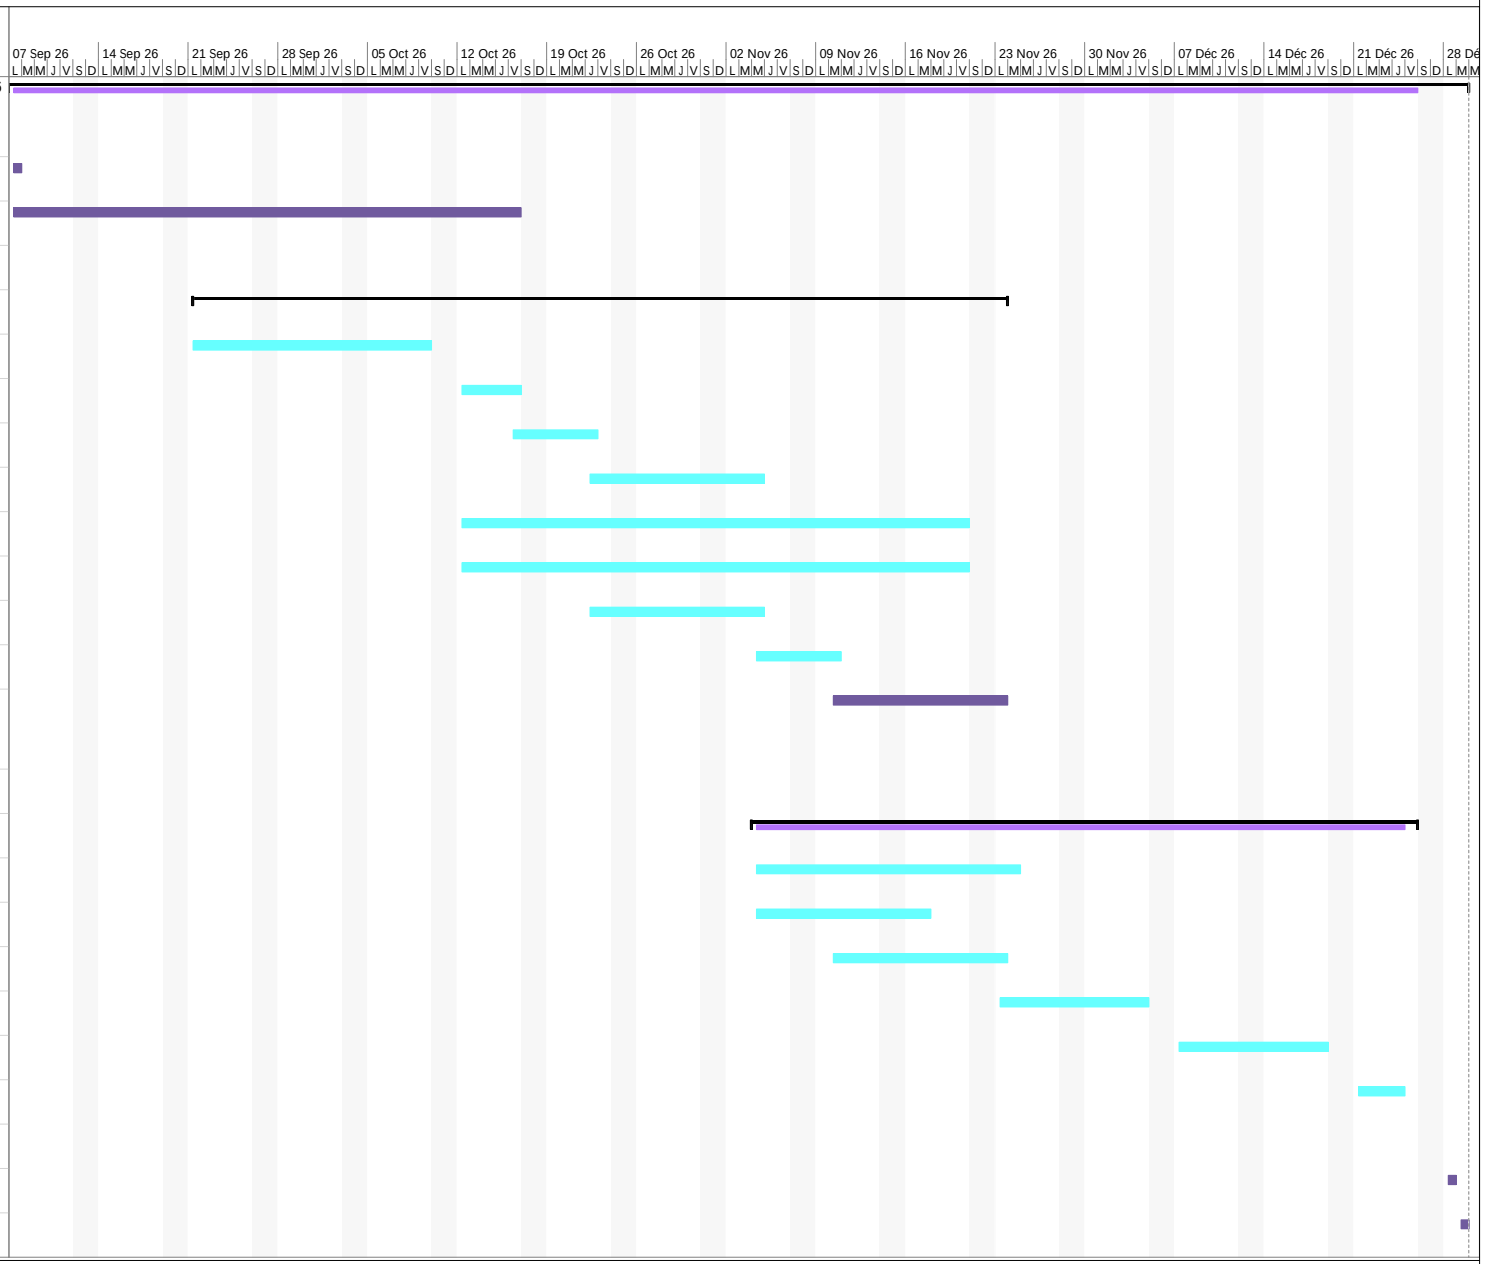
N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1		Travaux remplacement production et boucle Eau Osmosée - Service Dialyse	82 jours	Lun 07/09/26	Mar 29/12/26
2		OS démarrage	1 jour	Lun 07/09/26	Lun 07/09/26
3		Etude exécution et commandes	1,5 mois	Lun 07/09/26	Ven 16/10/26
4					
5		Lot 1 TCE	46 jours	Lun 21/09/26	Lun 23/11/26
6		Désamiantage local technique sous sol	3 semaines	Lun 21/09/26	Ven 09/10/26
7		Réseau sous dallage sous sol	1 semaine	Lun 12/10/26	Ven 16/10/26
8		Percements et ouvertures sous sol	1 semaine	Ven 16/10/26	Jeu 22/10/26
9		Travaux de résine de sol, peinture murs et faux pla	2 semaines	Jeu 22/10/26	Mer 04/11/26
10		Travaux d'électricité sous sol	1,5 mois	Lun 12/10/26	Ven 20/11/26
11		Travaux de ventilation, climatisation sous sol	1,5 mois	Lun 12/10/26	Ven 20/11/26
12		Percements SS4 et dés béton Dialyse B	2 semaines	Jeu 22/10/26	Mer 04/11/26
13		Percements SS4 et dés béton Dialyse C	1 semaine	Mer 04/11/26	Mar 10/11/26
14		Percements SS4 et Modification arche menuisée Dialyse A	2 semaines	Mar 10/11/26	Lun 23/11/26
15					
16		Lot 2 EAU OSMOSEE	38 jours	Mer 04/11/26	Ven 25/12/26
17		Installation production	3 semaines	Mer 04/11/26	Mar 24/11/26
18		Réseau Dialyse B	2 semaines	Mer 04/11/26	Mar 17/11/26
19		Réseau Dialyse C	2 semaines	Mar 10/11/26	Lun 23/11/26
20		Réseau Dialyse A	2 semaines	Lun 23/11/26	Ven 04/12/26
21		Mise en service et qualifications de boucles	2 semaines	Lun 07/12/26	Ven 18/12/26
22		Dépose anciennes boucles	4 jours	Lun 21/12/26	Jeu 24/12/26
23					
24		OPR	1 jour	Lun 28/12/26	Lun 28/12/26
25		Réception	1 jour	Mar 29/12/26	Mar 29/12/26
