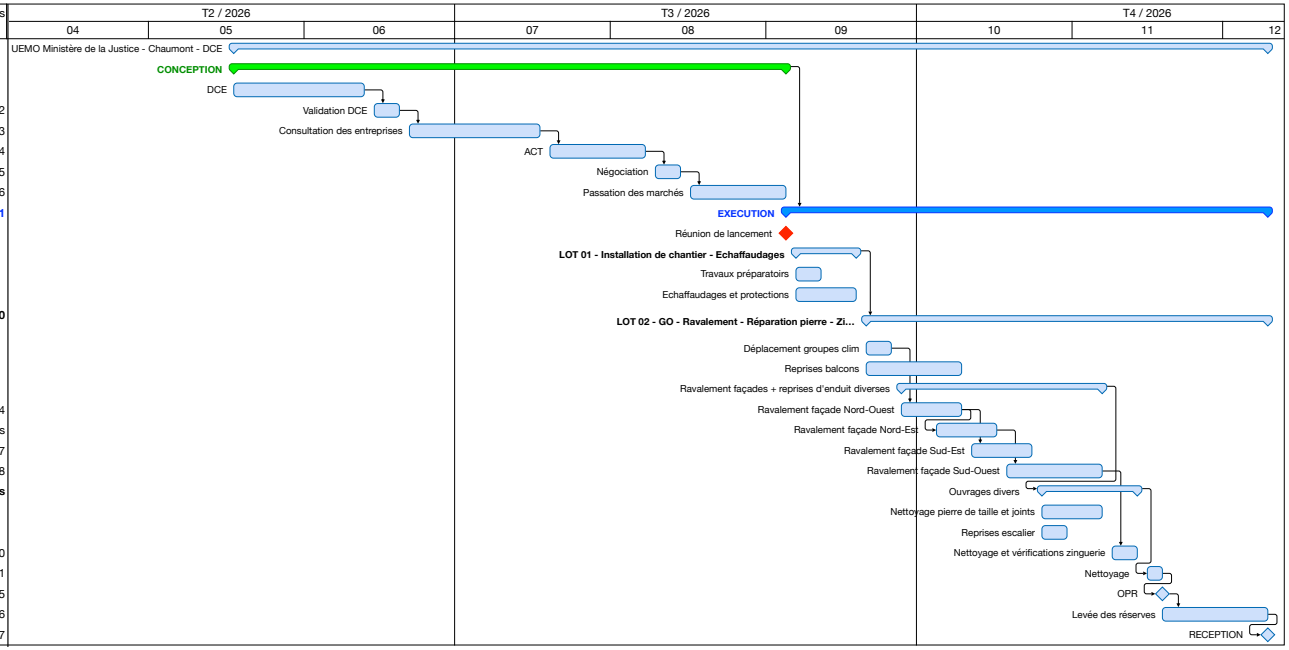#	Traits	Titre	Travail donné	Début prévu	Prédécesseurs
0	!!!	**UEMO Ministère de la Justice - Chaumont - DCE**		**18 mai 2026**	
1		**CONCEPTION**		**18 mai 2026**	
2		DCE	20 jours	18 mai 2026	
3		Validation DCE	5 jours	15 juin 2026	2
4		Consultation des entreprises	20 jours	22 juin 2026	3
5		ACT	15 jours	20 juil. 2026	4
6		Négociation	5 jours	10 août 2026	5
7		Passation des marchés	15 jours	17 août 2026	6
8		**EXECUTION**		**4 sept. 2026**	**1**
9		Réunion de lancement		4 sept. 2026	
10		**LOT 01 - Installation de chantier - Echaffaudages**		**7 sept. 2026**	
11		Travaux préparatoirs	5 jours	7 sept. 2026	
12		Echaffaudages et protections	10 jours	7 sept. 2026	
13		**LOT 02 - GO - Ravalement - Réparation pierre - Zinguerie**		**21/09/2026**	**10**
14		Déplacement groupes clim	5 jours	21/09/2026	
15		Reprises balcons	15 jours	21/09/2026	
16		**Ravalement façades + reprises d'enduit diverses**		**28/09/2026**	
17		Ravalement façade Nord-Ouest	10 jours	28/09/2026	14
18		Ravalement façade Nord-Est	10 jours	5 oct. 2026	17FD-5 jours
19		Ravalement façade Sud-Est	10 jours	12 oct. 2026	17
20		Ravalement façade Sud-Ouest	15 jours	19 oct. 2026	18
21		**Ouvrages divers**		**26 oct. 2026**	**16FD-10 jours**
22		Nettoyage pierre de taille et joints	10 jours	26 oct. 2026	
23		Reprises escalier	5 jours	26 oct. 2026	
24		Nettoyage et vérifications zinguerie	5 jours	9 nov. 2026	20
25		Nettoyage	3 jours	16 nov. 2026	21
26		OPR		18 nov. 2026	25
27		Levée des réserves	15 jours	19 nov. 2026	26
28		RECEPTION		9 déc. 2026	27
