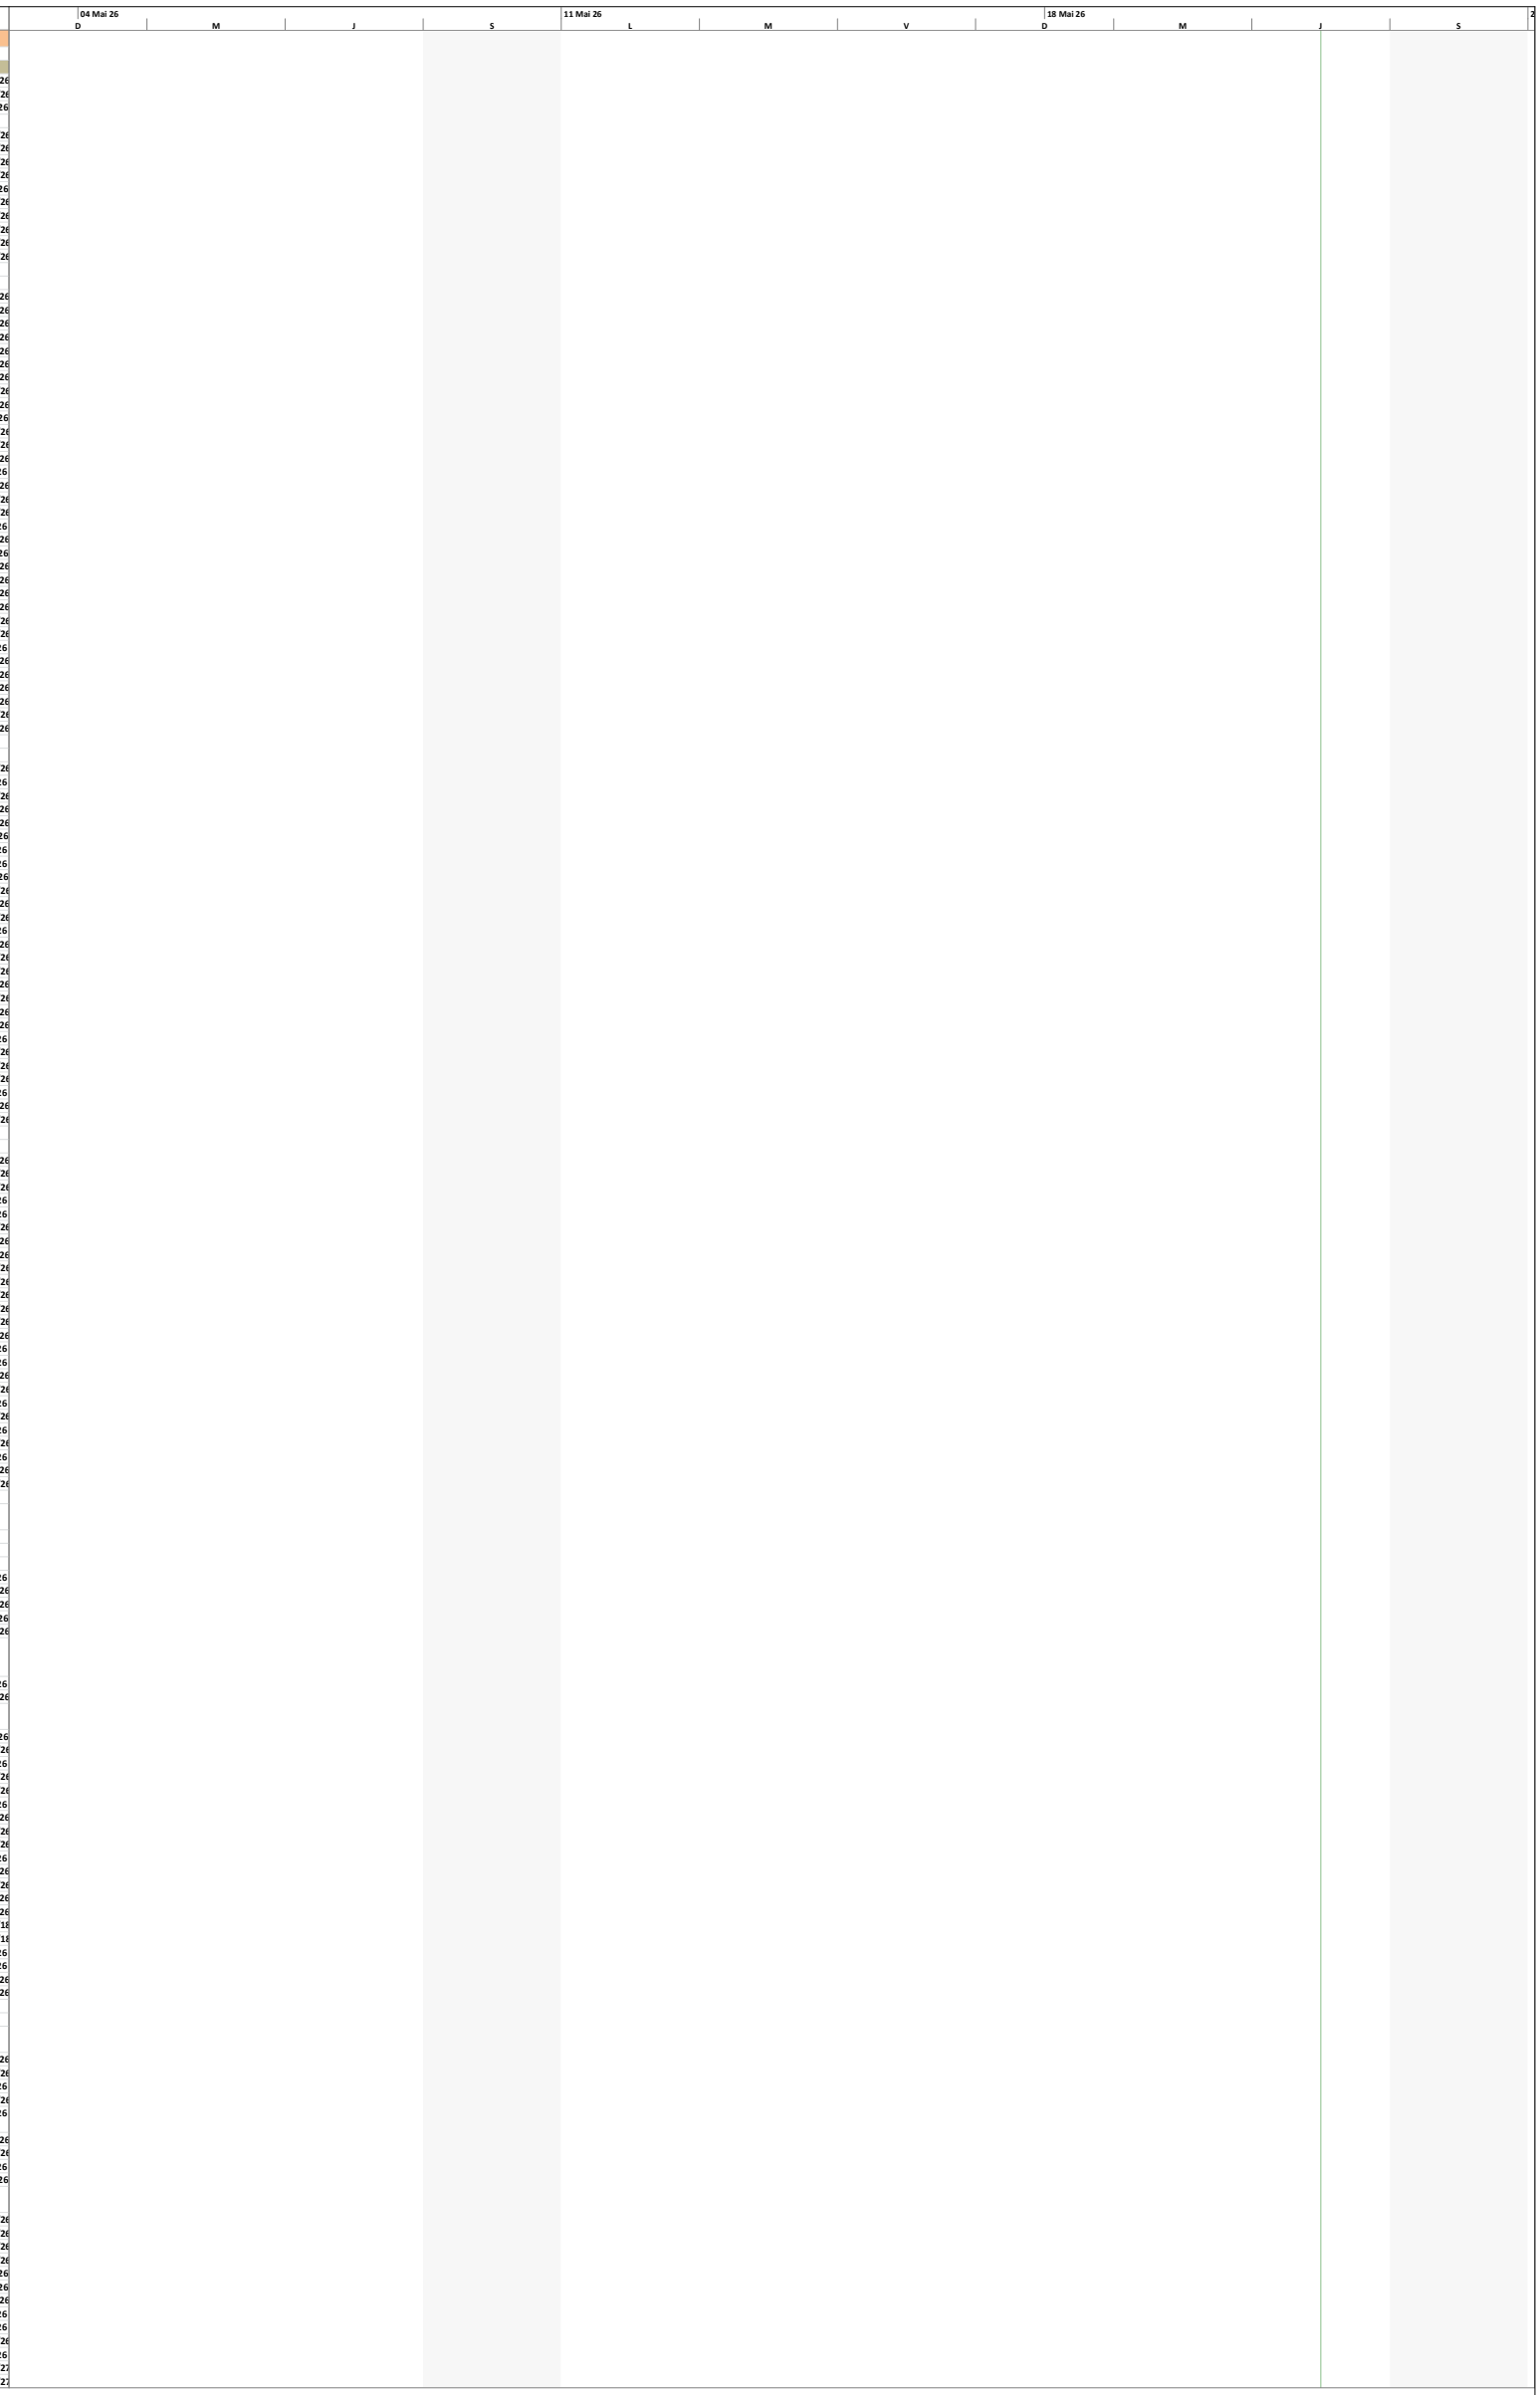N°	Mode Tâche	LOT	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1			**R2503_PTA ROUTINE**			
2						
3			**CALENDRIER DES TRAVAUX**			
4		Juridique	2ème Consultation Lot N°8 & DLRO	10 jr	Lun 01/06/26	Ven 12/06/26
5		Maîtrise d'Œuvre	RAO	2 jrs	Lun 08/06/26	Mar 09/06/26
6			Notification Lot N°8 CVC Plomberie	1 jr	Lun 15/06/26	Lun 15/06/26
7						
8		Toutes entreprises	Réunion de préparation Lot N°8	1 jr	Mar 16/06/26	Mar 16/06/26
9		Lot N°3	Plans exécutions ouvrages béton	15 jr	Mer 17/06/26	Mar 07/07/26
10		Lot N°4	Plans exécution Lot menuiseries aluminium	10 jr	Mer 17/06/26	Mar 30/06/26
11		Lot N°4	Commande et livraison fenêtres	25 jr	Mer 17/06/26	Mar 21/07/26
12		Lot N°4	Plans exécution serrurerie, structure support CTA	15 jr	Mar 16/06/26	Lun 06/07/26
13		Lot N°7	Plans exécution Lot Menuiserie bois	20 jr	Mer 17/06/26	Mar 14/07/26
14		Lot N°8	Plans exécution CVC	15 jr	Mer 17/06/26	Mar 07/07/26
15		Lot N°9	Plans exécution CFO Cfa SSI	20 jr	Mer 17/06/26	Mar 14/07/26
16		Lot N°10	Plans exécution chambre froide	30 jr	Mer 17/06/26	Mar 28/07/26
17		Lot N°11	Plans exécution étanchéité provisoire	10 jr	Mer 17/06/26	Mar 30/06/26
18						
19			**PTA**			
20		Lot N°2	Dépose des paillasses & confinements	3 jrs	Mer 17/06/26	Ven 19/06/26
21		Lot N°5	Dépose du faux plafond	3 jrs	Mer 17/06/26	Ven 19/06/26
22		Lot N°8	Dépose installations traitement d'air en plénum	5 jrs	Lun 22/06/26	Ven 26/06/26
23		Lot N°9	Dépose des installations électriques	4 jrs	Mar 16/06/26	Ven 19/06/26
24		Lot N°3	Création des plots béton en toiture terrasse	5 jrs	Lun 06/07/26	Ven 10/07/26
25		Lot N°3	Dépose des édicules en toiture terrasse	10 jr	Lun 08/06/26	Ven 19/06/26
26		Lot N°3	Rebouchage des trémies en plancher haut	10 jr	Lun 22/06/26	Ven 03/07/26
27		Lot N°11	Etanchéité provisoire au droit des trémies rebouchées	7 jrs	Lun 29/06/26	Mar 07/07/26
28		Lot N°3	Réalisation des nouvelles trémies	10 jr	Lun 22/06/26	Ven 03/07/26
29		Lot N°11	Etanchéité provisoire au droit des trémies créées	4 jrs	Mer 01/07/26	Lun 06/07/26
30		Lot N°3	Rebouchage des planchers dans les gaines techniques	3 jrs	Lun 06/07/26	Mer 08/07/26
31		Lot N°8	Installation appareillage CVC en plénum zone laboratoire	18 jr	Lun 13/07/26	Mer 05/08/26
32		Lot N°9	Mise en place réseaux électriques en plénum	15 jr	Lun 06/07/26	Ven 24/07/26
33		Lot N°6	Arrachage du revêtement de sol	2 jrs	Mer 29/07/26	Jeu 30/07/26
34		Lot N°4	Dépose des fenêtres et repose	15 jr	Lun 20/07/26	Ven 07/08/26
35		Lot N°5	Réalisation des doublages allèges fenêtres & impostes	12 jr	Lun 27/07/26	Mar 11/08/26
36		Lot N°5	Dépose des portes DAS et pose des nouveaux cadres	2 jrs	Lun 27/07/26	Mar 28/07/26
37		Lot N°06	Préparation des murs et poteaux revêtement goutelette	4 jrs	Lun 27/07/26	Jeu 30/07/26
38		Lot N°06	Réalisation du ragréage	1 jr	Ven 31/07/26	Ven 31/07/26
39		Lot N°4	Pose des cloisons vitrées	1 jr	Lun 03/08/26	Lun 03/08/26
40		Lot N°5	Réalisation du faux plafond	5 jrs	Lun 03/08/26	Ven 07/08/26
41		Lot N°9	Pose des luminaires	5 jrs	Lun 03/08/26	Ven 07/08/26
42		Lot N°06	Pose du revêtement de sol	5 jrs	Lun 10/08/26	Ven 14/08/26
43		Lot N°06	Pose du revêtement mural	5 jrs	Lun 17/08/26	Ven 21/08/26
44		Lot N°06	Pose des goulottes électriques et appareillage	5 jrs	Mer 19/08/26	Mar 25/08/26
45		Lot N°8	Pose des réseaux plomberie	5 jrs	Mer 19/08/26	Mar 25/08/26
46		Lot N°12	Nettoyage de livraison, vitrages, et première passe sol	4 jrs	Lun 24/08/26	Jeu 27/08/26
47		Lot N°7	Pose des plans de travail	3 jrs	Mer 26/08/26	Ven 28/08/26
48		Lot N°8	Pose lavabos	1 jr	Ven 28/08/26	Ven 28/08/26
49		Lot N°7	Pose des portes stratifiée DAS	1 jr	Ven 28/08/26	Ven 28/08/26
50		Lot N°4	Réalisation structure métallique support CTA en toiture	10 jr	Lun 03/08/26	Ven 14/08/26
51		Lot N°8	Pose des CTA en toiture terrasse	8 jrs	Lun 05/10/26	Mer 14/10/26
52		Lot N°8	Mise en service	2 jrs	Jeu 15/10/26	Ven 16/10/26
53						
54			**LABORATOIRE DE RECHERCHE**			
55			émolition de la cloison dans laboratoire & rebouchage en s	2 jrs	Lun 08/06/26	Mar 09/06/26
56		Lot N°8	épose des radiateurs et canalisations dans futur laboratoir	4 jrs	Lun 29/06/26	Jeu 02/07/26
57		Lot N°9	Dépose installations électriques	2 jrs	Lun 08/06/26	Mar 09/06/26
58		Lot N°8	Installation appareillage CVC en plénum zone laboratoire	6 jrs	Ven 03/07/26	Ven 10/07/26
59		Lot N°9	Mise en place réseaux électriques en plénum	5 jrs	Lun 29/06/26	Ven 03/07/26
60		Lot N°5	Dépose cadre porte existante et pose nouveau cadre	1 jr	Lun 13/07/26	Lun 13/07/26
61		Lot N°5	épose porte & réalisation cloison pour fermeture de la bai	2 jrs	Mer 15/07/26	Jeu 16/07/26
62		Lot N°5	Réalisation cloison 98/48	2 jrs	Mer 15/07/26	Jeu 16/07/26
63		Lot N°5	Démolition partielle de la cloison RLRA54/RLRA62	1 jr	Lun 20/07/26	Lun 20/07/26
64		Lot N°4	Dépose des fenêtres et repose	3 jrs	Lun 20/07/26	Mer 22/07/26
65		Lot N°5	Réalisation des doublages allèges fenêtres & impostes	3 jrs	Mer 22/07/26	Ven 24/07/26
66		Lot N°6	Préparation des murs	2 jrs	Lun 27/07/26	Mar 28/07/26
67		Lot N°4	Pose des cloisons vitrées	4 jrs	Lun 27/07/26	Jeu 30/07/26
68		Lot N°6	Réalisation du ragréage	1 jr	Ven 31/07/26	Ven 31/07/26
69		Lot N°5	Réalisation du faux plafond	3 jrs	Lun 03/08/26	Mer 05/08/26
70		Lot N°9	Pose des luminaires	2 jrs	Mar 04/08/26	Mer 05/08/26
71		Lot N°6	Pose du revêtement de sol	2 jrs	Jeu 06/08/26	Ven 07/08/26
72		Lot N°6	Pose du revêtement mural	3 jrs	Lun 10/08/26	Mer 12/08/26
73		Lot N°9	Pose des goulottes électriques et appareillage	2 jrs	Jeu 13/08/26	Ven 14/08/26
74		Lot N°8	Pose des réseaux plomberie	2 jrs	Jeu 13/08/26	Ven 14/08/26
75		Lot N°12	Nettoyage de livraison, vitrages	1 jr	Jeu 13/08/26	Jeu 13/08/26
76		Lot N°7	Pose des plans de travail	2 jrs	Lun 17/08/26	Mar 18/08/26
77		Lot N°8	Pose lavabos	1 jr	Mer 19/08/26	Mer 19/08/26
78		Lot N°7	Pose de la porte stratifiée	1 jr	Mer 19/08/26	Mer 19/08/26
79		Lot N°12	Nettoyage de livraison, sol, plans de travail	1 jr	Jeu 20/08/26	Jeu 20/08/26
80		CHU	Bio nettoyage	1 jr	Ven 21/08/26	Ven 21/08/26
81		CHU	Déménagement du service Hémostase	3 jrs	Lun 24/08/26	Mer 26/08/26
82						
83			**LOCAL COMPRESSEUR & HEMOSTASE CV**			
84		Lot N°1	Désamiantage RLRAL2, RLRA47, RLRA48, RLRA46	12 jr	Jeu 27/08/26	Ven 11/09/26
85		Lot N°8	Dépose des réseaux hydrauliques et ventilo-convecteur	2 jrs	Lun 14/09/26	Mar 15/09/26
86		Lot N°4	Dépose de la cloison vitrée séparation RLRA2/RLRA47	2 jrs	Mar 15/09/26	Mer 16/09/26
87		Lot N°9	Dépose des réseaux électriques en plafond & murs	4 jrs	Lun 14/09/26	Jeu 17/09/26
88		Lot N°2	Dépose des paillasses & confinements	2 jrs	Mer 16/09/26	Jeu 17/09/26
89		Lot N°5	Réalisation cloison de séparation RLRA2/RLRA47	2 jrs	Lun 21/09/26	Mar 22/09/26
90		Lot N°5	Réalisation de la baie et pose huisserie RLRA70 & RLRA69	1 jr	Ven 18/09/26	Ven 18/09/26
91		Lot N°5	Remplacement du cadre porte RLRA69	2 jrs	Jeu 17/09/26	Ven 18/09/26
92		Lot N°4	Dépose des fenêtres et repose	4 jrs	Ven 18/09/26	Mer 23/09/26
93		Lot N°5	Réalisation des doublages allèges fenêtres & impostes	3 jrs	Lun 21/09/26	Mer 23/09/26
94		Lot N°6	Préparation des murs en goutelette	2 jrs	Lun 21/09/26	Mar 22/09/26
95		Lot N°8	Installation appareillage CVC en plénum zone laboratoire	10 jr	Mer 16/09/26	Mar 29/09/26
96		Lot N°9	Mise en place réseaux électriques en plénum	5 jrs	Mer 16/09/26	Mar 22/09/26
97		Lot N°6	Réalisation du ragréage	1 jr	Ven 25/09/26	Ven 25/09/26
98		Lot N°5	Réalisation du faux plafond	4 jrs	Lun 28/09/26	Jeu 01/10/26
99		Lot N°9	Pose des luminaires	3 jrs	Mar 29/09/26	Jeu 01/10/26
100		Lot N°6	Pose du revêtement de sol	2 jrs	Jeu 01/10/26	Ven 02/10/26
101		Lot N°6	Pose du revêtement mural	3 jrs	Lun 05/10/26	Mer 07/10/26
102		Lot N°12	Nettoyage vitrages et 1ère passe sol	1 jr	Jeu 08/10/26	Jeu 08/10/26
103		Lot N°7	Pose des plans de travail	3 jrs	Ven 09/10/26	Mar 13/10/26
104		Lot N°9	Pose des goulottes électriques et appareillage	7 jrs	Mer 07/10/26	Jeu 15/10/26
105		Lot N°7	Pose des portes stratifiées	1 jr	Mer 07/10/26	Mer 07/10/26
106		Lot N°12	Nettoyage de livraison	1 jr	Jeu 08/10/26	Jeu 08/10/26
107		CHU	Bio nettoyage	1 jr	Ven 09/10/26	Ven 09/10/26
108		CHU	Réaménagement du service Hémostase	3 jrs	Lun 12/10/26	Mer 14/10/26
109						
110		Lots dito	Les travaux dans le local compresseur seront réalisé dans la même période que le local Hémostase	23 jrs	Lun 14/09/26	Mer 14/10/26
111						
112			**SECTEUR PRE-ANALYTIQUE & STOCKAGE CHAMBRE FROIDE**			
113			**PREMIERE PHASE SECTEUR PRE-ANALYTIQUE**			
114		Lot N°2	Dépose des plans de travail	1 jr	Jeu 27/08/26	Jeu 27/08/26
115		Lot N°1	Confinement moitié pièce	2 jrs	Jeu 27/08/26	Ven 28/08/26
116		Lot N°1	Désamiantage des plinthes	5 jrs	Lun 31/08/26	Ven 04/09/26
117		Lot N°5	Dépose du faux plafond	1 jr	Lun 07/09/26	Lun 07/09/26
118		Lot N°8	Dépose installations traitement d'air en plénum	4 jrs	Mar 08/09/26	Ven 11/09/26
119		Lot N°9	Dépose des installations électriques avec maintient fonctionnement zone pré-analityque, modification des réseaux accroché en tête de la cloison	6 jrs	Mar 08/09/26	Mar 15/09/26
120		Lot N°5	Démolition cloison séparative circulation	2 jrs	Mer 16/09/26	Jeu 17/09/26
121		Lot N°5	Démolition partielle cloison pour passage pneumatique	1 jr	Ven 18/09/26	Ven 18/09/26
122		Lot N°5 & Lot N°4	Construction nouvelle cloison avec intégration passe plélèvements	5 jrs	Lun 21/09/26	Ven 25/09/26
123		Lot N°4	Dépose d'un bloc fenêtres et repose	1 jr	Lun 28/09/26	Lun 28/09/26
124		Lot N°5	Réalisation des doublages allèges fenêtres & impostes	2 jrs	Mar 29/09/26	Mer 30/09/26
125		Lot N°6	Préparation des murs en goutelette	1 jr	Jeu 08/10/26	Jeu 08/10/26
126		Lot N°8	Installation appareillage CVC en plénum zone laboratoire	5 jrs	Jeu 01/10/26	Mer 07/10/26
127		Lot N°9	Mise en place réseaux électriques en plénum	5 jrs	Jeu 01/10/26	Mer 07/10/26
128		Lot N°6	Préparation des murs en goutelette	1 jr	Jeu 08/10/26	Jeu 08/10/26
129		Lot N°6	Réalisation du ragréage	1 jr	Ven 09/10/26	Ven 09/10/26
130		Lot N°5	Réalisation du faux plafond	2 jrs	Lun 12/10/26	Mar 13/10/26
131		Lot N°9	Pose des luminaires	2 jrs	Lun 12/10/26	Mar 13/10/26
132		Lot N°6	Pose du revêtement de sol	2 jrs	Mer 14/10/26	Jeu 15/10/26
133		Lot N°6	Pose du revêtement mural	2 jrs	Jeu 15/10/26	Ven 16/10/26
134		Lot N°7	Pose des plans de travail	2 jrs	Lun 19/10/26	Mar 20/10/26
135		Lot N°9	Pose des goulottes électriques et appareillage	4 jrs	Mar 20/10/26	Ven 23/10/26
136		Lot N°7	Pose de la porte stratifiée	1 jr	Ven 23/10/26	Ven 23/10/26
137		Hors marché	Modification du pneumatique	2 jrs	Lun 26/03/18	Mar 27/03/18
138		Lot N°5	Reprise cloison en traversée tuyaux pneumatique	1 jr	Mer 28/03/18	Mer 28/03/18
139		Lot N°4	Pose de la cabine pneumatique & masque canalisations	1 jr	Jeu 29/10/26	Jeu 29/10/26
140		Lot N°12	Nettoyage de livraison	1 jr	Jeu 29/10/26	Jeu 29/10/26
141		CHU	Bio nettoyage	1 jr	Ven 30/10/26	Ven 30/10/26
142		CHU	Réaménagement du pré-analytique	1 jr	Ven 30/10/26	Ven 30/10/26
143						
144						
145			**DEUXIEME PHASE SECTEUR STOCKAGE, CHAMBRE FROIDE, LOCAL INFORMATIQUE**			
146		Lot N°1	Désamiantage des plinthes & sol	15 jr	Lun 02/11/26	Ven 20/11/26
147		Lot N°5	Dépose du faux plafond	2 jrs	Lun 23/11/26	Mar 24/11/26
148		Lot N°8	Dépose installations traitement d'air en plénum	3 jrs	Mar 24/11/26	Jeu 26/11/26
149			Dépose des installations électriques	2 jrs	Mar 24/11/26	Mer 25/11/26
150		Lot N°5	Démolition cloisons, la porte d'entrée sera conservée pour l'accès chantier	2 jrs	Mer 25/11/26	Jeu 26/11/26
151		Lot N°3	Réalisation du décaissé dans la chape pour chambre froide	1 jr	Ven 27/11/26	Ven 27/11/26
152		Lot N°9	Modication CC dans local informatique	1 jr	Mer 25/11/26	Mer 25/11/26
153		Lot N°5	Création nouvel accès local informatique avec pose porte	1 jr	Jeu 26/11/26	Jeu 26/11/26
154		Lot N°4	Dépose blocs fenêtres et repose	3 jrs	Jeu 26/11/26	Lun 30/11/26
155		Lot N°5	Dépose portes tiercées accès local informatique & fermeture de la baie	1 jr	Ven 27/11/26	Ven 27/11/26
156		Lot N°5	Réalisation des doublages allèges fenêtres & impostes	2 jrs	Lun 30/11/26	Mar 01/12/26
157		Lot N°10	Montage chambre froide	15 jr	Mer 02/12/26	Mar 22/12/26
158		Lot N°8	Installation appareillage CVC en plénum	5 jrs	Mer 02/12/26	Mar 08/12/26
159		Lot N°9	Mise en place réseaux électriques en plénum	5 jrs	Mer 02/12/26	Mar 08/12/26
160		Lot N°3	Rebouchage en périphérie chambre froide	1 jr	Lun 14/12/26	Lun 14/12/26
161		Lot N°5	Réalisation des cloisons & doublages isolants métalliques	6 jrs	Lun 14/12/26	Lun 21/12/26
162		Lot N°6	Réalisation du ragréage	1 jr	Ven 18/12/26	Ven 18/12/26
163		Lot N°5	Réalisation du faux plafond	4 jrs	Lun 21/12/26	Jeu 24/12/26
164		Lot N°9	Pose des luminaires	4 jrs	Lun 21/12/26	Jeu 24/12/26
165		Lot N°6	Pose du revêtement de sol	2 jrs	Lun 28/12/26	Mar 29/12/26
166		Lot N°12	Nettoyage	2 jrs	Mer 30/12/26	Jeu 31/12/26
167		Lot N°10	Pose des racks de rangements	2 jrs	Lun 04/01/27	Mar 05/01/27
168		CHU	Bio nettoyage	1 jr	Mer 06/01/27	Mer 06/01/27
